

দুর্নীতি দমন কমিশন এর আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের
ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএ ফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন- সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের হার (%) সর্বনিম্ন- সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	দুর্নীতি দমন কমিশন	০২	০২	-	-	০১	০১	০.০০ ১০০	-	-

সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০২।

প্রকল্পের নামঃ নোয়াখালী ও হবিগঞ্জ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

১। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণঃ

ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত ব্যয় ১২৭২.৪৭ লক্ষ টাকা, সংশোধিত ব্যয় ১১১৬.২৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় ৯৯২.৪০ লক্ষ টাকা। মূলত প্রকল্পের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ ভূমি অধিগ্রহণ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন না হওয়ার কারণে প্রকল্পে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

নোয়াখালী ও হবিগঞ্জ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৯)

- ১। প্রকল্পের নাম : নোয়াখালী ও হবিগঞ্জ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)
- ২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : দুর্নীতি দমন কমিশন।
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : দুর্নীতি দমন কমিশন / গণপূর্ত বিভাগ।
- ৪। প্রকল্প এলাকা : নোয়াখালী ও হবিগঞ্জ।
- ৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃসাঃ)		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১২৭২.৪৭	১১১৬.২৩	৯৯২.৪০	জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৭	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

৬। **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য:**

৬.১ **পটভূমি:** দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ ২০০৪ সালের ২১ নভেম্বর সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধী পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন এবং একটি শক্তিশালী দুর্নীতি বিরোধী সংস্কৃতির চর্চা এবং এর প্রসার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে যাত্রা শুরু করে। যদিও প্রতিষ্ঠানটি এর কাজক্ষিত প্রভাব প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি, তবে ২০০৭ সালে এর পুনর্গঠনের পরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘের ২০০৩ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক রচিত কনভেনশনের সাথে মিল রেখে নতুন শক্তি ও প্রেরণা নিয়ে কাজ শুরু করে। দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি মোকাবেলায় তিনটি সক্রিয় কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে দায়বদ্ধ, যথাঃ পদ্ধতি পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিরোধ এবং এডভোকেসি যা চারটি সমর্থিত লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে দুর্নীতি দমন কমিশনের ২২টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে। এগুলোকে সমন্বিত জেলা কার্যালয় বলা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজের ব্যাপকতা বিবেচনায় এ অফিসগুলোতে অনেক কাজ সম্পাদন করতে হয়। কিন্তু অবকাঠামোগত সুবিধা, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহায়তা ইত্যাদির অভাবে আশানুরূপভাবে এ অফিসগুলোতে কাজ করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া, সমন্বিত জেলা কার্যালয়গুলোর জন্য নিজস্ব কোন অফিস ভবন নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাড়া বাড়ি অথবা জেলা প্রশাসন ভবনের এক/একাধিক কক্ষে দুদকের কার্যালয় অবস্থিত। এ অবস্থা হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ে দুদক এর নিজস্ব ভবন স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নোয়াখালী ও হবিগঞ্জ জেলায় নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

৬.২ উদ্দেশ্য: প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ৩টি জেলা সদরে দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মচারীদের জন্য উন্নত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং জেলা পর্যায়ে সংস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা।

৭। পিসিআর অনুসারে প্রকল্পের অর্থায়নিক বাস্তবায়ন:

(Financial Figure in Lac Tk)

Items of work (as per DPP)	Unit	Target (as per DPP)		Actual Progress	
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)
1	2	3	4	5	6
Revenue Components					
Stationery, seals and Stamps etc.		4.00		1.95	
Advertisements		2.00		1.00	
Hiring Vehicles		60.00		13.32	
Testing Fee		3.00		2.51	
Honorarium of PSC, PIC and Tender Committee meeting		3.50		0.71	
Others Expenses		3.00		0.24	
Repairs & Maintenance (Computers and office Equipment)		2.00		0.00	
Camera and accessories		1.00		1.00	
Computers With Software, Printer and Accessories etc		2.50		2.42	
Office furniture		6.00		5.29	
Fire Fighting Equipments		2.00		1.76	
Land Acquisition		195.45	0.59 acre	195.45	
Site Development		3.63		3.63	
Office Buildings		680.41	1449.89 & 865.76 sqm	635.60	
Approach Road		12.35		12.35	
Boundary Wall & Gate		28.83		28.83	
Gas Connection		3.07		3.07	
Water Supply and Sanitation		34.71		34.71	
Electrical Installation		48.56		48.56	
Price & Physical Contingenvy		20.22		0	
Grand Total =		1116.23		992 . 40	

৮। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

Name & Designation With pay Scale.	Full time	Part time	Responsible for more than one project	Date of		Remarks
				Joining	Transfer	
1	2	3	4	5	6	7
Niru Shamsun Nahar Director 43,000-69,850/-	-	Additional charge	No	28/10/2015	03/10/2017	
Jalal Saifur Rahman Director 43,000-69,850/-	-	Additional charge	No	03/10/2017	20/05/2018	
Mohammad Abdul Awal Director 43,000-69,850/-	-	Additional charge		20/05/2018	No	

৯। ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ঃ

নং	প্যাকেজ/কাজের নাম	-প্রাক্কলিত ব্যয় -কার্যাদেশকৃত মূল্য -প্রদত্ত বিল (কোটি টাকা)	-দরপত্র আহবানের তারিখ -চুক্তির তারিখ -চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ -প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
1	Construction of the office building at Habiganj for Anti-Corruption commission Integrated District office including 2 storied building with 6 storied foundation, Internal sanitary & Electrification, External Sanitary & Electrification, site development, Internal Road, Boundary Wall & gates, Fire Fighting equipment etc.	৩.৪৬৫ ৩.১১৮৯	০৮/০৫/২০১৮ ২৫/০৭/২০১৮ ২৫/০১/২০১৯	
2	Construction of the office building at Noakhali for Anti-Corruption	৪.০৯ ৪.০৯	২৩/০১/২০১৭ ৩০/০১/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৯	

নং	প্যাকেজ/কাজের নাম	-প্রাক্কলিত ব্যয় -কার্যাদেশকৃত মূল্য -প্রদত্ত বিল (কোটি টাকা)	-দরপত্র আহবানের তারিখ -চুক্তির তারিখ -চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ -প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
	commission Integrated Distict office including 2 storied building with 6 storied foundation, Internal sanitary & Electrification, External Sanitary & Electrification, site development, Appriach Road, Gas connection, Boundary Wall & gates, Fire Fighting equipment etc.			

১০। কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণঃ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে।

১১। প্রকল্পের অনুমোদন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধনঃ

(লক্ষ টাকায়)

	মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়
মূল	জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৭	১২৭২.৪৭
১ম সংশোধন	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	১১১৬.২৩

১২। সার্বিক অগ্রগতিঃ ১০০%

১৩। প্রকল্প পরিদর্শনঃ গত ২৯/০১/২১ ও ১২/০২/২১ তারিখে আইএমইডি'র উপ-পরিচালক মোছাঃ নাদিরা আখতার কর্তৃক প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নোয়াখালী জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব ইশরাত সাদমীন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

১৩.১ ভূমি অধিগ্রহণঃ প্রকল্পের অধীনে নোয়াখালী ও হবিগঞ্জ জেলায় ছয় তলা ফাউন্ডেশনসহ দুই তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে ডিপিপিতে ১৯৫.৪৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। দুই তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণের জন্য নোয়াখালী জেলায় ২৪ শতাংশ ও হবিগঞ্জ জেলায় ৩৫ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

১৩.২ অফিস ভবন নির্মাণঃ

(ক) প্রকল্পের অধীনে নোয়াখালী জেলায় ছয় তলা ফাউন্ডেশনসহ দুই তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে ৪.১১২৬ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়। তদনুযায়ী নোয়াখালী জেলায় ছয় তলা ফাউন্ডেশনসহ ১৪৪৯.৮৯ বর্গ মিটারের দুই তলা বিশিষ্ট একটি অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ২৩/১১/২০১৭ তারিখে টেন্ডার আহবান করা হয়, ৩০/০১/২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

(খ) প্রকল্পের অধীনে হবিগঞ্জ জেলায় ছয় তলা ফাউন্ডেশনসহ দুই তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে ৪.০৭৩০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়। তদনুযায়ী হবিগঞ্জ জেলায় ছয় তলা ফাউন্ডেশনসহ ৮৬৫.৭৬ বর্গ মিটারের দুই তলা বিশিষ্ট একটি অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ০৮/০৫/২০১৮ তারিখে টেন্ডার আহবান করা হয়, ২৫/০৭/২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ২৫/০১/২০১৯ তারিখে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

১৩.৩ **বাউন্ডারি ওয়াল, গেট, এপ্রোচ রোড,সাইট ডেভেলপমেন্ট:** বাউন্ডারি ওয়াল, গেট, এপ্রোচ রোড, নির্মাণ ও সাইট ডেভেলপমেন্টের জন্য ডিপিপিতে ৪১.১৮ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। নোয়াখালী জেলার অফিসের জন্য ৫২.৬৮ মিটার এপ্রোচ রোড, মেইন গেট ও ১২৫.৫৭ মিটার বাউন্ডারি ওয়াল ও হবিগঞ্জ জেলার অফিসের জন্য ৪০০ ফুট এপ্রোচ রোড, মেইন গেট ও ৪৯৪.৫০ ফুট বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

১৩.৪ **ড্রেন নির্মাণ, পয়ঃ নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ:** ড্রেন নির্মাণ, পয়ঃ নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহের জন্য ডিপিপিতে ৪৮.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী নোয়াখালী জেলার জন্য ৯২.৮১ মিটার ও হবিগঞ্জ জেলার ২৮০.০০ ফুট ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২টি অফিসে পানি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩.৫ **ক্যামেরা এবং এক্সেসরিজ ক্রয়:** অফিসের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ক্যামেরা এবং এক্সেসরিজ ক্রয়ের নিমিত্তে ডিপিপিতে ১.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

১৩.৬ **ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট ক্রয়:** ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের নিমিত্তে ডিপিপিতে ২.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। নোয়াখালী জেলার জন্য ৩৪ টি ও হবিগঞ্জ জেলার জন্য ১৬ টি ফায়ার এক্সটিংগুইশার স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে স্থাপিত ইকুইপমেন্টসমূহ সচল অবস্থায় পাওয়া গেছে।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য অর্জন
প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ৩টি জেলা সদরে দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মচারীদের জন্য উন্নত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং জেলা পর্যায়ে সংস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা।	প্রকল্পের আওতায় ৩টি জেলা সদরে দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মচারীদের জন্য উন্নত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে সংস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে।

১৫। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৬। **রাজস্ব খাতে স্থানান্তরঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৭। **অডিট সংক্রান্ত তথ্য:**

পিসিআরের তথ্য এবং পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অডিট সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ


(ক) নোয়াখালী জেলার অফিস নির্মাণে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে ৩১-০৩-১৯ থেকে ০৫-০৪-১৯ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে ২৪-০৩-২০ থেকে ৩১-০৩-২০ অডিট সম্পন্ন হয়েছে। বীমা কাভারেজ নির্ধারণ না করে নোয়াখালী অফিস ভবন নির্মাণ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় বীমা কাভারেজ সংক্রান্ত ১টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয় যা অডিট রিপোর্ট না পাওয়ায় এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। তবে অডিটর জেনারেলের অফিস কর্তৃক এখনও অডিট করা হয় নাই।

(খ) হবিগঞ্জ জেলার অফিস নির্মাণে কোন অডিট সম্পাদন হয়নি।

১৮। **বিশেষ পর্যবেক্ষণ:**

- ১৮.১ নোয়াখালী অফিসের উপ-পরিচালক জনাব মোঃজাহাঙ্গীর আলম এর নিকট থেকে জানা যায় যে, কাজের গুণগত মান ভাল এবং ডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। তবে গাড়ীর গ্যারেজ ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ করা হলেও তাদের গাড়ীর আকার বড় হওয়ার কারণে গ্যারেজ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছেনা, এছাড়াও সোলার বিদ্যুৎ ঠিকমত কাজ করছে না। তবে পিডব্লিউডি দ্বুত উক্ত সমস্যা সমাধান করে দিবেন বলে জানিয়েছেন। এছাড়াও তিনি জানান যে, তাদের অফিস নির্মাণের বিষয়ে তারা কোন অসুবিধা অনুধাবন করছেন না, বা এ বিষয়ে তাদের কোন অভিযোগ নেই।
- ১৮.২ হবিগঞ্জ অফিসের উপ-পরিচালক জনাব কামরুজ্জামান জানান যে, কাজের গুণগত মান ভাল এবং ডিপিপি অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে অফিসের রুমের বারান্দায় সেফটি গ্রিল মাত্র দুই ফুট উচ্চতা সম্পন্ন এবং উপরের অংশ পুরো ফাঁকা। এতে করে অফিসের নিরাপত্তা পুরোপুরি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এছাড়াও তিনি জানান যে, তাদের অফিস ব্যবহারের বিষয়ে তারা কোন অসুবিধা অনুধাবন করছেন না, বা এ বিষয়ে তাদের কোন অভিযোগ নেই।
- ১৮.৩ প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার পরেও ২টি অফিস ভবন নির্মাণে কোন এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়নি।
- ১৮.৪ নোয়াখালী জেলার অফিস নির্মাণে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইন্টারনাল অডিট সম্পন্ন হলেও হবিগঞ্জ জেলার অফিস নির্মাণে কোন মূল অডিট সম্পাদন হয়নি।
- ১৮.৫ পিসিআর অনুযায়ী নোয়াখালী অফিস নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ব্যয় ও কার্যাদেশকৃত মূল্য একই এবং প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ও প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০ জুন, ২০১৯, যা অসামঞ্জস্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।
- ১৯। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের উল্লেখ্যযোগ্য স্থির চিত্র:**



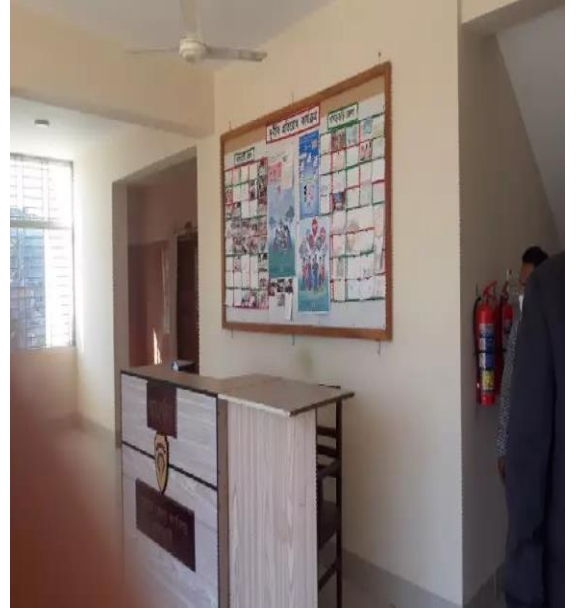

২০। মতামত/সুপারিশঃ

- ২০.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রকল্পের মেয়াদ ও মোট ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়নি যা প্রশংসাযোগ্য। তবে প্রকল্পটি একবার সংশোধন করতে হয়েছে। পরবর্তীতে এ ধরনের প্রকল্প সংশোধন ব্যতীত বাস্তবায়ন করার বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে।
- ২০.২ নোয়াখালী ও হবিগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ভবন দুইটি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থাপনাসমূহ সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ২০.৩ নোয়াখালী আঞ্চলিক অফিসের গ্যারেজ ও সোলার সিস্টেম দ্রুত মেরামত করে দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ২০.৪ হবিগঞ্জ আঞ্চলিক অফিসের রুমের বারান্দায় সেফটি গ্রীল দ্রুত মেরামতপূর্বক অফিসের নিরাপত্তা পুরোপুরি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ২০.৫ নোয়াখালী অফিস ভবন নির্মাণের বিষয়ে উত্থাপিত অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ২০.৬ উভয় অফিস ভবন নির্মাণের বিষয়ে দ্রুত এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ২০.৭ পিসিআর অনুযায়ী নোয়াখালী অফিস নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ব্যয় ও কার্যাদেশকৃত মূল্য একই এবং প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ও প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০ জুন, ২০১৯, যা আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

রাজামাটি, কুষ্টিয়া এবং ময়মনসিংহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)
শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৯)

- ১। প্রকল্পের নাম : রাজামাটি, কুষ্টিয়া এবং ময়মনসিংহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)
- ২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : দুর্নীতি দমন কমিশন।
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : দুর্নীতি দমন কমিশন/গণপূর্ত বিভাগ।
- ৪। প্রকল্প এলাকা : রাজামাটি, কুষ্টিয়া এবং ময়মনসিংহ।
- ৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃসাঃ)		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮৮২.৯২	১৭৮৬.৫৫	১৭৭৬.৮৯	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

৬। **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য:**

৬.১ **পটভূমি:** দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ ২০০৪ সালের ২১ নভেম্বর সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধী পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন এবং একটি শক্তিশালী দুর্নীতি বিরোধী সংস্কৃতির চর্চা এবং এর প্রসার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে যাত্রা শুরু করে। যদিও প্রতিষ্ঠানটি এর কাজের প্রভাব প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি, তবে ২০০৭ সালে এর পুনর্গঠনের পরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘের ২০০৩ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক রচিত কনভেনশনের সাথে মিল রেখে নতুন শক্তি ও প্রেরণা নিয়ে কাজ শুরু করে। দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি মোকাবেলায় তিনটি সক্রিয় কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে দায়বদ্ধ, যথাঃ পদ্ধতি পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিরোধ এবং এডভোকেসি যা চারটি সমর্থিত লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে দুর্নীতি দমন কমিশনের ২২টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে, এগুলোকে সমন্বিত জেলা কার্যালয় বলা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজের ব্যাপকতা বিবেচনায় এ অফিসগুলোতে অনেক কাজ সম্পাদন করতে হয়। কিন্তু অবকাঠামোগত সুবিধা, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহায়তা ইত্যাদির অভাবে আশানুরূপভাবে এ অফিসগুলোতে কাজ করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া, সমন্বিত জেলা কার্যালয়গুলোর জন্য নিজস্ব কোন অফিস ভবন নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাড়া বাড়ি অথবা জেলা প্রশাসন ভবনের এক/একাধিক কক্ষে দুদকের কার্যালয় অবস্থিত। এ অবস্থা হতে পরিব্রাণের লক্ষ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ে দুদক এর নিজস্ব ভবন স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে যশোরে ভবন নির্মিত হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় রাজামাটি, কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহে নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

৬.২ **উদ্দেশ্য:** প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ৩টি জেলা সদরে দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মচারীদের জন্য উন্নত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং জেলা পর্যায়ে সংস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা।

৭। পিসিআর অনুসারে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন:

(Financial Figure in Lac Tk)

Items of work (as per DPP)	Unit	Target (as per DPP)		Actual Progress	
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)
1	2	3	4	5	6
Honorarium allowance		1.51		0.91	
Transport hiring		3.86		2.06	
Advertising expenses		1.87		1.87	
Testing fee		3.62		3.12	
Other stationery		3.95		1.95	
Computer Repair & Maintenance		0.50		0	
Non-residential buildings (Site Development, Office Buildings, Approach Road, Boundary Wall & Gate)		960.80	867.76 sqm* 2 & 945.28 sqm	960.54	
Drainage structure		4.25		4.25	
Sanitation & Water supply		56.24		52.24	
Computers and accessories		4.57		4.57	
Camera and accessories		1.96		1.96	
Electrical equipment		144.77		144.77	
Fire fighting equipment		1.80		1.80	
Furniture		2.34		2.34	
Tree, crop, and plant resources yielding repeat products		2.70		2.70	
Acquisition/ purchase of land		591.81	1.00 acre	591.81	
Grand Total =		1786.55		1776.89	

৮। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

Name & Designation With pay Scale.	Full time	Part time	Responsible for more than one project	Date of		Remarks
				Joining	Transfer	
1	2	3	4	5	6	7
Mr. Manzur Ahmed Director 43,000-69,850/-	-	Additional charge		27/11/2016	08/11/2017	
Mr. Jalal Saifur Rahaman Director 43,000-69,850/-	-	Additional charge		08/11/2017	No	

৯। ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ঃ

নং	প্যাকেজ/কাজের নাম	-প্রাক্কলিত ব্যয় -কার্যাদেশকৃত মূল্য -প্রদত্ত বিল (কোটি টাকা)	-দরপত্র আহবানের তারিখ -চুক্তির তারিখ -চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ -প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
1	Construction of 2 storied ACC Office Building With 4 storied foundation in the District of Rangamati under the project “Construction of the office Building for Rangamati, Kushtia and Mymensingh Integrated District office	৩.৬৪৯৫ ৩.৬৪৯৫	০৯/০৫/২০১৭ ০১/০৮/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৯	
	Construction of 2 storied ACC Office Building With 4 storied foundation in the District of Kushtia under the project “Construction of the office Building for Rangamati, Kushtia and Mymensingh Integrated District office	৩.৫৪১৬ ৩.৫৪১৬	০৯/০৫/২০১৭ ০১/০৮/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৯	

নং	প্যাকেজ/কাজের নাম	-প্রাক্কলিত ব্যয় -কার্যাদেশকৃত মূল্য -প্রদত্ত বিল (কোটি টাকা)	-দরপত্র আহবানের তারিখ -চুক্তির তারিখ -চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ -প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
	Construction of 2 storied ACC Office Building With 4 storied foundation in the District of Mymensingh under the project “Construction of the office Building for Rangamati, Kushtia and Mymensingh Integrated District office	৪.৫৬০৭ ৪.৫১৮১	০৯/০৫/২০১৭ ০১/০৮/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৯	

১০। কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণঃ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

১১। প্রকল্পের অনুমোদন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধনঃ

(লক্ষ টাকায়)

	মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়
মূল	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	১৮৮২.৯২
১ম সংশোধন	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	১৭৮৬.৫৫

১২। সার্বিক অগ্রগতিঃ আর্থিক ১০০%
বাস্তব ১০০%

১৩। প্রকল্প পরিদর্শনঃ গত ১৫/০১/২০২১, ০৫/ ০২/২০২১ ও ০৪/০৬/২০২১ তারিখে আইএমইডি’র উপ-পরিচালক মোহাঃ নাদিরা আখতার কর্তৃক প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

১৩.১ ভূমি অধিগ্রহণঃ প্রকল্পের অধীনে রাজামাটি, কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ জেলায় চার তলা ফাউন্ডেশনসহ দুই তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ডিপিপি ৫৯১.৮১ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। দুই তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণের জন্য রাজামাটি জেলায় ৪৪.৫০ শতাংশ, কুষ্টিয়া জেলায় ১ একর, ময়মনসিংহ জেলায় ৫০ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

১৩.২ অফিস ভবন নির্মাণঃ

(ক) প্রকল্পের অধীনে রাজামাটি জেলায় ৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ দুই তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ডিপিপি ৩.৬৪৯৫ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়। তদনুযায়ী রাজামাটি জেলায় চার তলা ফাউন্ডেশনসহ ৮৬৫.৭৬ বর্গমিটারের দুই তলা বিশিষ্ট একটি অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ০৯/০৫/২০১৭ তারিখে টেন্ডার আহবান করা হয়, ০১/০৮/২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

- (খ) প্রকল্পের অধীনে কুষ্টিয়া জেলায় চার তলা ফাউন্ডেশনসহ দুই তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে ৩.৫৪১৬ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়। তদনুযায়ী কুষ্টিয়া জেলায় চার তলা ফাউন্ডেশনসহ ৯৪৫.২৮ বর্গমিটারের দুই তলা বিশিষ্ট একটি অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ০৯/০৫/২০১৭ তারিখে টেন্ডার আহবান করা হয়, ০১/০৮/২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।
- (গ) প্রকল্পের অধীনে ময়মনসিংহ জেলায় চার তলা ফাউন্ডেশনসহ দুই তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে ৪.৫৬০৭ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়। তদনুযায়ী ময়মনসিংহ জেলায় চার তলা ফাউন্ডেশনসহ ৯৪৫.২৮ বর্গমিটারের দুই তলা বিশিষ্ট একটি অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ০৯/০৫/২০১৭ তারিখে টেন্ডার আহবান করা হয়, ০১/০৮/২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।
- ১৩.৩ **বাউন্ডারি ওয়াল, গেট, এপ্রোচ রোড, সাইট ডেভেলপমেন্ট:** বাউন্ডারি ওয়াল, গেট, এপ্রোচ রোড নির্মাণ ও সাইট ডেভেলপমেন্টের জন্য ডিপিপিতে ৯৬০.৮০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। রাজশামাটি জেলার অফিসের জন্য ৩৯৩.৮০ বর্গ মিটার এপ্রোচ রোড, মেইন গেট ও ২০৮.৮০ মিটার বাউন্ডারি ওয়াল, কুষ্টিয়া জেলার অফিসের জন্য ৩৬৬.৩৫ বর্গ মিটার এপ্রোচ রোড, মেইন গেট ও ৪৮.৪৪ মিটার বাউন্ডারি ওয়াল, ময়মনসিংহ জেলার অফিসের জন্য ৯৫৫.০০ বর্গ মিটার এপ্রোচ রোড, মেইন গেট ও ১৩২.০০ মিটার বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।
- ১৩.৪ **ড্রেন নির্মাণ:** অফিসের পয়ঃপানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণের নিমিত্ত ৪.২৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী রাজশামাটি জেলার জন্য ৯০.৮৭ মিটার, কুষ্টিয়া জেলার ১৬৫.৬৫ মিটার, ময়মনসিংহ জেলার জন্য ১৬২.০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।
- ১৩.৫ **পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ:** পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি সরবরাহের জন্য ডিপিপিতে ৫৬.২৪ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। ৩টি অফিসে পানি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ১৩.৬ **ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট ক্রয়:** ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের নিমিত্ত ডিপিপিতে ১.৮০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। রাজশামাটি জেলার জন্য ২৫ টি, কুষ্টিয়া জেলার জন্য ০৮ টি ও ময়মনসিংহ জেলার জন্য ১৭ টি ফায়ার এক্সটিংগুইশার স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে স্থাপিত ইকুইপমেন্টসমূহ সচল অবস্থায় পাওয়া গেছে।
- ১৩.৭ **বৃক্ষরোপণসহ অন্যান্য:** বৃক্ষরোপণসহ অন্যান্য ক্রয়ের জন্য ২.৭০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। ৩টি অফিসেরই আজিনায় বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। রোপিত বৃক্ষগুলো ভাল অবস্থায় আছে।

১৪। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য অর্জন
প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ৩টি জেলা সদরে দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মচারীদের জন্য উন্নত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং জেলা পর্যায়ে সংস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা।	প্রকল্পের আওতায় ৩টি জেলা সদরে দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মচারীদের জন্য উন্নত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে সংস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে।

১৫। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৬। **রাজস্ব খাতে স্থানান্তরঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৭। **অডিট সংক্রান্ত তথ্য:** পিসিআরে অডিট সংক্রান্ত কোন তথ্য নেই। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, রাজামাটি, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ জেলার অফিস নির্মাণে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ৩টি অফিস নির্মাণে কোন অডিট আপত্তি নেই। তবে অডিটর জেনারেলের অফিস কর্তৃক এখনও অডিট করা হয় নাই।

১৮। **বিশেষ পর্যবেক্ষণ:**

১৮.১ রাজামাটি অফিসের উপ-পরিচালক জনাব মোঃনাছিম উদ্দিন এর কাছে থেকে জানা যায় যে, কাজের গুণগত মান ভাল এবং ডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, অফিস নির্মাণের বিষয়ে তারা কোন অসুবিধা অনুধাবন করছেন না, বা এ বিষয়ে তাদের কোন অভিযোগ নেই।

১৮.২ কুষ্টিয়া অফিসের উপ-পরিচালক জনাব মোঃজাকারিয়া এর কাছে থেকে জানা যায় যে, কাজের গুণগত মান ভাল এবং ডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, অফিস নির্মাণের বিষয়ে তারা কোন অসুবিধা অনুধাবন করছেন না, বা এ বিষয়ে তাদের কোন অভিযোগ নেই।

১৮.৩ ময়মনসিংহ অফিসের উপ-পরিচালক জনাব মোঃফারুখ আহমেদ এর কাছে থেকে জানা যায় যে, কাজের গুণগত মান ভাল এবং ডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, অফিস নির্মাণের বিষয়ে তারা কোন অসুবিধা অনুধাবন করছেন না, বা এ বিষয়ে তাদের কোন অভিযোগ নেই।

১৮.৪ প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার পরেও কোন এক্সট্রানীল অডিট সম্পন্ন হয়নি।

১৮.৫ পিসিআর অনুযায়ী রাজামাটি, কুষ্টিয়া এবং ময়মনসিংহ অফিস ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ব্যয় ও কার্যাদেশকৃত মূল্য একই এবং প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ও প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০ জুন, ২০১৯, যা অসামঞ্জস্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৯। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের উল্লেখ্যযোগ্য স্থির চিত্র:**





২০। মতামত/সুপারিশঃ

- ২০.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রকল্পের মেয়াদ ও মোট ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়নি যা প্রশংসারযোগ্য। তবে প্রকল্পটি একবার সংশোধন করতে হয়েছে। পরবর্তীতে এ ধরনের প্রকল্প সংশোধন ব্যতীত বাস্তবায়ন করার বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে।
- ২০.২ রাজশামাটি, কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ জেলায় প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ভবন তিনটি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থাপনাসমূহ সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ২০.৩ তিনটি অফিস ভবন-ই নির্মাণের বিষয়ে দ্রুত এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ২০.৪ পিসিআর অনুযায়ী রাজশামাটি, কুষ্টিয়া এবং ময়মনসিংহ অফিস ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ব্যয় ও কার্যাদেশকৃত মূল্য একই এবং প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ও প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০ জুন, ২০১৯, যা আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
