




নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার
অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

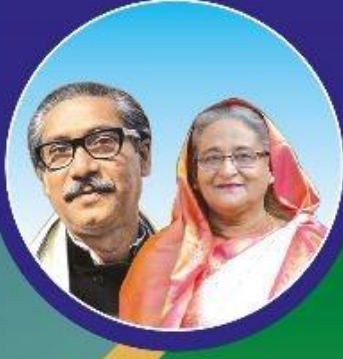

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২৩



বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
নির্বাহী সারসংক্ষেপ	v
শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms).....	vii
শব্দকোষ (Glossary).....	viii
প্রথম অধ্যায় :প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা	১
১.১ প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ.....	১
১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য.....	১
১.৪ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	২
১.৫ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়:.....	২
১.৬ প্রকল্পের বছরভিত্তিক ব্যয় বিভাজন	২
১.৭ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা (আরডিপিপি অনুযায়ী)	৩
১.৮ প্রকল্পের লগ-ফ্রেম) ডিপিপি থেকে উদ্ধৃত(.....	৫
১.৯ প্রকল্পের আওতায় স্কীম নির্বাচন পদ্ধতি	৬
১.১০ এক্সিট প্লান.....	৬
১.১১ প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা	৭
১.১২ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা.....	১০
দ্বিতীয় অধ্যায়: নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা.....	১৪
২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার পরামর্শকের কার্যপরিধি (টিওআর অনুযায়ী).....	১৪
২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনের কৌশলগত পদ্ধতি	১৫
২.২.১ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি.....	১৬
২.২.২ সমীক্ষার ধারণা) Conceptualization).....	১৭
২.৩.৩ প্রকল্পের প্রাসঙ্গিক দলিল/দস্তাবেজ পর্যালোচনা	১৮
২.৪ নিবিড় পরিবীক্ষণের নির্দেশক নির্বাচন.....	১৮
২.৫ সমীক্ষা পদ্ধতি	১৯
২.৬ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন	২০
২.৬.১ কাজের গুণগতমান	২০
২.৭ এলাকা নির্বাচন এবং নমুনা আকার নির্ধারণ	২০
২.৭.১ সমীক্ষা এলাকা নির্বাচন ও নমুনায়িত সংখ্যা	২১
২.৮ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা.....	২৪
২.৯ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি.....	২৬
২.৯.১ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ	২৬
২.৯.২ প্রশ্নপত্রের প্রাক-সার্ভে যাচাই (Field pre-testing of Questionnaire).....	২৬
২.৯.৩ সাক্ষাৎকার গ্রহণ	২৬
২.৯.৪ সমীক্ষা ও উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control)	২৬
২.১০ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ	২৬
২.১১ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও দাখিল.....	২৭
২.১২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা.....	২৭
তৃতীয় অধ্যায় :ফলাফল পর্যালোচনা.....	২৯
৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি	২৯
৩.২ প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ব্যয় এবং বাস্তবায়নকাল	২৯

৩.৩ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ পর্যালোচনা.....	২৯
৩.৪ প্রকল্পের বছর ভিত্তিক সার্বিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা.....	৩০
৩.৫ অর্থবছর ভিত্তিক ডিপিপি'র সংস্থান ও বরাদ্দ, অর্থছাড় এবং প্রকৃত ব্যয় পর্যালোচনা.....	৩০
৩.৬ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি.....	৩২
৩.৭ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা.....	৩৬
৩.৭.১ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ.....	৪৬
৩.৮ পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-১ পর্যালোচনা, প্যাকেজ (CRMIDP/GABN/W-57).....	৪৭
৩.৮.১ পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-২, প্যাকেজ (CRMIDP/NYNG/W-340).....	৪৮
৩.৮.২ পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-৩, প্যাকেজ (CRMIDP/NYNG/W-398).....	৫০
৩.৮.৩ পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-৪, প্যাকেজ (CRMIDP/NYNG/W-494).....	৫১
৩.৮.৪ পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-৫, প্যাকেজ (CRMIDP/NYNG/W-518).....	৫২
৩.৯ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত পণ্যের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ.....	৫৪
৩.১০ প্রকল্পের ড্রইং ও ডিজাইন পর্যালোচনা।.....	৫৭
৩.১১ সরেজমিনে পূর্তকাজ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা.....	৬০
৩.১২ প্রকল্পের পিআইসি ও পিএসসি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা.....	৬৫
৩.১২.১ পিআইসি ও পিএসসি সভার আলোচনা সংক্রান্ত তথ্য:.....	৬৫
৩.১৩ লগফ্রেমের আলোকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন বিশ্লেষণ.....	৬৮
৩.১৪ প্রকল্প পরিচালনা কাঠামো ও লোকবল.....	৭১
৩.১৪.১ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনা.....	৭১
৩.১৫ বাহ্যিক অডিট পর্যালোচনা.....	৭২
৩.১৫.১ প্রকল্পের টেকসই পরিকল্পনা.....	৭৫
অংশ খঃ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্যসমূহের ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ.....	৭৬
৩.১৬ খানা পর্যায়ে প্রকল্পের সম্ভাব্য উপকারভোগীদের জরিপের ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ.....	৭৬
৩.১৬.১. আর্থসামাজিক তথ্যাদি পর্যালোচনা-.....	৭৬
৩.১৬.২ বাজার সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা.....	৭৭
৩.১৭ স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালার ফলাফল পর্যালোচনা.....	৮৩
৩.১৮ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII).....	৮৫
৩.১৯ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII).....	৮৭
৩.২০ দলীয় আলোচনা (FGD).....	৮৯
চতুর্থ অধ্যায় :প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা.....	৯০
৪.১ SWOT বিশ্লেষণ.....	৯০
৪.২ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ.....	৯০
৪.৩ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ.....	৯১
৪.৪ প্রকল্পের সুযোগসমূহ.....	৯১
৪.৫ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ.....	৯১
পঞ্চম অধ্যায় :পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ.....	৯২
৫.০ প্রকল্পের সার্বিক পর্যবেক্ষণ.....	৯২
৫.১ প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন ও বাস্তবায়নকাল.....	৯২
৫.২ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ পর্যবেক্ষণ.....	৯২
৫.৩ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ.....	৯৩
৫.৪ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ.....	৯৩
৫.৫ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ.....	৯৩
৫.৬ সরেজমিনে মার্কেটসমূহ পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ.....	৯৪

৫.৭ ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ.....	৯৪
৫.৮ প্রকল্প পিআইসি ও পিএসসি কমিটির সভার পর্যবেক্ষণ.....	৯৪
৫.৯ প্রকল্পের পরিচালনা কাঠামো ও লোকবল সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ.....	৯৫
৫.১০ প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান পর্যবেক্ষণ.....	৯৫
৫.১১ সুবিধাভোগীদের মতামতের ফলাফল পর্যবেক্ষণ.....	৯৫
ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপারিশ ও উপসংহার.....	৯৬
৬.১ সুপারিশসমূহ.....	৯৬
৬.২ উপসংহার.....	৯৭

সারণি তালিকা

সারণি-১.১: প্রকল্পের অনুমোদিত অঙ্গ ও অঙ্গাভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন	৩
সারণি-১.২: বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব কর্ম-পরিকল্পনা	৭
সারণি-১.৩: পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি.....	১০
সারণি-১.৪: সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি	১২
সারণি-১.৫: তথ্যদাতার প্রকার অনুসারে তথ্যদাতার সংখ্যা, স্থান ও তথ্য সংগ্রহ উপকরণ.....	২৪
সারণি-১.৬: প্রতিবেদনসমূহ দাখিলের সময়সূচী	২৭
সারণি-১.৭: নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা	২৭
সারণি-১.৮: অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও প্রকৃত ব্যয় বিশ্লেষণ.....	৩১
সারণি-১.৯: প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	৩২
সারণি-১.১০: পূর্ত কাজ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ.....	৩৭
সারণি-১.১১: পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-১ বিশ্লেষণ, প্যাকেজ (CRMIDP/GABN/W-57).....	৪৭
সারণি-১.১২: পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-২ বিশ্লেষণ, প্যাকেজ (CRMIDP/NYNG/W-340)	৪৯
সারণি-১.১৩: পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-৩ বিশ্লেষণ, প্যাকেজ (CRMIDP/NYNG/W-398).....	৫০
সারণি-১.১৪: পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-৪ বিশ্লেষণ, প্যাকেজ (CRMIDP/NYNG/W-494).....	৫১
সারণি-১.১৫: পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-৫ বিশ্লেষণ, প্যাকেজ (CRMIDP/NYNG/W-518)	৫৩
সারণি-১.১৬: পিআইসি ও প্রকল্প স্ট্রয়ারিং কমিটির সভার হার	৬৫
সারণি-১.১৭: প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত).....	৭১
সারণি-১.১৮: প্রকল্পের অধীনে নিয়োগকৃত জনবলের তালিকা	৭১
সারণি-১.১৯: বাহ্যিক অডিট সংক্রান্ত বিশ্লেষণ	৭২
সারণি-১.২০: উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি এবং নিরীক্ষিত অফিসের জবাবসমূহ.....	৭২
সারণি-১.২১.১: উত্তরদাতাদের বয়স সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ.....	৭৬
সারণি-১.২১.২: উত্তরদাতাদের পেশা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ.....	৭৬
সারণি-১.২১.৩: বাজারের অবকাঠামো নির্মাণ বিষয়ে অবগত এবং স্থান নির্বাচন বিষয়ে সুফলভোগীদের মতামত বিশ্লেষণ.....	৭৭
সারণি-১.২১.৪: বাজারে নির্মিত অবকাঠামোর ভিতরের স্পেস ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদী বিষয়ক মতামত বিশ্লেষণ.....	৭৮
সারণি-১.২১.৫: দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো নির্মাণে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা বিষয়ক মতামত বিশ্লেষণ	৭৮
সারণি-১.২১.৬: বাজারের অবকাঠামো নির্মাণে স্থানীয় কোন পক্ষ দ্বারা বাধাগ্রস্ত বিষয়ক মতামত বিশ্লেষণ.....	৮০
সারণি-১.২১.৭: বাজারের নতুন অবকাঠামোটি নির্মাণের পর/নির্মিত হলে স্থানীয় কৃষকগণ প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করতে পারছেন/পারবেন কিনা এ সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা.....	৮০
সারণি-১.২১.৮: বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বিশ্লেষণ	৮০
সারণি-১.২১.৯: অবকাঠামোটি নির্মাণের পূর্বে কৃষক তার উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্যগুলো কিভাবে বাজারজাত করতেন এ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ.....	৮১
সারণি-১.২১.১০: বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ বিশ্লেষণ.....	৮১

সারণি-৩.১৬.২.৯: বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য সুলভ মূল্য সহজলভ্য হয়েছে/হবে কি না বিশ্লেষণ	৮১
সারণি-৩.১৬.২.১০ বাজারের সাথে যোগাযোগ মাধ্যম/ব্যবস্থা বিষয়ক তথ্যের বিশ্লেষণ.....	৮২
সারণি-৩.১৬.২.১১: নির্মিত অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা বিষয়ক মতামত বিশ্লেষণ	৮২
সারণি-৪.১: SWOT বিশ্লেষণ ও দিক নির্দেশনার সারাংশ	৯০

লেখচিত্র ও চিত্র তালিকা

লেখচিত্র ৩.১: অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও অগ্রগতির চিত্র.....	৩০
লেখচিত্র ৩.১৬.২.১: বাজারের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে পূর্বের তুলনায় মাসিক গড় আয় বৃদ্ধি বিষয়ক মতামত বিশ্লেষণ... ৭৭	৭৭
লেখচিত্র-৩.১৬.২.২: দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো নির্মাণের পূর্বে কৃষকের উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্য সামগ্রী বিক্রয় বিষয়ক মতামত বিশ্লেষণ.....	৭৯
লেখচিত্র-৩.১৬.২.৩: নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হওয়া অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা বিষয়ক মতামত বিশ্লেষণ.....	৭৯
লেখচিত্র-৩.১৬.৪: নির্মিত মার্কেটটিতে বাজার বসার উপযুক্ত কিনা সে বিষয়ক মতামত বিশ্লেষণ.....	৮২
চিত্র-২.১: পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রমের তাত্ত্বিক কাঠামো	১৬
চিত্র-২.২: সমীক্ষা নকশার চার্ট.....	১৯
চিত্র-৩.৩: Test Report of Pressure Gauge. Habigonj.....	৫৬
চিত্র-৩.৪: নকশার সাথে বর্তমান বাজার অবকাঠামোর অবস্থা যাচাই, শাহজালাল বাজার, সিলেট.....	৫৭
চিত্র-৩.৫ (১): প্রকল্পের নকশা পর্যালোচনা (অংশ-১), শাহজালাল বাজার, সিলেট সদর, সিলেট.....	৫৮
চিত্র-৩.৫ (২): প্রকল্পের নকশা পর্যালোচনা (অংশ-২), শাহজালাল বাজার, সিলেট সদর, সিলেট	৫৯
চিত্র-৩.৬: শাহজালাল বাজার, সিলেট সদর, সিলেট	৬০
চিত্র-৩.৭: রামপুর বাজার, মেঘনা উপজেলা, কুমিল্লা	৬১
চিত্র-৩.৮: তালুহ বাজার, দুপচাঁচিয়া উপজেলা, বগুড়া.....	৬১
চিত্র-৩.৯: কর্তারহাট, লালমোহন উপজেলা, ভোলা.....	৬২
চিত্র-৩.১০: শম্ভুপুর নতুনহাট, তজুমদ্দিন উপজেলা, ভোলা	৬২
চিত্র-৩.১১: নাঙ্গলকোট বাজার, বন্দর থানা, নারায়ণগঞ্জ	৬৩
চিত্র-৩.১২: ফতুল্লা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ	৬৩
চিত্র-৩.১৩: স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার চিত্র.	৮৩
চিত্র-৩.১৪: কেআইআই সাক্ষাৎকার, প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী.....	৮৫
চিত্র-৩.১৫: কেআইআই সাক্ষাৎকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার	৮৭
চিত্র-৩.১৬: দলীয় আলোচনার চিত্র.....	৮৯

পরিশিষ্ট/সংযোজনীসমূহ

তথ্যপুঞ্জি	৯৮
পরিশিষ্ট-১: মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকৃত চলমান ও নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়া মার্কেট ভবনের চিত্র	৯৯
পরিশিষ্ট-২: পূর্ত কাজ সংক্রান্ত তথ্যাদি	১০৩
সংযোজনী-১: নমুনা জরিপ প্রশ্নমালা.....	১২১
সংযোজনী-২: কেআইআই গাইডলাইন (প্রকল্প পরিচালক, উপ প্রকল্প পরিচালক)	১২৬
সংযোজনী-৩: কেআইআই গাইডলাইন (নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলী).....	১৩১
সংযোজনী-৪: কেআইআই গাইডলাইন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চেয়ারম্যান, বাজার সমিতির সভাপতি).....	১৩৫
সংযোজনী-৫: দলীয় আলোচনা গাইড লাইন.....	১৩৬
সংযোজনী-৬: সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশ্নমালা	১৩৮
সংযোজনী-৭: ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট	১৪১

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ দ্রুত অগ্রসরমান একটি উন্নয়নশীল দেশ। তবে এর জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ এখনও গ্রামে বসবাস করে। আর গ্রামীণ হাট বাজার হলো গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। বর্তমানে গ্রামীণ পর্যায়ে অবকাঠামোগত উন্নয়নের অভাবে গ্রামীণ হাট বাজারের পূর্ণ সুবিধা ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা ও কৃষকগণ পাচ্ছে না। এহেন প্রেক্ষাপটে, গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে, দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের বিভিন্ন অংশসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো নির্মাণ ও পূর্ত কাজ। প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি জাত পণ্য বাজারজাতের সুবিধা প্রদান, গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

প্রকল্পটির ডিপিপি গত ০৩/০৫/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মূল প্রকল্পটি ১৭৩০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয়। বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রথম বার জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১ সময় বৃদ্ধি করা হয়। পুনরায় প্রকল্পের ২.২৫% ব্যয় হ্রাস করে প্রথম সংশোধনী হিসেবে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি এবং সংশোধিত অনুমোদিত সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় গত ২০/০৬/২২ তারিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে দ্বিতীয় বার জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়।

এই নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প প্রণয়ন, সংশোধন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং প্রকল্পটির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়নসহ প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল টেকসই করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা। এরই ধারাবাহিকতায়, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, পণ্য ও কাজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ, সরেজমিনে পরিদর্শন, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে প্রশ্নোত্তর জরিপ, KII এবং FGD ও কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করা হয়েছে। ০৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলার সকল উপজেলায় বিস্তৃত এই প্রকল্পটির আওতায় মোট ৫০৭টি বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও সরেজমিনে পরিদর্শনের ক্ষেত্রে, দৈব-চয়ন পদ্ধতিতে ৩৮টি জেলার ৯৮টি উপজেলায় ৯৮টি বাজার অবকাঠামো নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, মে-২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৫৭১৭.৬২৭ লক্ষ টাকা বা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৩২.৯২% শতাংশ এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৭%। অতিক্রান্ত সময় বিবেচনায় প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি অনেকটা পিছিয়ে আছে। কোভিড-১৯, প্রকল্পভুক্ত ১১০টি বাজারের জায়গাতে অস্থায়ী স্থাপনা ও ৩৫টি বাজারের স্থায়ী স্থাপনা অপসারণপূর্বক জায়গা প্রাপ্তিতে বিলম্ব, ৮০টি বাজারের জায়গা সংক্রান্ত জটিলতা ও নাম পরিবর্তন করা, কিছু জেলায় জেলা প্রশাসন হতে মার্কেট নির্মাণের অনুমতি প্রাপ্তিতে বিলম্ব, ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি বিলম্বিত হয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত ৮৭টি বাজারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৮টি বাজার হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১৯১টি বাজার নির্মাণ কাজ চলমান। এছাড়াও উপরোক্ত জটিলতার কারণে ৭৭টি বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে প্রকল্প অফিস জানিয়েছে।

প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৪টি পণ্য প্যাকেজের মধ্যে ১০টি পণ্য প্যাকেজেরই দরপত্র আহ্বান ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে ০৯টি। সিভিল ওয়ার্কের ৫০৭টি প্যাকেজের মধ্যে ৩৬৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান ও ৩৪৮টি প্যাকেজের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। ৮৭টি প্যাকেজের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ও ১৯১টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সেবা প্যাকেজের আওতায় ২০টি প্যাকেজের মধ্যে ১৯টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। ক্রয় প্যাকেজের দরপত্র দলিল, কার্যাদেশ ও চুক্তিপত্রের দলিলাদির বিভিন্ন অংশ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ক্রয় কার্যক্রমে অনুসৃত টেন্ডারিং পদ্ধতি ও এসটিইএম ডিপিপি/আরডিপিপি'র প্রভিশন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রায় প্যাকেজই দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে বাজারের আকার ভেদে পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন প্যাকেজের মূল্য ডিপিপি/আরডিপিপির তুলনায় কম-বেশি হয়েছে। প্রায় বেশি সংখ্যক প্যাকেজেই দেখা যায় যে পূর্ব উল্লেখিত কারণে, চুক্তির সময় বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্প এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শনে কাজের মান ভাল পাওয়া গেছে। বাজারের স্থাপত্য ডিজাইন দৃষ্টিনন্দন ও আধুনিক। তবে, কিছু বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ব্রুট লক্ষ্য করা গেছে, যথাঃ অবকাঠামোর প্লিন্থ লেভেল ও গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফাটল, নিচ তলার মেঝেতে প্লাস্টার উঠে যাওয়া, সিঁড়ি ও ২য় তলার কিছু স্থানে টাইলস ফিটিংস ভাল না হওয়া এবং কিছু ক্ষেত্রে ফিনিশিং ভাল না হওয়া। এব্যাপারে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বাজারের স্থানের জন্য অনুমতি গ্রহণ, ভূমি প্রাপ্তি ও নির্মাণ পরবর্তীতে হস্তান্তর - এই সকল ক্ষেত্রেই, জেলা প্রশাসনের সাথে এলজিইডির সমন্বয়ের অভাব লক্ষণীয়, যা প্রকল্পটির দীর্ঘসূত্রিতার

একটি কারণ বটে। সমন্বয়ের জন্য উভয় পক্ষকে একসাথে বসা প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত অনেক বাজারের জায়গা নির্বাচন করা এবং ফাঁকা করা সম্ভব হয়নি। আবার, ইতিমধ্যে যে সকল বাজার অবকাঠামোগুলোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তাঁর একটি বড় অংশ জেলা প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় দেরি হচ্ছে। এতে করে নির্মিত ভবনগুলির গুরুত্বপূর্ণ উপদান যথাঃ লাইট, বেসিন, পানির টেপ, ইত্যাদি চুরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা নষ্ট হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বাজারগুলি মাদকসেবীদের আস্তানায় পরিণত হয়েছে। আবার হস্তান্তরের পরও, দোকান বরাদ্দ দিতে দেরি হচ্ছে। নীতিমালা প্রণয়নে দেরিকে কারণ বলা হচ্ছে। এতে করে সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এধরনের নির্মিত অথচ হস্তান্তর হয়নি, বাজারগুলি স্থানীয়দের অধীনে চালু থাকার চিত্র সরেজমিনে পরিদর্শন চলাকালীন সময়ে পাওয়া গেছে।

এ পর্যন্ত প্রকল্পটির মোট ২টি পিআইসি ও ৪টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, বাস্তবে যেখানে ডিপিপি অনুযায়ী এবং পরিকল্পনা বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী ১৩টি সভা হওয়ার কথা। তাছাড়া ৬ বছরে মাত্র ১টি অডিট সম্পন্ন হয়েছে। এই বৃহৎ প্রকল্পটির ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক তদারকি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই বিষয়গুলি আরও গুরুত্বের সাথে নেয়া প্রয়োজন। প্রকল্পটির ‘সবল’ দিকগুলির মধ্যে অন্যতম জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন না হওয়া এবং বাজারে দোকান প্রাপ্তিতে ব্যাপক চাহিদা। তবে ‘দুর্বল’ দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম দোকান বরাদ্দের নীতিমালা তৈরি না হওয়া ও হস্তান্তরে দেরি, ইত্যাদি। বাজার অবকাঠামোগুলো নির্মিত হলে, সার্বিকভাবে দেশের পল্লী অবকাঠামো বিকশিত হবে, গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের ব্যবসা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তবে, নির্মিত এই স্থাপনাগুলির রক্ষণাবেক্ষণে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারলে কিংবা সঠিক সময়ে বরাদ্দ দেয়া না হলে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম টেকসইকরণের লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ হলো: প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনেক পিছিয়ে থাকার কারণ অনুসন্ধান এবং পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে বাস্তবানুগভাবে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক এটি সঠিক ভাবে অনুসরণের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা, এখন পর্যন্ত যে সকল বাজার অবকাঠামোর জায়গা নির্বাচন করা এবং ফাঁকা করা সম্ভব হয়নি সেগুলির বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয় জোরদার করা, যে সকল স্থানে দৃশ্যমান নির্মাণ ত্রুটি রয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রে ঠিকাদারকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা ও তা শোধরানো এবং সার্বিক তদারকি আরও বাড়ানো; প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় পিআইসি/পিএসসি মিটিং ও অডিট কার্যক্রম নিবিড় করা, ইতিমধ্যে যে সকল বাজার অবকাঠামোগুলো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং হস্তান্তরও হয়েছে, অনতিবিলম্বে নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক উক্ত বাজারের দোকানগুলো বরাদ্দের ব্যবস্থা করা। অন্যথায় বাজারের অবকাঠামোগুলো এভাবে পড়ে থাকলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। সর্বোপরি, প্রকল্পটি তাঁর বাস্তব লক্ষ্য থেকে অগ্রগতিতে অনেক পিছিয়ে। এহেন প্রেক্ষাপটে, উপরোল্লিখিত সুপারিশমালাসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে, যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে, দ্রুততার সাথে কর্ম সম্পাদনে মনোযোগী হওয়া আশু প্রয়োজন।

শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)

ADP	:	Annual Development Programme
BoQ	:	Bill of Quantity
CE	:	Chief Engineer
CRMIDP	:	Countrywide Rural Market Infrastructure Development Project
DPP	:	Development Project Proposal/Proforma
DPD	:	Deputy Project Director
EE	:	Executive Engineer
FGD	:	Focus Group Discussion
IA	:	Implementing Agency
IA	:	Important Assumptions
IMED	:	Implementation Monitoring & Evaluation Division
KII	:	Key Informant Interview
MSDAL	:	Modern Social Development Associates Ltd.
MVI	:	Means of Verifiable Indicators
NCT	:	National Competitive Tender
NS	:	Narrative Summary
OTM	:	Open Tender Method
OVI	:	Objectively Verifiable Indicators
PPA	:	Public Procurement Act
PPR	:	Public Procurement Rules
RDPP	:	Revised Development Project Proposal
SWOT	:	Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
SPSS	:	Statistical Package for the Social Science
SC	:	Steering Committee
TC	:	Technical Committee
TEC	:	Tender Evaluation Committee
ToR	:	Terms of Reference

শব্দকোষ (Glossary)

Cylinder Test: যে কোন কংক্রিট স্ট্রাকচারের কংক্রিটের শক্তি নিরূপণ করার একটি সহজ এবং নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা হচ্ছে কংক্রিট সিলিন্ডার টেস্ট। এ টেস্টের মাধ্যমে কংক্রিটের Compressive Strength পরিমাপ করা হয়।

Concrete Segregation: কোন নির্মাণাধীন ভবনে ঢালাই চলাকালীন কংক্রিটের উপাদানসমূহ, যথাঃ খোয়া, বালু ও সিমেন্ট আলাদা হয়ে যাওয়াই হলো সেগ্রিগেশন।

Exit plan: কোন প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দপ্তর কর্তৃক অন্য কোন দপ্তরের উপর সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনের দায়ভার হস্তান্তর করে প্রণীত প্রস্থান পরিকল্পনাকে এক্সিট প্লান বলা হয়।

Concrete Bleeding: কোন নির্মাণাধীন ভবনে ঢালাই চলাকালীন কংক্রিট থেকে পানি আলাদা হয়ে যাওয়াই হলো কংক্রিটের ব্লিডিং।

Memorandum of Understanding (MOU): যখন কোন কার্যাদি সম্পাদনের উদ্দেশ্য দুই বা একাধিক পক্ষের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় তাকে ইংরেজিতে Memorandum of Understanding (MOU) বলা হয়।

Sustainable plan: কোন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বা অবকাঠামোর মাধ্যমে বর্তমান চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি সেসব উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বা অবকাঠামো যাতে ভবিষ্যতে গণমানুষকে সুবিধা দিতে ঘাটতি বা বাঁধার কোন কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রেখে পরিকল্পিত উন্নয়নই হল টেকসই পরিকল্পনা। মূলতঃ এক্সিট প্ল্যান এর সমকক্ষ হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

Stakeholders: Stakeholders বলতে কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনকে বোঝায়, যারা একটি প্রকল্পের কোনও সিদ্ধান্ত, কর্মকান্ড বা ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে, বা সেটি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে তাকেই প্রকল্পের অংশীজন বা স্টেকহোল্ডার বলে।

Case Study: কেস স্টাডি হলো সমীক্ষা কার্যক্রমের গুণগত গবেষণার একটি কৌশলগত পদ্ধতি। কেস স্টাডির মাধ্যমে কোন প্রকল্প বা কার্যক্রম বাস্তবায়নের আগের তথ্য এবং প্রকল্প বা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরের তথ্য অনুসন্ধান করে বিশ্লেষণ করাকে কেস স্টাডি বলে। এটি একজন ব্যক্তি, একটি পরিবার বা কোন গোত্রের উপর পরিচালনা করা হয়।

Project Implementation Unit (PIU): কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যখন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে শাখা খোলা হয় তখন তাকে Project Implementation Unit (PIU) বলা হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে শাখা বা Project Implementation Unit (PIU) গঠন না করেও Project Implementation Unit (PIU) খোলা হয়ে থাকে।

Specification: কোন কাজ সম্পাদন করার জন্য যে সকল বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয় সবগুলোকে উক্ত কাজের Specification বলা হয়।

Sampling: নমুনায়ন হলো সমগ্রকের একটি অংশ তথা ছোট পরিধিতে বিস্তৃত সমগ্রকের সব বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব স্বরূপ। গবেষণা কাজে নমুনায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, এই নমুনায়নের মাধ্যমে গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। অর্থাৎ স্বল্প সংখ্যক যে কোন বিষয়ের উপর অনুসন্ধান সীমিত রেখে বিস্তৃত পরিধির অধিক সংখ্যক বিষয়ের সম্পর্কে জানা যায় তাকে নমুনায়ন বা sampling বলা হয়।

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বর্তমানে অবকাঠামোগত উন্নয়নের অভাবে গ্রামীণ হাট-বাজারের পূর্ণ সুবিধা গ্রামীণ কৃষক ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী (ব্যবসায়ী) পাচ্ছে না। বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় গ্রামের কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ সুবিধার অভাবে স্বত্বভোগীদের নিকট স্বল্প মূল্যে উৎপাদন স্থলে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে স্থায়ী অবকাঠামো না থাকায় গ্রামীণ বাজারে মালামালের সরবরাহ অপ্রতুল থাকায় ভোক্তাদের অধিক মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতে হয়। গ্রামীণ বাজারের ভবনসহ ৪ তলা বুনিয়েদের উপর দুই/এক তলা ভবন, যার প্রতিটি তলা প্রায় ৪০০০-১০০০০ বর্গফুট) অন্যান্য (আভ্যন্তরীণ সড়ক, পানি নিষ্কাশনের জন্য উন্মুক্ত ড্রেন, পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ) ভৌত সুবিধা প্রদান করা হলে কৃষি ও অকৃষি পণ্যের সহজ বাজার জাতের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষক প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে পারবে। ভোক্তারাও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহজে ন্যায্য মূল্যে ক্রয়ের সুবিধা পাবে। সৃষ্ট সুবিধাদির মিথস্ক্রিয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ অর্থনীতির সংকলন বৃদ্ধি পাবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প কৌশলের অনুরূপে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন করে গ্রাম পর্যায়ে কৃষি ও অকৃষি পণ্যের সহজ বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষককে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহজলভ্য করা যাবে। অধিকন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করা যাবে। প্রকল্পের মেয়াদকাল হবে জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামীণ কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠীর খাদ্যের চাহিদা ও জীবিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে গ্রামীণ হাট-বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য সুলভ মূল্যে সহজলভ্য হবে। ফলে গ্রামের জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং একই সাথে উক্ত উন্নত বাজারকে কেন্দ্র করে পল্লী অঞ্চল নগরায়নের দিকে ধাবিত হবে অর্থাৎ নগর ও গ্রাম এর মধ্যে দূরত্ব ও দারিদ্র্য ক্রমশ হ্রাসের মাধ্যমে শহরমুখী জন স্রোত হাস পাবে।

১.২ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.২.১	প্রকল্পের নাম	:	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
১.২.২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ
১.২.৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
১.২.৪	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৬৯১০০.০০ লক্ষ টাকা
১.২.৫	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৫
১.২.৬	প্রকল্পের স্থান	:	বাংলাদেশের ৮বিভাগের ৬৪ টি জেলার ৫০৭ টি উপজেলা

১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাতের সুবিধা প্রদান;
- গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি; এবং
- স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

১.৪ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

প্রধান প্রধান কার্যক্রম	পরিমাণ
নির্মাণ ও পূর্ত কাজ	৫০৭টি
ভূমি অধিগ্রহণ	১ একর
ডাবল- কেবিন পিকআপ	২টি
মটর সাইকেল	১৫০টি
কম্পিউটার এবং মালামাল (কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্কেনার, ফ্যাক্স , ইউপিএস)	৭৫টি
অফিস সরঞ্জামাদি লেভেল মেশিন (প্রতিটি উপজেলায় ১ টি করে)	৪৯১টি
উপজেলা মেটেরিয়াল টেস্টিং ইকুইপমেন্ট (প্রতিটি উপজেলায় ৬ টি সিরিভার মোল্ড, ব্রাশসহ একটি সিভ সেট, ২ সেট কংক্রিট স্ল্যাম্প কোন , ২ টি ব্যালেন্স করে), কংক্রিট কোর ড্রিল মেশিন (প্রতি জেলায় ১ টি করে)।	৬৪টি

১.৫ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকা)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়		বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	*পরিবর্তন (+/-)	
	মোট	জিওবি			ব্যয় (%)	মেয়াদ(%)
মূল	১৭৩০০০.০০	১৭৩০০০.০০	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০	৩১/১০/২০১৭খ্রি.	-	-
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেক মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	১৭৩০০০.০০	১৭৩০০০.০০	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১	--	--	৩৩%
১ম সংশোধিত	১৬৯১০০.০০	১৬৯১০০.০০	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২	২৭-০৭-২০২১ খ্রি.	(-) ২.২৫%	৬৬%
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	১৬৯১০০.০০	১৬৯১০০.০০	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৫	২০/০৬/২০২২ খ্রি.	--	১০০%

সূত্রঃআরডিপিপি

১.৬ প্রকল্পের বহরভিত্তিক ব্যয় বিভাজন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	প্রকল্প সংস্করণ	জিওবি	মোট
০১.	০২.	০৩.	০৪.
বছর-১ (২০১৭-২০১৮)	মূল	৫৫৩৩৬.১৫	৫৫৩৩৬.১৫
	১ম সংশোধিত	৩৪.৯৩	৩৪.৯৩
বছর-২ (২০১৮-২০১৯)	মূল	৫৩১০৭.৩৫	৫৩১০৭.৩৫
	১ম সংশোধিত	১২১৭.২০	১২১৭.২০
বছর-৩ (২০১৯-২০২০)	মূল	৬৪৫৫৬.৫১	৬৪৫৫৬.৫১
	১ম সংশোধিত	৫৯০৪.০০	৫৯০৪.০০
বছর-৪ (২০২০-২০২১)	মূল	০.০০	০.০০
	১ম সংশোধিত	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০

অর্থবছর	প্রকল্প সংস্করণ	জিওবি	মোট
০১.	০২.	০৩.	০৪.
বছর-৫ (২০২১-২০২২)	মূল	০.০০	০.০০
	১ম সংশোধিত	১২৩৩০৩.৮৭	১২৩৩০৩.৮৭
বছর-৬ (২০২২-২০২৩)	মূল	০.০০	০.০০
	১ম সংশোধিত	০.০০	০.০০
মোট	মূল	১৭৩০০০.০০	১৭৩০০০.০০
	১ম সংশোধিত	১৬৯১০০.০০	১৬৯১০০.০০

তথ্য সূত্রঃ আরডিপিপি

১.৭ প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা (আরডিপিপি অনুযায়ী)

সারণি-১.১: প্রকল্পের অনুমোদিত অঙ্গ ও অঙ্গাভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	একক	জিওবি	পিএ	নিজ স্ব	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	লক্ষ্যমাত্রা প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতাংশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(ক) রাজস্ব								
০১	অফিসারদের বেতন	৯	জন	২১৩.০০	--	--	২১৩.০০	০.১২৫
০২	কর্মচারীদের বেতন	৫	জন	৮২.৩৬	--	--	৮২.৩৬	০.০৪৮
০৩	দায়িত্ব ভাতা	১৪	জন	১.০০	--	--	১.০০	০.০০০৫
০৪	যাতায়াত ভাতা	১৪	জন	১.০০	--	--	১.০০	০.০০০৫
০৫	শিক্ষা ভাতা	১৪	জন	৭.০০	--	--	৭.০০	০.০০৪
০৬	বাড়ী ভাড়া ভাতা	১৪	জন	১৫৮.১১	--	--	১৫৮.১১	০.০৯৩
০৭	চিকিৎসা ভাতা	১৪	জন	১৩.০০	--	--	১৩.০০	০.০০৭
০৮	টিফিন ভাতা	১৪	জন	০.৮৫	--	--	০.৮৫	০.০০০৫
০৯	উৎসব বোনাস	১৪	জন	৫২.০০	--	--	৫২.০০	০.০৩০
১০	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১৪	জন	৭.০০	--	--	৭.০০	০.০০৪
১১	সম্মানি	১৪	জন	১৬.০	--	--	১৬.০	০.০০৯
১২	নববর্ষ ভাতা	১৪	জন	৫.০০	--	--	৫.০০	০.০০২
১৩	অন্যান্য ভাতা	১৪	জন	৫.০০	--	--	৫.০০	০.০০২
১৪	মোবাইল / সেলুলার ভাতা	১৪	জন	১.৫০	--	--	১.৫০	০.০০০৮
১৫	অতিরিক্ত সময়ে কাজের ভাতা	১৪	জন	০.৪০	--	--	০.৪০	০.০০০২
১৬	আপ্যায়ন খরচ	--	থোক	২০.৭২	--	--	২০.৭২	০.০১২
১৭	আউটসোর্সিং	৭৮	জন	১৫৭৪.০০	--	--	১৫৭৪.০০	০.৯৩০
১৮	বিদ্যুৎ	--	থোক	১৮.০০	--	--	১৮.০০	০.০১০
১৯	ডাক / পোস্টজ	--	থোক	৭.০০	--	--	৭.০০	০.০০৪
২০	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	--	থোক	০.৯০	--	--	০.৯০	০.০০০৫
২১	বিজ্ঞাপন ও প্রচার	--	থোক	৩৬০.০০	--	--	৩৬০.০০	০.২১২
২২	টেলেক্স/ ফ্যাক্স / ইন্টারনেট	--	থোক	১.০০	--	--	১.০০	০.০০০৫
২৩	সেমিনার / কনফারেন্স	--	থোক	৩.০০	--	--	৩.০০	০.০০১

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পরিমাণ	একক	জিওবি	পিএ	নিজ স্ব	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	লক্ষ্যমাত্রা প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতাংশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২৪	রেজিস্ট্রেশন ফি	--	থোক	১.০০	--	--	১.০০	০.০০০৫
২৫	কপি / অনুলিপি	--	থোক	৫.০০	--	--	৫.০০	০.০০২
২৬	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	--	থোক	১৯৯.৯৮	--	--	১৯৯.৯৮	০.১১৭
২৭	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	--	থোক	৭৫.০১	--	--	৭৫.০১	০.০৪৪
২৮	ভ্রমণ ব্যয়	--	থোক	৬৭.০০	--	--	৬৭.০০	০.০৩৯
২৯	পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	--	থোক	১৩৫.০০	--	--	১৩৫.০০	০.০৭৯
৩০	গ্যাস ও জ্বালানি	--	থোক	১.০০	--	--	১.০০	০.০০০৫
৩১	নিরাপত্তা ও সেবা সংগ্রহ	--	থোক	১.০০	--	--	১.০০	০.০০০৫
৩২	কম্পিউটার সামগ্রী	--	থোক	৭০.০০	--	--	৭০.০০	০.০৪১
৩৩	মুদ্রণ ও বঁধাই	--	থোক	২৮.৯০	--	--	২৮.৯০	০.০১৭
৩৪	স্ট্যাম্প ও সিল	--	থোক	১০০.০০	--	--	১০০.০০	০.০৫৯
৩৫	অন্যান্য মনিহরী	--	থোক	১২১.০০	--	--	১২১.০০	০.০৭১
৩৬	কনসালটেশি	২০	জন	১০৭০.০০	--	--	১০৭০.০০	০.৬৩২
৩৭	সার্ভে ও ইনভেস্টিগেশন	--	থোক	৫৫০.০০	--	--	৫৫০.০০	০.৩২৫
৩৮	মোটর যানবাহন	২	টি	১১৫.০০	--	--	১১৫.০০	০.০৬৮
৩৯	কম্পিউটার	--	থোক	১৬.০০	--	--	১৬.০০	০.০০৯
৪০	অফিস সরঞ্জামাদি	--	থোক	২৫.০০	--	--	২৫.০০	০.০১৪
৪১	অনাবাসিক ভবন	--	থোক	৭.০০	--	--	৭.০০	০.০০৪
৪২	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	--	থোক	১৫.০০	--	--	১৫.০০	০.০০৮
৪৩	অন্যান্য ব্যয় (মধ্যবর্তী মূল্যায়ন)	--	থোক	২০.০০	--	--	২০.০০	০.০১১
উপ-মোট (রাজস্ব)							৫১৭০.৭২	৩.০৫৭
(খ) মূলধন								
৪৪	অনাবাসিক ভবন সমূহ	৫০৭	টি	১৫২১০০.	--	--	১৫২১০০.০	৮৯.৯৪৬
৪৫	ডাবল- কেবিন পিকআপ	২	টি	৯৫.৯০	--	--	৯৫.৯০	০.০৫৬
৪৬	মটর সাইকেল	১৫০	টি	২৪৭.৬৫	--	--	২৪৭.৬৫	০.১৪৬
৪৭	কম্পিউটার এবং মালামাল (কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্কেনার, ফ্যাক্স, ইউপিএস)	৭৫	টি	৮৪.০০	--	--	৮৪.০০	০.০৪৯
৪৮	সরঞ্জামাদি (হেভি ডিউটি ডিজিটাল ফটোকপিয়ার)	২	টি	৫.৭৪	--	--	৫.৭৪	০.০০৩
৪৯	অফিস সরঞ্জামাদি লেভেল মেশিন (প্রতিটি উপজেলায় ১ টি করে)	৪৯১	টি	৭৩৬.৫০	--	--	৭৩৬.৫০	০.৪৩৫
৫০	উপজেলা মেটেরিয়াল টেস্টিং ইকুইপমেন্ট (প্রতিটি উপজেলায় ৬ টি সিরিভার মোন্ড , ব্রাশসহ একটি সিড সেট ,২ সেট কংক্রিট	৪৯১	টি	৬৮৭.৪০	--	--	৬৮৭.৪০	০.৪০৫

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পরিমাণ	একক	জিওবি	পিএ	নিজ স্ব	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	লক্ষ্যমাত্রা প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতাংশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	স্ল্যাম্প কোন, ২ টি ব্যালেন্স করে),							
৫১	কংক্রিট কোর ড্রিল মেশিন (প্রতি জেলায় ১ টি করে)।	৬৪	টি	৩২০.০০	--	--	৩২০.০০	০.১৮৭
৫২	আসবাবপত্র (টেবিল, চেয়ার, ফাইল কেবিনেট ও আলমারি)	--	থোক	১৪.০৯	--	--	১৪.০৯	০.০০৭
৫৩	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	১	একর	১০০.০০	--	--	১০০.০০	০.০৫৯
উপ-মোট (মূলধন)		--	--	--	--	--	১৫৪৩৯১.২৮	৯১.৩০১
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		--	--	--	--	--	৩০০০.০০	১.৭৭৪
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		--	--	--	--	--	৬৫৩৮.০০	৩.৮৬৬
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		--	--	--	--	--	১৬৯১০০.০	১০০

তথ্য সূত্রঃ আরডিপিপি

১.৮ প্রকল্পের লগ-ফ্রেম (ডিপিপি থেকে উদ্ধৃত)

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
লক্ষ্য (Goal)			
গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করে দারিদ্র হ্রাস করণ।	- গ্রামীণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি। - গ্রামীণ জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি।	- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। - পরিকল্পনা কমিশনের (GED) রিপোর্ট ইমপেক্ট স্টাডি।	
উদ্দেশ্য (Purpose)			
- গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাতের সুবিধা প্রদান; - গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি; এবং - স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	- উৎপাদন ও ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি। - কৃষি অকৃষি পণ্যের অপচয় রোধ। - উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি।	- খানা জরীপ - প্রকল্প এলাকায় বিশেষ জরীপ	- স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও সহযোগিতা। - স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ।
আউটপুট			
উন্নত বিপণন পরিবেশ সম্পন্ন গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো।	- জুন ২০২২ এর মধ্যে ৫০৭ টি গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন (প্রতি তলা ৩০০০-১০০০০ বর্গফুট)	- প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সংরক্ষিত তথ্য ও প্রতিবেদন। - অডিট রিপোর্ট। - প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন। - প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন। - আইএমইডির প্রতিবেদন।	- অগ্রগতির সমানুপাতে অর্থ প্রাপ্তি। - স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা। - প্রাকৃতিক দুর্যোগ। - স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
ইনপুট			
■ ভূমি। ■ লোকবল। ■ পূর্ত কাজ।	■ ভূমি ১ একর- ১.০০ কোটি। ■ লোকবল- (১১৩ কনসালটেন্ট আউটসোর্সিং সহ) জন। ■ পূর্ত কাজ- ৫০৭ টি মার্কেট ১৫২১০০,০০ লক্ষ টাকা।	■ এডিপিতে আর্থিক সংস্থান বিভাজন অনুযায়ী জিও প্রদান। ■ প্রকল্প পরিচালকের রেকর্ড ও তথ্য। ■ অডিট ও আইএমইডির রিপোর্ট। ■ জেলা পর্যায়ে তথ্য ও ভূমি অধিগ্রহণের রেকর্ড।	■ যথা সময়ে জনবল নিয়োগ। ■ প্রয়োজন মারফিক অর্থ প্রাপ্তি। ■ যথা সময়ে ভূমি প্রাপ্তি।

উৎস: আরডিপিপি

১.৯ প্রকল্পের আওতায় স্বীকৃত নির্বাচন পদ্ধতি

প্রকল্পটি পল্লী অঞ্চলে বাস্তবায়িত হচ্ছে বিধায় যে সকল গ্রামীণ বাজার উপজেলা, জেলা শহরের সাথে উন্নত সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগের মাধ্যমে সংযুক্ত সেসকল বাজার অগ্রাধিকার পেয়েছে। যে সকল গ্রামীণ বাজার সরকারি ডাকের আওতায় রয়েছে, সপ্তাহে অন্তত একদিন হাট বসে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য প্রতিদিন কেনাবেচা হয় সে সকল বাজার উন্নয়নের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। বিদ্যমান বাজারের সীমানা চিহ্নিত করে মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ডিজাইন সম্পন্ন করে প্রতিটি বাজারে প্রায় ৩০০.০০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বাজারের আয়তন ও প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ভিত্তিতে ব্যয় হ্রাস বা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.১০ এক্সিট প্লান

প্রকল্পের আওতায় বাজারের অবকাঠামো উন্নয়নের পর সরকারী হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা, পদ্ধতি এবং উহা হতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালার আলোকে স্থানীয় উপজেলা পরিষদ ও ক্ষেত্র বিশেষ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে উক্ত বাজারের বাজার কমিটি প্রস্তাবিত অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা রাখবেন। বাজারের ইজারা লব্ধ অর্থ হতে নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাজার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৫% ৪৫% অর্থ ব্যয় করা হবে। উপজেলা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রস্তাবিত হাটের নবনির্মিত ভবনের বিভিন্ন অংশের ইজারা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রদান করবেন।

১.১১ প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম, বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা এবং অগ্রগতি নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা চলাকালে যাচাই করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা/বিশ্লেষণ অধ্যায়-৩'এ করা হয়েছে।

সারণি-১.২ কর্ম-পরিকল্পনা কার্যক্রম শিডিউল দেখানো হয়েছে।

সারণিঃ ১.২ বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব কর্ম-পরিকল্পনা

আইটেম	Details (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা					বছর-১ (২০১৭-১৮ অর্থবছর)			বছর-২ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)			বছর-৩ (২০১৯-২০ অর্থবছর)			বছর-৪ (২০২০-২১ অর্থবছর)			বছর-৫ (২০২১-২২ অর্থবছর)		
		একক	একক	পরিমাণ	মোট খরচ	ওজন	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব	
								অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
ক) রাজস্ব :																					
৩১১১	অফিসারদের বেতন	জনমাস		৫৪	২১৩.০০	০.১২৬	২.২৪	০.১০	০.০০১৩	২৬.৪১	০.১০	০.০১৫	৩৫.১৯	০.১০	০.০২০৩	৪০.০০	০.১০	০.০২৩	১০৯.১৬	০.১০	০.০৬৩
	কর্মচারীদের বেতন	জনমাস		৩০	৮২.৩৬	০.০৪৯	০.০০	০.১০	০.০০০০	৫.০৯	০.১০	০.০০৩	১৯.৩৭	০.১০	০.০১১২	১৮.০০	০.১০	০.০১০	৩৯.৯০	০.১০	০.০২৩
	দায়িত্ব ভাতা	জনমাস			১.০০	০.০০১	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	১.০০	০.১০	০.০০১
	যাতায়ত ভাতা	জনমাস			১.০০	০.০০১	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.১০	০.১০	০.০০০	০.১১	০.১০	০.০০০১	০.১৬	০.১০	০.০০০	০.৬৩	০.১০	০.০০০
	শিক্ষা ভাতা	জনমাস			৭.০০	০.০০৪	০.০৪	০.১০	০.০০০০	০.৫৬	০.১০	০.০০০	০.৭৯	০.১০	০.০০০৫	১.১০	০.১০	০.০০১	৪.৫১	০.১০	০.০০৩
	বাড়ী ভাড়া ভাতা	জনমাস			১৫৮.১১	০.০৯১	১.১২	০.১০	০.০০০৬	১৬.৮৮	০.১০	০.০১০	২৩.৬৯	০.১০	০.০১৩৭	৩২.০০	০.১০	০.০১৮	৮৪.৪২	০.১০	০.০৪৯
	চিকিৎসা ভাতা	জনমাস			১৩.০০	০.০০৮	০.০৬	০.১০	০.০০০০	১.৫৫	০.১০	০.০০১	১.৬৬	০.১০	০.০০১০	২.১৫	০.১০	০.০০১	৭.৫৮	০.১০	০.০০৪
	টিফিন ভাতা	জনমাস			০.৮৫	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০৭	০.১০	০.০০০	০.০৭	০.১০	০.০০০০	০.১৪	০.১০	০.০০০	০.৫৭	০.১০	০.০০০
	উৎসব বোনাস	জনমাস			৫২.০০	০.০৩০	০.৫৬	০.১০	০.০০০৩	৫.০২	০.১০	০.০০৩	৬.৪২	০.১০	০.০০৩৭	৯.০০	০.১০	০.০০৫	৩১.০০	০.১০	০.০১৮
	স্মৃতি বিনোদন ভাতা	জনমাস			৭.০০	০.০০৪	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.৬০	০.১০	০.০০০	০.৯২	০.১০	০.০০০৫	১.০০	০.১০	০.০০১	৪.৪৮	০.১০	০.০০৩
	সম্মানি	জনমাস			১৬.০০	০.০০৯	০.৩৭	০.১০	০.০০০২	২.১৭	০.১০	০.০০১	৪.০০	০.১০	০.০০২৩	২.০০	০.১০	০.০০১	৭.৪৬	০.১০	০.০০৪
	নববর্ষ ভাতা	জনমাস			৫.০০	০.০০৩	০.১১	০.১০	০.০০০১	০.৫৫	০.১০	০.০০০	০.৬৭	০.১০	০.০০০৪	০.৯৫	০.১০	০.০০১	২.৭২	০.১০	০.০০২
	অন্যান্য ভাতা	জনমাস			৫.০০	০.০০৩	৩.০০	০.১০	০.০০১৭	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.৭৫	০.১০	০.০০০	১.২৫	০.১০	০.০০১
	মোবাইল/সেলুলার ভাতা	জনমাস			১.৫০	০.০০১	০.০১	০.১০	০.০০০০	০.১১	০.১০	০.০০০	০.২২	০.১০	০.০০০১	০.২৫	০.১০	০.০০০	০.৯১	০.১০	০.০০১
	অতিরিক্ত সময়ে কাজের ভাতা	জনমাস			০.৪০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.৪০	০.১০	০.০০০
৩১১১	আপায়ন খরচ	জনমাস			২০.৭২	০.০১২	০.৫০	০.১০	০.০০০৩	১.৫৮	০.১০	০.০০১	৩.৬৪	০.১০	০.০০২১	৫.০০	০.১০	০.০০৩	১০.০০	০.১০	০.০০৬
	আউটসোর্সিং	জনমাস		৪৬৮	১৫৭৪.০০	০.৯১০	০.০০	০.১০	০.০০০০	২৭৮.৪৬	০.১০	০.১৬১	৩০০.১২	০.১০	০.১৭৩৫	৩০২.০০	০.১০	০.১৭৫	৬৯৩.৪২	০.১০	০.৪০১
	বিদ্যুৎ	মাস			১৮.০০	০.০১০	০.০০	০.১০	০.০০০০	৩.৩০	০.১০	০.০০২	৩.০০	০.১০	০.০০১৭	৪.০০	০.১০	০.০০২	৭.৭০	০.১০	০.০০৪
	ডাক/পোস্টেজ	মাস			৭.০০	০.০০৪	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.৪৮	০.১০	০.০০০	১.০৭	০.১০	০.০০০৬	১.৫০	০.১০	০.০০১	৩.৯৫	০.১০	০.০০২
	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	মাস			০.৯০	০.০০১	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.১৯	০.১০	০.০০০	০.১০	০.১০	০.০০০১	০.২০	০.১০	০.০০০	০.৪১	০.১০	০.০০০
	বিজ্ঞাপন ও প্রচার	মাস			৩৬০.০০	০.২০৮	১.৯৯	০.১০	০.০০১২	৭৭.৭৬	০.১০	০.০৪৫	৯০.০০	০.১০	০.০৫২০	৫০.০০	০.১০	০.০২৯	১৪০.২৫	০.১০	০.০৮১

আইটেম ম	Details (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা					বছর-১ (২০১৭-১৮ অর্থবছর)			বছর-২ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)			বছর-৩ (২০১৯-২০ অর্থবছর)			বছর-৪ (২০২০-২১ অর্থবছর)			বছর-৫ (২০২১-২২ অর্থবছর)		
		একক	একক	পরিমাণ	মোট খরচ	ওজন	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব	
								অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
	টেলিফোন/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	মাস			১.০০	০.০০১	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	১.০০	০.১০	০.০০১
	সেমিনার/কনফারেন্স	থোক			৩.০০	০.০০২	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	৩.০০	০.১০	০.০০২
৩২২১	রেজিস্ট্রেশন ফি	থোক			১.০০	০.০০১	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	১.০০	০.১০	০.০০১
	কপি/ অনুলিপি	থোক			৫.০০	০.০০৩	০.৫০	০.১০	০.০০০৩	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	৪.৫০	০.১০	০.০০৩
৩২৩১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা			১৯৯.৯৮	০.১১৬	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	৬১.৬৩	০.১০	০.০৩৫৬	০.০০	০.১০	০.০০০	১৩৮.৩৫	০.১০	০.০৮০
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	সংখ্যা			৭৫.০১	০.০৪৩	০.০০	০.১০	০.০০০০	১৪.৭৬	০.১০	০.০০৯	০.০০	০.১০	০.০০০	৩৫.২৫	০.১০	০.০২০	২৫.০০	০.১০	০.০১৪
৩২৪৪	ভ্রমণ ব্যয়	থোক			৬৭.০০	০.০৩৯	০.৪৮	০.১০	০.০০০৩	৩.০০	০.১০	০.০০২	৬.৭২	০.১০	০.০০৩৯	৭.০০	০.১০	০.০০৪	৪৯.৮০	০.১০	০.০২৯
৩২৪৩	পেট্রোল ওয়েল লুব্রিক্যান্ট	থোক			১৩৫.০০	০.০৭৮	০.৯৯	০.১০	০.০০০৬	৪.৫২	০.১০	০.০০৩	৪০.০০	০.১০	০.০২৩১	১০.০০	০.১০	০.০০৬	৭৯.৪৯	০.১০	০.০৪৬
	গ্যাস ও জ্বালানী	মাস			১.০০	০.০০১	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	১.০০	০.১০	০.০০১
৩২৫৩	নিরাপত্তা সেবা সংগ্রহ	থোক			১.০০	০.০০১	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	১.০০	০.১০	০.০০১
৩২৫৫	কম্পিউটার সামগ্রি	মাস			৭০.০০	০.০৪০	০.০০	০.১০	০.০০০০	৬.২২	০.১০	০.০০৪	১৯.৯৮	০.১০	০.০১১৫	১১.৪০	০.১০	০.০০৭	৩২.৪০	০.১০	০.০১৯
	মুদ্রণ ও বাধাই	মাস			২৮.৯০	০.০১৭	০.৪৬	০.১০	০.০০০৩	০.০০	০.১০	০.০০০	১.২৩	০.১০	০.০০০৭	১.৫৫	০.১০	০.০০১	২৫.৬৬	০.১০	০.০১৫
	ষ্ট্যাম্প ও সীল	মাস			১০০.০০	০.০৫৮	৫.৫০	০.১০	০.০০৩২	১৫.০০	০.১০	০.০০৯	৫৬.৩৭	০.১০	০.০৩২৬	১০.০০	০.১০	০.০০৬	১৩.১৩	০.১০	০.০০৮
	অন্যান্য মনিহরী	থোক			১২১.০০	০.০৭০	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	৫৯.১৭	০.১০	০.০৩৪২	১০.০০	০.১০	০.০০৬	৫১.৮৩	০.১০	০.০৩০
৩২৫৭	কনসাল্টেন্সি	জন	২৬		১০৭০.০০	০.৬১৮	০.০০	০.১০	০.০০০০	১১১.৪৬	০.১০	০.০৬৪	১৩৯.৪৬	০.১০	০.০৮০৮	১৪৫.০০	০.১০	০.০৮৪	৬৭৩.৬৮	০.১০	০.৩৮৯
	সার্ভে ও ইনভেস্টিগেশন	থোক			৫৫০.০০	০.৩১৮	০.০০	০.১০	০.০০০০	২১৮.৮০	০.১০	০.১২৪	৭১.০০	০.১০	০.০৪১০	৫৫.০০	০.১০	০.০৩২	২০৯.২০	০.১০	০.১২১
৩২৫৮	মোটর যানবাহন	টি		২	১১৫.০০	০.০৬৬	১.০০	০.১০	০.০০০৬	৫.১০	০.১০	০.০০৩	৫২.৬০	০.১০	০.০৩০৪	৮.০০	০.১০	০.০০৫	৪৮.৩০	০.১০	০.০২৮
	কম্পিউটার	থোক			১৬.০০	০.০০৯	১.০০	০.১০	০.০০০৬	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০০	২.০০	০.১০	০.০০১	১৩.০০	০.১০	০.০০৮
	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক			২৫.০০	০.০১৪	১.০০	০.১০	০.০০০৬	০.০০	০.১০	০.০০০	৩.০০	০.১০	০.০০১৭	৩.০০	০.১০	০.০০২	১৮.০০	০.১০	০.০১০
	অনাবাসিক ভবন	থোক			৭.০০	০.০০৪	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	১.৪০	০.১০	০.০০০৮	৫.৬০	০.১০	০.০০৩	০.০০	০.১০	০.০০
	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	মাস			১৫.০০	০.০০৯	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.৯৩	০.১০	০.০০১	০.০০	০.১০	০.০০০০	১.০০	০.১০	০.০০১	১৩.০৭	০.১০	০.০০৮
	অন্যান্য ব্যয় (মধ্যবর্তী মূল্যায়ন)	থোক			২০.০০	০.০১২	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০০		০.১০	০.০০০	২০.০০	০.১০	০.০১২
	মোট রাজস্ব ব্যয় :					৫১৭০.৭২		২০.৯৩			৭৯৬.৬৭			১০০৪.০			৭৭৫.০০		২৫৭৪.১		

আইটেম	Details (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা					বছর-১ (২০১৭-১৮ অর্থবছর)			বছর-২ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)			বছর-৩ (২০১৯-২০ অর্থবছর)			বছর-৪ (২০২০-২১ অর্থবছর)			বছর-৫ (২০২১-২২ অর্থবছর)		
		একক	একক	পরিমাণ	মোট খরচ	ওজন	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব	
								অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
													০						২২		
খ) মূলধন :																					
৪১১১	অনাবাসিক ভবন সমূহ	টি		৫০৭	১৫২১০০. ০০	৮৭.৯২	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	৪৯০০.০ ০	০.১০	২.৮৩২	২৩৯১০. ০০	০.১০	১৩.৮২১	১২৩২৯০ .০০	০.১০	৭১.২৬৬
	ডাবল-কেবিন পিকআপ	টি		২	৯৫.৯০	০.০৬	০.০০	০.১০	০.০০০০	৯৫.৯০	০.১০	০.০৬০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০
৪১১২	মটর সাইকেল	টি		১৫০	২৪৭.৬৫	০.১৪	০.০০	০.১০	০.০০০০	২৪৭.৬৫	০.১০	০.১৪০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০
	কম্পিউটার এবং মালামাল (কম্পিউটার, প্রি ন্টার, স্ক্যানার ফ্যাক্স, ইউপিএস)	টি		৭৫	৮৪.০০	০.০৫	৪.৮০	০.১০	০.০০২৮	৭০.৩৫	০.১০	০.০৪০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	৮.৮৫	০.১০	০.০০৫
	সরঞ্জামাদি (হেভি ডিউটি ডিজিটাল ফটোকপিয়ার)	সংখ্যা			৫.৭৪	০.০০	৩.৯৫	০.১০	০.০০২৩	১.৭৯	০.১০	০.০০১	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০
	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক			১৭৪৩.৯০	১.০১	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	৩১৫.০০	০.১০	০.১৮২	১৪২৮.৯ ০০	০.১০	০.৮২৬
	আসবাবপত্র (টেবিল, চেয়ার, ফা ইল কেবিনেট ও আলমারী)	একর			১৪.০৯০০	০.০১	৫.২৫	০.১০	০.০০৩০	৪.৮৪	০.১০	০.০০৩	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	৪.০০০	০.১০	০.০০২
৪১৪১	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	একর		১	১০০.০০	০.০৬	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০০১	০.১০	০.০০০		০.১০	০.০০০	১০০.০০ ০	০.১০	০.০৫৮
মোট মূলধন ব্যয়:					১৫৪৩৯১. ২৮	৮৯.২৪	১৪.০০	০.১০	০.০০৮১	৪২০.৫৩	০.১০	০.২৪৩	৪৯০০.০ ০	০.১০	২.৮৩২	২৪২২৫. ০০	০.১০	১৪.০০৩	১২৪৮৩১ .৭৫০	০.১০	৭২.১৫৭
ফিজিক্যাল কন্ট্রোল:					৩০০০.০ ০	১.৭৩	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০০১	০.১০	০.০০০		০.১০	০.০০০	৩০০০.০ ০০	০.১০	১.৭৩৪
প্রাইজ কন্ট্রোল:					৬৫৩৮.০ ০	৩.৭৮	০.০০	০.১০	০.০০০০	০.০০	০.১০	০.০০০	০.০০০১	০.১০	০.০০০		০.১০	০.০০০	৬৫৩৮.০ ০০	০.১০	৩.৭৭৯
সর্বমোট:					১৬৯১০০. ০০		৩৪.৯৩			১২১৭.২০			৫৯০৪.০ ০			২৫০০০. ০০			১৩৬৯৪ ৩.৮৭২		

তথ্য সূত্রঃ আরডিপিপি

১.১২ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা চলাকালে যথাযথভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ক্রয় পরিকল্পনা পিপিএ-০৬ এবং পিপিআর-০৮ অনুসারে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছিল কিনা তা' সমীক্ষাকালে যাচাই করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ক্রয় সংক্রান্ত দলিল/কাগজপত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত একটি চেকলিষ্ট প্রণয়ন করা হয়েছে, যার সাহায্যে এই ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে। সারণি-১.৩ ও ১.৪-এ প্রকল্পের চুক্তিবদ্ধ মূল কার্য ও সেবা ক্রয় কার্যক্রমের শিডিউল দেখানো হয়েছে এবং অধ্যায়-৩'এ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা/বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি-১.৩: পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পূর্ত কাজ (গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন) CRMIDP/ W :১-৫০৭ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ):										
রংপুর										
CRMIDP/PANG/W-01	দেওয়ান হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	১৮০.০০	১৬/০১/২০২০	০৬/০২/২০২০	৩০/১১/২০২১
CRMIDP/PANG/W-02	তবেয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৬০.০০	০১/০৬/২০২১	২৭/০৮/২০২১	০৫/০৩/২০২২
CRMIDP/PANG/W-03	নতুন হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	১৭০.০০	১০/০৭/২০১৯	২০/০১/২০২০	২৮/০৭/২০২১
CRMIDP/PANG/W-21	খোঁচা বাড়ী হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	১১/০৫/২০২৩	০২/০৮/২০২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/PANG/W-157	সিপাইপাড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	১১/০৬/২০২৩	০২/০৮/২০২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/THKR/W-06	রামনাথ হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩৪২.০০	০৯/০৬/২০২০	২৬/০১/২০২১	০১/১২/২০২২
CRMIDP/THKR/W-07	স্কুলের হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৫০.০০	২৭/১০/২০১৯	০২/০৬/২০	০৮/১২/২১
CRMIDP/THKR/W-08	যাদুরাণী হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩৫৭.০০	০৯-০৬-২০	২৬/০১/২০২১	০১/১২/২২
CRMIDP/THKR/W-09	বরচুনা	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৭৬.০০	৩১/৭/২০১৯	১১/০৩/১৯	০৫/১১/২১
CRMIDP/THKR/W-10	নেকমরদ	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩১৯.০০	৩১/৭/২০১৯	৩০/১০/২০১৯	১৭/০৮/২০২১
CRMIDP/DINJ/W-11	পাঁচকুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	১১/০৫/২৩	০২/০৮/২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/DINJ/W-12	পাঁচবাড়ী হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৭৪.৫০	১২/১০/১৯	০৮/০৩/২০	২২/১০/২০২১
CRMIDP/DINJ/W-13	কাটার হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৭০.০০	১০/০১/১৯	০১/০৬/২০	০৭/১২/২১
CRMIDP/DINJ/W-231	কল্লানী হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	০৮/১০/২৩	২০/১১/২০২৩	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/DINJ/W-15	গোপেন সাহার হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩২১.০০	১২/১০/১৯	১৫/০৩/২০২০	২২/০৯/২০২১
CRMIDP/DINJ/W-16	মাদারগঞ্জ হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৯৫.০০	০২/১২/২০	০৬/০৩/২০	১২/১০/২১
CRMIDP/DINJ/W-17	রুদরানী হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	১৭২.০০	০২/১২/২০	০৬/০৩/২০	০৭/১০/২১
CRMIDP/DINJ/W-18	রানীগঞ্জ হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩১০.০০	১৯/৮/২০২০	২৪/১১/২০২০	১৭/১১/২০২১
CRMIDP/DINJ/W-19	মংলা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	২৮/০৮/২০২৩	২৭/১১/২০২৩	৩০/০৫/২০২৫

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/DINJ/W-20	বটতলী হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৫৬.০০	১০/০৪/১৯	০১/০৬/২০	০৭/১২/২১
CRMIDP/DINJ/W-22	আপতাবগঞ্জ হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৭৭.০০	২২/৫/২০১৯	০৮/০৮/১৯	২০/১/২০২১
CRMIDP/DINJ/W-23	হাবরা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৬০.০০	১৫/০৩/২০২১	১৫/০৫/২০২১	১৫/০৫/২০২২
CRMIDP/DINJ/W-24	চৌরঙ্গী হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৭৮.০০	৩১/৭/২০১৯	২৩/১০/২০১৯	৩০/৪/২০২১
CRMIDP/NILP/W-25	কাজির হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	১১/০৪/২৩	০২/০৫/২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/NILP/W-26	কিশোরগঞ্জ জিসি	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	১১/০৩/২৩	০২/০১/২৪	১৫/০৫/২০২৫
CRMIDP/NILP/W-27	খেরকাটি হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	১১/০৫/২৩	০২/০১/২৪	১৫/০৫/২০২৫
CRMIDP/NILP/W-28	বরাগাড়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	১২/০৫/২৩	০৩/০১/২৪	১৫/০৫/২০২৫
CRMIDP/NILP/W-29	বাবুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	১৩/০৫/২৩	০৪/০১/২৪	১৫/০৫/২০২৫
CRMIDP/NILP/W-30	চৌওয়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	১৪/০৫/২৩	০৫/০১/২৪	১৫/০৫/২০২৫
CRMIDP/LAMH/W-31	তিস্তা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	১৫/০৫/২৩	০৬/০১/২৩	১৫/০৫/২০২৫
CRMIDP/LAMH/W-32	সাপটি বাড়ী হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	১৭৬.০০	১৬/১০/২০১৯	২১/০১/২০২০	২৭/০৭/২০২১
CRMIDP/LAMH/W-33	বড় কাটা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৯৫.০০	০২/০৪/২০	১৪/০৫/২০২০	২০/১০/২০২১
CRMIDP/LAMH/W-34	রসুলগঞ্জ বাজার হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	১৮৬.০০	০২/০৪/২০	১৪/০৪/২০২০	২০/০৫/২০২১
CRMIDP/LAMH/W-35	জিবের হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৭৫.০০	১১/০৩/১৯	১৫/০১/২০২০	২২/০৭/২০২১
CRMIDP/RNG/W-36	লাহিরির হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৮৫.০০	০১/১২/২০	১২/০৪/২০	১৮/২/২০২১
CRMIDP/RNG/W-37	মুচির হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৬৫.০০	২৭/১১/২০১৯	০২/১০/২০	৩০/০৬/২০২২
CRMIDP/RNG/W-38	ভাঙ্গাগড়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৫০.০০	০২/০২/২১	১৫/৩/২০২১	১৫/৪/২০২২
CRMIDP/RNG/W-39	টেপা মধুপুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৮৫.০০	০৯/১১/১৯	২৮/১১/২০১৯	৩০/৪/২০২১
CRMIDP/RNG/W-40	বালার হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	০৮/০৯/২৩	১১/০১/২৩	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/RNG/W-41	টাম্বলপুর ভোলানাথ হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৮৪.০০	০৪/০৭/১৯	০৬/১২/১৯	০৫/১০/২০
CRMIDP/RNG/W-526	পাঁওটানা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৮৫.০০	০৯/০১/২১	২৬/১২/২০২১	১২/১০/২২
CRMIDP/RNG/W-42	বালুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৬৬.০০	০৮/১০/২০	১২/১০/২০	১৮/০৯/২০২১
CRMIDP/RNG/W-43	নেকের হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	০৮/০৯/২৩	১২/০১/২৩	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KURM/W-44	মোগলবাসা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	০৮/০৯/২৩	১১/০১/২৩	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KURM/W-45	পাগলা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৯৫.০০	১৬/২/২০২০	২৮/০৬/২০২০	০১/০৫/২১
CRMIDP/KURM/W-46	কোদালকাঠী হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৯৫.০০	২১/১১/২০২৩	০২/০২/২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KURM/W-47	থানা হাট জিসি	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩/০২/২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KURM/W-48	খোলা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৬১.০০	০২/০৯/২১	০৫/০৯/২১	১৫/০৫/২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/KURM/W-49	ভিতরবন্দ হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৯০.০০	২২/০১/২০২০	২১/০৬/২০২০	০১/০৫/২১
CRMIDP/KURM/W-50	পাংগা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৫০.০০	২৫/১১/২০২০	২৮/০২/২০২১	১৬/০২/২০২২
CRMIDP/KURM/W-51	রৌমারী বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২২৮.০০	১৬/০৯/২০২০	২৮/০২/২০২১	০১/০২/২২
CRMIDP/KURM/W-52	মিনা বাজার হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২০	০৩/০২/২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/GABN/W-53	পুরাতন বাদিয়াখালী হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩৩০.০০	২১/৯/২০২০	১৫/১২/২০২০	২০/০৬/২০২২
CRMIDP/GABN/W-54	চাঁদপাড়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২০	০৩/০২/২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/GABN/W-55	ফুলছড়ি হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২০	০৩/০২/২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/GABN/W-56	কাশিয়া বাড়ী বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২০	০৩/০২/২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/GABN/W-57	নলডাংগা কাচারী বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	৩৪০.০০	২১/৯/২০২০	২০/১২/২০২০	২৪/০৬/২০২২
CRMIDP/GABN/W-58	কচুয়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২০০.০০	২১/৯/২০২০	১২/০৯/২০	১৪/১২/২০২১
CRMIDP/GABN/W-59	ছাইতানতলা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	HOPE	জিওবি	২৯৫.০০	২১/৯/২০২০	২০/১২/২০২০	২৪/০৬/২০২২

তথ্য সূত্রঃ আরডিপিপি

সারণি-১.৪: সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	Consultancy Services										
	Senior Architect	জন	১	SIC	HOPE	জিওবি	১২১.১৬২		২৭/০৮/২০১৮	০১/০৭/২০১৮	৩০/০৬/২০২২
	Junior Architect	জন	২	SIC	HOPE	জিওবি	১৭১.৯৩৮		২৭/০৮/২০১৮	০১/০৭/২০১৮	৩০/০৬/২০২২
	Senior Structural Engineer	জন	১	SIC	HOPE	জিওবি	১২৫.৫৩৬		২৭/০৮/২০১৮	০১/০৭/২০১৮	৩০/০৬/২০২২
	Junior Structural	জন	২	SIC	HOPE	জিওবি	১৬৩.৭৬০		২৭/০৮/২০১৮	০১/০৭/২০১৮	৩০/০৬/২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
CS/1- 20	Engineer										
	Participation Expert	জন	১	SIC	HOPE	জিওবি	৪২.০০		২৭/০৪/২০১৮	০১/০৭/২০১৮	৩০/০৬/২০২২
	Environmental Expert	জন	১	SIC	HOPE	জিওবি	৪০.০০		২৭/০৪/২০১৮	০১/০৭/২০১৮	৩০/০৬/২০২২
	Auto CAD Operator	জন	১০	SIC	HOPE	জিওবি	৩২৫.৬০		২৭/০৪/২০১৮	০১/০৭/২০১৮	৩০/০৬/২০২২
	Junior Electrical Engineer	জন	১	SIC	HOPE	জিওবি	৪০.০০		০১/০৩/২০২১	০১/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২২
	Junior Plumbing Engineer	জন	১	SIC	HOPE	জিওবি	৪০.০০		০১/০৩/২০২১	০১/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২২
উপমোট :							১০৭০.০০				
ক্রয়যোগ্য সেবার মোট মূল্য :							১০৭০.০০				

তথ্য সূত্রঃ আরডিপিপি

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার পরামর্শকের কার্যপরিধি (টিওআর অনুযায়ী)

নিবিড় পরিবীক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতির পর্যালোচনা করা, যাতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের আসল উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন দুর্বলতাসমূহ সনাক্ত করে প্রকল্পটি যথাসময়ে সঠিকভাবে শেষ করার ব্যাপারে পরামর্শ ও সুপারিশ দেয়া। এছাড়াও নির্মাণকাজে ব্যবহৃত মালামালের গুণগতমান ও ড্রইং-ডিজাইন মোতাবেক স্থাপনাগুলো নির্মাণ হয়েছে/হচ্ছে কিনা তা যাচাই এবং নির্মাণ কাজের অগ্রগতিসহ ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কার্যপরিধি টিওআর অনুযায়ী নিম্নে সন্নিবেশিত করা হলোঃ

২.১.১	প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
২.১.২	প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
২.১.৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
২.১.৪	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
২.১.৫	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
২.১.৬	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
২.১.৭	প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
২.১.৮	প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ
২.১.৯	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
২.১.১০	প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
২.১.১১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয় অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;
২.১.১২	প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়েছে, প্রকল্পের IRR, NPV ইত্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।
২.১.১৩	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
২.১.১৪	প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প তত্ত্বাবধান কমিটির সভা আয়োজন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.১.১৫	প্রকল্পটির ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ ফিজিবিলিটি স্টাডি হয়েছে কিনা এ বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ থাকতে হবে;
২.১.১৬	প্রকল্পটির আওতায় বাজার উন্নয়নের জন্য স্থান নির্বাচন যথাযথ ছিল কিনা, জমির জটিলতা রয়েছে কিনা এ বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ থাকতে হবে;
২.১.১৭	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এবং নির্মিতব্য বাজারের মালিকানা কার হবে, বাজার রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে হবে, বাজারে দোকান সমূহ কিভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হবে, বাজার নির্মাণের ফলে পরিবেশের কোন ক্ষতি হবে কি না সে বিষয়ে আলোচ্য প্রকল্পটিতে সুস্পষ্ট রূপরেখা আছে কিনা যে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ থাকতে হবে;
২.১.১৮	প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে বলতে হবে বর্তমানে প্রকল্পটি রাইট ট্রাকে আছে কিনা, না থাকলে কেন নেই তার পর্যবেক্ষণপূর্বক এ থেকে উত্তোরণের বিষয়ে সুপারিশমালায় থাকতে হবে;
২.১.১৯	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে তথ্যদাতাদের মোবাইল নাম্বার, জাতীয় পরিচয়পত্র (যদি সম্ভব হয়) সংগ্রহের পাশাপাশি FGD ও KII করার ভিডিও তৈরি করে অত্র বিভাগে জমা দিতে হবে, যা প্রমাণক হিসেবে গণ্যকরা হবে।
২.১.২০	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনের কৌশলগত পদ্ধতি


দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান বিধায় প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি এবং ক্রয় প্রক্রিয়া যাচাই বাছাই করার জন্য এই নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটি গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক কর্তৃক সঠিক দায়িত্ব পালন, কর্মপদ্ধতি ও নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সুপারিশ প্রদান ইত্যাদি এর অন্যতম অনুষঙ্গ। প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান সমীক্ষা কার্যক্রম কৌশল পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য অর্জনে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলোঃ

- (১) বিদ্যমান দলিলাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ,
- (২) জরিপের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ,
- (৩) সরজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনসহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান সমীক্ষার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান সমীক্ষার কৌশলগত পদ্ধতি নির্ধারণে যে কয়টি ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে, তা হচ্ছে (১) প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা, (২) প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থা, (৩) কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, (৪) সরকারি ক্রয় আইন ও সরকারি ক্রয় বিধিমালা প্রতিপালন বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ, (৫) ক্রয়/কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি সম্পর্কে পর্যালোচনা, (৬) প্রকল্প তত্ত্বাবধান কমিটির সভা, সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ে পর্যালোচনা, (৭) ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট সম্পাদন সম্পর্কে পর্যালোচনা, (৮) প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি সম্পর্কে পর্যালোচনা, (৯) প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়েছে তা যাচাই, (১০) লগ-ফ্রেমের আলোকে output অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ, (১১) উপকারভোগীদের মতামত পর্যালোচনা, (১২) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদিসহ টেকসই (sustainable) পরিকল্পনা সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য উপাত্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে যাচাই করে খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটি, তত্ত্বাবধান কমিটি ও জাতীয় কর্মশালার সুপারিশের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নোক্ত ফ্লো-চার্টের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রমের তাত্ত্বিক বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো।

চিত্র.২.১: পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রমের তাত্ত্বিক কাঠামো

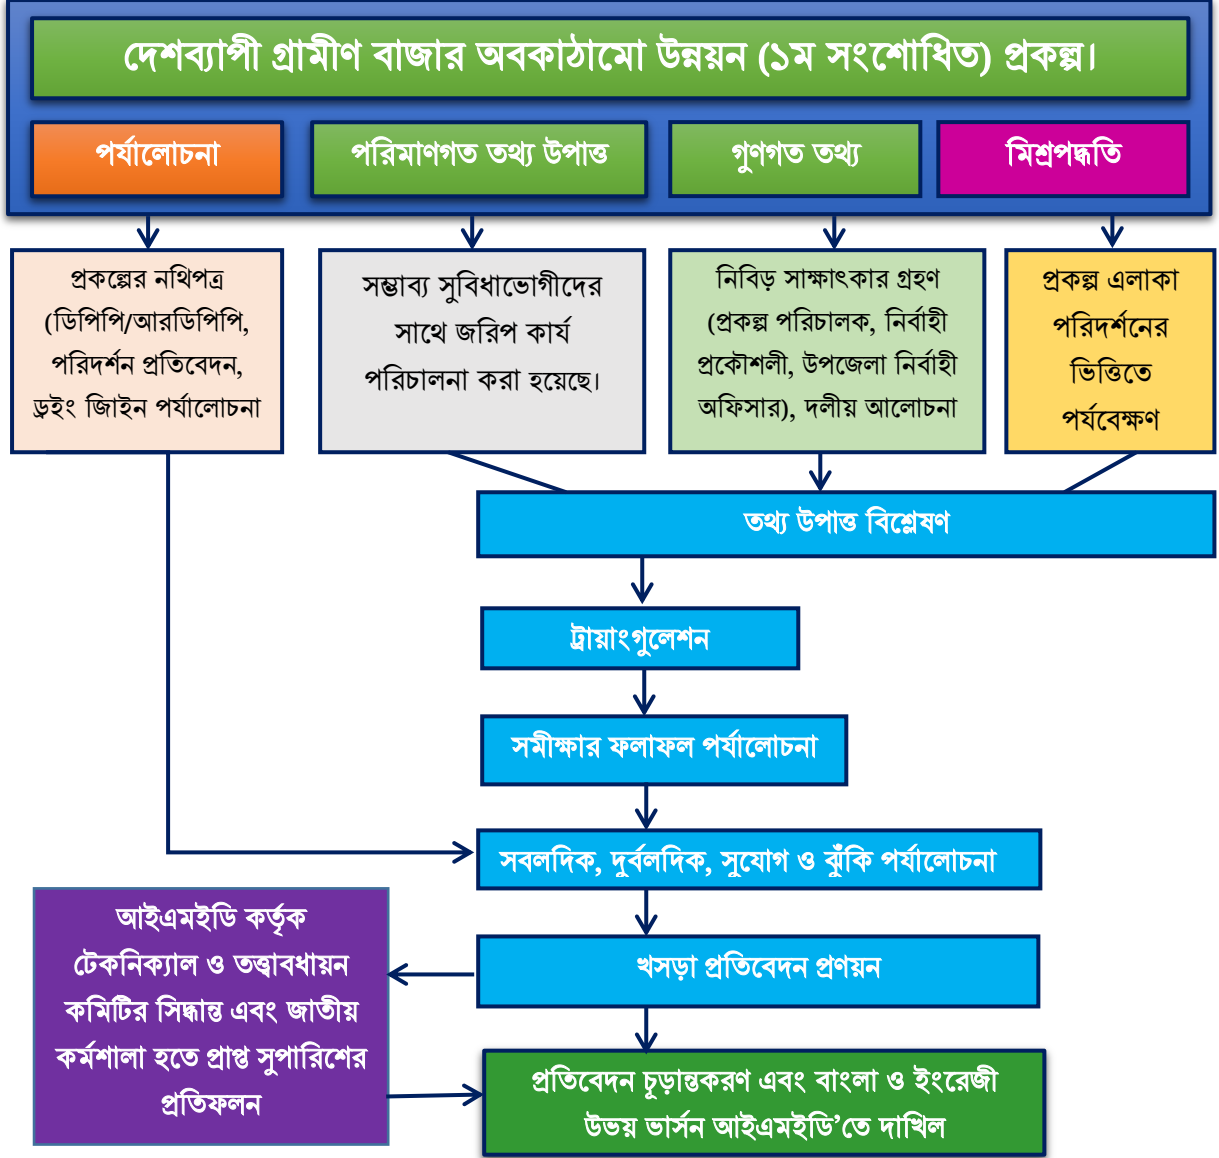

২.২.১ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

মাঠ পর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের সুবিধাভোগী প্রশ্নমালা (সংযোজনী-১), প্রকল্প পরিচালক, উপপ্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প অফিসের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে নিবিড় আলাপচারিতা (কেআইআই) গাইডলাইন (সংযোজনী-২), জেলা পর্যায়ে নির্বাহী/তত্ত্বাবধান প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলীগণের সাথে নিবিড় আলাপচারিতা গাইডলাইন (সংযোজনী-৩), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান/ইউপি চেয়ারম্যান, বাজার সমিতির সভাপতি/সেক্রেটারি সাথে নিবিড় আলোচনা গাইডলাইন (সংযোজনী-৪), সুফলভোগী, ব্যবসায়ী, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে দলীয় আলোচনা গাইড লাইন (সংযোজনী-৫), সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে কেআইআই (সংযোজনী-৬) এবং ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্রয় চেকলিস্ট (সংযোজনী-৭) প্রস্তুত করা হয়েছে সেগুলোর উপযোগীতা মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের আগে যাচাই করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা ও প্রয়োজনীয় টুলসমূহ ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান আইএমইডি'র পরামর্শক্রমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্যসমূহ দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্ধারিত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে সার্ভে/জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত তথ্যসমূহের জন্য নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনসহ স্থানীয় পর্যায়ে একটি মতবিনিময় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে এবং

কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ সংগ্রহপূর্বক সকল তথ্য ও উপাত্ত যাচাই বাচাই করে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.২.২ সমীক্ষার ধারণা (Conceptualization)

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটি সম্পন্ন করার জন্য টার্মস অব রেফারেন্স এর প্রদত্ত কার্যপরিধি অনুসরণ করা হয়েছে। কার্যপরিধির সকল কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য টার্মস অব রেফারেন্স অনুযায়ী বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে যা নিম্নের সারণিতে সন্নিবেশ করা হলো।

ধাপসমূহ	কার্যক্রম
বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনা	- নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা টিমের সাথে আলোচনা এবং দায়িত্ব বন্টন; - প্রকল্প দলিল ;পর্যালোচনা (আরডিপিপি/ডিপিপি) - নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার বাস্তবায়নাধীন সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন পর্যালোচনা; - বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ;
নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রস্তুতিমূলক কাজ	- নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে; - তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা ও ছক প্রস্তুতকরণ; - তথ্য সংগ্রহকারী, সুপারভাইজর ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান; - সমীক্ষা এলাকা ও তথ্য প্রদানকারী নির্বাচন; - আইএমইডি'র মতামত ত প্রশ্নমালা ও ছকপারামর্শ অনুসরণে প্রস্তুতকৃত/চূড়ান্তকরণ এবং মাঠ পর্যায়ে যাচাইকরণ; - কর্মপদ্ধতি চূড়ান্তকরণ; - প্রারম্ভিক প্রতিবেদন তৈরি এবং আইএমইডি'তে উপস্থাপন;
তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও মান নিয়ন্ত্রণ	- মাঠ পর্যায়ে হতে প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ; - সুপারভাইজরগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহকারীদের দৈনন্দিন কাজ তদারকি ও যাচাইকরণ, - মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অবকাঠামো যাচাইকরণ; - স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন এবং সংগৃহীত তথ্য যাচাইকরণ;
সংগৃহীত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণ	- মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যের ভুল-ত্রুটি সংশোধন; - সংগৃহীত তথ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন; - কম্পিউটারে তথ্য এন্ট্রি ও সংকলন; - প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল সারণি ও লেখচিত্র ইত্যাদি উপস্থাপন; - বিশ্লেষণকৃত প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকল্পের সবলতা, সুযোগ, দুর্বলতা ও ঝুঁকি নিয়ে পর্যালোচনা;
প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং উপস্থাপন	- প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট সেক্টর-৩ এ দাখিল; - খসড়া প্রতিবেদনের উপর যথাক্রমে আইএমইডি'র টেকনিক্যাল ও তত্ত্বাবধান কমিটির মতামত গ্রহণ; - টেকনিক্যাল ও তত্ত্বাবধান কমিটির সুপারিশের আলোকে ২য় খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; ২য় খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন; - কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরে দাখিল।

২.৩.৩ প্রকল্পের প্রাসঙ্গিক দলিল/দস্তাবেজ পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রকল্পের প্রয়োজনীয় দলিলাদি যেমনঃ ডিপিপি/আরডিপিপি, আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, টেকনিক্যাল ও তত্ত্বাবধান কমিটির সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় ও সংগ্রহের যাবতীয় তথ্যাবলী, অডিট রিপোর্ট, সার্ভে রিপোর্ট, আলোকচিত্র ও সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তসমূহ প্রকল্প অফিস হইতে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্জিত সাফল্যের সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা, অগ্রগতির পর্যায়সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা তুলনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে ত্রুটি-বিচ্যুতি, সফলতা ও ব্যর্থতাগুলো চিহ্নিত করার জন্য প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপিসহ সকল প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.৪ নিবিড় পরিবীক্ষণের নির্দেশক নির্বাচন


প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও পটভূমির সঙ্গে তার নকশা/পরিকল্পনা তথা ডিপিপি'তে বর্ণিত বিষয়সমূহের চলক (Variable) ও নির্দেশকের (Indicator) মাধ্যমে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। সমীক্ষার শর্তাবলী (ToR) পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নিম্নোক্ত তিনটি পর্যায়ে চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ করা সম্ভবঃ

পরিবীক্ষণের প্রকৃতি	পরীক্ষণীয় বিষয়/নির্দেশক
প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রস্তুতি অবস্থা	- প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে কিনা; - যথাযথ সময়ে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হয়েছে কিনা, যদি দেরিতে নিয়োগ হয়ে থাকে তার কারণ এবং বিলম্বে নিয়োগের কারণে প্রকল্পে কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা; - প্রকল্প প্রণয়নে কোনো ত্রুটি ছিল বা আছে কিনা (এর ফলে বাস্তবায়নে কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে) এবং প্রকল্প প্রণয়নে ও পরিচালনায় পূর্ব অভিজ্ঞতা বিষয়ে পর্যালোচনা;
প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মূল্যায়ন	- প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে কিনা; - প্রকল্পের পিআইসি ও পিএসসি সভার আয়োজন ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী হচ্ছে কিনা এবং পিএসসি সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন হয় কিনা; - অর্থবছর ভিত্তিক ডিপিপি'র সংস্থান ও বরাদ্দ, অর্থছাড় এবং প্রকৃত ব্যয়সমূহ পর্যালোচনা; - প্রকল্পের অজ্ঞাভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (ভৌত ও আর্থিক) পর্যালোচনা; - প্রকল্পের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা; - ক্রয় কার্যক্রমে দরপত্র মূল্যায়ন, কৃতকার্য ঠিকাদারের অনুকূলে ইস্যুকৃত কার্যাদেশ পর্যালোচনাপূর্বক কার্যপরিধিতে বর্ণিত শর্তাবলী বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বা হয় কিনা; - নির্বাচিত ঠিকাদারের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ও ব্যাংক গ্যারান্টি যাচাই করা হয়েছে কিনা; - প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য/সেবা/কার্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পিপিআর-০৮ এবং পিপিএ-০৬ অনুসরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে কিনা; - সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য/সেবা/কার্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পিপিআর-০৮ এবং পিপিএ-০৬ এর ব্যত্যয় ঘটলে তা পর্যালোচনা; - প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা যেমনঃ বাস্তবায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি যদি থাকে তা পর্যালোচনা; - প্রকল্পের ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল অডিট (কতটি অডিট এবং কত টাকার) ইত্যাদি বিষয়ক পর্যালোচনা; - প্রকল্পের লগ-স্ট্রিম অনুযায়ী উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা; - টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা; - প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিষয়ে SWOT বিশ্লেষণ;

পরিবীক্ষণের প্রকৃতি	পরীক্ষণীয় বিষয়/নির্দেশক
প্রকল্প বর্তমানে ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির অবস্থা	- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বর্তমান ভৌত অবকাঠামোর অবস্থা; - অবকাঠামো নির্মাণ সামগ্রী/মেটেরিয়ালস গুলোর গুণগতমান যাচাইকরণ; নির্মিত/নির্মিতব্য মার্কেট ভবনের বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন (স্থাপত্য নকশা, কাঠামোগত নকশা, প্লাসিং নকশা ও বৈদ্যুতিক নকশা ইত্যাদি) অনুযায়ী কাজসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে/হচ্ছে কিনা তা যাচাইপূর্বক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা; - নির্মাণ সামগ্রী/মেটেরিয়ালস গুলোর গুণগতমান ঠিক রাখার লক্ষ্যে ল্যাবটেস্ট করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়েছে এবং পুণরায় ল্যাব টেস্ট করা হয়েছে; - বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে কিনা এবং সে মোতাবেক কাজ পরিচালিত হচ্ছে কিনা? না হলে তার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.৫ সমীক্ষা পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুটি মূল গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ (ক) সংখ্যাগত জরিপ ও (খ) গুণগত জরিপ। সংখ্যাগত জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এই নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাগণের উত্তরসমূহের গুণগতমান মূল্যায়ন করা হয়েছে। অধিকন্তু বাস্তব অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য সরেজমিনে প্রকল্প স্থান পরিদর্শন, সেতুর নির্মাণ সমগ্র ও যন্ত্রপাতিসহ ইত্যাদি সকল গুণগত ও পরিমাণগত সংশ্লিষ্ট বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সমীক্ষাটি মোট ০৩ পর্বে সম্পন্ন হয়েছে। নিম্নে চার্টের মাধ্যমে প্রতিটি পর্বের ধাপগুলো দেখানো হলঃ

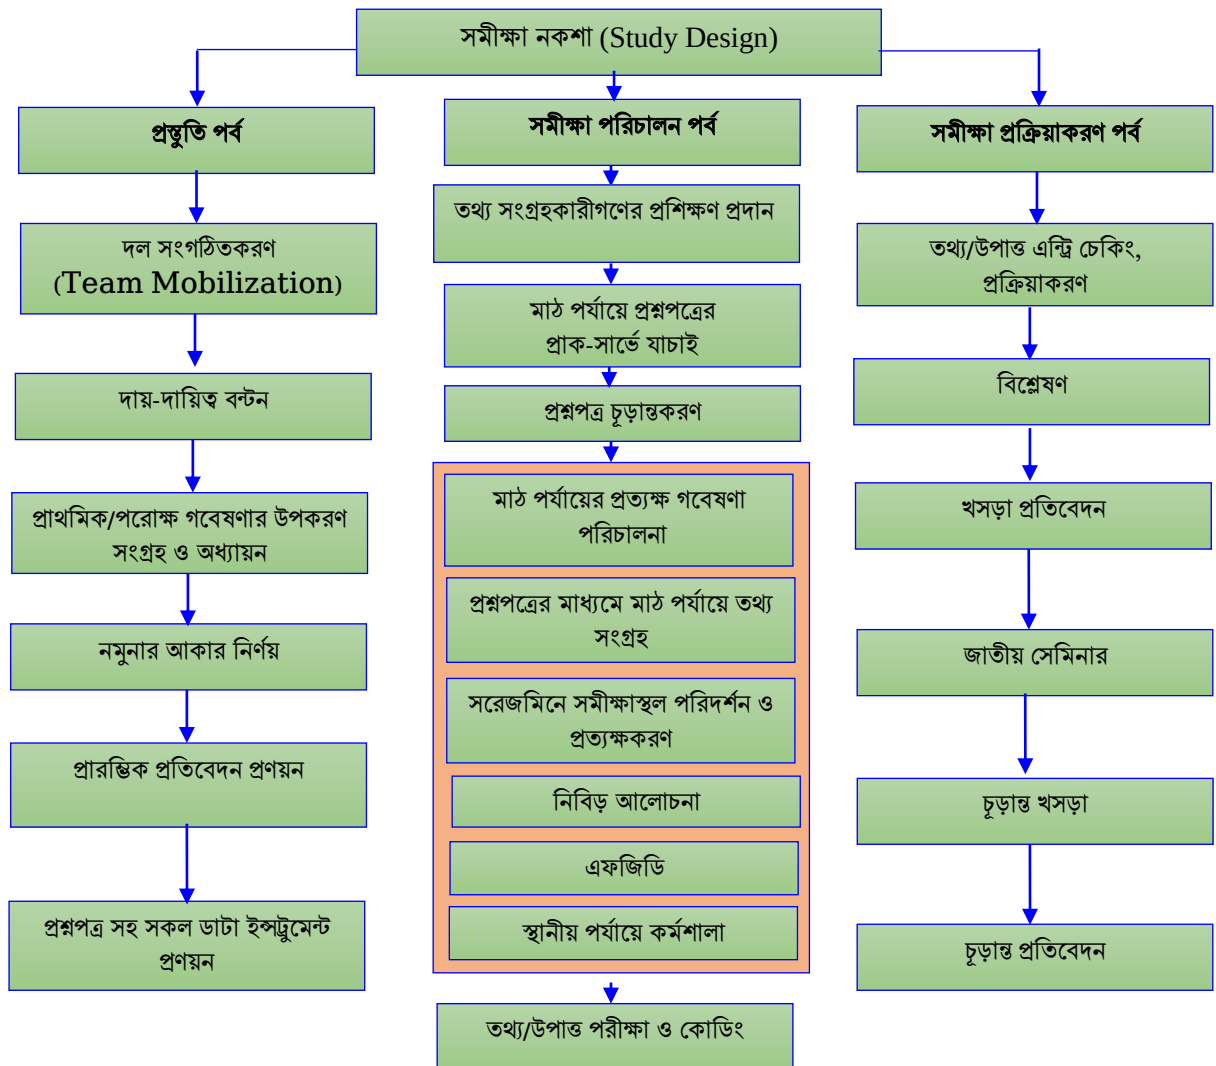

চিত্র-২.২: সমীক্ষা নকশার চার্ট

২.৬ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন

- মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে।
- মূল ডিজাইন এর সাথে কাজের তুলনা করা হয়েছে।
- সময় অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হচ্ছে/হবে কিনা বা কাজের বাস্তব অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- ঠিকাদার ও মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।
- কাজের মান পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাব পরীক্ষা রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- পুনরায় ল্যাব পরীক্ষা করে কাজের মান নিশ্চিত করা হয়েছে।
- নির্মিত/নির্মিতব্য মার্কেটের বিভিন্ন ধরনের (ডিজাইন) স্থাপত্য নকশা, কাঠামোগত নকশা, প্লাস্টিং নকশা ও বৈদ্যুতিক নকশা ইত্যাদি (অনুযায়ী কাজসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে/হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা হয়েছে।

২.৬.১ কাজের গুণগতমান

- ✓ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের প্রদত্ত অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- ✓ নির্মাণ কালীন ত্রুটি যথাঃ সেগ্রিগেশন, ব্লিডিং, অপরিষ্কৃত কিউরিং, পরিবেশ ও সতর্কতা মেনে না চলা, ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা পূর্বক প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়েছে।
- ✓ সাইট প্ল্যান, বেসমেন্ট প্ল্যান ও অন্যান্য ফ্লোর প্ল্যানের সাথে চলমান কাজের তুলনা করা হয়েছে।

২.৭ এলাকা নির্বাচন এবং নমুনা আকার নির্ধারণ

যে কোন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম কতটুকু চলমান বা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে/হচ্ছে কিনা এবং উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কতটুকু সফল হয়েছে তা নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নিরূপনের কৌশল হচ্ছে বাস্তব পরিদর্শন ও সুবিধাভোগীদের প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণ। প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৮বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৯২টি উপজেলায় ৫০৭টি বাজারের নির্মাণ কার্যক্রম চলমান থাকায় দ্বৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকল্পভূক্ত ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৫০% হিসেবে ৩২টি জেলা এবং ৪৯২টি উপজেলার ২০% হিসেবে ৯৮টি উপজেলার প্রতি উপজেলা থেকে ১টি করে বাজার নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রতিটি স্তর (Strata) থেকে দৈবভাবে (Randomly) নমুনা জরিপের জন্য দৈবচয়ন করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় নির্বাচিত নমুনাসমূহ যেন প্রতিনিধিত্বমূলক হয় সেটি নিশ্চিত করে সুফলভোগীদের নমুনা আকার নির্ণয়ে যে পরিসংখ্যানিক সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

$$n = \frac{z^2 pq}{e^2} \times deff$$

যেখানে,

n = কাক্সিত নমুনা সংখ্যা

z = the value of standard variety at a given confidence level

p = নমুনা অনুপাত সম্ভাবনা

q = নমুনা অনুপাত বিপরীত সম্ভাবনা

e = Acceptable error (the precision)

deff = Design Effect

নমুনার সংখ্যা নির্ধারণের জন্যে ৯৫% confidence level অনুমান করা হয়েছে। ফলে “z” এর মান হচ্ছে ১.৯৬।
তাছাড়া, p এর মান যদি ০.৫ ধরা হয় (যা সর্বোচ্চ নমুনা সংখ্যা নিশ্চিত করে), তবে q এর মান হবে (১-০.৫) = ০.৫।
e- এর মান ০.০৩ ধরা হয়েছে। deff এর মান ১.৫৬।

$$n = \frac{(1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5}{0.03^2} \times 1.56$$

$$= 1664.63$$

$$\approx 1665$$

সুবিধাভোগী নমুনার আকার (Sample Size) ১৬৬৬জন নির্ধারণ করে দ্বৈবভাবে (Randomly) সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৭.১ সমীক্ষা এলাকা নির্বাচন ও নমুনায়িত সংখ্যা

বিভাগ	জেলা	নমুনায়ীত উপজেলার নাম	নমুনায়ীত বাজারের নাম	নির্মাণ কাজের বর্তমান অবস্থা	নমুনার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
ঢাকা বিভাগ					
ঢাকা	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর	বসন্তপুর হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		গোয়ালন্দ	জামতলা হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		বালিয়াকান্দি	বহরপুর হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ সদর	ফতুল্লা বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		আড়াইহাজার	দুপতারা বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		বন্দর	লাংগলবন্ধ বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
	টাংগাইল	টাংগাইল সদর	তোরাবগঞ্জ হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		ঘাটাইল	ঘাটাইল হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		গোপালপুর	হাদিরা হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		বাসাইল	বাথুলিসাদি হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
	নরসিংদী	পলাশ	চরসিদ্ধুর বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		রায়পুরা	রাধাগঞ্জ বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		শিবপুর	শিবপুর বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
সিলেট বিভাগ					
সিলেট	হবীগঞ্জ	হবীগঞ্জ সদর	পুরাইখলা বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		চুনাবুঘাট	কাজির হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		নবীগঞ্জ	পানিউমমদা বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
	সিলেট	সিলেট সদর	শাহাজালাল বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		গোলাপগঞ্জ	পরগুনা বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		কোম্পানীগঞ্জ	তুকের বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
	মৌলভীবাজার	কুলাউড়া	বৃন্দারানী দীঘিরপাড় বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		কমলগঞ্জ	টিলা বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		মৌলভীবাজার সদর	অফিস বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
চট্টগ্রাম বিভাগ					
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা	সরকার হাট বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		হাটহাজারী	মদন হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		মিরসরাই	করমআলী বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭

বিভাগ	জেলা	নমুনায়ীত উপজেলার নাম	নমুনায়ীত বাজারের নাম	নির্মাণ কাজের বর্তমান অবস্থা	নমুনার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
		রাংগুনিয়া	ধামির হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
	কুমিল্লা	চান্দিনা	শ্রীমন্তপুর বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		দাউদকান্দি	গৌরীপুর বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		লাকসাম	বিজরা বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		মেঘনা	রামপুর বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
	ফেনী	ফেনী সদর	ফাজিলপুর বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		ছাগলনাইয়া	চাঁদগাজী বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		সোনাগাজী	ওলামা বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	ভাইবোনছড়া বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		লক্ষিছড়ি	লক্ষীছড়ি বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		মানিকছড়ি	যোগ্যহোলা বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
	রাঙ্গামাটি	বাগাইছড়ি	মাহিনা বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		নানিয়ারচর	ঘিলাছড়ি বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		রাজস্থলী	রাজস্থলী বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
খুলনা বিভাগ					
খুলনা	বাগেরহাট	কচুয়া	তালেশ্বর হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		মোল্লারহাট	চুনখোলা বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		রামপাল	ভোজপাতিয়া বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
	যশোর	ঝিকরগাছা	কুল্লা বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		চৌগাছা	সাক্ষাডাংগা বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		মনিরামপুর	দুর্বাডাঙ্গা বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
	খুলনা	তেরখাদা	সচিয়াদাহো হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		বাটিয়াঘাটা	হাটবাড়ী হাট জিসি	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		পাইকগাছা	কাসিমনগর হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
	মেহেরপুর	মুজিবনগর	কেদারগঞ্জ হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		গাংনী	ভাটপাড়া হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
	সাতক্ষীরা	কলারোয়া	দমদম হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		সাতক্ষীরা সদর	ঘোনা বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		তাল্লা	পোরার হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
বরিশাল বিভাগ					
বরিশাল	বরিশাল	উজিরপুর	শিকারপুর হাট ও বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		বানাড়িপাড়া	জামভিটা হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
	ভোলা	বোরহানউদ্দিন	কুঞ্জের হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		চরফ্যাশন	উত্তর ইছা বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		লালমোহন	কর্তার হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		তজুমদ্দিন	শম্ভুপুর নতুন হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		পিরোজপুর	ভান্ডারিয়া	সেনের হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ
	মঠবাড়ীয়া		সাফা বাজর	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
	নাজিরপুর		বাবুর হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
ময়মনসিংহ বিভাগ					

বিভাগ	জেলা	নমুনায়ীত উপজেলার নাম	নমুনায়ীত বাজারের নাম	নির্মাণ কাজের বর্তমান অবস্থা	নমুনার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
ময়মনসিংহ	জামালপুর	জামালপুর সদর	নান্দিনা বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		বকশীগঞ্জ	সূর্য নগর হাট (নাইম মিয়র হাট)	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		দেওয়ানগঞ্জ	কাঠার বিল বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
	শেরপুর	শেরপুর সদর	ভীমগঞ্জ বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		নকলা	বাউশা বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		নালিতাবাড়ী	ঘাগপাড়া বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
	ময়মনসিংহ	ফুলপুর	বাওলা বাজর	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		নান্দাইল	কালি বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		ফুলবাড়ীয়া	বাবুগঞ্জ বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		ভালুকা	মাহমুদপুর বাজার	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
রাজশাহী বিভাগ					
রাজশাহী	বগুড়া	আদমদিঘী	বিহীগ্রাম হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		ধুনট	খাটিয়ামারি হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		দুপচাঁচিয়া	তালুচ হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
	নাটোর	বড়াইগ্রাম	রায়না ভারত হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		লালপুর	কলশনগড় হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		নলডাঙ্গা	বেলঘড়িয়া হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
	পাবনা	পাবনা সদর	তারাবাড়ীয়া বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		ভাঙ্গুরা	ময়দান দিঘী হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		সাঁথিয়া	সোনাতলা হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	কাঁকন হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		বাঘা	মনিগ্রাম হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		তানোর	বিপ্লি হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৮
	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	চন্ডিদাসগিতি হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		উল্লাপাড়া	প্রতাপ হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		তাড়াশ	গুল্টা হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
রংপুর বিভাগ					
রংপুর	দিনাজপুর	চিরির বন্দর	মাদারগঞ্জ হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		কাহারোল	বটতলী হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		বিরল	চৌরঙ্গী হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
	রংপুর	গংগাচরা	ভাঙ্গাগড়া হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		পীরগাছা	টাম্বলপুর ভোলানাথ হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		পীরগঞ্জ	বালুর হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
	কুড়িগ্রাম	ফুলবাড়ী	খোলা হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		ভূবুংগামারী	পাগলা হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	নলডাংগা কাচারী বাজার	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		সাঘাটা	কচুয়া হাট	নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ	১৭
		গাইবান্ধা সদর	পুরাতন বাদিয়াখালী হাট	নির্মাণ কাজ চলমান	১৭
		৩২টি জেলা	৯৮টি উপজেলা	৯৮টি বাজার	--

২.৮ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা

ক) এফজিডি আলোচনা (Focus Group Discussion)

প্রকল্পের অধীন গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাতের সুবিধা প্রদান, গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি চলমান থাকায় বর্তমানে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান কতটুকু সম্ভব হবে তা নিরূপণ করার জন্য প্রকল্প এলাকায় এফজিডি করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডিতে ১০/১২ জন করে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। মোট ৩২টি এফজিডির আয়োজন করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	তথ্যদাতার ধরণ	সংখ্যা
১.	ব্যবসায়ী, স্থানীয় নির্বাচিত জন প্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক, নারী প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য কর্মী, ব্যবসায়ী ও স্থানীয় সচেতন নাগরিক, সমাজসেবক, ঈমামসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ২৫টি দলীয় আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে	২৫
২.	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সেক্রেটারীসহ অন্যান্য স্টেক হোল্ডারগণের সমন্বয়ে ৭টি দলীয় আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে	৭
মোট ২২টি এফজিডি ব্যক্তির সংখ্যা =		৩২X১২=৩৮৪

খ) নিবিড় আলোচনা/পরামর্শমূলক বৈঠক (Key Informant Interview)

প্রকল্পের কার্যকারিতা, প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, কাজের গুণগতমান, ঝুঁকি, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ইত্যাদি জানার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত বিভিন্ন পর্যায়ের পূর্ণ বা আংশিক দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তাগণের সাথে নিবিড় আলাপচারিতা (Key Informant Interview) KII করা হয়েছে। যাদের সাথে নিবিড় আলোচনা করা হয়েছে তাদের কিছু তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	তথ্যদাতার ধরণ	সংখ্যা
১.	প্রকল্প পরিচালক	১
২.	উপ- প্রকল্প পরিচালক	১
৩.	নির্বাহী প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধান প্রকৌশলী (জেলা পর্যায়ে)	৩২
৪.	উপজেলা প্রকৌশলী	৯৮
৫.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (৩২টি জেলা থেকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ৩২জন)	৩২
৬.	উপজেলা চেয়ারম্যান/ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার (দৈবচয়ন ভিত্তিতে)	২০
৭.	বাজার বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সেক্রেটারী (দৈবচয়ন ভিত্তিতে)	৪০
৮.	ঠিকাদার	২০
		২৪৪

সারণি-২.১: তথ্যদাতার প্রকার অনুসারে তথ্যদাতার সংখ্যা, স্থান ও তথ্য সংগ্রহ উপকরণ

ক) পরিমাণগত তথ্যসংগ্রহের উৎস এবং আকার

ক্রঃ	পদ্ধতি	তথ্যদাতার ধরণ	তথ্য সংগ্রহ উপকরণ	তথ্যদাতার সংখ্যা
১.	ডকুমেন্ট পর্যালোচনা	ডিপিপি/আরডিপিপি, প্রকল্পের ডিজাইন, প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্তর্বর্তীকালীন জরিপ প্রতিবেদন।	---	প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন
সংখ্যাগত পদ্ধতি				
২.	প্রকল্পের সুবিধাভোগী সমীক্ষা	প্রকল্প এলাকার সাধারণ জনগণ ও ব্যবসায়ী	কাঠামোগত প্রশ্নপত্র (সংযোজনী-১)	১৬৬৬ জন
			উপ-মোট	১৬৬৬ জন
গুণগত পদ্ধতি				
৩.	কী ইনফরমেন্ট	প্রকল্প পরিচালক, উপ- প্রকল্প পরিচালক,	KII চেকলিস্ট	২৪৪ জন

ক্রঃ	পদ্ধতি	তথ্যদাতার ধরণ	তথ্য সংগ্রহ উপকরণ	তথ্যদাতার সংখ্যা
	ইন্টারভিউ	নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান/ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বর, বাজার সমিতির সভাপতি/সেক্রেটারী এবং অন্যান্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে ২৪৪ টি KII পরিচালিত হয়েছে।		
৪.	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক, নারী প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য কর্মী, ব্যবসায়ী ও স্থানীয় সচেতন নাগরিক, সমাজসেবক, ঈমাম ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণের সমন্বয়ে ৩২টি এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে, প্রতিটি এফজিডিতে ১০/১২ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন।	এফজিডি চেকলিস্ট/ গাইড লাইন	৩২ টি (প্রতি এফজিডিতে) ৩২X১২= মোট ৩৮৪
০৫	কেস স্টাডি	ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজ ৫টি ও ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে ৫টি কেস স্টাডি পরিচালনা করা হয়েছে।	কেস স্টাডি গাইড লাইন	১০টি
০৬	মাঠ পরিদর্শন এবং ভৌত পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণ	প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন	প্রকল্প এলাকায় অঙ্গভিত্তিক কাজের পর্যবেক্ষণ	---
০৭	ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা	প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদান ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাইকরণ	ক্রয় চেকলিস্ট	---
০৮	গুণগতমান যাচাই এবং পরীক্ষা	বিভিন্ন উপাদান ও ভৌত উন্নয়ন কাজের নমুনা পরীক্ষা	ল্যাবরেস্ট রিপোর্ট	---
০৯	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, জেলা প্রশাসক (যদি থাকে), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী, সচেতন নাগরিক, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও কর্মী, ঈমাম, ব্যবসায়ী, নারী প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি/সেক্রেটারীসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের সমন্বয়ে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।	সমীক্ষার বিষয়বস্তু উপস্থাপনাসহ মুক্ত আলোচনা	১টি (৫০জন)
১০	জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা	আইএমইডি ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ এবং জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে	সমীক্ষার চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন	১টি (১১০ জন)
সর্বমোট=				২৪৬৪ জন

২.৯ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

২.৯.১ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

সমীক্ষার জন্য মোট ১৬৬৬ জন উপকারভোগী উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, ০১ জন তথ্য সংগ্রহকারী এ ধরনের সমীক্ষায় দৈনিক গড়ে ০৫-০৮ জনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এ হিসেবে ১২ জন তথ্য সংগ্রহকারী ১৭ কর্মদিবস সময়ের মধ্যে উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ১৬ জন তথ্য সংগ্রহকারীকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য ০৩ জন সুপারভাইজর নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সুপারভাইজরগণ তথ্য সংগ্রহকারীদের follow-up করবেন এবং KII ও FGD, কেস স্টাডি পরিচালনা করেছেন এবং তথ্য সংগ্রহকারীগণ এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করেছেন। সকল তথ্য সংগ্রহের জন্য মোট ১৮ দিন সময় প্রয়োজন হয়েছে (একদিন ছুটি বিবেচনা করে)।

প্রারম্ভিক প্রতিবেদন তত্ত্বাবধান কমিটির সভায় অনুমোদনের পর তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজরগণকে ২ দিনের প্রশিক্ষণ (অর্ধবেলা ফিল্ড প্রি-টেস্টিং) দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের সময় আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আইএমইডি কর্তৃক প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৯.২ প্রশ্নপত্রের প্রাক-সার্ভে যাচাই (Field pre-testing of Questionnaire)

তথ্য সংগ্রহকারীগণ সমাজতীয় তথ্য/উপাত্ত দ্বারা খসড়া প্রশ্নপত্র পূরণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাদের ভুল-ত্রুটি ঘটনাস্থলেই চিহ্নিত করে ত্রুটিমুক্তভাবে প্রশ্নপত্র পূরণের প্রশিক্ষণ দেয়া ছাড়াও কিভাবে ভুল সংশোধন বা মোকাবেলা করতে হয় সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর পূরণকৃত প্রশ্ন পত্রের আলোকে খসড়া প্রশ্নপত্রের ত্রুটি ও দুর্বলতা সংশোধন করা হয়েছে এবং সংশোধিত প্রশ্নমালার সাহায্যে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

২.৯.৩ সাক্ষাৎকার গ্রহণ

নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে উত্তরদাতাগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রেই উত্তর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্পের স্থির চিত্র সংগ্রহ ও ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য যাচাই, নিবিড় আলোচনা, এফজিডি ইত্যাদির জন্য সংশ্লিষ্ট চেকলিস্ট/গাইড লাইন অনুসরণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে অনুমতি সাপেক্ষে নিবিড় আলোচনা রেকর্ড করা হয়েছে।

২.৯.৪ সমীক্ষা ও উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control)

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় সুপারভাইজরগণ প্রতিটি প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট ঠিকমত পূরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখেছেন। দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে ৫% পূরণকৃত প্রশ্নপত্র পূরণের পরই যাচাই করে দেখেছেন। প্রশ্নপত্র পূরণে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি দেখা গেলে সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৯.৫ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ

কম্পিউটারের মাধ্যমে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাঠ হতে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিশুদ্ধ করা হয়েছে এবং সেগুলো কম্পিউটারে এন্ট্রির মাধ্যমে রেকর্ড করা হয়েছে। উপাত্ত প্রক্রিয়ার জন্য প্রধানত SPSS version 20 এবং ক্ষেত্র বিশেষে Microsoft Access ও Microsoft Excel 2010 ব্যবহার করা হয়েছে। যথাযথ Tabulation-এর সাহায্যে প্রক্রিয়াকৃত উপাত্ত ও ফলাফল সারণি, গ্রাফ ও চার্ট আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সেগুলো সমীক্ষায় বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য প্রতিবেদনের যথাস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে।

২.১১ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও দাখিল

সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ পূর্বক সহজ বোধগম্য ভাষায় প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে বর্ণিত সমীক্ষার রূপরেখা ও প্রশ্নপত্র সংযুক্ত করে টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ এবং তত্ত্বাবধান কমিটির অনুমোদনের জন্য ২৮ কপি প্রেরণ করা হয়েছে এবং তত্ত্বাবধান কমিটির অনুমোদনের পর মাঠ পর্যায়ের তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত সকল তথ্য/উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের পর ১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করে টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ এবং তত্ত্বাবধান কমিটির অনুমোদনের জন্য ২৮ কপি প্রেরণ করা হয়েছে। ১ম খসড়া প্রতিবেদনের উপর দেয়া সংশ্লিষ্ট কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ-এর আলোকে ২য় খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ২য় খসড়া প্রতিবেদনের কপি জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত কর্মশালায় উপস্থাপন করার জন্য ১১০ কপি প্রেরণ করা হয়েছে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণের মন্তব্য বিবেচনায় নিয়ে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন পুনরায় টেকনিক্যাল কমিটির মতামত ও অনুমোদনের জন্য আইএমইডিতে ১২ কপি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে এবং অনুমোদিত চূড়ান্ত প্রতিবেদন এর প্রিন্ট কপি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেক্টর-৩ এর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে (বাংলা-৪০ কপি ও ইংরেজী-২০ কপি) মহাপরিচালক, সেক্টর-৩, আইএমইডি বরাবর দাখিল করা হয়েছে।

সারণি ২.২: নিম্নেউল্লিখিত প্রতিবেদনসমূহের সংখ্যা ও সময়সূচীর আলোকে দাখিল করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রতিবেদনের নাম	সংখ্যা/কপি	ভাষা	সময়
০১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ও তত্ত্বাবধান) কমিটির সভার জন্য	১২+১৬=২৮ কপি	বাংলা	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
০২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ও তত্ত্বাবধান) কমিটির সভার জন্য	১২+১৬=২৮ কপি	বাংলা	চুক্তি সম্পাদনের ৬৮ দিনের মধ্যে
০৩.	দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদন (ডিসেমিনেশন কর্মশালা) কমিটির সভার জন্য	বাংলা ১১০ কপি	বাংলা	চুক্তি সম্পাদনের ৭৮ দিনের মধ্যে
০৪.	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল) কমিটির সভার জন্য	১২ কপি	বাংলা	চুক্তি সম্পাদনের ৮০ দিনের মধ্যে
০৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	বাংলা ৪০ ও ইংরেজি ২০	বাংলা ও ইংরেজি	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে

২.১২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চুক্তি সম্পাদনের পর হতে প্রারম্ভিক প্রতিবেদন পেশ করা পর্যন্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতিমধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে, যেমনঃ (ক) পরামর্শকদের দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে (খ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার দলিলাদি/উপকরণ সংগ্রহ ও পর্যালোচনার কাজ চলছে (গ) নমুনা চয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে sample population নির্ণীত হয়েছে এবং (ঘ) প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (Inception Report) প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রারম্ভিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করার পর কারিগরি ও তত্ত্বাবধান কমিটির অনুমোদনক্রমে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন অনুযায়ী যে সমস্ত কাজ করা হয়েছে তার কর্মপরিকল্পনা (Work plan) নিম্নে সারণি ২.৩ এ দেখানো হলো।

সারণি: ২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	সময়	মাস					তারিখ
			ফেব্রু২৩	মার্চ-২৩	এপ্রিল-২৩	মে-২৩	জুন ২৩	
১.	চুক্তি স্বাক্ষর	১ দিন	■					১৬/০২/২০২৩
২.	খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও	১১দিন	■					১৭/০২/২৩-

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	সময়	মাস					তারিখ
			ফেব্রুৱা-২৩	মার্চ-২৩	এপ্রিল-২৩	মে-২৩	জুন ২৩	
	দাখিল							০২/০৩/২০২৩
৩.	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রিপোর্ট সংশোধন	০৩ দিন						০৩/০৩/২৩- ০৫/০৩/২০২৩
৪.	তত্ত্বাবধান কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্ট অনুমোদন	০৫ দিন						০৬/০৩/২৩- ১০/০৩/২০২৩
৫.	প্রশ্নমালা চূড়ান্তকরণ ও মাঠ পর্যায়ের জনবল নিয়োগ	১৬ দিন						১১/০৩/২৩- ২৫/০৩/২০২৩
৬.	প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম পরিবেক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ							
৭.	উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের তদারকি							
৮.	FGD পরিচালনা করা							
৯.	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা করা							
১০.	সংগৃহীত উপাত্ত সম্পাদনা	১৮ দিন						২৬/০৩/২০২৩- ১৭/০৪/২০২৩
১১.	ডাটা এন্ট্রি ও যাচাইকরণ							
১২.	টেবুলেশন সম্পন্ন							
১৩.	ডাটা বিশ্লেষণ							
১৪.	১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল	১৫ দিন						১৮/০৪/২০২৩- ২২/০৪/২০২৩
১৫.	খসড়া প্রতিবেদন টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা							
১৬.	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও ২য় খসড়া প্রতিবেদন দাখিল	২৩ দিন						২৩/০৪/২০২৩- ১৫/০৫/২০২৩
১৭.	জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত সংগ্রহ	১৩ দিন						১৬/০৫/২০২৩- ২৮/০৫/২০২৩
১৮.	সেমিনারের মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল	১৫ দিন						২৯/০৫/২০২৩- ১৬/০৬/২০২৩
মোট		১২০ দিন						

তৃতীয় অধ্যায়

ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অঙ্গসমূহকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: রাজস্ব খাত ও মূলধন খাত। রাজস্ব খাতের অন্তর্ভুক্ত খরচসমূহ হচ্ছে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতাদি, পরামর্শ সেবা (কনসালটেন্সি), বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, মোটর যানবাহন, সার্ভে ও ইনভেস্টিগেশন। অন্যদিকে, মূলধন খাতে রয়েছে অনাবাসিক ভবন সমূহ, মটর সাইকেল ক্রয়, ডাবল-কেবিন পিকআপ, কম্পিউটার এবং মালামাল (কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্কেনার, ফ্যাক্স, ইউপিএস), অফিস সরঞ্জামাদি লেভেল মেশিন (প্রতিটি উপজেলায় ১ টি করে), উপজেলা মেটেরিয়াল টেস্টিং ইকুইপমেন্ট (প্রতিটি উপজেলায় ৬ টি সিলিন্ডার মোন্ড, ব্রাশসহ একটি সিড সেট, ২ সেট কংক্রিট স্ল্যাম্প কোন ২ টি ব্যালেন্স করে) ইত্যাদি। এই সকল অঙ্গসমূহের তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা নিম্নরূপ:

৩.২ প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ব্যয় এবং বাস্তবায়নকাল

প্রকল্পটির ডিপিপি গত ০৩/০৫/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মূল প্রকল্পটি ১৭৩০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত (৩৬ মাস) বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রথম বার জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১ সময় বৃদ্ধি করা হয়। পুনরায় গত ২৫.০৭.২০২১ তারিখে প্রকল্পের ২.২৫% ব্যয় হ্রাস করে ১৬৯১০০.০০ লক্ষ টাকায় প্রথম সংশোধনী হিসেবে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে যথাযথ সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে দ্বিতীয় বার জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়। এতে প্রকল্পের মোট সময় বৃদ্ধি পায় মূল পর্যায়ের তুলনায় ৬০ মাস বা ১৬৬.৬৭% এবং হ্রাস পায় ৩৯০০.০০ লক্ষ টাকা বা ২.২৫%।

৩.৩ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ পর্যালোচনা

তিন বছরের প্রারম্ভিক পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পটি, পরবর্তীতে আট বছর পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু ছয় বছর অতিক্রান্ত হবার পরও এর অগ্রগতি প্রায় ৩২%, যা কোনভাবেই আশাব্যঞ্জক নয়। প্রকল্পের অধীনে ৫০৭টি বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করার কথা থাকলেও মে, ২৩ পর্যন্ত ৮৭টি বাজারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, তন্মধ্যে ২৮টি বাজার হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১৯১টি বাজার অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জটিলতার কারণে ৭৭টি বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

প্রকল্প অফিসে যোগাযোগের মাধ্যমে ও সরেজমিনে পরিদর্শনে, এ বিষয়ে যে কারণ গুলিলক্ষ্য করা গেছে, তা হচ্ছে;

- প্রকল্পভুক্ত ১১০টি বাজারের জায়গাতে অস্থায়ী স্থাপনা ও ৩৫টি বাজারে স্থায়ী স্থাপনা থাকায় স্থাপনাসমূহ অপসারণপূর্বক খালী জায়গা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়া;
- মার্কেট ভবন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত বাজারসমূহে প্রস্তাবিত জমির আকৃতি, ধরন ও সয়েল কন্ডিশন ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় প্রতিটি মার্কেট ভবনের জন্য Need Based আলাদা আলাদা ডিজাইন ও ড্রইং প্রস্তুত এবং সাইট পরিবর্তন হওয়ায় পরিবর্তিত সাইটের ডিজাইন ও ড্রইং প্রস্তুত করতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হওয়া;
- ডিপিপিতে অনুমোদিত ৮০টি বাজারের জায়গা সংক্রান্ত জটিলতা থাকায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেত উক্ত বাজারসমূহের নাম পরিবর্তন করা;
- কিছু জেলায় প্রশাসন হইতে মার্কেট নির্মাণের অনুমতি প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের কাজ শুরু করতে বিলম্ব হওয়া;
- ডিপিপিতে অনুমোদিত ১৩টি বাজারের মার্কেট নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় তা বাদ দেয়া;


- কোভিড-১৯ সময়ে নির্মাণ কাজ ব্যহত হওয়া ও পর্যাপ্ত বাজেট না পাওয়া, ইত্যাদি।

৩.৪ প্রকল্পের বছর ভিত্তিক সার্বিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা

প্রকল্পের আরডিপিপিতে মোট ৫ (পাঁচ) অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা রয়েছে (অনুচ্ছেদ-১.৯)। প্রকল্প অফিসের অর্থবছর ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে লক্ষ্য করা যায়, প্রকল্পটির শুরুতেই ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি, এর মূল কারণ হলো ডিজাইন প্রস্তুতে বিলম্ব হয়েছিল। এছাড়া ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১, ২০২১-২২ অর্থবছরেও কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অগ্রগতি অনেকাংশই কম। বাজার অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি খাস জমি না থাকা, মামলা সংক্রান্ত জটিলতা, কিছু স্থানে মার্কেট ভবন নির্মাণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা প্রশাসন থেকে অনাপত্তি না পাওয়া, বরাদ্দ স্বল্পতা এবং পরবর্তীতে কোভিড-১৯ এর কারণে সারাদেশে লকডাউন থাকায় সরকারি বিধি নিষেধে ঠিকাদার ও নির্মাণ শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রকল্প স্থলে যেতে না পারায় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অগ্রগতি কিছুটা কম হয়েছে। তবে সময় অতিক্রান্ত বিবেচনায়, প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রস্তাবিত অবশিষ্ট সময়ে প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে যথাযথভাবে তদারকির মাধ্যমে চলমান কাজগুলো সম্পন্ন করলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

৩.৫ অর্থবছর ভিত্তিক ডিপিপি'র সংস্থান ও বরাদ্দ, অর্থছাড় এবং প্রকৃত ব্যয় পর্যালোচনা

প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক ডিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড়, প্রকৃত ব্যয় এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০১৭-২০১৮ ডিপিপি'র সংস্থান ছিল ৫৫৩৩৬.১৫ লক্ষ টাকা এবং আরএডিপি'র বরাদ্দ ৩৫.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে আরএডিপি'র বরাদ্দ ছিল ০.০৬৩%। অর্থছাড় হয়েছে ৩৪.৯৩ লক্ষ টাকা ও প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৩৪.৯৩ লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ ডিপিপি'র সংস্থান ছিল ৫৩১০৭.৩৫ লক্ষ টাকা এবং আরএডিপি'র বরাদ্দ ১২২০.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে আরএডিপি'র বরাদ্দ ছিল ২.৩০%। অর্থছাড় হয়েছে ১২২০.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১২১৭.২০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ ডিপিপি'র সংস্থান ছিল ৬৪৫৫৬.৫১ লক্ষ টাকা এবং আরএডিপি'র বরাদ্দ ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে আরএডিপি'র বরাদ্দ ছিল ৯.২৯%। অর্থছাড় হয়েছে ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৫৯০৪.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে আরডিপিপি'র সংস্থান ছিল ২৫০০০.০০ লক্ষ ২৫০৯৯.৯৭ লক্ষ টাকা এবং আরএডিপি'র বরাদ্দ ১৮০০০.০০ ও ১৭৮০০.০০ লক্ষ টাকা। অর্থছাড় হয়েছে ১৪৪৫০.০ ও ১৭৮০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৪৪৪৭.৯০ ও ১৭৭৯৮.৮৪ লক্ষ টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আরডিপিপি'র সংস্থান ছিলনা এবং আরএডিপি'র বরাদ্দ ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা, বরাদ্দের বিপরীতে অর্থছাড় হয়েছে ১৭০০০.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকৃত ব্যয় হয়েছে মে, ২৩ পর্যন্ত ১৬৩১৪.৮৩৭ লক্ষ টাকা। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের অর্থছাড়ের তুলনায় অগ্রগতি সন্তোষজনক। প্রকল্পটির মে, ২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৫৫৭১৭.৬২৭ লক্ষ টাকা বা ৩২.৯৪ শতাংশ এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৭%। নিম্নে লেখচিত্র ও সারণি ৩.১-এ বিস্তারিত উপস্থাপন করা হলো।

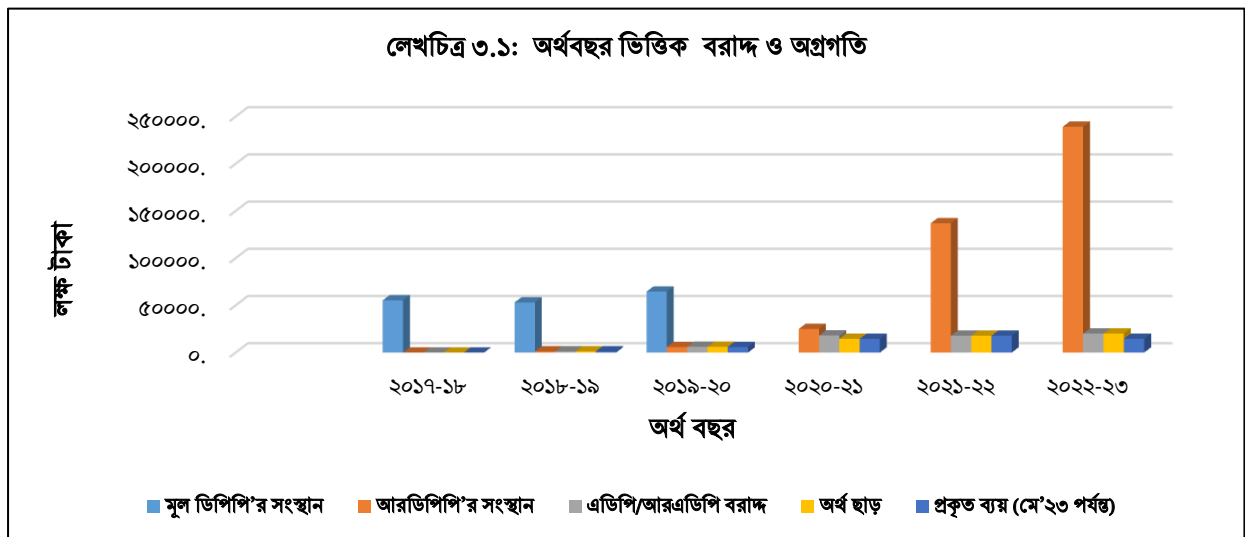

সারণিঃ ৩.১ অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও প্রকৃত ব্যয় বিশ্লেষণ

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপি/আরডিপিপি'র সংস্থান			এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ		অর্থ ছাড় (%)		প্রকৃত ব্যয় (%)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	
	ডিপিপি	আরডিপিপি	পিএ/ নিজস্ব	জিওবি	পিএ/ নিজস্ব	জিওবি	পিএ/ নিজস্ব	জিওবি	পিএ/ নিজস্ব	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অর্জন (%)
	জিওবি										
২০১৭-১৮	৫৫৩৩৬.১৫	৩৪.৯৩	--	৩৫.০০	--	৩৫.০০	--	৩৪.৯৩	--	০.০৬	০.০২
২০১৮-১৯	৫৩১০৭.৩৫	১২১৭.২০	--	১২২০.০০	--	১২২০.০০	--	১২১৭.২০	--	২.৩০	০.৭২
২০১৯-২০	৬৪৫৫৬.৫১	৫৯০৪.০০	--	৬০০০.০০	--	৬০০০.০০	--	৫৯০৪.০০	--	৯.২৯	৩.৪৯
২০২০-২১	--	২৫০০০.০০	--	১৮০০০.০০	--	১৪৪৫০.০	--	১৪৪৪৭.৯০	--	৭২.০০	৮.৫৪
২০২১-২২	--	১৩৬৯৪ ৩.৮৭	--	১৭৮০০.০০	--	১৭৮০০.০০	--	১৭৭৯৮.৮৪	--	১২.৯৯	১০.৫২
২০২২-২৩	--	--	--	২০০০০.০০	--	১৭০০০.০০	--	১৬৩১৪.৮৩৭ (মে, ২৩ পর্যন্ত)	--	--	৯.৬৫
সর্বমোটঃ	১৭৩০০০.০০	১৬৯১০০.০০	--	৬৩০৫৫.০০	--	৫৬৫০৫.০০	--	৫৫৭১৭.৬২৭	--	৩৭.২৯	৩২.৯৪

তথ্য সূত্রঃ প্রকল্পের আরডিপিপি ও প্রকল্প অফিস

৩.৬ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি

প্রকল্পের জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৯৪০২.৭৯ লক্ষ টাকা ও বাস্তব ২৩.৩০%। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের বরাদ্দ রয়েছে ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং অর্থ ছাড় হয়েছে ১৭০০০.০০ লক্ষ টাকা, অর্থছাড়ের বিপরীতে মে-২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৬৩১৪.৮৩৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের এ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি মে-২৩ পর্যন্ত ৫৫৭১৭.৬২৭ লক্ষ টাকা বা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৩২.৯৪% শতাংশ এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৭%।

সারণি-৩.২: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	উপাদানের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন-২০২২)		চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের মে-২৩ পর্যন্ত খরচ		চলতি অর্থবছরের মে-২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব %	আর্থিক	বাস্তব %	আর্থিক	বাস্তব %	আর্থিক	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
--	ক) রাজস্ব										
০১	অফিসারদের বেতন	৯ জন	২১৩.০০	১২৩.৭৮	৫৮.১১	৩২.৭৭	১৫.৩৮	২৯.৯৮৯	৯১.৫০	১৫৩.৭৭	৭২.১৯
০২	কর্মচারীদের বেতন	৫ জন	৮২.৩৬	৪৮.৭৪	৫৯.১৮	১১.০০	১৩.৩৫	১০.০০৯	৯০.৯৭	৫৮.৭৪	৭১.৩২
--	উপ-মোট (বেতন)	১৪ জন	২৯৫.৩৬	১৭২.৫২	৫৮.৪১	৪৩.৭৭	১৪.৮১	৩৯.৯৯৮	৯১.৩৮	২১২.৫১	৭১.৯৪
০৩	দায়িত্ব ভাতা	১৪ জন	১.০০	০.১৫	১৫.০০	০.২৬	২৬.০০	০.২৪০	৯২.৩০	০.৩৯	৩৯.০০
০৪	যাতায়াত ভাতা	১৪ জন	১.০০	০.৪৩	৪৩.০০	০.১১	১১.০০	০.০৯৯	৯০.০০	০.৫৩	৫৩.০০
০৫	শিক্ষা ভাতা	১৪ জন	৭.০০	২.৮৯	৪১.২৮	০.৬৪	৯.১৪	০.৫৬৫	৮৮.৩০	৩.৪৫	৪৯.২৮
০৬	বাড়ী ভাড়া ভাতা	১৪ জন	১৫৮.১১	৮৭.৩১	৫৫.২২	২২.৮৫	১৪.৪৫	২০.৯১৮	৯১.৫৪	১০৮.২৩	৬৮.৪৫
০৭	চিকিৎসা ভাতা	১৪ জন	১৩.০০	৬.৩০	৪৮.৪৬	১.৬০	১২.৩০	১.৪৫৫	৯০.৯৫	৭.৭৬	৫৯.৬৯
০৮	মোবাইল / সেলুলার ভাতা	১৪ জন	১.৫০	০.৭৬	৫০.৬৫	০.১৮	১২.০০	০.১১০	৬১.১০	০.৮৭	৫৮.০০
০৯	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১৪ জন	০০	০.১৮	০.০	০.২৮	০.০	০.২৫৩	০.০	০.৪৪	০.০
১০	টিফিন ভাতা	১৪ জন	০.৮৫	০.৯৬	১১২.৯৪	০.০৮	৯.৪১	০.০৬৬	৮২.৫০	১.০২	১২০.০০
১১	উৎসব বোনাস	১৪ জন	৫২.০০	২৮.৬২	৫৫.০৪	৭.৩৭	১৪.১৭	৪.৩৬৪	৫৯.২০	৩২.৯৮	৬৩.৪২
১২	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১৪ জন	৭.০০	৩.৫২	৫০.২৯	০.৭৩	১০.৪২	০.৭২৩	৯৯.০৫	৪.২৫	৬০.৭১
১৩	সম্মানি	১৪ জন	১৬.০০	১১.৩৮	৭১.১২৫	১.০০	৬.২৫	০.৭৪০	৭৪.০০	১২.১২	৭৫.৭৫
১৪	নববর্ষ ভাতা	১৪ জন	৫.০০	২.৫৩	৫০.৬০	০.৭৪	১৪.৮০	০.৭৩৬	৯৯.৪৫	৩.২৭	৬৫.৪০

ক্রমিক নং	উপাদানের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন-২০২২)		চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের মে-২৩ পর্যন্ত খরচ		চলতি অর্থবছরের মে-২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব %	আর্থিক	বাস্তব %	আর্থিক	বাস্তব %	আর্থিক	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৫	অন্যান্য ভাতা	১৪ জন	৫.০০	৩.৭৬	৭৫.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৭৬	৭৫.২০
১৬	অতিরিক্ত সময়ে কাজের ভাতা	১৪ জন	০.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
-	উপ-মোট (ভাতাদি)	--	২৬৭.৮৬	১৪৮.৮০	৫৫.৫৫	৩৫.৮৪	১৩.৩৮	৩০.২৭	৮৪.৪৫	১৭৯.০৬	৬৬.৮৪
-	মোট বেতন ভাতাদি	--	৫৬৩.২২	৩২১.৩২	৫৭.০৫	৭৯.৬১	১৪.১৩	৭০.২৭	৮৮.২৬	৩৯১.৫৮	৬৯.৫২
১৭	আপ্যায়ন খরচ	থোক	২০.৭২	১২.২৪	৫৯.০৭	৩.০০	১৪.৫০	২.৫৭৭	৮৫.৯১	১৪.৮২	৭১.৫২
১৮	বিদ্যুৎ	থোক	১৮.০০	১১.২৬	৬২.৫৫	২.২৫	১২.৫০	০.৬৯৫	৩০.৮৭	১১.৯৬	৬৬.৪৪
১৯	ডাক/পোস্টজ	থোক	৭.০০	৩.৬২	৫১.৭১	০.১০	১.৪৩	০.১০০	১০০.০০	৩.৭২	৫৩.১৪
২০	কুরিয়ার	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.২০	১০০	০.১৫৭	৭৮.৫০	০.১৬	৮০.০০
২১	টেলিফোন/টেলিগ্রাম	থোক	০.৯০	০.৪৮	৫৩.৩৩	০.১০	১১.১০	০.০৪৬	৪৬.০০	০.৫৩	৫৮.৮৯
২২	বিজ্ঞাপন ও প্রচার	থোক	৩৬০.০০	২১৪.৫৪	৫৯.৫৭	১৫.৩৫	৪.২৫	১০.০০০	৬৫.১৫	২২৪.৫৪	৬২.৩৭
২৩	আউটসোর্সিং	৭৮ জন	১৫৭৪.০০	১১৯৩.৪৬	৭৫.৮২	২৭০.০০	১৭.১৫	২৩১.৮৩৭	৮৫.৮৫	১৪২৫.৩০	৯০.৫৫
২৪	টেলেক্স/ ফ্যাক্স / ইন্টারনেট	থোক	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫	সেমিনার / কনফারেন্স	থোক	৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৬	রেজিস্ট্রেশন ফি	থোক	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৭	কপি / অনুলিপি	থোক	৫.০০	০.৫০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৫০	১০.০০
২৮	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	থোক	১৯৯.৯৮	৬১.৬৩	৩০.৮১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬১.৬৩	৩০.৮১
২৯	অত্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	থোক	৭৫.০০	৭২.৭০	৯৬.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭২.৭০	৯৬.৯৩
৩০	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৬৭.০০	১৮.৮৬	২৮.১৫	৫.০০	৭.৪৫	২.২৬৮	৪৫.৩৬	২১.১২	৩১.৫২
৩১	পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	১৩৫.০০	৭৬.৭২	৫৬.৮২	২০.০০	১৪.৮০	১৯.২২৭	৯৬.১৫	৯৫.৯৫	৭১.০৭
৩২	গ্যাস ও জ্বালানি	থোক	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৩	নিরাপত্তা ও সেবা সংগ্রহ	থোক	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	৭০.০০	৪৩.৫৫	৬২.২০	১৫.০০	২১.৪০	১৪.৯৪০	৯৯.৬০	৫৮.৪৯	৮৩.৫৫
৩৫	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	২৮.৯০	১.৬৮	৫.৮১	১.০০	৩.৪৫	০.০০	০.০০	১.৬৮	৫.৮১

ক্রমিক নং	উপাদানের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন-২০২২)		চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের মে-২৩ পর্যন্ত খরচ		চলতি অর্থবছরের মে-২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব %	আর্থিক	বাস্তব %	আর্থিক	বাস্তব %	আর্থিক	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩৬	স্ট্যাম্প ও সিল	থোক	১০০.০০	৯৬.৪৭	৯৬.৪৭	৮.৬৮	৮.৬৮	৮.৩৪৭	৯৬.১৫	১০৪.৮২	১০৪.৮২
৩৭	অন্যান্য মনিহরী	থোক	১২১.০০	৭৭.২৮	৬৩.৮৬	৭.৫০	৬.২০	৬.৯৮৪	৯৩.১০	৮৪.২৬	৬৯.৬৩
৩৮	কনসালটেশন	২০ জন	১০৭০.০০	৫৫৭.৩৯	৫২.১০	৮২.০০	৭.৬৬	৭৩.৬৪৩	৮৯.৮০	৬৩১.০৪	৫৮.৯৭
৩৯	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	থোক	২০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪০	সার্ভে ও ইনভেস্টিগেশন	থোক	৫৫০.০০	৩১০.৮০	৫৬.৫১	১৪.৪০	২.৬০	১৪.৪০০	১০০.০০	৩২৫.২০	৫৯.১২
--	মোট সরবরাহ সেবা	--	৪৪২৯.৫০	২৭৫৩.১৯	৬২.১৫	৪৬৪.৫৮	১০.৪৮	৩৮৫.২২	৮২.৯১	৩১৩৮.৪১	৭০.৮৫
৪১	মোটর যানবাহন	২ টি	১১৫.০০	৭৫.৩৩	৬৫.৫০	১৭.০০	১৪.৭৮	১১.৩৯৩	৬৭.০০	৮৬.৭২	৭৫.৪০
৪২	কম্পিউটার	থোক	১৬.০০	১৬.৬৯	১০৪.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.৬৯	১০৪.৩১
৪৩	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	২৫.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	৪০.০০	৫.০০	৫০.০০	৫.০০	২০.০০
৪৪	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	থোক	১৫.০০	১.৯৩	১২.৮৬	১৪.৫৫	৯৭.০০	১০.০০	৬৮.৭০	১১.৯৩	৭৯.৫৩
৪৫	অনাবাসিক ভবন	থোক	৭.০০	৫.৮২	৮৩.১৪	১০.০০	১৪২.৮৫	৯.৪৪৯	৯৪.৫০	১৫.২৮	২১৮.২৮
-	মোট মেরামত সংরক্ষণ ও পূর্ণবার্ষিক	--	১৭৮.০০	৯৯.৭৬	৫৬.০৪	৫১.৫৫	২৮.৯৬	৩৫.৮৫	৬৯.৫৪	১৩৫.৬১	৭৬.১৮
-	উপ-মোট (রাজস্ব)	--	৫১৭০.৭২	৩১৭৪.২৬৫০	৬১.৩৮	৫৯৫.৭৪০০	১১.৫২	৪৯১.৩৩৯০	৮২.৪৭	৩৬৬৫.৬০	৭০.৮৯
-	মূলধন										
৪৬	অনাবাসিক ভবন সমূহ	৫০৭টি	১৫২১০০.০০	৩৫৫০২.৯৯	৪২৮.৪১	১৬৩০৩.৭৬	৪৫.৯২	১৫৮২৩.০০	৯৭.০৫	৫১৩২৫.৯৯	১৪৪.৫৬
৪৭	ডাবল- কেবিন পিকআপ	২টি	৯৫.৯০	৯৫.৯০	১০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	৯৫.৯০	১০০.০০
৪৮	মোটর সাইকেল	১৫০টি	২৪৭.৬৫	২৪৭.৬৫	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৪৭.৬৫	১০০.০০
৪৯	কম্পিউটার এবং মালামাল (কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্কেনার, ফ্যাক্স, ইউপিএস)	৭৫টি	৮৪.০০	৭৫.১৫	১১১.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫.১৫	১০০.০০
৫০	সরঞ্জামাদি (হেভি ডিউটি ডিজিটাল ফটোকপিয়ার)	২টি	৫.৭৪	৫.৭৪	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.৭৪	১০০.০০
৫১	অফিস সরঞ্জামাদি লেভেল মেশিন (প্রতিটি উপজেলায় ১)	৪৯১টি	৭৩৬.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রমিক নং	উপাদানের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন-২০২২)		চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের মে-২৩ পর্যন্ত খরচ		চলতি অর্থবছরের মে-২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব %	আর্থিক	বাস্তব %	আর্থিক	বাস্তব %	আর্থিক	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	টি করে)										
৫২	উপজেলা মেটেরিয়াল টেস্টিং ইকুইপমেন্ট (প্রতিটি উপজেলায় ৬ টি সিরিডার মোল্ড, ব্রাশসহ একটি সিড সেট, ২ সেট কংক্রিট স্ল্যাম্প কোন, ২ টি ব্যালেন্স করে),	৪৯১টি	৬৮৭.৪০	০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫৩	কংক্রিট কোর ড্রিল মেশিন (প্রতি জেলায় ১ টি করে)।	৬৪টি	৩২০.০০	২৯০.২৫	১১০.২৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৯০.২৫	১০০.০০
৫৪	আসবাবপত্র (টেবিল, চেয়ার, ফাইল কেবিনেট ও আলমারি)	থোক	১৪.০৯	১০.৮৪	১২৯.৯৮	০.৫০	৪.৬১	০.৪৯৮	৯৯.৬০	১১.৩৪	১০৪.৬১
৫৫	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	১ একর	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
-	উপমোট মূলধন:	--	১৫৪৩৯১.২৮	৩৬২২৮.৫১৯ ০	২৩.৪৬৫৩	১৬৪০৪.২৬০০	১০.৬২৫১	১৫৮২৩.৪৯ ৮০	৯৬.৪৫৯ ৬	৫২০৫২.০২	৩৩.৭১৪৩
-	(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	--	৩০০০.০০	-	-	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
-	(ঘ) প্রাইজ কন্টিনজেন্সি	--	৬৫৩৮.০০	-	-	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
-	মোট (ক+খ+গ+ঘ)	--	১৬৯১০০.০	৩৯৪০২.৭৮৪	২৩.৩০	১৭০০০.০০	১০.০৫	১৬৩১৪.৮৩ ৭	৯৫.৯৬	৫৫৭১৭.৬২	৩২.৯৪

তথ্য সূত্রঃ প্রকল্প অফিস

পর্যালোচনাঃ

অঙ্গাভিত্তিক অগ্রগতির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, রাজস্ব খাতে মোট ৫১৭০.৭২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মে ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬৬৫.৬০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৭০.৮৯%। রাজস্ব খাতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপ-খাত হলো: কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতাদি, পরামর্শ সেবা (কনসালটেন্সি), বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, মোটর যানবাহন, সার্ভে ও ইনভেস্টিগেশনসহ ইত্যাদি। এখানে লক্ষণীয় যে, রাজস্ব খাতের আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা এবং কুরিয়ার এ দুটি অঙ্কে সংশোধিত ডিপিপিতে কোন বরাদ্দ

ছিলনা। কিন্তু এ দুটি খাতে দেখা যায় যে ২০২৩ পর্যন্ত আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা হিসেবে ০.৪৪ লক্ষ টাকা এবং কুরিয়ার বাবদ ০.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, এ দুটি খাতে বাস্তবতার নিরিখে ব্যয় করা হয়েছে, তবে টেলিফোন/টেলিগ্রাম এবং ডাক/পোস্টেজ খাত থেকে আন্তঃঅঞ্চল ব্যয় সমন্বয় করে এ খাত দুটি সংশোধন করা হবে। রাজস্ব খাতের অঞ্চলগুলোর অগ্রগতি সন্তোষজনক। অপরদিকে মূলধন খাতের মোট বরাদ্দ ১৫৪৩৯১.২৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫২০৫২.০২ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩৩.৭১৪৩%। মূলধন খাতের বিভিন্ন উপখাত যেমন: অনাবাসিক ভবন সমূহ, মটর সাইকেল ক্রয়, ডাবল-কেবিন পিকআপ, কম্পিউটার এবং মালামাল (কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্কেনার, ফ্যাক্স, ইউপিএস), অফিস সরঞ্জামাদি লেভেল মেশিন (প্রতিটি উপজেলায় ১ টি করে), উপজেলা মেটেরিয়াল টেস্টিং ইকুইপমেন্ট (প্রতিটি উপজেলায় ৬ টি সিরিভার মোন্ড, ব্রাশসহ একটি সিভ সেট, ২ সেট কংক্রিট স্ল্যাম্প কোন, ২ টি ব্যালেন্স করে) ইত্যাদি। অফিস সরঞ্জামাদি লেভেল মেশিন (প্রতিটি উপজেলায় ১ টি করে) ৪৯১টির জন্য আরডিপিপি প্রাক্কলন রয়েছে ৭৩৬.৫০ লক্ষ টাকা এবং উপজেলা মেটেরিয়াল টেস্টিং ইকুইপমেন্ট (প্রতিটি উপজেলায় ৬টি সিরিভার মোন্ড, ব্রাশসহ একটি সিভ সেট, ২ সেট কংক্রিট স্ল্যাম্প কোন, ২ টি ব্যালেন্স করে) ৪৯১টির জন্য আরডিপিপি প্রাক্কলন রয়েছে ৬৮৭.৪০ লক্ষ টাকা, এ দুটি অঙ্কে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। অবকাঠামোগুলো বরাদ্দের পর এসব অঙ্কের কার্যক্রম শুরু হবে। এছাড়াও ভূমি অধিগ্রহণ ১ একরের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ১০০ লক্ষ টাকা, যেহেতু সরকারি খাস জমিতে বাজারের অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে, তাই এখন পর্যন্ত এই অঙ্কের খরচের প্রয়োজন হয়নি। উপরোক্ত মূলধন খাতগুলোর অগ্রগতি সময়ের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। তবে সার্বিকভাবে পর্যালোচনায় দেখা যায়, এখনও সময় রয়েছে ২৫ মাস, অগ্রগতি বিবেচনায় প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে যথাযথভাবে তদারকির মাধ্যমে চলমান কাজগুলো সম্পন্ন করলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

৩.৭ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনার সাথে প্রকৃত প্রকিউরমেন্ট সম্পাদন প্রক্রিয়ার আইনগত বিধিবদ্ধতা প্রতিপালনের বিষয়াদি পরীক্ষা করা। প্রতিবেদনের এ অংশে প্রকৃত প্রকিউরমেন্টের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় সম্পর্কিত আইন পিপিএ-২০০৬ ও বিধিমালা পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা কিংবা কোন ক্ষেত্রে আইন ও নীতিমালা অনুসরণে ব্যত্যয় ঘটেছে কিনা ইত্যাদি নিরীক্ষণ করা হয়েছে। এ পর্যালোচনায় ডিপিপি/আরডিপিপি'তে সংযোজিত ক্রয় পরিকল্পনার সাথে প্রকৃত প্রকিউরমেন্টের পণ্য, কার্য ও সেবার প্যাকেজ ক্রয় ও সংগ্রহের পরিমাণ, গুণগতমান, ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ, ক্রয় কমিটি গঠন, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, মূল্যায়িত দরের সমতার ক্ষেত্রে যে নির্ণায়ক অনুসরণ করা হয়েছে তার বিবরণ, প্রাক্কলিত মূল্য, দাপ্তরিক মূল্য ও প্রকৃত ব্যয় বা চুক্তি মূল্যের মধ্যে হ্রাস বা বৃদ্ধি, দরপত্র আহ্বান, চুক্তি স্বাক্ষর ও চুক্তি অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদনের মেয়াদকাল প্রাক্কলন ও প্রকৃত প্রকিউরমেন্টের মধ্যে মেয়াদকালের হ্রাস/বৃদ্ধি, সনদ গ্রহণ ও প্রত্যয়ন, নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র এবং ঠিকাদারের দাখিলকৃত কর্মপরিকল্পনাসহ ইত্যাদি বিষয়াদির বিশ্লেষণমূলক পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান করা হয়েছে। ক্রয় সংক্রান্ত একটি চেকলিস্ট প্রণয়ন করা হয়েছে যার সাহায্যে ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়েছে।

ক্রয় কার্যক্রমে দেখা যায় যে, ডিপিপি/আরডিপিপি অনুসারে মোট ৫৪১টি প্যাকেজ রয়েছে, তন্মধ্যে পণ্য সংক্রান্ত ১৪টি, পূর্ত কাজ সংক্রান্ত ৫০৭টি ও সেবা সংক্রান্ত ২০টি প্যাকেজ। পণ্য সংক্রান্ত ১৪টি প্যাকেজের মধ্যে ১০টি পণ্য প্যাকেজেরই দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ১০টি এবং ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে ০৯টি। সিভিল ওয়ার্কের ৫০৭টি প্যাকেজের মধ্যে ৩৬৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, ৩৪৮টি প্যাকেজের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং ৮৭টি প্যাকেজের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ও ১৯১টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সেবা প্যাকেজের আওতায় (ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ) ২০টি প্যাকেজ রয়েছে, বাস্তবে ১৯টি প্যাকেজেরই দরপত্র আহ্বান ও চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। বিস্তারিত সারণি ৩.৩ বিশ্লেষণ করা হলো।

সারণি-৩.৩: পূর্ত কাজ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্যা: নং	পর্যায়	প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য	পাথক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুঃ কাজ শেষের তারিখ	প্রকৃত কাজ শেষের তাঃ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
CRMID P/GAB N/W-57	প্রাক্কলিত	নলডাংগা কাচারী বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৯৫.০০	২৮১.১১	১৭.৩২ কম	তারিখ	১৫/০৩/২০	-	২১/০৯/২০	-	১৫/০৪/২১	-	
										সময়	-	-	১৯০ দিন	-	২০৬ দিন	-	
	প্রকৃত	নলডাংগা কাচারী বাজার	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	৩৪০.০০			তারিখ	২/১১/২০	২৯/১১/২০	২০/১২/২০	-	২৪/৬/২২	১০/২/২৩	
										সময়	-	২৭ দিন	২১ দিন	৪৮ দিন	৫১১ দিন	২৩১ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ২৭দিন এবং ৪৮দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫১১ দিনে বাস্তবে ২৩১দিন। সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৭৪২ দিন, প্রায় ২ বছর। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও পাকুর গাছ অপসারণ এবং ডিজাইনের সঙ্গে প্রাক্কলনের মিল না থাকায় প্রশাসনিক অনুমোদনে বিলম্ব হওয়ায় সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ৩৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২৮১.১১ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ১৭.৩২% কম। পিপিআর-০৮ অনুযায়ী ওএসটিইএম ক্রয় পদ্ধতিতে দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য অধিক হাস হলে কোন সমস্যা নেই, তবে এক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র দাখিলকারীর নিকট যৌক্তিক ব্যাখ্যা চাইতে পারে, সন্তোষজনক জবাবের ভিত্তিতে NOA প্রদান করা যেতে পারে। অর্থাৎ এখানে পিপিআর-০৮ এর কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/GAB N/W-58	প্রাক্কলিত	কচুয়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৮০.০০	১৯৯.৪৭	১৬.১৮ কম	তারিখ	১৫/০৩/২০	-	২১/০৯/২০	-	১৫/০৪/২১	-	
										সময়	-	-	১৯০ দিন	-	২০৬ দিন	-	
	প্রকৃত	কচুয়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	২৩৮.০০			তারিখ	২/১১/২০	২৯/১১/২০	৯/১২/২০	-	১৬/০৬/২২	২০/৬/২২	
										সময়	-	২৭ দিন	১০ দিন	৩৭ দিন	৫৫৩ দিন	৩৫ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ২৭দিন এবং ৩৭দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫৫৩ দিনে বাস্তবে ৩৫দিন। সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৫৮৮ দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, নির্মাণস্থলে পুরাতন পরিত্যক্ত স্থাপনা অপসারণের কারণে কাজ শুরু করতে বিলম্ব হওয়ায় ৫৩৩ দিন সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ২৩৮ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ১৯৯.৪৭ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ১৬.১৮% কম। পিপিআর-০৮ অনুযায়ী ওএসটিইএম ক্রয় পদ্ধতিতে দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য অধিক হাস হলে কোন সমস্যা নেই, তবে এক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র দাখিলকারীর নিকট যৌক্তিক ব্যাখ্যা চাইতে পারে, সন্তোষজনক জবাবের ভিত্তিতে NOA প্রদান করা যেতে পারে। অর্থাৎ এখানে পিপিআর-০৮ এর কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/PBN/ W-100	প্রাক্কলিত	তারাবাড়ীয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৪০.০০	১৭১.৮০	১৭.০০ কম	তারিখ	১৮/০৪/১৯	-	২২/০৭/১৯	-	২৯/০৭/২০	-	
										সময়	-	-	৯৫ দিন	-	৩৭৩ দিন	-	
	প্রকৃত	তারাবাড়ীয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২০৭.০০			তারিখ	২৩/৪/১৯	২৪/৬/১৯	১৬/৭/১৯	-	২৩/৭/২০	-	
										সময়	-	৬২ দিন	২২ দিন	৮৪ দিন	৩৭৩ দিন	-	

প্যা: নং	পর্যায়	প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য	পাথক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুঃ কাজ শেষের তারিখ	প্রকৃত কাজ শেষের তাঃ	মন্তব্য
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৬২দিন এবং ৮৪দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৩৭৩ দিনে বাস্তবে ৩৭৩দিনের মধ্যে কাজ শেষ হয়েছে। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ২০৭ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ১৭১ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ১৭% কম। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি। পিপিআর-০৮ অনুযায়ী ওএসটিইএম ক্রয় পদ্ধতিতে দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য অধিক হ্রাস হলে কোন সমস্যা নেই, তবে এক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র দাখিলকারীর নিকট যৌক্তিক ব্যাখ্যা চাইতে পারে, সন্তোষজনক জবাবের ভিত্তিতে NOA প্রদান করা যেতে পারে। অর্থাৎ এখানে পিপিআর-০৮ এর কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/PBN/ W-107	প্রাক্কলিত	সোনাতলা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৪০.০০	২১৭.৮০	১৭.৫ কম	তারিখ	১৮/০৪/১৯	-	২৩/০৭/১৯	-	৩০/০৭/২০	-	
	প্রকৃত	সোনাতলা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৬৪.০০			সময়	-	-	৯৬ দিন	-	৩৭৩ দিন	-	
										তারিখ	২৩/৪/১৯	২৪/৬/১৯	২২/৭/১৯	-	২৯/৭/২০	চলমান	
										সময়	-	৬২ দিন	২৮ দিন	৯০ দিন	৩৭৩ দিন	-	
CRMID P/RAJ/ W- 114	প্রাক্কলিত	কাঁকন হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৭০.০০	২৩৯.৬৭	১৫.০১ কম	তারিখ	২৪/১১/১৯	-	১৯/০২/২০	-	৩০/০৮/২০	-	
	প্রকৃত	কাঁকন হাট	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	২৮২.০০			সময়	-	-	৮৭ দিন	-	১৯৩ দিন	-	
										তারিখ	৪/১২/১৯	২০/০৮/২১	২৪/৮/২১	-	২৩/১/২৩	২৩/১/২৩	
										সময়	-	৬২৫ দিন	৪ দিন	৬২৯ দিন	৫১৭ দিন	০	
CRMID P/RAJ/ W- 118	প্রাক্কলিত	বিল্লি হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৭০.০০	২১৮.০৫	৩.০৮ কম	তারিখ	০৯/০১/২০	-	২৭/০৫/২০	-	০৬/১০/২১	-	
	প্রকৃত	বিল্লি হাট	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	২২৫.০০			সময়	-	-	১৩৯ দিন	-	৪৯৭ দিন	-	
										তারিখ	১২/১/২০	২২/০২/২০	২৫/২/২০	-	২৪/৮/২১	২৪/০৮/২১	
										সময়	-	৪১ দিন	৩ দিন	৪৪ দিন	৫৪৬ দিন	০	
CRMID P/SRG/ W- 127	প্রাক্কলিত	গুন্টা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৮০.০০	১৮৩.৩৮	১৫.১১ কম	তারিখ	০২/১২/১৯	-	১৯/০২/২০	-	৩০/০৮/২১	-	
	প্রকৃত	গুন্টা হাট	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	২১৬.০০			সময়	-	-	৭৯ দিন	-	৫৫৮ দিন	-	
										তারিখ	৮/১২/১৯	২৯/১/২০	১৯/২/২০	-	৩০/৮/২১	২৫/০৩/২১	
										সময়	-	৫২ দিন	২১ দিন	৭৩ দিন	৫৫৮ দিন	২০৭ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৫২দিন এবং ৭৩দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫৫৮ দিনে বাস্তবে ২০৭দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৭৬৫ দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, বাজারের সীমানা নির্ধারণ ও অস্থায়ী দোকান অপসারণের বিলম্ব। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ২১৬ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ১৮৩.৩৮ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ১৫.১১ % কম। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি। পিপিআর-০৮ অনুযায়ী ওএসটিইএম ক্রয় পদ্ধতিতে দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য অধিক হ্রাস হলে কোন সমস্যা নেই, তবে এক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র																	

প্যা: নং	পর্যায়	প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য	পাথক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুঃ কাজ শেষের তারিখ	প্রকৃত কাজ শেষের তাঃ	মন্তব্য
দাখিলকারীর নিকট যৌক্তিক ব্যাখ্যা চাইতে পারে, সন্তোষজনক জবাবের ভিত্তিতে NOA প্রদান করা যেতে পারে। অর্থাৎ এখানে পিপিআর-০৮ এর কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/JSR/ W-146	প্রাক্কলিত	কুল্লা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	৩০০.০০	৩৩০.৯৬	৫.০৬ বেশি	তারিখ	১৫/০৩/২১	-	১৫/০৫/২১	-	১৫/০৫/২২	-	
	প্রকৃত	কুল্লা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	৩১৫.০০			সময়	-	-	৬১ দিন	-	৩৬৫ দিন	-	
										তারিখ	৮/৯/২২	৭/১১/২২	২৭/১১/২২		৩/১২/২৩	চলমান	
										সময়	-	৬০ দিন	২০ দিন	৮০ দিন	৩৭১ দিন	-	
CRMID P/JSR/ W-148	প্রাক্কলিত	দুর্বাডাঙ্গা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৮৫.০০	২২০.৬১	১২.৮০ কম	তারিখ	১৩/০৫/১৯	-	০৮/০৮/১৯	-	১৩/০১/২১	-	
	প্রকৃত	দুর্বাডাঙ্গা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	২৫৩.০০			সময়	-	-	৮৭ দিন	-	৫২৪ দিন	-	
										তারিখ	১৩/৫/১৯	১৬/৬/১৯	৮/৮/১৯	-	১৩/১/২১	৫/৫/২২	
										সময়	-	৩৪ দিন	৫৩ দিন	৮৭ দিন	৫২৪ দিন	৪৭৭ দিন	
CRMID P/KHL/ W-156	প্রাক্কলিত	হাটবাড়ী হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	৩৫০.০০	৩৩৩.৬৯	১২.১৮ কম	তারিখ	১৭/০৮/২০	-	১৫/০৩/২০	-	১৫/০৪/২১	-	
	প্রকৃত	হাটবাড়ী হাট	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	৩৮০.০০			সময়	-	-	-১৫৫ দিন	-	৩৯৬ দিন	-	
										তারিখ	১৮/৮/২০	৮/১১/২০	৬/১২/২০	-	২১/১১/২১	৩০/৬/২৩	
										সময়	-	৮২ দিন	২৮ দিন	১১০ দিন	৩৫০ দিন	৫৮৬ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৮২দিন এবং ১১০দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৩৫০ দিনে বাস্তবে ৫৮৬দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৯৩৬ দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, নির্মাণস্থলে পুরাতন ভবন এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি সংক্রান্ত জটিলতা ছিলো। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ৩৮০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ৩৩৩.৬৯ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ১২.১৮% কম। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে।																	
CRMID P/KHL/ W-162	প্রাক্কলিত	কাসিমিনগর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	৩০০.০০	২৯২.৪৬	১০.০১ কম	তারিখ	২২/০৭/২০	-	৩০/১২/২০	-	০৫/১১/২১	-	
	প্রকৃত	কাসিমিনগর হাট	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	৩২৫.০০			সময়	-	-	১৬১ দিন	-	৩১০ দিন	-	
										তারিখ	২২/৭/২০	৪/১০/২০	২৮/১০/২০	-	৭/৩/২২	৩০/৫/২৩	
										সময়	-	৭৪ দিন	২৪ দিন	৯৮ দিন	৪৯৫ দিন	২৯৯ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৭৪দিন এবং ৯৮দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৪৯৫ দিনে বাস্তবে ২৯৯দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৭৯৪ দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, জমি সংক্রান্ত জটিলতা থাকায় লে-আউটে বিলম্ব। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ৩২৫ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২৯২.৪৬ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ১০.০১% কম। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয়																	

প্যা: নং	পর্যায়	প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য	পাথক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুঃ কাজ শেষের তারিখ	প্রকৃত কাজ শেষের তাঃ	মন্তব্য
পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/MHP R/-173	প্রাক্কলিত	কেদারগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৭০.০০	২১৪.৯৩	৮.৯২ কম	তারিখ	১৪/০৬/১৯	-	১৬/০৯/১৯	-	২২/০৩/২১	-	
										সময়	-	-	৯৪ দিন	-	৫৫৩ দিন	-	
	প্রকৃত	কেদারগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	২৩৬.০০			তারিখ	১৭/৬/১৯	৫/৯/১৯	১৬/৯/১৯	-	২২/৩/২১	১৫/২/২২	
										সময়	-	৮০ দিন	১১ দিন	৯১ দিন	৫৫৩ দিন	২৯৯ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৮০দিন এবং ৯১দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫৫৩ দিনে বাস্তবে ২৯৯দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৮৫২ দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, কোভিডের কারণে সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ২৩৬ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২১৪.৯৩ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ৮.৯২% কম। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/MHR P/W-174	প্রাক্কলিত	ভাটপাড়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৭০.০০	২১৩.১৯	১১.৯০ কম	তারিখ	১৪/০৬/১৯	-	১৬/০৯/১৯	-	০৩/১০/২১	-	
										সময়	-	-	৯৪ দিন	-	৭৪৮ দিন	-	
	প্রকৃত	ভাটপাড়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	২৪২.০০			তারিখ	১৭/০৬/১৯	১৬/০৯/১৯	১৬/০৯/২১	-	১০/৩/২১	১০/৩/২১	
										সময়	-	৯১ দিন	০	৯১ দিন	৫৪১ দিন	৪২৮ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৯১দিন এবং ৯১দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫৪১ দিনে বাস্তবে ৪২৮দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৯৬৯ দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, কোভিডের কারণে সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ২৪২ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২১৩.১৯ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ১১.৯০% কম। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/SATK /W-182	প্রাক্কলিত	ঘোনা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৯৩.০০	২৭৯.২৬	১১.৩৪ কম	তারিখ	১১/১২/১৯	-	০৭/০৪/২০	-	১৩/১০/২১	-	
										সময়	-	-	১১৮ দিন	-	৫৫৪ দিন	-	
	প্রকৃত	ঘোনা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	৩১৫.০০			তারিখ	১২/১২/১৯	১০/০৩/২০	৭/৪/২০	-	১৩/১০/২১	১৫/২/২৩	
										সময়	-	৮৯ দিন	২৮ দিন	১১৭ দিন	৫৫৪ দিন	৪৯০ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৮৯দিন এবং ১১৭দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫৫৪ দিনে বাস্তবে ৪৯০দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ১০৪৪ দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, পুরাতন দোকান ঘর ও বৃক্ষাদি অপসারণে জটিলতা এবং অতি বর্ষায় প্রকল্পস্থ পানিতে নিমজ্জিত থাকায়। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ৩১৫ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২৭৯.২৬ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি																	

প্যা: নং	পর্যায়	প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য	পাথক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুঃ কাজ শেষের তারিখ	প্রকৃত কাজ শেষের তাঃ	মন্তব্য
মূল্য ১১.৩৪% কম। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/SATK /W-188	প্রাক্কলিত	পোরার হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৮৫.০০	২২৬.১০	১৪.৬৭ কম	তারিখ	০৮/১০/২০	-	১৫/০৩/২০	-	১৫/০৪/২১	-	
										সময়	-	-	-২০৭ দিন	-	৩৯৬ দিন	-	
	প্রকৃত	পোরার হাট	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	২৬৫.০০			তারিখ	৮/১০/২০	২৪/১২/২০	২১/১/২১	-	২৭/১/২২	৩০/৬/২৩	
										সময়	-	৭৭ দিন	২৮ দিন	১০৫ দিন	৩৭১ দিন	৫১৯ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৭৭দিন এবং ১০৫দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৩৭১ দিনে বাস্তবে ৫১৯দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৮৯০ দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, পুরাতন দোকান ঘর ও বৃক্ষাদি অপসারণে জটিলতা এবং অতি বর্ষায় প্রকল্পস্থ পানিতে নিমজ্জিত থাকায়। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ২৬৫ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২২৬.১০ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ১৪.৬৭% কম। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/SRP/ W-269	প্রাক্কলিত	ভীমগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৭০.০০	২৫৬.৯৬	১০.১৫ কম	তারিখ	০২/০৯/১৯	-	০৯/১২/২০	-	০৮/০৫/২১	-	
										সময়	-	-	৪৬৪ দিন	-	১৫০ দিন	-	
	প্রকৃত	ভীমগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	২৮৬.০০			তারিখ	৩/৯/১৯	২১.১১.১৯	৯/১২/১৯	-	৮/৫/২১	২৭/২/২২	
										সময়	-	৮০ দিন	১৭ দিন	৯৭ দিন	৫১৬ দিন	২৯৫ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৮০দিন এবং ৯৭দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫১৬ দিনে বাস্তবে ২৯৫দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৮১১ দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, কোভিডের কারণে ও স্থানীয় সমস্যার জন্য সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ২৮৬ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২৫৬.৯৬ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ১০.১৫% কম। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/SRP/ W-271	প্রাক্কলিত	বাউশা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২২৫.০০	২১২.২৫	৮.১১ কম	তারিখ	০২/০৯/১৯	-	০৯/১২/২০	-	০৮/০৫/২১	-	
										সময়	-	-	৪৬৪ দিন	-	১৫০ দিন	-	
	প্রকৃত	বাউশা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	২৩১.০০			তারিখ	৩/৯/১৯	২১/১১/১৯	৯/১২/১৯	-	৮/৫/২১	১৫/২/২২	
										সময়	-	৭৯ দিন	১৮ দিন	৯৭ দিন	৫১৬ দিন	২৮৩ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৭৯দিন এবং ৯৭দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫১৬ দিনে বাস্তবে ২৮৩দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৭৯৯ দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, কোভিড-১৯																	

প্যা: নং	পর্যায়	প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য	পাশক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুঃ কাজ শেষের তারিখ	প্রকৃত কাজ শেষের তাঃ	মন্তব্য	
এবং পুরাতন দোকান ঘর অপসারণসহ ইত্যাদি সমস্যার জন্য সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ২৩১ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২১২.২৫ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ৮.১১% কম। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																		
CRMID P/SRP/ W-273	প্রাক্কলিত	ঘাগপাড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৬৫.০০	২৫০.১৩	৮.০৪ কম	তারিখ	২২/০৭/১৯	-	৩০/১০/২০	-	৩০/০৩/২১	-		
											সময়	-	-	৪৬৬ দিন	-	১৫১ দিন		-
	প্রকৃত	ঘাগপাড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	২৭২.০০			তারিখ	২৪/৭/১৯	১৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	-	৩০/৩/২১	২৫/২/২২		
										সময়	-	৮৩ দিন	১৫ দিন	৯৮ দিন	৫১৭ দিন	৩৩২ দিন		
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৮৩দিন এবং ৯৮দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫১৭ দিনে বাস্তবে ৩৩২দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৮৪৯ দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, কোভিড-১৯, স্থানীয় সমস্যার জন্য সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ২৭২ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২৫০.১৩ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ৮.০৪% কম। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																		
CRMID P/RJBR/ W-332	প্রাক্কলিত	বসন্তপুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৭০.০০	২৫৮.৫০	৭.০১ কম	তারিখ	১৩/১১/১৯	-	১১/০৩/২০	-	১০/০৯/২১	-		
											সময়	-	-	১১৯ দিন	-	২২৩ দিন		-
	প্রকৃত	বসন্তপুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	২৭৮.০০			তারিখ	২০/১১/১৯	১/৩/২০	৪/৩/২০	-	১০/৯/২১	১০/৯/২১		
										সময়	-	১০২ দিন	৩ দিন	১০৫ দিন	৫৫৫ দিন	০		
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ১০২দিন এবং ১০৫দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫৫৫ দিনে বাস্তবে চুক্তিকৃত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হয়েছে। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ২৭৮ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২৫৮.৫০ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ৭.০১% কম। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																		
CRMID P/RJBR/ W-333	প্রাক্কলিত	বহরপুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৯৫.০০	২০৯.৯৫	১৭.৩৪ কম	তারিখ	১৭/০৭/১৯	-	০৪/১১/১৯	-	১০/০৫/২১	-		
											সময়	-	-	১১০ দিন	-	৫৪৯ দিন		-
	প্রকৃত	বহরপুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	২৫৪.০০			তারিখ	২২/৭/১৯	৭/১০/১৯	১৬/১০/১৯	-	১০/৫/২১	২/১২/২১		
										সময়	-	৭৭ দিন	৯ দিন	৮৬ দিন	৫৭২ দিন	২০৬ দিন		
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৭৭দিন এবং ৮৬দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫৭২ দিনে বাস্তবে ২০৬দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৭৭৮ দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ২৫৪ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২০৯.৯৫ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ১৭.৩৪% কম। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																		

প্যা: নং	পর্যায়	প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য	পাথক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুঃ কাজ শেষের তারিখ	প্রকৃত কাজ শেষের তাঃ	মন্তব্য
CRMID P/NYN G/W-338	প্রাক্কলিত	দুপতারা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৮০.০০	২৬৯.৩৬	৪.৮০ বেশি	তারিখ	২৮/০৭/১৯	-	০১/১০/১৯	-	০৭/০৪/২১	-	
	প্রকৃত	দুপতারা হাট	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	২৫৭.০০			সময়	-	-	৬৫ দিন	-	৫৫৪ দিন	-	
										তারিখ	৩০/৭/১৯	২৪/৯/১৯	১/১০/১৯	-	৭/৪/২১	২৯/১২/২১	
										সময়	-	৫৬ দিন	৭ দিন	৬৩ দিন	৫৫৪ দিন	২৬৬ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৫৬দিন এবং ৬৩দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫৫৪ দিনে বাস্তবে ২৬৬দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৮২০ দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, কোভিড-১৯’র জন্য সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ২৫৭ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২৬৯.৩৬ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ৪.৮০% কম। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/NYN G/W-340	প্রাক্কলিত	লাংগলবন্ধ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	৩০৭.০০	২৯২.৯৮	০.০০৬ কম	তারিখ	২২/১২/১৯	-	১৬/০২/২০	-	২৩/০৮/২১	-	
	প্রকৃত	লাংগলবন্ধ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	২৯৩.০০			সময়	-	-	৫৬ দিন	-	৫৫৪ দিন	-	
										তারিখ	২২/১২/১৯	১১/২/২০	১১/২/২০	-	২৩/৮/২১	২৮/১১/২২	
										সময়	-	৫১ দিন	০	৫১ দিন	৫৫৯ দিন	৪৬২ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৫১দিন এবং ৫১দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫৫৯ দিনে বাস্তবে ৪৬২দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ১০২১দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, কোভিড-১৯’র জন্য সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ২৯৩ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২৯২.৯৮ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ০.০০৬% কম। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/TNGL /W-348	প্রাক্কলিত	তোরাবগঞ্জ হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৮০.০০	২৭০.১৮	১১.৪১ কম	তারিখ	০৩/০৬/১৯	-	২৯/০৮/১৯	-	০৫/০৩/২১	-	
	প্রকৃত	তোরাবগঞ্জ হাট	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	৩০৫.০০			সময়	-	-	৮৭ দিন	-	৫৫৪ দিন	-	
										তারিখ	৩/৬/১৯	৯/৮/১৯	২৯/৮/১৯	-	৫/৩/২১	২০/৫/২৩	
										সময়	-	৬৭ দিন	২০ দিন	৮৭ দিন	৫৫৪ দিন	৮০৬ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৬৭দিন এবং ৮৭দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫৫৪ দিনে বাস্তবে ৮০৬দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ১৩৬০দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, কোভিড-১৯ ও প্রাক্কলন সংশোধনের জন্য সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ৩০৫ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২৭০.১৮ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ১১.৪১% কম। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/TNGL	প্রাক্কলিত	হাদিরা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৫০.০০	২৪৭.০২	১৩.৩২ কম	তারিখ	২২/০৫/১৯	-	২২/০৮/১৯	-	২৮/০২/২১	-	
										সময়	-	-	৯২ দিন	-	৫৫৬ দিন	-	

প্যা: নং	পর্যায়	প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য	পাথক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুঃ কাজ শেষের তারিখ	প্রকৃত কাজ শেষের তাঃ	মন্তব্য
/W-356	প্রকৃত	হাদিরা হাট	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	২৮৫.০০			তারিখ	২১/৫/১৯	৮/৮/১৯	২২/৮/১৯	-	২৮/২/২১	৩০/৪/২২	
										সময়	-	৭৯ দিন	১৪ দিন	৯৩ দিন	৫৫৬ দিন	৪২৬ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৭৯দিন এবং ৯৩দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫৫৬ দিনে বাস্তবে ৪২৬দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৯৮২দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, প্রাক্কলন সংশোধনের জন্য সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ২৮৫ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২৪৭.০২ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ১৩.৩২% কম। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/HBG/ W-375	প্রাক্কলিত	কাজির হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	৩০০.০০	৩৬৪.৩৪	২.৩২ বেশি	তারিখ	১৫/০৩/২১	-	১৫/০৫/২১	-	১৫/০৫/২২	-	
										সময়	-	-	৬১ দিন	-	৩৬৫ দিন	-	
	প্রকৃত	কাজির হাট	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	৩৭৩.০০			তারিখ	২০/১২/২১	২৯/৫/২২	৯/৬/২২	-	১৪/৬/২৩	চলমান	
										সময়	-	১৬০ দিন	১১ দিন	১৭১ দিন	৩৭০ দিন	-	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ১৬০দিন এবং ১৭১দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৩৭০ দিনে। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ৩৭৩ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ৩৬৪.৩৪ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ২.৩২% বেশি। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/MOL V/W- 379	প্রাক্কলিত	অফিস বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	৩০৮.০০	২৯৪.০২	৬.৬৬ কম	তারিখ	০১/০৬/২০	-	৩০/০৯/২০	-	২২/০২/২২	-	
										সময়	-	-	১২১ দিন	-	৫১০ দিন	-	
	প্রকৃত	অফিস বাজার	টি	১	ওএসটিইএম (ই-জিপি)	হোপ	৩১৫.০০			তারিখ	২/৬/২০	৯/৯/২০	৩০/৯/২০	-	২২/০২/২২	২২/৬/২৩	
										সময়	-	৯৯ দিন	২১ দিন	১২০ দিন	৫১০ দিন	৪৮৫ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৯৯দিন এবং ১২০দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫১০ দিনে বাস্তবে ৪৮৫দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৯৯৫দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, মামলা জনিত জটিলতার জন্য সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ৩১৫ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২৯৪.০২ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ৬.৬৬% কম। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/SYL/ W-404	প্রাক্কলিত	পরগুনা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	৩৫০.০০	৩৫০.৭২	১.৬৫ বেশি	তারিখ	২০/০৪/২০	-	২৭/০৫/২০	-	১৪/০৮/২১	-	
										সময়	-	-	৩৭ দিন	-	৪৪৪ দিন	-	
	প্রকৃত	পরগুনা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	৩৪৫.০০			তারিখ	২২/৪/২০	১৩/০৭/২০	০৯/০৮/২০	-	১৪/০৮/২১	১০/৯/২২	

প্যা: নং	পর্যায়	প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য	পাথক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুঃ কাজ শেষের তারিখ	প্রকৃত কাজ শেষের তাঃ	মন্তব্য
					(ই-জিপি)					সময়	-	৮২ দিন	২৭ দিন	১০৯ দিন	৩৭০ দিন	৩৯২ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৮২দিন এবং ১০৯দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৩৭০ দিনে বাস্তবে ৩৯২দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৭৬২দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, Recost Estimate অনুমোদনের জন্য সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ৩৪৫ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ৩৫০.৭২ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ১.৬৫% বেশি। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/CHT/ W-436	প্রাক্কলিত	সরকার হাট বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৮৫.০০	২৩৩.৬৯	১৪.০৮ কম	তারিখ	১৫/০৩/২১	-	১৫/০৫/২১	-	১৫/০৫/২২	-	
										সময়	-	-	৬১ দিন	-	৩৬৫ দিন	-	
	প্রকৃত	সরকার হাট বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২৭২.০০			তারিখ	১৬/৬/২০	০২/১১/২০	১৫/১১/২০	-	২২/০৫/২২	১০/৩/২৩	
					(ই-জিপি)					সময়	-	১৩৯ দিন	১৩ দিন	১৫২ দিন	৫৫৩ দিন	২৯২ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ১৩৯দিন এবং ১৫২দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫৫৩ দিনে বাস্তবে ২৯২দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৮৪৫দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, কোভিড-১৯'র জন্য সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ২৭২ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২৩৩.৬৯ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ১৪.০৮% কম। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	
CRMID P/KHG R/W- 494	প্রাক্কলিত	যোগ্যহোলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	৩০০.০০	১৯৭.১১	১৩.৫৪ কম	তারিখ	১৫/০৩/২১	-	১৫/০৫/২১	-	১৫/০৫/২২	-	
										সময়	-	-	৬১ দিন	-	৩৬৫ দিন	-	
	প্রকৃত	যোগ্যহোলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	২২৮.০০			তারিখ	০৯/১২/২১	১০/২/২২	২৪/২/২২	-	০৩/০৩/২৩	০৩/৫/২৩	
					(ই-জিপি)					সময়	-	৬৩ দিন	১৪ দিন	৭৭ দিন	৩৭২ দিন	৬১ দিন	
পর্যালোচনাঃ ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৬৩দিন এবং ৭৭দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৩৭২ দিনে বাস্তবে ৬১দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৪৩৩দিন। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, জমি সংক্রান্ত জটিলতার জন্য সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ২২৮ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ১৯৭.১১ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ১৩.৫৪% কম। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। এখানে কোন পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।																	

তথ্য সূত্রঃ আরডিপিপি ও প্রকল্প অফিস

৩.৭.১ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

পিপিআর ২০০৮ অনুসারে যেকোন সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি'তে সংশ্লিষ্ট পণ্য, কার্য ও সেবার ক্রয় পরিকল্পনা সংযুক্ত করতে হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা বিষয়ে পিপিআর ২০০৮ এর তৃতীয় অধ্যায়ে ক্রয় সংক্রান্ত নীতিসমূহ অংশে ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের বিধান রয়েছে। ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত ধারা ১৬ হলো “ক্রয় পরিকল্পনা ইত্যাদি”। ধারা ১৬ (১)- এ বলা হয়েছে, “ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সকল ক্রয়কারীর জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।” (২)- এ বলা হয়েছে, “পণ্য ক্রয় পরিকল্পনায় মূল্য বা পদ্ধতি নির্বিশেষে ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সকল অতীষ্ট বস্তু বা বিষয়, যথা, পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য, ভৌত, ভৌতসেবা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবার শ্রেণিভিত্তিক বিন্যাসপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।” (৩)- এ বলা হয় যে, “উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচী এবং রাজস্ব বাজেটের জন্য আলাদাভাবে ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে।” (৪)- এ উল্লেখ করা হয় যে, “ক্রয়কারী উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচীর অধীন ক্রয়ের ক্ষেত্রে, [তফসিল- ৫ এর অংশ-ক অনুসারে], প্রকল্প পূর্ণ মেয়াদকালের জন্য সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং উহা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP) বা কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (TPP) এর সঙ্গে সংযুক্ত করিতে হইবে।” এবং (৫)- এ বলা হয়েছে, “ক্রয়কারী প্রত্যেক অর্থবছরের শুরুতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রত্যাশিত তহবিল প্রবাহের বিষয়টি বিবেচনাক্রমে, কোন উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচীর সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং [প্রাক্কলিত ব্যয় (cost estimate)] বাৎসরিক ভিত্তিতে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে হালনাগাদ করিবে।” [পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮: জানুয়ারি ২০২১, পৃষ্ঠা- ৫০]

প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্পটির শুরুতে ডিপিপি'তে পূর্তকাজ ও সেবা সংক্রান্ত কোন বিস্তারিত ক্রয় পরিকল্পনা সংযুক্ত করা হয়নি, পূর্তকাজ ক্রয় পরিকল্পনায় শুধু বলা হয়েছে w-1 to 520, SR-3 to 4 Outsourcing Employee, ক্রয় পদ্ধতির ধরণ এনওটিএম। অন্যদিকে সেবা সংক্রান্ত ক্রয় পরিকল্পনায় বলা হয়েছে SR-1 to 1000 Survey (Total Station Survey & Soil Investigation survey), SR-107 to 113 Consultancy service. এখানে আলাদা আলাদা প্যাকেজ প্রস্তুতের প্রয়োজন ছিল, যা করা হয়নি। পণ্য প্যাকেজে দেখা যায়, জিডি/২-৩ মটর সাইকেল ক্রয়, পরিমাণ-১৫০টি, প্রাক্কলিত মূল্য ২৭০ লক্ষ টাকা ক্রয় পদ্ধতির ধরণ ডিপিএম/এনওটিএম। ডিপিপি প্রণয়ন এবং অনুমোদনের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় ত্রুটি ছিলো। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ (এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার) এবং ২৭/০৭/২০২১ প্রকল্পের ব্যয় ২.২৫% হ্রাস করে পুনরায় ১ (এক) বছরের জন্য সময় বৃদ্ধি করে ১ম সংশোধনী হিসেবে আরডিপিপি অনুমোদন করা হয়। এখানে দেখা যায় পূর্ত কাজ সংক্রান্ত প্যাকেজে ৫২৪টি প্যাকেজ রয়েছে, যেখানে বাস্তবে হওয়ার কথা ৫০৭টি, ক্রয় পদ্ধতির ধরন ওএসটিইএম। অন্যদিকে জিডি/২-৩, মটর সাইকেল ক্রয় ২টি, প্রাক্কলিত মূল্য ২৪৭.৬৫ লক্ষ টাকা। জিডি/১১-১৪ অফিস আসবাবপত্র, পরিমাণ-৪৭টি, ক্রয় পদ্ধতি আরএফকিউ, প্রাক্কলিত মূল্য ১৪.০৯ লক্ষ টাকা। যদিও এখানে ১১-১৪ মোট ৪টি প্যাকেজ বুঝানো হয়েছে, বাস্তবে এভাবে কোন নিয়ম নেই। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সমীক্ষাটি যেহেতু একটি নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা সেহেতু প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এগুলো মূলত ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ব্যত্যয়।

ক্রয় সংক্রান্ত প্রতিটি কাজের দরপত্র দলিল, কার্যাদেশ ও চুক্তিপত্রের দলিলাদির বিভিন্ন অংশ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দরপত্র প্রকাশের পর থেকে দরপত্র জমাদানের জন্য ২৮-দিন সময় দেয়া হয়েছে; দরপত্র দুইটি (বাংলা ও ইংরেজি) জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র ক্রয় অনুমোদনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রমে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি প্যাকেজেই ডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য অনেক ব্যবধান ছিল। যেহেতু বিভিন্ন বাজার অবকাঠামো বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনে নির্মিত হচ্ছে, তাই প্রয়োজন ভিত্তিক এমনটা হয়েছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান। পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনের সময় প্যাকেজগুলোর প্রাক্কলিত মূল্য ঠিক করে নেয়া হবে। তবে কিছু কিছু প্যাকেজ ব্যতীত প্রায় প্যাকেজেই ডিপিপির প্রাক্কলিত অপেক্ষা অনেকাংশ কমেই চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে, যদিও ইজিপি'তে আহ্বানকৃত দরপত্রে ১০% পর্যন্ত (±) করার সুযোগ আছে। এজন্য দাপ্তরিক মূল্যের উপর নির্ভর করে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। যেমনঃ প্যাকেজ নং-

CRMIDP/GABN/W-57, সংশোধিত ডিপিপি মূল্য ২৯৫.০০ লক্ষ টাকা, দাপ্তরিক মূল্য ৩৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ২৮১.১১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এখানে দেখা যায় দাপ্তরিক ১৭.৩২% কমে এবং প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ৪.৭১% কম। অন্যদিকে প্যাকেজ নং CRMIDP/HBG/W-375, সংশোধিত ডিপিপি মূল্য ৩০০.০০ লক্ষ টাকা, দাপ্তরিক মূল্য ৩৭৩.০০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ৩৬৪.৩৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এখানে দেখা যায় দাপ্তরিক ২.৩২% বেশি এবং প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ২১.৪৫% বেশি। পিপিআর-০৮ অনুযায়ী ওএসটিইএম ক্রয় পদ্ধতিতে দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য অধিক হ্রাস হলে কোন সমস্যা নেই, তবে এক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র দাখিলকারীর নিকট যৌক্তিক ব্যাখ্যা চাইতে পারে, সন্তোষজনক জবাবের ভিত্তিতে NOA প্রদান করা যেতে পারে। অর্থাৎ এখানে পিপিআর-০৮ এর কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি। প্রায় বেশি সংখ্যক প্যাকেজেই দেখা যায়, কোভিড-১৯, ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা, মামলা জনিত কারণ, এনওসি পেতে বিলম্ব, পুরাতন স্থাপনা এবং অস্থায়ী দোকানপাট, বৃক্ষাদি অপসারণে বিলম্বসহ ইত্যাদি কারণে চুক্তির সময় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৮ পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-১ পর্যালোচনা, প্যাকেজ (CRMIDP/GABN/W-57)

পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-১ (প্যাকেজ নং-৫৭), এপ্যাকেজটি বাস্তবায়িত হয়েছে গাইবান্ধা জেলার সাধুল্লাপুর উপজেলায় নলডাঙ্গা কাঁচারী বাজার। দরপত্র দলিল, কার্যাদেশ ও চুক্তিপত্রের দলিলাদির বিভিন্ন অংশ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ক্রয় কার্যক্রমে অনুসৃত টেন্ডারিং পদ্ধতি ওএসটিইএম ডিপিপি/আরডিপিপি'র প্রতিশন অনুযায়ী ছিল। ইজিপি'র মাধ্যমে দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। দরপত্র তিনটি (বাংলা ও ইংরেজি) জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র প্রকাশের পর থেকে দরপত্র জমাদানের জন্য ৩০দিন সময় দেয়া হয়েছে। বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা ২৬টি, প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ৮টি। দরপত্র খোলার সময় ৩জন সদস্য উপস্থিত ছিল, মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ৩ জন, তন্মধ্যে বহিঃ সদস্য ১ জন। দরপত্র মূল্যায়নের সময় ৩ জনেই উপস্থিত ছিলেন। রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ৭টি। ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ২৭দিন এবং ৪৮দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫১১ দিনে বাস্তবে ২৩১দিন। সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৭৪২ দিন, প্রায় ২ বছর। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও পাকুর গাছ অপসারণ এবং ডিজাইনের সঙ্গে প্রাক্কলনের মিল না থাকায় প্রশাসনিক অনুমোদনে বিলম্ব হওয়ায় সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। দরপত্র ক্রয় অনুমোদনের জন্য হোপ'এর অনুমোদন নেয়া হয়েছে। প্যাকেজটির প্রাক্কলিত মূল্য ২৯৫.০০ লক্ষ টাকা, দাপ্তরিক মূল্য ৩৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২৮১.১১ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ১৭.৩২% কম। পিপিআর-০৮ অনুযায়ী ওএসটিইএম ক্রয় পদ্ধতিতে দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য অধিক হ্রাস হলে কোন সমস্যা নেই, তবে এক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র দাখিলকারীর নিকট যৌক্তিক ব্যাখ্যা চাইতে পারে, সন্তোষজনক জবাবের ভিত্তিতে NOA প্রদান করা যেতে পারে। অর্থাৎ এখানে পিপিআর-০৮ এর কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি। কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম আব্দুল মালেক এন্ড এসএস (জেভি) ফুলছড়ি। এখানে দেখা যায়, ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যটি সঠিক ছিল, ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের কাছাকাছি চুক্তি মূল্য রয়েছে, কিন্তু দাপ্তরিক মূল্য অনেক বেশি নির্ধারণ ছিল, যা বাস্তবভিত্তিক নয়। এপ্যাকেজটিতে পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি, তবে ভবিষ্যতে ক্রয় কার্যক্রমের দাপ্তরিক মূল্য নির্ধারণ যাতে বাস্তবানুগ হয় সেদিকে আরও সচেতন থাকতে হবে।

সারণি ৩:৪: পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-১ বিশ্লেষণ, প্যাকেজ (CRMIDP/GABN/W-57)

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং	Costruction of two(2) storied Rural Market Building with 04 (stroied foundation) in Noldanga Kachari Bazar under Sadullhapur Upazila, Gaibandha. প্যাকেজ CRMIDP/GABN/W-57
২	ডিপিপি/আরডিপিপি'র প্রতিশন কী ছিল?	ওএসটিইএম
৩	ক্রয় পদ্ধতি/টেন্ডারিং অনুসৃত পদ্ধতি	ওএসটিইএম (ই-জিপি)

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
৪	ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ	(১) অন-লাইন
৫	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)	১। দৈনিক মাধুর, তারিখঃ ২৩/০৯/২০২০ ২। দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৩/০৯/২০২০ ৩। দ্যা নিউ ন্যাশন, তারিখঃ ২৪/০৯/২০১৯ ৪। www.eprocure.gov.bd , তারিখঃ ২৩/০৯/২০২০
৬	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষের তারিখ ও সময়	০১/১১/২০২০-০৩/১১/২০২০ইং, সময়ঃ বিকাল ১:০০ ঘটিকা
৭	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	২৬টি
৮	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	০৮টি
৯	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	০৩/১১/২০২০ইং, সময়ঃ সকাল ১:০০ ঘটিকা
১০	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩ জন
১১	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	০৯/১১/২০২০
১২	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন
১৩	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন
১৪	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	৭ টি
১৫	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	১ টি
১৬	Notification of Award প্রদানের তারিখ	২৫/১১/২০২০
১৭	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় [প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)]	২৯৫ লক্ষ টাকা
১৮	দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৪০ লক্ষ টাকা
১৯	চুক্তি মূল্য	২৮১.১১ লক্ষ টাকা
২০	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	আব্দুল মালেক এন্ড এসএস (জেভি) ফুলছড়ি
২১	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	২০/১২/২০২০
২২	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	১৫/০৪/২১
২৩	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	২৫/১২/২০২০
২৪	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	২৪/০৬/২০২২
২৫	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	১০/০২/২০২৩
২৬	সময় বৃদ্ধির কারণ	বৈদ্যুতিক খুঁটি ও পাকুর গাছ অপসারণ এবং ডিজাইনের সঙ্গে প্রাক্কলনের মিল না থাকায় প্রশাসনিক অনুমোদনে বিলম্ব হয়েছে।

৩.৮.১ পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-২, প্যাকেজ (CRMIDP/NYNG/W-340)

পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-২ (প্যাকেজ নং-৩৪০), এপ্যাকেজটি বাস্তবায়িত হয়েছে নারায়নগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলায় নাজুলকোট বাজার। দরপত্র দলিল, কার্যাদেশ ও চুক্তিপত্রের দলিলাদির বিভিন্ন অংশ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ক্রয় কার্যক্রমে অনুসৃত টেন্ডারিং পদ্ধতি ও এসটিইএম ডিপিপি/আরডিপিপি'র প্রতিশন অনুযায়ী ছিল। ইজিপি'র মাধ্যমে দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। দরপত্র দুইটি (বাংলা ও ইংরেজি) জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র প্রকাশের পর থেকে দরপত্র জমাদানের জন্য ৩৪ দিন সময় দেয়া হয়েছে। বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা ১টি, প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ১টি। দরপত্র খোলার সময় ২জন সদস্য উপস্থিত ছিল, মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ৩ জন, তন্মধ্যে বহিঃ সদস্য ১ জন। দরপত্র মূল্যায়নের সময় ৩ জনেই উপস্থিত ছিলেন। রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ১টি। ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৫১ দিন এবং ৫১দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫৫৯ দিনে বাস্তবে ৪৬২দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ১০২১দিন, প্রায় ৩ বছর। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, কোভিড-১৯ এবং ডিজাইন রিভাইজড করার কারণে ৪৬২ দিন বিলম্ব হয়েছে। দরপত্র ক্রয় অনুমোদনের জন্য হোপ'এর

অনুমোদন নেয়া হয়েছে। প্যাকেজটির প্রাক্কলিত মূল্য ৩০৭.০০ লক্ষ টাকা, দাপ্তরিক মূল্য ২৯৩.০০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২৯২.৯৮ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ০.০২৭% কম। কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম মেসার্স এসআর এন্টারপ্রাইজ। এখানে দেখা যায়, ডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যটি সঠিক ছিল, ডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের কাছাকাছি চুক্তি মূল্য রয়েছে, কিন্তু দাপ্তরিক মূল্য বেশি নির্ধারণ ছিল, যা বাস্তবভিত্তিক নয়। এপ্যাকেজটিতে পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।

সারণি ৩.৫: পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-২ বিশ্লেষণ, প্যাকেজ (CRMIDP/NYNG/W-340)

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং	Costruction of two(2) storied Rural Market Building with 04 (stroied foundation) in Langolkot Bazar under Bandor Upazila, Narayongonj. প্যাকেজ CRMIDP/NYNG/W-340
২	ডিপিপি/আরডিপিপি'র প্রভিশন কী ছিল?	ওএসটিইএম
৩	ক্রয় পদ্ধতি/টেন্ডারিং অনুসৃত পদ্ধতি	ওএসটিইএম (ই-জিপি)
৪	ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ	(১) অন-লাইন
৫	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)	১। দৈনিক ভোরের কাগজ, তারিখঃ ২৩/১২/১৯ ২। নিউজ টুডেজ, তারিখঃ ২৪/০৯/২০১৯ ৩। www.eprocure.gov.bd , তারিখঃ ২৩/০৯/১৯
৬	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষের তারিখ ও সময়	২২/১২/১৯-২৬/০১/২০, সময়ঃ বিকাল ১২:০০ ঘটিকা
৭	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	১টি
৮	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	১টি
৯	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	২৭/০১/২০, সময়ঃ সকাল ১২:০০ ঘটিকা
১০	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	২ জন
১১	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন
১২	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	২ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন
১৩	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	১ টি
১৪	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	১ টি
১৫	Notification of Award প্রদানের তারিখ	১১/০২/২০২০
১৬	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় [প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)]	৩০৭লক্ষ টাকা
১৭	দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়	২৯৩.০০ লক্ষ টাকা
১৮	চুক্তি মূল্য	২৯২.৯৮ লক্ষ টাকা
১৯	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	মেসার্স এসআর এন্টারপ্রাইজ
২০	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	১১/০২/২০২০
২১	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	২৩/০৮/২০২১
২২	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	২৩/০২/২০২০
২৩	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	২৩/০৮/২০২১
২৫	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	২৮/১১/২০২২
২৬	সময় বৃদ্ধির কারণ	কোভিড-১৯ এবং ডিজাইন রিভাইজড করার কারণে ৩৭০ দিন বিলম্ব হয়েছে।

৩.৮.২ পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-৩, প্যাকেজ (CRMIDP/NYNG/W-398)

পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-৩ (প্যাকেজ নং-৩৯৮), এপ্যাকেজটি বাস্তবায়িত হয়েছে সিলেট জেলার সিলেট সদর উপজেলায় শাহাজালল বাজার। দরপত্র দলিল, কার্যাদেশ ও চুক্তিপত্রের দলিলাদির বিভিন্ন অংশ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ক্রয় কার্যক্রমে অনুসৃত টেন্ডারিং পদ্ধতি ও এসটিইএম ডিপিপি/আরডিপিপি'র প্রতিশন অনুযায়ী ছিল। ইজিপি'র মাধ্যমে দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। দরপত্র দুইটি (বাংলা ও ইংরেজি) জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র প্রকাশের পর থেকে দরপত্র জমাদানের জন্য ৩২ দিন সময় দেয়া হয়েছে। বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা ২টি, প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ২টি। দরপত্র খোলার সময় ২জন সদস্য উপস্থিত ছিল, মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ৩ জন, তন্মধ্যে বহিঃ সদস্য ১ জন। দরপত্র মূল্যায়নের সময় ৩ জনেই উপস্থিত ছিলেন। রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ২টি। ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৮০ দিন এবং ২৫দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৫৪০ দিনে বাস্তবে ৪৪৯দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৯৮৯দিন, প্রায় ৩ বছর। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, কোভিড-১৯ এবং ডিজাইন রিভাইজড করার কারণে ৪৪৯ দিন বিলম্ব হয়েছে। দরপত্র ক্রয় অনুমোদনের জন্য হোপ'এর অনুমোদন নেয়া হয়েছে। প্যাকেজটির প্রাক্কলিত মূল্য ২৯৫.০০ লক্ষ টাকা, দাপ্তরিক মূল্য ২২৮.০০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২২৯.০৯ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ০.৪৭% বেশি। কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম মেসার্স এস আহমেদ এন্ড কোং। এখানে দেখা যায়, ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যটি সঠিক ছিল, ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের কাছাকাছি চুক্তি মূল্য রয়েছে, কিন্তু দাপ্তরিক মূল্য কম নির্ধারণ ছিল, যা বাস্তবভিত্তিক নয়। এপ্যাকেজটিতে পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।

সারণি ৩.৬: পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-৩ বিশ্লেষণ, প্যাকেজ (CRMIDP/NYNG/W-398)

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং	Costruction of two(2) storied Rural Market Building with 04 (stroied foundation) in Shahjalal Bazar under Sylhet Sadar Upazila, Sylhet. প্যাকেজ CRMIDP/SYL/W-398
২	ডিপিপি/আরডিপিপি'র প্রতিশন কী ছিল?	ওএসটিইএম
৩	ক্রয় পদ্ধতি/টেন্ডারিং অনুসৃত পদ্ধতি	ওএসটিইএম (ই-জিপি)
৪	ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ	(১) অন-লাইন
৫	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)	১। দৈনিক মানব জমিন, তারিখঃ ২২/০৯/১৯ ২। ঢাকা ত্রিভুনি, তারিখঃ ২২/০৯/১৯ ৩। www.eprocure.gov.bd , তারিখঃ ২২/০৯/১৯
৬	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষের তারিখ ও সময়	২২/০৯/২০১৯-২৪/১০/১৯, সময়ঃ বিকাল ২:০০ ঘটিকা
৭	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	২টি
৮	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	২টি
	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	২৪/১০/২০১৯, সময়ঃ সকাল ২:০০ ঘটিকা
৯	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	২ জন
১০	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	০২/১২/২০১৯
১১	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন
১২	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন
১৩	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	২ টি
১৪	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	০
১৫	Notification of Award প্রদানের তারিখ	১১/১২/২০১৯
১৬	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় [প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)]	২৯৫ লক্ষ টাকা
১৭	দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়	২২৮.০০ লক্ষ টাকা

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১৮	চুক্তি মূল্য	২২৯.০৯ লক্ষ টাকা
১৯	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	মেসার্স এস আহমেদ এন্ড কোং
২০	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	০৫/০১/২০২০
২১	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	০৫/০৭/২০২১
২২	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	১২/০১/২০২০
২৩	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	০৫/০৭/২০২১
২৪	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	২৭/০৯/২০২২
২৫	সময় বৃদ্ধির কারণ	কোভিড-১৯ এর কারণে ৪৪৪ দিন বিলম্ব হয়েছে।

৩.৮.৩ পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-৪, প্যাকেজ (CRMIDP/NYNG/W-494)

পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-৩ (প্যাকেজ নং-৩৯৮), এপ্যাকেজটি বাস্তবায়িত হয়েছে খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলায় যোগ্যাছোলা বাজার। দরপত্র দলিল, কার্যাদেশ ও চুক্তিপত্রের দলিলাদির বিভিন্ন অংশ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ক্রয় কার্যক্রমে অনুসৃত টেন্ডারিং পদ্ধতি ওএসটিইএম ডিপিপি/আরডিপিপি'র প্রতিশন অনুযায়ী ছিল। ইজিপি'র মাধ্যমে দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। দরপত্র দুইটি (বাংলা ও ইংরেজি) জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র প্রকাশের পর থেকে দরপত্র জমাদানের জন্য ৩৩ দিন সময় দেয়া হয়েছে। বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা ৬টি, প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ৫টি। দরপত্র খোলার সময় ৩জন সদস্য উপস্থিত ছিল, মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ৩ জন, তন্মধ্যে বহিঃ সদস্য ১ জন। দরপত্র মূল্যায়নের সময় ৩ জনেই উপস্থিত ছিলেন। রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ৫টি। ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৬৩ দিন এবং ১৪দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৩৬৫ দিনে বাস্তবে ৬০দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৪২৫দিন, প্রায় ২ বছর। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ৬০ দিন বিলম্ব হয়েছে। দরপত্র ক্রয় অনুমোদনের জন্য হোপ'এর অনুমোদন নেয়া হয়েছে। প্যাকেজটির প্রাক্কলিত মূল্য ৩০০.০০ লক্ষ টাকা, দাপ্তরিক মূল্য ২২৮.০০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ১৯৭.১১ লক্ষ টাকা। বাস্তবে দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য ১৩.৫৪% কম মূল্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। পিপিআর-০৮ অনুযায়ী ওএসটিইএম ক্রয় পদ্ধতিতে দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য অধিক হ্রাস হলে কোন সমস্যা নেই, তবে এক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র দাখিলকারীর নিকট যৌক্তিক ব্যাখ্যা চাইতে পারে, সন্তোষজনক জবাবের ভিত্তিতে NOA প্রদান করা যেতে পারে। অর্থাৎ এখানে পিপিআর-০৮ এর কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি। কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম শুভরংকর চাকমা। এখানে দেখা যায়, ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যটি সঠিক ছিল, ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের কাছাকাছি চুক্তি মূল্য রয়েছে, কিন্তু দাপ্তরিক মূল্য কম নির্ধারণ ছিল, যা বাস্তবভিত্তিক নয়। এপ্যাকেজটিতে পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।

সারণি ৩.৭: পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-৪ বিশ্লেষণ, প্যাকেজ (CRMIDP/NYNG/W-494)

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং	Costruction of two(2) storied Rural Market Building with 04 (stroied foundation) in Jaggochhola Bazar under Manikchari Upazila, Khakrachari. প্যাকেজ CRMIDP/KHGR/W-494
২	ডিপিপি/আরডিপিপি'র প্রতিশন কী ছিল?	ওএসটিইএম
৩	ক্রয় পদ্ধতি/টেন্ডারিং অনুসৃত পদ্ধতি	ওএসটিইএম (ই-জিপি)
৪	ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ	(১) অন-লাইন

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
৫	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)	১। দৈনিক স্বদেশ প্রতিদিন, তারিখঃ ১০/১২/২১ ২। ডেইলি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, তারিখঃ ১২/১২/২১ ৩। www.eprocure.gov.bd , তারিখঃ ১০/১২/২১
৬	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষের তারিখ ও সময়	০৯/১২/২১-১১/০১/২২, সময়ঃ বিকাল ৫:০০ ঘটিকা
৭	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	৬টি
৮	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	৫টি
৯	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	১২/০১/২০২২, সময়ঃ সকাল ১২:৩০ ঘটিকা
১০	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩ জন
১১	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	????
১২	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	৩ জন, বহিঃ সদস্য ছিলনা
১৩	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩ জন, বহিঃ সদস্য ছিলনা
১৪	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	৫ টি
১৫	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	০
১৬	Notification of Award প্রদানের তারিখ	১০/০২/২০২২
১৭	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় [প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)]	৩০০.০০ লক্ষ টাকা
১৮	দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়	২২৮.০০ লক্ষ টাকা
১৯	চুক্তি মূল্য	১৯৭.১১ লক্ষ টাকা
২০	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	শুভরংকর চাকমা
২১	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	২৪/০২/২০২২
২২	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	১৫/০৫/২০২২
২৩	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	০৩/০৩/২০২২
২৪	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	০৩/০৩/২০২৩
২৫	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	চলমান (চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে ০৩/০৫/২০২৩ পর্যন্ত)
২৬	সময় বৃদ্ধির কারণ	জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বিলম্ব হয়েছে।

৩.৮.৪ পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-৫, প্যাকেজ (CRMIDP/NYNG/W-518)

পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-৩ (প্যাকেজ নং-৩৯৮), এপ্যাকেজটি বাস্তবায়িত হয়েছে রাজশাহী জেলার কাউখালী উপজেলায় চক্রোয় বাজার। দরপত্র দলিল, কার্যাদেশ ও চুক্তিপত্রের দলিলাদির বিভিন্ন অংশ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ক্রয় কার্যক্রমে অনুসৃত টেন্ডারিং পদ্ধতি ও এসটিইএম ডিপিপি/আরডিপিপি'র প্রভিশন অনুযায়ী ছিল। ইজিপি'র মাধ্যমে দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। দরপত্র দুইটি (বাংলা ও ইংরেজি) জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র প্রকাশের পর থেকে দরপত্র জমাদানের জন্য ২২ দিন সময় দেয়া হয়েছে। বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা ৬টি, প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ৬টি। দরপত্র খোলার সময় ৩জন সদস্য উপস্থিত ছিল, মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ৩ জন, তন্মধ্যে বহিঃ সদস্য ১ জন। দরপত্র মূল্যায়নের সময় ৩ জনেই উপস্থিত ছিলেন। রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ৫টি। ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্র আহ্বান থেকে নোয়া প্রদান পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে ৮৬ দিন এবং ২৮দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার কথা ৩৩৬ দিনে বাস্তবে উক্ত প্যাকেজের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সময় বৃদ্ধির ডকুমেন্টস ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলে সংযুক্ত আছে। এপ্যাকেজটিতে প্রকৃত কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ৪২৫দিন, প্রায় ২ বছর। সময় বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ৬০ দিন বিলম্ব হয়েছে। দরপত্র ক্রয় অনুমোদনের জন্য হোপ'এর অনুমোদন নেয়া হয়েছে।

প্যাকেজটির প্রাক্কলিত মূল্য ২৭৫.০০ লক্ষ টাকা, দাপ্তরিক মূল্য ৩৯৪.০০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ৩৪৪.০৩ লক্ষ টাকা। বাস্তবে দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা ১২.৬৮% বেশি মূল্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম মেসার্স আরআইপি এন্টারপ্রাইজ, খাকড়াছড়ি। এখানে দেখা যায়, ডিপির প্রাক্কলিত মূল্যটি সঠিক ছিল, ডিপির প্রাক্কলিত মূল্যের কাছাকাছি চুক্তি মূল্য রয়েছে, কিন্তু দাপ্তরিক মূল্য অনেক বেশি নির্ধারণ ছিল, যা বাস্তবভিত্তিক নয়। এপ্যাকেজটিতে পিপিআর-০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।

সারণি ৩.৮: পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি-৫ বিশ্লেষণ, প্যাকেজ (CRMIDP/NYNG/W-518)

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং	Costruction of two(2) storied Rural Market Building with 04 (stroied foundation) in Chakroy Bazar under Kawkhali Upazila, Rangamati. প্যাকেজ CRMIDP/RANG/W-518
২	ডিপিপি/আরডিপিপি'র প্রভিশন কী ছিল?	ওএসটিইএম
৩	ক্রয় পদ্ধতি/টেন্ডারিং অনুসৃত পদ্ধতি	ওএসটিইএম (ই-জিপি)
৪	ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ	(১) অন-লাইন
৫	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)	১। দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, তারিখঃ ১৯/১২/২১ ২। ডেইলি ঢাকা, তারিখঃ ১৯/১২/২১ ৩। www.eprocure.gov.bd , তারিখঃ ১৯/১২/২১
৬	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষের তারিখ ও সময়	১৯/১২/২১-১০/০১/২২, সময়ঃ বিকাল ৫:০০ ঘটিকা
৭	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	৬টি
৮	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	৬টি
	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	১৯/০১/২০২২, সময়ঃ সকাল ১২:০০ ঘটিকা
৯	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩ জন
১০	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	০৩/০৩/২০২২
১১	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	৩ জন, বহিঃ সদস্য ছিলনা
১২	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩ জন, বহিঃ সদস্য ছিলনা
১৩	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	৫ টি
১৪	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	১টি
১৫	Notification of Award প্রদানের তারিখ	১৫/০৩/২০২২
১৬	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় [প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)]	২৭৫ লক্ষ টাকা
১৭	দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৯৪.০০ লক্ষ টাকা
১৮	চুক্তি মূল্য	৩৪৪.০৩ লক্ষ টাকা
১৯	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	মেসার্স আরআইপি এন্টারপ্রাইজ, খাকড়াছড়ি
২০	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	১২/০৪/২০২২
২১	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	১৫/০৭/২০২১
২২	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	১৯/০৪/২০২২
২৩	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	২১/০৩/২০২৩
২৪	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	চলমান

৩.৯ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত পণ্যের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ

Test Report: LABORATORY AT: Mymensingh

SPECIFIC GRAVITY & ABSORPTION TEST OF COURSE AGGREGATE (ASTM C-127)

Client: Ue, Phulpur, Mym.	Memo No/Ref, 46.02.61.8100.001.16.21-349	Date: 03/-6/21
Scheme: Rural Market Building	Location: Const.Of 02 (two) Storied Buliding At Bowla Bazar	
Sample No:	Sampled by & Date: SAE,Phulpur,mym	
Type of Speciment: Stone Chips	Quantity Collected from Filed:	
Lab. Reg.No.WAA/ /20-21	Date of test: 16/06/21	

Approx, Capacity of wire Basket:

Nominal Max. Aggregate Size:

Sieve for separating Finer paticles (if excessive amount):

% of Coarser portion (retained on No.4 sieve), p1:

% of Finer portion, p2:

Description	Test No			Remarks
	Test-1	Test-2	Test-3	
Wt.of SSD Specimen in Air (B), gm	4010	3980	4210	Specification Maximum 2%
Wt.of Saturated Specimen in Water (C), gm				
Wt.of Oven-Dry Specimen in Air (A), gm				
Temperature of Water (T), deg.C				
Sp.Gr.of Water at T deg.C Gt				
Bulk Specific Gravity (OD), 23/23deg. $C=A/(B-C) \times G_T/G_{23}$				
Bulk Specific Gravity (SSD), 23/23deg. $C=B/(B-C) \times G_T/G_{23}$				
Apparent Specific Gravity (SSD), 23/23deg. $C=A/(B-C) \times G_T/G_{23}$				
Water Absortion, $=(B-A)/A \times 100$ %	1.6	1.6	1.7	
Average Specific Gravity, 23/23deg.C				
Average Water Absortion, %	1.6			

Test Report: Physical description of test pile and equipment use are provided in Table-1 Table-2 bellow

Physical description of test pile

Test pile no	Date of pile	Date of plie	Length of plie	Dia of plie	Applied load
SP-04, P-20	14-03-2022	01-06-2022	65.0FT	500MM	81.00 Tons

Description of Equipment used

Test pile no	Ram Dia	Pressure gauge			Dial gauge	
		Range	Calibration	Regression equation		
SP-04, P-20	19.10cm	0-1000 Bar	24-05-2022	$Y=1.0308x-41.089$	0.01mm	0-50mm

Interpreation of test result:

- Load corresponding to a settlement equal to 10% of the pile diagonal dia in the case of normal uniform dia pile or 7.5% of base dia in case of under-reamed or large Cast-in-situ pile.
- Load corresponding to a settlement of 12 mm.

The Bangladesh National Building Cod, BNBC (2006) recommends that the allowable load Capacity of pile shall not be more then one-half of that test loads which produces a permanent net Settlement (i.e., gross Settlement less rebound) of not more than 0.00028 mm/kg of test load nor 20 mm.

ACCORDING TO Indian Standard Code of practice (IS:29111979), Allowable pile capacity is smaller of the following:

- (a) Two thirds of the final load at which the total settlement attains a value of 12 mm.
- (b) Half of the final load settlement equal to 10% of the diagonal section in the case of normal uniform dia in case of under-reamed pile.

Obserbation: According to the Code of Practice 2004 of British Standards Institution (1972), the allowable pile capacity should be 50% of the final load, which cause the pile to settlement a depth of 10% of pile width or diagonal section.

Test result: test result is provided in Table-03 bellow:

Test Pile and Test Results

Test pile no	Length of pile	Dia of pile	Test Result			
			Max-m applied load	Gross Settlement	Net Settlement	Failure Condition
SP-04, P-20	65.0ft	500mm	81.00 Tons	6.96 mm	4.49 mm	Did not fail

Ultimate & allowable load capacities by different methods are presented in Table-4 & 5

Ultimate Load Capacity of the Test pile

SL.NO	Test pile No.	Ultimate Load Capacity in Ton		
		BNBC (2006)	Davisson (1973)	IS: 2911
1.0	SP-04, P-20	>81.00 Tons	>81.00 Tons	81.00 Tons

Allowable Load Capacity of the Test pile

SL.No.	Test pile No.	Allowable Load Capacity in Ton		
		BNBC (2006) (F.S=1.5)	Davisson (1973) (F.S=1.5)	IS: 2911 (F.S=1.5)
1.0	SP-04, P-20	>54.00 Tons	>54.00 Tons	54.00 Tons


BANGLADESH UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (BUET)
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
 Mobile: 01819 557 964; PABX: (8802) 55167100, 55167228-57 Ext: 7224, Information: <http://brtc.ce.buet.ac.bd>, Report verification: <http://verify.ce.buet.ac.bd>
STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

TEST OF DEFORMED M.S. BARS (ASTM A 615M-16)
 Sent by: Md. Shahiduzzaman Khan
 Executive Engineer, LGED, Mymensingh.
 Project: CRMIDP Project, Construction of 2 (Two) Storied Market with 4 Storied Foundation at Bowla Bazar under Fulpur, Mymensingh (Package# CRMIDP/MYMW-247).

BRTC No.: 1162-42655CE/21-22; Dt. 25/9/2021
 Ref.: 46.02.6100.000.99.001.21.2360; Dt. 23/6/2021
 Date of Test: 27/9/2021
 Contractor/supplier: Noor Hossain & Sneha Enterprise (JV).
 Samples were received in SEALED condition.

SL. No.	Frog Mark / Identification	Bar Desig / Nominal dia.	Actual bar dia.	Unit Weight	Average Unit Weight	Yield or Proof Load	Yield or Proof Strength	Average Yield or Proof Strength (YS)	Tensile Load	Tensile Strength	Average Tensile Strength (TS)	TS/YS	Elongation (%) (G. length = 200 mm)	Average Elongation (%)	Bend Test
		mm	mm	kg/m	kg/m	kN	MPa	MPa	kN	MPa	MPa				
1	SCRM 400 60G	20	20.3	2.539	2.507	138	440	447	227	725	725	1.62	18	17	-
2	SCRM 400 60G	20	20.0	2.463		138	440	(64500 psi)	224	715	(105000 psi)		17		-
3	SCRM 400 60G	20	20.2	2.520		144	459		232	740			17		-
4	SCRM 400 60G	16	16.3	1.638		88.2	439	432	138	690	(100000 psi)	1.60	19	19	-
5	SCRM 400 60G	16	16.3	1.634	1.643	85.2	424	(62500 psi)	138	690			19		-
6	SCRM 400 60G	16	16.4	1.658		87.2	434		139	695			19		-
7	SCRM 400 60G	12	12.3	0.939		48.6	430	430	72	635	(92500 psi)	1.48	19	19	-
8	SCRM 400 60G	12	12.3	0.930	0.934	48.6	430	(62500 psi)	72	635			19		-
9	SCRM 400 60G	12	12.3	0.933		48.6	430		72	635			19		-
10	SCRM 400 60G	10	10.1	0.632		33.1	419	421	49	620	630	1.50	20	20	-
11	SCRM 400 60G	10	10.3	0.658	0.639	33.6	425	(61000 psi)	50.8	645	(91500 psi)		19	20	-
12	SCRM 400 60G	10	10.1	0.627		33.1	419		49.5	625			20		-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ASTM A615M-16 Weight Requirements and Nominal Area of bars (Table A1.1)

Bar desig./Nominal dia., mm	7	10	12	16	20	22	25	28	32	36	40	50	60
Nominal area, sq.mm	50.3	79	113	201	314	380	491	616	804	1018	1257	1963	2827
Nominal weight, kg/m	0.395	0.617	0.888	1.578	2.466	2.98	3.853	4.834	6.313	7.99	9.865	15.41	22.2

Measured unit weight shall not be less than 94% of the nominal weight. 8mm bar size is not covered in ASTM A615M-16.
 Area and weight of 8mm and 22mm dia. bars are derived based on principle followed for other sizes in Table A1.1
 Actual dia. and TS/YS ratio are provided for informative purpose only. These are not requirements of ASTM A615M-16.
 Actual diameter is the diameter of a perfectly round plain bar having same mass per unit length.

Conversion factor: 1.0 MPa = 1.0 N/mm² = 145 psi. Strengths are based on nominal area.

ASTM A615M-16 Tensile Requirements for Common Steel Grades

	Grade 60	Grade 75	Grade 80
	[420]	[520]	[550]
Tensile strength, min. psi [MPa]	90 000 [520]	100 000 [690]	105 000 [725]
Yield strength, min. psi [MPa]	60 000 [420]	75 000 [520]	80 000 [550]

Bar Designation No.
 10, 12, 16, 20
 25, 28
 28, 32, 36, 40, 50, 60

Countersigned by:
 Prof. Dr. A. B. M. Badruzzaman, Test-in-Charge
 Dept. of Civil Engg., BUET

Test performed by:
 Dr. M. Zakaria Ahmed
 Professor, Dept. of Civil Engg.

Important Note: Samples as supplied to us have been tested. BRTC does not have any responsibility as to the representative character of the samples required to be tested. It is recommended that the samples are sent in a secure and sealed cover/pack/container under the signature of a competent authority. In order to avoid fraudulent fabrication of test results, this report has been printed on a security paper. It is also recommended that the test results be collected by a duly authorized person.

Test Report of M.S REBAR, Mymensingh

BANGLADESH UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (BUET)



DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
Mobile: 01819 557 964; PABX: 966 5650-80 Ext. 7226; www.buet.ac.bd/ce/



STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

Calibration of Pressure Gauge

BRTC No.: 1102-62173/CE/21-22

Reference : Letter

Sent By: M/S. Alom Construction

Project: -


Equipment: Pressure Gauge: WIKA; Gauge ID: JS-3 (back side)

Capacity: 0-1000 bar

Date of Calibration: 24.05.2022

Date: 23/05/2022

Date: 23/05/2022

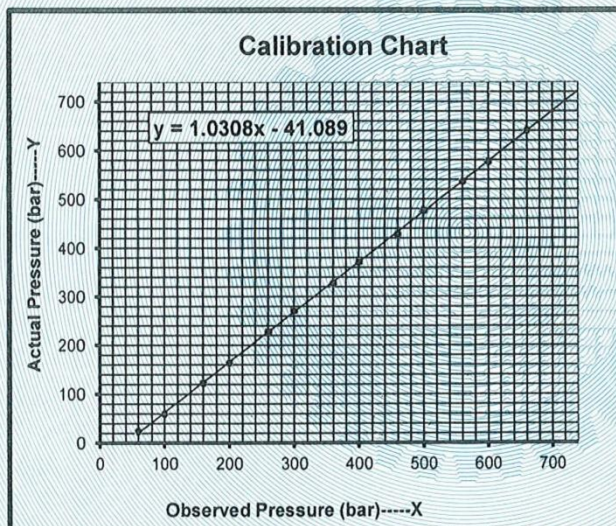

Observed Pressure (bar)	Actual Pressure (bar)
60	24.00
100	60.00
160	123.00
200	164.00
260	228.00
300	271.00
360	327.00
400	371.50
460	428.00
500	477.00
560	536.50
600	577.00
660	641.00

Note: Pressure Gauge was received in unsealed condition

1 bar= 1.0197 kg/cm²=14.503 psi

Countersigned by:

Prof. Dr. A. B. M. Badruzzaman
Test-in-Charge
Department of Civil Engineering
BUET, Dhaka-1000, Bangladesh

Calibrated by:

Dr. Md. Zakaria Ahmed
Professor
Department of Civil Engineering
BUET, Dhaka-1000, Bangladesh



BUETCE 0334591

চিত্র-৩.৩: Test Report of Pressure Gauge. Habigonj

টেন্ড রিপোর্ট পর্যালোচনাঃ

- নির্ধারিত সিমেন্ট ও স্টিল বার সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে।
- বেশিরভাগই টেন্ড সিলড অবস্থায় করানো হয়েছে, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রেই আনসিলড অবস্থায় টেন্ড করা হয়েছে।
- সিমেন্ট প্রস্তুতকারক কোম্পানি ও প্রস্তুতের তারিখ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, যা সঠিক ছিল।
- কংক্রিট এবং স্টিল বারের শক্তি নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়েছে, যা বুয়েট কর্তৃক প্রদত্ত। প্রতিটি রিপোর্টের ফলাফল ভাল ছিল।


৩.১০ প্রকল্পের ড্রইং ও ডিজাইন পর্যালোচনা।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা টিম সরেজমিনে প্রতিটি ভবনের ড্রইং বা নকশা পর্যালোচনা করেন। নকশা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নকশা অনুযায়ী যথাযথভাবে নির্মাণ কাজ করছে তাতে কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। নিম্নে নকশা পর্যালোচনার চিত্র দেওয়া হলো-




চিত্র-৩.৪: নকশার সাথে বর্তমান বাজার অবকাঠামোর অবস্থা যাচাই, শাহজালাল বাজার, সিলেট সদর, সিলেট।

তারিখঃ ৩০/০৩/২০২৩

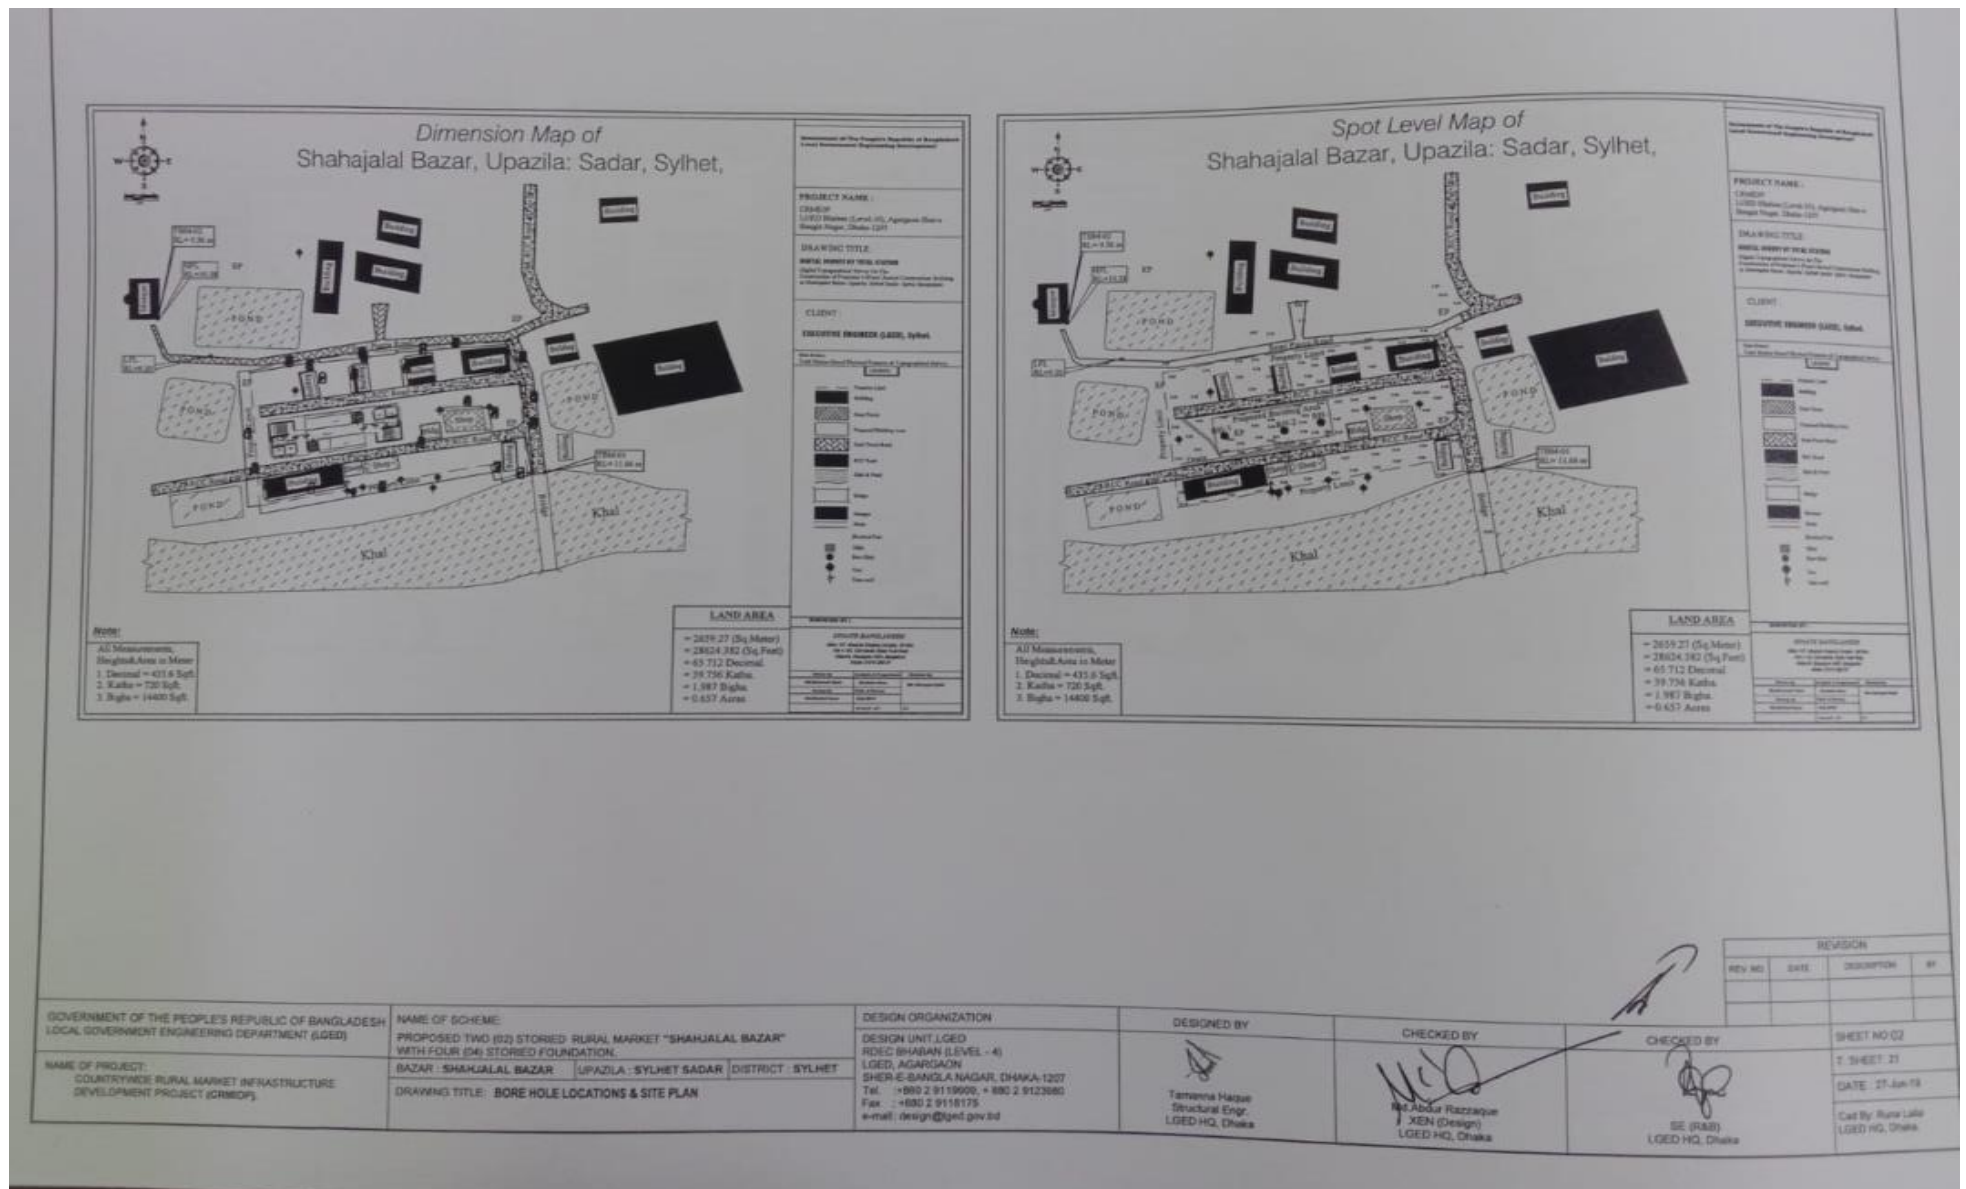

চিত্র ৩.৫ (১): প্রকল্পের নকশা পর্যালোচনা (অংশ-১), শাহজালাল বাজার, সিলেট সদর, সিলেট।

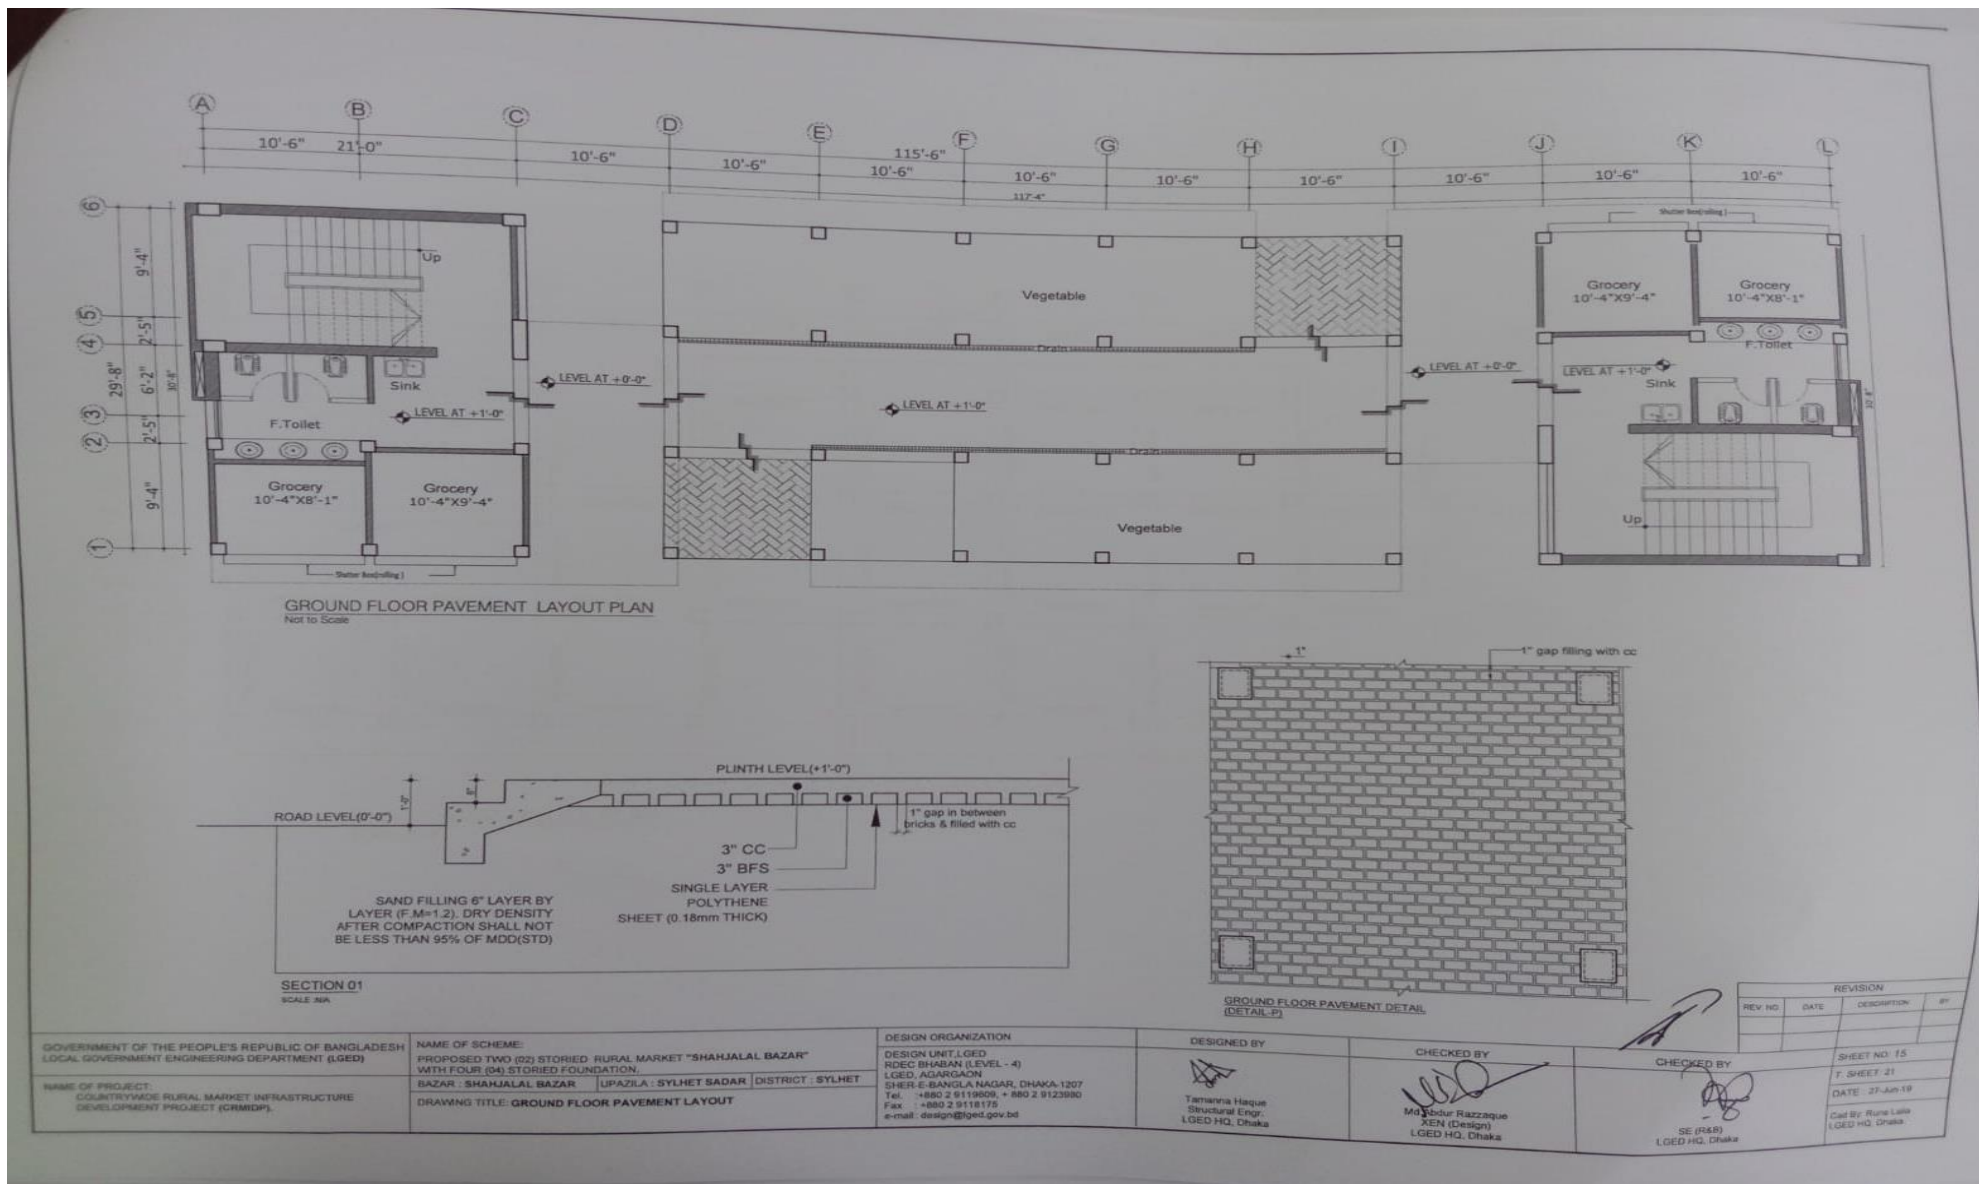

চিত্র-৩.৫ (২): প্রকল্পের নকশা পর্যালোচনা (অংশ-২), শাহজালাল বাজার, সিলেট সদর, সিলেট।

৩.১১ সরেজমিনে পূর্তকাজ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা দলের সদস্যগণ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণপূর্বক নিম্নের বিষয়গুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।

(ক) বাজারের নামঃ শাহজালাল বাজার,

উপজেলাঃ সিলেট সদর, জেলাঃ সিলেট

কাজের অগ্রগতিঃ ১০০%

সরেজমিনে পরিদর্শনের তারিখঃ ৩০-০৩-২৩



চিত্র-৩.৬: শাহজালাল বাজার, সিলেট সদর, সিলেট

রেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, কিন্তু বাজারের অবকাঠামোটিতে বেশ কিছু ত্রুটি রয়েছে, যেমন: এই বাজার অবকাঠামোর প্লিন্থ লেভেলে বেশ কিছু ফাঁটল দেখা গেছে যেগুলো নীট সিমেন্ট পেস্ট দ্বারা ভরাট করে ফিনিশিং দেয়া হয়েছে। তবে ডিজাইন অনুযায়ী ফ্লোর স্পেস ঠিক আছে, বাজার অবকাঠামোটি ঠিকাদার থেকে বুঝে নেওয়ার আগে সমস্যাগুলো সমাধান করে নিতে হবে। বাজারের সন্নিহিতে যে সকল ব্যবসায়ীগণ ব্যবসা পরিচালনা করছেন, তাদের বাজার অবকাঠামোটিতে দোকান বরাদ্দ পেতে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেছে। ব্যবসায়ীগণ জানান, দ্রুত বাজার অবকাঠামোটির দোকানগুলো বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন, অন্যথায় এভাবে দীর্ঘ পড়ে থাকলে ভিতরের লাইট, পানির ট্যাব এবং অন্যান্য ফিটিংসগুলো নষ্ট হয়ে যাবে।

(খ) বাজারের নামঃ রামপুর বাজার

উপজেলাঃ মেঘনা, জেলাঃকুমিল্লা

কাজের অগ্রগতিঃ ১০০%

সরেজমিনে পরিদর্শনের তারিখঃ ১৮-০৩-২৩



চিত্র-৩.৭: রামপুর বাজার, মেঘনা উপজেলা, কুমিল্লা

সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, কিন্তু বাজারের অবকাঠামোটিতে বেশ কিছু ত্রুটি রয়েছে, যেমন: গ্রাউন্ড ফ্লোরে যথাযথ কিউরিং এর অভাবে কিছু স্থানের কনক্রিটে সংকোচন-জনিত ফাটল (Shrinkage cracks) পরিলক্ষিত হয়েছে। এগুলো নির্মাণ কাজের ত্রুটি নির্দেশক। তবে ডিজাইন অনুযায়ী ফ্লোর স্পেস ঠিক আছে, বাজার অবকাঠামোটি ঠিকাদার থেকে বুঝে নেওয়ার আগে সমস্যাগুলো সমাধান করে নিতে হবে।



চিত্র-৩.৮: তালুহ বাজার, দুপচাঁচিয়া উপজেলা, বগুড়া

সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলায় তালুহ বাজারের নিচ তলায় নির্মাণ কাজের ফিনিশিং ভালো হয়নি। তবে ডিজাইন অনুযায়ী ফ্লোর স্পেস ঠিক আছে, বাজার অবকাঠামোটি ঠিকাদার থেকে বুঝে নেওয়ার আগে সমস্যাগুলো সমাধান করে নিতে হবে। বাজারের সন্নিহিতে যে সকল ব্যবসায়ীগণ ব্যবসা পরিচালনা করছেন,

তাদের বাজার অবকাঠামোটিতে দোকান বরাদ্দ পেতে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেছে। ব্যবসায়ীগণ জানান, দ্রুত বাজার অবকাঠামোটির দোকানগুলো বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন, অন্যথায় এভাবে দীর্ঘ পড়ে থাকলে ভিতরের লাইট, পানির ট্যাব এবং অন্যান্য ফিটিংসগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। বাজারের স্থান নির্বাচন সঠিক আছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে। নিচ তলায় খোলা বাজারে বিভিন্ন স্থানে ক্রাক দেখা যায়। সরেজমিন পরিদর্শনকালীন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র- ৩.৯: কর্তারহাট, লালমোহন উপজেলা, ভোলা

সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, ভোলা জেলা, লালমোহন উপজেলা, কর্তারহাট বাজারে অবস্থিত নির্মাণাধীন অবকাঠামোটির সিঁড়ি ও ২য় তলার ফ্লোর টাইলসসমূহের সাউন্ড রেসপন্স পরীক্ষা করে দেখা গেছে ৮৫% ভাগের বেশি জায়গায় সঠিক ভাবে টাইলস বসানো হয়েছে। অর্থাৎ টাইলস ফিটিং ভালো হয়নি। ২য় তলার দোকানের শাটারিং কাজের গুণগতমান ও ফিটিংসগুলো মোটামুটি ভালো। ভবনের প্লাস্টারের ফিনিশিং মোটামুটি ভালো। বৈদ্যুতিক লাইনে নিম্নমানের পাইপ ও ক্যাবল ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়াশব্রুনের দরজা ও টাইলসসহ অন্যান্য ফিটিংস নিম্নমানের ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে ডিজাইন অনুযায়ী ফ্লোর স্পেস ঠিক আছে, বাজার অবকাঠামোটি ঠিকাদার থেকে বুঝে নেওয়ার আগে সমস্যাগুলো সমাধান করে নিতে হবে।



চিত্র- ৩.১০: শম্ভুপুর নতুনহাট, তজুমদ্দিন উপজেলা, ভোলা

সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, ভোলা জেলা, তজুমদ্দিন উপজেলা, শম্ভুপুর নতুনহাটে অবস্থিত অবকাঠামোটির নির্মাণ কাজ ২০২১ সালে সম্পূর্ণ হয়েছে। নির্মাণাধীন ভবনের জমির দলিল সংক্রান্ত সমস্যার কারণে এখন পর্যন্ত ভবনটি হস্তান্তর ও এলজিইডি কর্তৃক বুঝে নেয়া সম্ভব হয়নি। সরেজমিনে পরিদর্শন দেখা যায়। মেঝেতে অপরিষ্কার রাবিশ পড়ে আছে, নিচতলার মেঝেতে প্লাস্টার ফেটে গিয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় দেয়ালের প্লাস্টার ফেটে যেতেও দেখা গিয়েছে। রং এর কালার নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দোকানে নিম্নমানের শাটারিং ও শাটারের কাভার ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ভবনের স্ট্রাকচারগত কাজের গুণগতমান ভালো পরিলক্ষিত হয়েছে এবং ডিজাইন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ভোলা জেলা, চরফ্যাশন উপজেলা, উত্তর ইছা বাজারে অবস্থিত অবকাঠামোটি ২০২১ সনের জুলাই মাসের ০৫ তারিখ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিডি) এর মাধ্যমে সমাপ্তকৃত হাটের মার্কেট ভবনটি হস্তান্তর ও গ্রহণ করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, ভবনের নিচ তলার মেঝেতে প্লাস্টার উঠে নিচের ব্রিক দেখা যাচ্ছে, দেয়ালের প্লাস্টার ফেটে গিয়েছে। বেসিং ও ওয়াশরুম গুলো দীর্ঘদিন যাবত অপরিষ্কার থাকায় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গিয়েছে।



চিত্র- ৩.১১: নাজলকোট বাজার, বন্দর থানা, নারায়ণগঞ্জ



চিত্র-৩.১২: ফতুল্লা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

****** অবশিষ্ট পরিদর্শনকৃত মার্কেট ভবনের চিত্র পরিশিষ্ট-১ দেয়া হলো।**

পর্যালোচনাঃ

- শাহজালাল বাজার, সিলেট সদর, সিলেট। সরেজমিন পরিদর্শনে এই বাজার অবকাঠামোর প্লিস্ট লেভেলে বেশ কিছু ফাটল দেখা গেছে যেগুলো নীট সিমেন্ট পেস্ট দ্বারা ভরাট করে ফিনিশিং দেয়া হয়েছে।

- রামপুর বাজার, মেঘনা উপজেলা, কুমিল্লা। গ্রাউন্ড ফ্লোরে কিছু স্থানে যথাযথ কিউরিং এর অভাবে কিছু স্থানের কনক্রিটে সংকোচন-জনিত ফাটল (Shrinkage cracks) পরিলক্ষিত হয়েছে। এগুলো নির্মাণ কাজের ত্রুটি নির্দেশক।
- ভোলা জেলা, চরফ্যাশন উপজেলা, উত্তর ইছা বাজারে অবস্থিত অবকাঠামোটি ২০২১ সনের জুলাই মাসের ০৫ তারিখ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিডি) এর মাধ্যমে সমাপ্তকৃত হাটের মার্কেট ভবনটি হস্তান্তর ও গ্রহণ করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, ভবনের নিচ তলার মেঝেতে কিছু জায়গায় প্লাস্টার উঠে নিচের ব্রিক দেখা যাচ্ছে এবং দেয়ালের প্লাস্টার ফেটে গিয়েছে। বেসিং ও ওয়াশরুম গুলো দীর্ঘদিন যাবত অপরিষ্কার থাকায় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গিয়েছে।
- ভোলা জেলা, লালমোহন উপজেলা, কর্তারহাট বাজারে অবস্থিত নির্মাণাধীন অবকাঠামোটির সিঁড়ি ও ২য় তলার ফ্লোর টাইলসসমূহের সাউন্ড রেসপন্স পরীক্ষা করে দেখা গেছে ৮৫% ভাগের বেশি জায়গায় সঠিক ভাবে টাইলস বসানো হয়েছে। অর্থাৎ ১৫% জায়গায় টাইলস ফিটিংস ভালো হয়নি। ২য় তলার দোকানের শাটারিং কাজের গুণগতমান ও ফিটিংসগুলো মোটামুটি ভালো। ভবনের প্লাস্টারের ফিনিশিং মোটামুটি ভালো। ওয়াশরুমের দরজা ও টাইলসসহ অন্যান্য ফিটিংস নিম্নমানের ব্যবহার করতে দেখা যায়।
- ভোলা জেলা, তজুমদ্দিন উপজেলা, শম্ভুপুর নতুনহাটে অবস্থিত অবকাঠামোটির নির্মাণ কাজ ২০২১ সালে সম্পূর্ণ হয়েছে। নির্মাণাধীন ভবনের জমির দলিল সংক্রান্ত সমস্যার কারণে এখন পর্যন্ত ভবনটি হস্তান্তর ও এলজিইডি কর্তৃক বুঝে নেয়া সম্ভব হয়নি। সরেজমিনে পরিদর্শন দেখা যায়। ভবনের মেঝেতে অপরিপূর্ণ রাবিশ পড়ে আছে এবং নিচতলার মেঝেতে কিছু জায়গায় প্লাস্টার ফেটে গিয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় দেয়ালের প্লাস্টার ফেটে যেতেও দেখা গিয়েছে। রং এর কালার নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিছু স্থানে দোকানে নিম্নমানের শাটারিং ও শাটারের কাভার ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ভবনের স্ট্রাকচারগত কাজের গুণগতমান ভালো পরিলক্ষিত হয়েছে এবং ডিজাইন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলায় তালুছ বাজারের নিচ তলায় নির্মাণ কাজের ফিনিশিং ভালো হয়নি। নিচ তলায় খোলা বাজারে বিভিন্ন স্থানে ক্রাক দেখা যায়।

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রমের সরেজমিন পরিদর্শনকালীন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

৩.১২ প্রকল্পের পিআইসি ও পিএসসি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা

পরিকল্পনা বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী, প্রকল্প পরিচালনার জন্য প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজনের বিধান রয়েছে, সে অনুযায়ী জুলাই ২০১৭ হতে মে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে মোট ৭০ (সত্তোর) মাসে ২৩টি পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজন করার কথা এবং ডিপিপি অনুযায়ী বছরে প্রতি ৩ মাসে ১বার বা পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজনের বিধান রয়েছে। বাস্তবে জুলাই ২০১৭ হতে মে ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রায় ৬ বছরে ০২টি পিআইসি ও ০৪টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ পরিপত্র ও ডিপিপি অনুযায়ী সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার হার পিআইসি ০২ (৮.৬৯%) এবং পিএসসি ০৪ (১৭.৩৯%)। সুতরাং, পরিপত্র ও ডিপিপি'র প্রদত্ত নিয়মানুযায়ী সবগুলো সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি ঠিক রাখতে হলে এবং কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হলে ডিপিপি ও পরিকল্পনা বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী পিআইসি ও পিএসসি সভাগুলো নিয়মিত আয়োজন প্রয়োজন। বিস্তারিত তথ্য নিম্নের সারণি ৩.৯ এ'দেওয়া হলো-

সারণি ৩.৯ পিআইসি ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার হার

সভার নাম	সভা অনুষ্ঠানের বিধান		সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা জুলাই-২০১৭ হতে মে, ২০২৩ (৭০ মাস)		সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বাস্তব অগ্রগতি জুলাই-২০১৭ হতে মে, ২০২৩ (৭০ মাস)	
	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি অনুযায়ী	পরিপত্র অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (সভার সংখ্যা)	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (সভার সংখ্যা)	পরিপত্র অনুযায়ী সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা ও হার	ডিপিপি অনুযায়ী সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা ও হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পিআইসি সভা	প্রতি ৩ মাসে	প্রতি ৩ মাসে	২৩	২৩	০২ (৮.৬৯%)	০২ (৮.৬৯%)
পিএসসি সভা	১ বার	১ বার	২৩	২৩	০৪ (১৭.৩৯%)	০৪ (১৭.৩৯%)

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

৩.১২.১ পিআইসি ও পিএসসি সভার আলোচনা সংক্রান্ত তথ্য:

সর্বশেষ সভার নাম ও তারিখ	সভায় আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি
পিএসসি সভা তারিখ: তারিখঃ ১৪/০৫/২০১৯	- গুণগত মান বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত যথাযথ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে; - বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুসারে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য নিয়মিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) সভা আয়োজন করতে হবে; - প্রকল্পের আওতায় যে সকল বাজারের স্থান পরিবর্তন করা প্রয়োজন তা উক্ত এলাকার স্থানীয় জনমত ও চাহিদা এবং উক্ত এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়ের পরামর্শের ভিত্তিতে সরকারি বিধি বিধান অনুসরণ করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় অনুমোদনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে; এবং - প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে যথাযথ যৌক্তিকতাসহ আবশ্যিক অন্যান্য বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করে সার্বিক তথ্যাদি পরবর্তী প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সিদ্ধান্তগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়নি।
পিএসসি সভা তারিখ:	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ভূমি মন্ত্রণালয়ের “হাট বাজারের সরকারি খাস	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

সর্বশেষ সভার নাম ও তারিখ	সভায় আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩/০২/২০ খ্রি:	জমিতে বহুতল বিশিষ্ট ভবন এবং ■ বহুতল বিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণ প্রসঙ্গে” জারীকৃত নির্দেশনা (ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৪/০৪/১৯৯৯ তারিখের ভূম/৭-হাট-১/৯৮/১০৫ (৭৬) নং স্মারক) যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। ■ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে সম্পৃক্ত রেখে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে; ■ প্রয়োজনীয়তার নিরীখে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে/হচ্ছে।
পিএসসি সভা তারিখ: ৮/০৩/২১খ্রি:	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ভূমি মন্ত্রণালয়ের “হাট বাজারের সরকারি খাস জমিতে বহুতল বিশিষ্ট ভবন এবং বহুতল বিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণ প্রসঙ্গে” জারীকৃত নির্দেশনা (ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৪/০৪/১৯৯৯ তারিখের ভূম/৭-হাট-১/৯৮/১০৫ (৭৬) নং স্মারক) যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং যে সকল বাজার উন্নয়নের অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না সেগুলো বাদ যাবে; ■ নতুন বাজার অন্তর্ভুক্ত করতে হলে তা উন্নয়নের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের অনুমতি ডিপিপি-তে সংযোজনী হিসেবে দিতে হবে; ■ বাস্তবতার নিরীখে প্রকল্পটির ২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধিসহ সংশোধনের সুপারিশ করা হলো; ■ প্রয়োজনে সংশোধিত প্রস্তাবের ওপর পুনরায় স্টিয়ারিং কমিটির সভা হতে পারে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।
পিএসসি সভা তারিখ: ১৬/০২/২২ খ্রি:	■ আলোচ্য প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় ব্যতিরেকে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত অর্থাৎ ৩ (তিন) বছর বৃদ্ধির সুপারিশ করা হলো। ■ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/নির্মিতব্য বহুতল বিশিষ্ট মার্কেট ভবন ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হস্তান্তর সংক্রান্ত পরিপত্রটি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। ■ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে অতি দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য বাজারের চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
পিআইসি সভা তারিখ: ১১/০১/২২ খ্রি:	উপর্যুক্ত তথ্যসমূহ সভায় উপস্থাপনের পর প্রকল্প পরিচালক জনাব স্বপন কান্তি পাল জানান যে, বছরভিত্তিক এডিপি অর্থের বরাদ্দ না পাওয়া, মার্কেট ভবন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত বাজার সমূহে প্রস্তাবিত জমির আকৃতি, ধরণ ও সয়েল কন্ডিশন ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় প্রতিটি মার্কেট ভবনের জন্য করতে হবে Need Based আলাদা আলাদা ডিজাইন ও ড্রইং প্রস্তুত করা এবং প্রস্তাবিত বাজারে ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় খাস জমি না থাকা এবং কিছু জেলায় মার্কেট ভবন নির্মাণের জন্য জেলা প্রশাসন হতে অনুমতি না পাওয়ায় প্রকল্পের কাজগুলো সম্পন্ন করতে দেরি হচ্ছে। তাই প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদকাল ৩ (তিন) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ■ প্রকল্পের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে অতি দ্রুত বাজারের চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন এবং এর পাশাপাশি মার্কেট ভবন নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য প্রণীত খসড়া পরিপত্রটি অতি দ্রুত অনুমোদন করার উদ্যোগ গ্রহণ না করতে হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে/হচ্ছে।

সর্বশেষ সভার নাম ও তারিখ	সভায় আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	- প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দ্রুত প্রক্রিয়াকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। - ভবিষ্যতে গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়ার আগে সকল অংশীজনদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে প্রকল্প প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
পিআইসি সভা তারিখ: ০২/০১/২৩ খ্রি:	- প্রকল্প পরিচালক উপর্যুক্ত তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন পূর্বক জানান যে, জমি সংক্রান্ত জটিলতা/প্রস্তাবিত স্থানে একাধিক ব্যক্তি মালিকানাধীন অবকাঠামো/অস্থায়ী স্থাপনা ও প্রাচীন বড় গাছ বিদ্যমান থাকায়, মামলা চলমান থাকায় এবং যথাসময়ে ভূমি মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা প্রশাসন হতে অনাপত্তি পত্র না পাওয়ায় এ পর্যন্ত মোট ৩৫ টি বাজারে মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে, তার মধ্যে ১৬টি বাজারে মার্কেট ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে মাননীয় এমপি মহোদয়গণের নিকট হতে ৮টি বিকল্প বাজারে মার্কেট ভবন নির্মাণের জন্য ডি.ও পত্রের মাধ্যমে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। তাছাড়া, এ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, এমপি ও সচিব সহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নিকট থেকে ৮০ টি নতুন বাজারে মার্কেট ভবন নির্মাণের জন্য ডি.ও পত্রের মাধ্যমে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ডি.ও পত্রের মাধ্যমে প্রস্তাবিত বিকল্প বাজারসমূহ ও প্রস্তাবিত নতুন বাজারসমূহ আরডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করে বাজারের তালিকায় সংযোজন- বিয়োজন করে বাস্তবায়নযোগ্য বাজারের তালিকা সংশোধন করা প্রয়োজন। এছাড়া, আউটসোর্সিং খাতে নিয়োগকৃত জনবলের বেতন ভাতাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য আরডিপিপি'তে যে অর্থের সংস্থান আছে প্রকল্পের মেয়াদ ৩ (তিন) বছর বৃদ্ধি পাওয়ায় তা দ্বারা উক্ত ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হবে না। সেই কারণে আউটসোর্সিং খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য আন্তঃখাত সমন্বয় করা প্রয়োজন। - আন্তঃখাত সমন্বয় এর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে/হচ্ছে।

প্রকল্প অফিসের কার্যবিবরণী

৩.১৩ লগফ্রেমের আলোকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন বিশ্লেষণ

প্রকল্পের এ পর্যায়ে, সম্পাদিত কার্যাবলীর আলোকে উদ্দেশ্য অর্জন কতটুকু হয়েছে, তা মূল্যায়ন করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
লক্ষ্য (Goal)			
গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রবিদ্ধির হার ত্বরান্বিত করে দারিদ্র হ্রাসকরণ।	- গ্রামীণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি। - গ্রামীণ জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি।	- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। - পরিকল্পনা কমিশনের (GED) রিপোর্ট ইমপেক্ট স্টাডি।	
পর্যালোচনাঃ গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রবিদ্ধির হার ত্বরান্বিত করে দারিদ্র হ্রাসকরণের লক্ষ্যে সমগ্র দেশে গ্রামীণ পর্যায়ে বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। মূলত: এসকল মার্কেটের নিচ তলায় চারদিকে খোলা থাকবে এবং উক্ত স্থানে শাকসবজি, মাছ, মাংস তরিতরকারী বিক্রেতাদের বসার স্থান করা হচ্ছে। দোতালায় মহিলাদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য ২০% দোকান বরাদ্দ দেয়া হবে। অবশিষ্ট দোকানগুলো মুদি ও মনিহারী ব্যবসার জন্য বরাদ্দ দেয়া হবে। অতএব নির্মিত মার্কেটের দোকানগুলো নীতিমালা অনুযায়ী যথাযথ ভাবে বরাদ্দ হলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রবিদ্ধির হার ত্বরান্বিত হবে।	পর্যালোচনাঃ বাংলাদেশ দ্রুত অগ্রসরমান একটি উন্নয়নশীল দেশ। গত এক দশকে বাংলাদেশ সেন্ট্রাফজনক অগ্রগতি অর্জন করেছে। গ্রামীণ বাজার অবকাঠামোর ভৌত সুবিধা প্রদান করা হলে কৃষি ও অকৃষি পণ্য সহজতর বাজার জাতের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষক প্রতিযোগীতা মূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করতে পারবে, ফলে গ্রামীণ জনগণের মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পাবে এবং ভোক্তারাও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহজে ন্যায্য মূল্যে ক্রয়ের সুবিধা পাবে। অধিকন্তু স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	পর্যালোচনাঃ সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, যাচাইয়ের মাধ্যম হিসেবে যে উপাদানগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক আছে।	
উদ্দেশ্য (Purpose)			
- গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাতের সুবিধা প্রদান; - গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি; এবং - স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	- উৎপাদন ও ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি। - কৃষি অকৃষি পণ্যের অপচয় রোধ। - উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি।	- খানা জরীপ - প্রকল্প এলাকায় বিশেষ জরীপ	- স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও সহযোগিতা। - স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ।
পর্যালোচনাঃ গ্রামীণ বাজার অবকাঠামোর ভৌত সুবিধা প্রদান	পর্যালোচনাঃ প্রকল্পের অধীনে নির্মিত মার্কেটগুলো চালু হলে একদিকে যেমন স্থানীয় কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ তাদের উৎপাদিত কৃষি অকৃষি	পর্যালোচনাঃ সরেজমিন পরিদর্শন ও খানা জরিপের মাধ্যমে দেখা যায়, যাচাইয়ের মাধ্যম হিসেবে যে উপাদানগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক	পর্যালোচনাঃ গুরুত্বপূর্ণ অনুমান হিসেবে উপরোক্ত উপাদানগুলি সঠিক পরিলক্ষিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
করা হলে কৃষি ও অকৃষি পণ্য সহজতর বাজার জাতের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষক প্রতিযোগীতা মূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করতে পারবে; ■ যেহেতু মার্কেটের নিচ তলায় চারদিকে খোলা রয়েছে এবং উক্ত স্থানে শাকসবজি, মাছ, মাংস তরিতরকারী বিক্রেতাদের বসার স্থান করা হয়েছে/হচ্ছে। নীতিমালা অনুযায়ী দোতলায় মহিলাদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য দোকান বরাদ্দসহ মুদি ও মনিহারী ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হলে গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ■ অধিকন্তু স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	পণ্য সামগ্রী সহজে বাজারজাত করতে পারবে এবং ভোক্তা সাধারণ সহজে ন্যায্য মূল্যে হাতের নাগালে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারবে তখন বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর অপচয় রোধ হবে।	আছে।	
আউটপুট			
■ উন্নত বিপণন পরিবেশ সম্পন্ন গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো।	জুন ২০২২ এর মধ্যে ■ ৫০৭ টি গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন (প্রতি তলা ৩০০০-১০০০০ বর্গফুট)	■ প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সংরক্ষিত তথ্য ও প্রতিবেদন। ■ অডিট রিপোর্ট। ■ প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন। ■ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন। ■ আইএমইডির প্রতিবেদন।	■ অগ্রগতির সমানুপাতে অর্থ প্রাপ্তি। ■ স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা। ■ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ■ স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ।
পর্যালোচনাঃ প্রকল্পের প্রধান কাজ হচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামীণ পর্যায়ে বাজার অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে উন্নত বিপণন পরিবেশ সৃষ্টি করা। যেখানে সপ্তাহে অন্তত ১দিন হাট বসে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র	পর্যালোচনাঃ আউটপুটের বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক কলামে দেখা যায় ২০২২ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রকল্পের মোট ৫০৭টি বাজার নির্মাণের কথা		

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
পাওয়া যায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো সেসকল স্থানকে বাজার অবকাঠামো নির্মাণের জন্য গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।	বাস্তবে মে ২০২৩ পর্যন্ত ৫০৭টি বাজারের মধ্যে ৮৭টি বাজার অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তন্মধ্যে ২৮টি অবকাঠামো হস্তান্তর করা হয়েছে, ১৯১টি অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। অর্থাৎ আউটপুটের বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক কলামের সূচকটি ২০২২ সঠিক ছিলনা। এ'পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি মে-২৩ পর্যন্ত ৫৫৭১৭.৬২৭ লক্ষ টাকা বা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৩২.৯২% শতাংশ এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৭%।	পর্যালোচনাঃ যাচাইয়ের মাধ্যম হিসেবে প্রকল্পের নথি, আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন তথ্যাদি এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করে যাচাই করা হয়েছে।	পর্যালোচনাঃ গুরুত্বপূর্ণ অনুমান হিসেবে উপরোক্ত উপাদানগুলি সঠিক পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে প্রকল্পটির শুরুতে এবং কোভিড কালীন সময়ে সঠিক সময়ে প্রকল্পের বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
ইনপুট			
- ভূমি। - লোকবল। - পূর্ত কাজ।	- ভূমি ১ একর- ১.০০ কোটি। - লোকবল- (১১৩ কনসালটেন্ট আউটসোর্সিংসহ) জন। - পূর্ত কাজ- ৫০৭ টি মার্কেট ১৫২১০০,০০ লক্ষ টাকা।	- এডিপিতে আর্থিক সংস্থান বিভাজন অনুযায়ী জিও প্রদান। - প্রকল্প পরিচালকের রেকর্ড ও তথ্য। - অডিট ও আইএমইডির রিপোর্ট। - জেলা পর্যায়ে তথ্য ও ভূমি অধিগ্রহণের রেকর্ড।	- যথা সময়ে জনবল নিয়োগ। - প্রয়োজন মাফিক অর্থ প্রাপ্তি। - যথা সময়ে ভূমি প্রাপ্তি।
পর্যালোচনাঃ প্রকল্পের মার্কেট নির্মাণের জন্য কোন ভূমি ক্রয়ের প্রয়োজন হয়নি। ১১৩জন (কনসালটেন্ট আউটসোর্সিংসহ) লোকবলের মধ্যে ১১২ জন নিয়োগ করা হয়েছে, হিসাব রক্ষক পদটি শূণ্য অবস্থায় আছে। পূর্ত কাজ চলমান রয়েছে।	পর্যালোচনাঃ প্রকল্পের অধীনে মার্কেট নির্মাণে কোন ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নেই, অবকাঠামোগুলো সম্পূর্ণ সরকারি খাস জমিতে নির্মিত হচ্ছে। প্রকল্পের ৫০৭টি বাজারের মধ্যে ৮৭টি বাজার অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তন্মধ্যে ২৮টি অবকাঠামো হস্তান্তর করা হয়েছে, ১৯১টি অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং বিভিন্ন জটিলতার কারণে ৭৭টি অবকাঠামো নির্মাণ করা যাচ্ছে না।	পর্যালোচনাঃ যাচাইয়ের মাধ্যম হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের রেকর্ড ও ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করা যাচাই করা হয়েছে।	পর্যালোচনাঃ গুরুত্বপূর্ণ অনুমান হিসেবে উপরোক্ত উপাদানগুলির কথা বলা হয়েছে, বাস্তবে কোভিড কালীন সময়ে সঠিক সময়ে প্রকল্পের বরাদ্দ পাওয়া যায়নি এবং সঠিক সময়ে আরডিপিপি অনুমোদন হলেও প্রকল্পের অধীনে ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা ও মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নির্মাণ কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

৩.১৪ প্রকল্প পরিচালনা কাঠামো ও লোকবল

৩.১৪.১ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প পরিচালনা, বাস্তবায়ন ও প্রকল্প পরবর্তী দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মহোদয়'কে সভাপতি করে ১৪ সদস্যের একটি 'প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)' গঠন করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে অধ্যাবদি পর্যন্ত ২ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। বিস্তারিত নিম্নের সারণি ৩.১০ ও ৩.১১'এ দেওয়া হলো-

সারণি ৩.১০: প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত)

প্রকল্প পরিচালক	পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/ অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
জনাব মোঃ শাহ আলমগীর	প্রকল্প পরিচালক	১৮/০২/২০১৮খ্রিঃ হতে ২৩/০৮/২১খ্রিঃ	নিয়মিত	না	-
জনাব স্বপন কান্তি পাল	প্রকল্প পরিচালক	২৩/০৮/২০২১খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি	নিয়মিত	না	-

তথ্যসূত্রঃ প্রকল্প অফিস

প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে একটি টিম করা হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প পরিচালক, উপপ্রকল্প পরিচালকসহ নিম্নবর্ণিত মোট ১৮টি পদে জনবল নিয়োগের প্রবিশন রয়েছে, তন্মধ্যে হিসাব রক্ষক ব্যতীত ১৭ জন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। হিসাব রক্ষকের পদটি শূণ্য অবস্থায় আছে। নিম্নবর্ণিত জনবল সরকারি বিধি ও শর্ত মোতাবেক বেতন ভাতা পাবেন। প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ বেতন ও ভাতাদি আহরণ করবেন। প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মচারীগণের বেতন ভাতা, সরবরাহ ও সেবা ইত্যাদি খরচের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন। টিমটির গঠন নিম্নরূপঃ

সারণি ৩.১১ প্রকল্পের অধীনে নিয়োগকৃত জনবলের তালিকা

ক্রমিক নং	পদের নাম ও গ্রেড	ডিপিপি মোতাবেক পদের সংখ্যা	নিয়োগের ধরণ	নিয়োগকৃত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড-৪)	০১ (এক)	প্রেষণে	০১ (এক)	--	--
২.	উপ- প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড-৫)	০১ (এক)	প্রেষণে	০১ (এক)	--	--
৩.	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী (গ্রেড-৬)	০১ (এক)	প্রেষণে	০১ (এক)	--	--
৪.	সহকারী প্রকৌশলী (গ্রেড-৯)	০২ (দুই)	প্রেষণে/আউটসোর্সিং	০২ (দুই)	--	--
৫.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (গ্রেড-১০)	০৪ (চার)	প্রেষণে/আউটসোর্সিং	০৪ (চার)	--	--
৬.	হিসাবরক্ষক (গ্রেড-১১)	০১ (এক)	প্রেষণে	--	০১ (এক)	--
৭.	হিসাব সহকারী (গ্রেড-১৬)	০১ (এক)	প্রেষণে/আউটসোর্সিং	০১ (এক)	--	--
৮.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬)	০৩ (তিন)	প্রেষণে/আউটসোর্সিং	০৩ (তিন)	--	--
৯.	ড্রাইভার (গ্রেড-১৬)	০২ (দুই)	আউটসোর্সিং	০২ (দুই)	--	--
১০.	অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)	০২ (দুই)	আউটসোর্সিং	০২ (দুই)	--	--
মোটঃ		১৮ (আঠারো)			১৭ (সতেরো)	--

তথ্য সূত্রঃ ডিপিপি ও প্রকল্প অফিসের তথ্য

৩.১৫ বাহ্যিক অডিট পর্যালোচনা

সমীক্ষা টীম কর্তৃক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাহ্যিক অডিট পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকল্প শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ৬ (ছয়) অর্থবছর অতিবাহিত হচ্ছে তন্মধ্যে ১ (এক) অর্থবছরে বাহ্যিক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, মোট ৪ (চার) টি অডিট আপত্তি হয়েছে; তন্মধ্যে ০৪ (চার) টি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রকল্প অফিস কর্তৃক জবাব প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিস্তারিত সারণি-৩.১২ এ প্রদর্শিত।

সারণি ৩.১২: বাহ্যিক অডিট সংক্রান্ত বিশ্লেষণ

অডিট সম্পাদনের বছর	অডিট আপত্তির সংখ্যা	নিষ্পন্ন সংখ্যা	অডিট সংশ্লিষ্ট অর্থের পরিমাণ	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায়
২০২২-২৩	০৪	০	৫২৮,১৫৭.০০	আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রকল্প অফিস কর্তৃক জবাব প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			১৭,৮৬,৪৯২.০০	
			২১,৪০৮,৯২২.০০	
			৫৬,২০৫,৩৩০.০০	
মোট=	-	-	৭৮,১৪২,৪০৯.০০	

পর্যালোচনাঃ

বাহ্যিক নিরীক্ষা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের শুরু থেকে এপর্যন্ত ১ (এক) অর্থবছরে বাহ্যিক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, ১ (এক) অর্থবছরে মোট ৪ (চার) টি অডিট আপত্তি হয়েছে; তন্মধ্যে ০৪ (চার) টি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রকল্প অফিস কর্তৃক জবাব প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে। নিম্নে সারণি ৩.১৩: নিরীক্ষা অফিসের উত্থাপিত আপত্তি ও প্রকল্প অফিস কর্তৃক আপত্তিগুলোর জবাব সন্নিবেশ করা হলোঃ

সারণি ৩.১৩: উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি এবং নিরীক্ষিত অফিসের জবাবসমূহ

ক্রঃনং	সম্পাদনের বছর	আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির শিরোনাম ও অর্থের পরিমাণ	গৃহীত ব্যবস্থা	নিষ্পত্তির পর্যায়
০১	২০২২-২৩	৪	শিরোনামঃ ডিজাইন বহির্ভূত আইটেমে ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৫,২৮,১৫৭/- টাকা। অনিয়মের কারণঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নিয়মানুগ নিরীক্ষায় ডিজাইন বহির্ভূত আইটেমে ব্যয় করায় সরকারের ৫,২৮,১৫৭/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত নিরীক্ষায় প্রকল্পের Estimate, Design ও টেন্ডার অনুমোদন সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত ০৫টি প্যাকেজে ডিজাইন বহির্ভূত আইটেম Deep Tubwell প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করে মোট (১,১২,৮০০+ ৮০,৮৫৭+১,১২,৮০০+ ১,০৮,৯০০+১,১২,৮০০) = ৫,২৮,১৫৭/- টাকার অতিরিক্ত দরপত্র অনুমোদন করা হয়েছে। ফলে সরকারের ৫,২৮,১৫৭/-টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বাস্তবতার ভিত্তিতে Design বহির্ভূত আইটেম যোগ	আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রকল্প অফিস কর্তৃক জবাব প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে	আপত্তিটি নিষ্পন্ন হয়নি

ক্রঃনং	সম্পাদনের বছর	আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির শিরোনাম ও অর্থের পরিমাণ	গৃহীত ব্যবস্থা	নিষ্পত্তির পর্যায়
			করার কোন সুযোগ নেই। GFR-১০ মোতাবেক একদজন দূরদর্শী ব্যক্তি নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক উক্ত বিধি লংঘন করায় সরকারের ৫,২৮,১৫৭/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।		
			শিরোনামঃ রোট সিডিউল অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য প্রয়োগে সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৭,৮৬,৪৯২/- টাকা। অনিয়মের কারণঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর নিয়ন্ত্রনাধীন দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নিয়মানুগ নিরীক্ষায় রোট সিডিউল অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য প্রয়োগে সরকারের ১৭,৮৬,৪৯২/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত নিরীক্ষায় প্রকল্পের প্রাক্কলন, রোট সিডিউল ও দরপত্র অনুমোদন সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত ০১টি প্যাকেজে ২তলা ভবন নির্মাণ রোট সিডিউল অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে দরপত্র অনুমোদন করা হয়েছে PWD -২০১৮ রোট সিডিউল অনুযায়ী ৪তলা ভবনের ফাউন্ডেশন রোট প্রতি বর্গমিটারে ১০,৮৪৭/- টাকা নির্ধারিত থাকলেও বর্ণিত প্যাকেজের Foundation work কাজে প্রতি বর্গ মিটারে ১৪,১১১/- টাকা মূল্যে দরপত্র অনুমোদন করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি বর্গমিটারে (১৪,১১১-১০,৮৪৭)=৩,২৬৪/- টাকা অতিরিক্ত মূল্য যোগ করে দরপত্র অনুমোদন করা হয়েছে। GFR-১০ মোতাবেক একদজন দূরদর্শী ব্যক্তি নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক উক্ত বিধি লংঘন করায় সরকারের ১৭,৮৬,৪৯২/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।	আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রকল্প অফিস কর্তৃক জবাব প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে	আপত্তিটি নিষ্পন্ন হয়নি
			শিরোনামঃ বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ে সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২১৪০৮৯২২/- টাকা। অনিয়মের কারণঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর নিয়ন্ত্রনাধীন প্রকল্প পরিচালক, দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প কার্যালয়ে ২০২১-	আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রকল্প অফিস কর্তৃক জবাব প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে	আপত্তিটি নিষ্পন্ন হয়নি

ক্রঃনং	সম্পাদনের বছর	আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির শিরোনাম ও অর্থের পরিমাণ	গৃহীত ব্যবস্থা	নিষ্পত্তির পর্যায়
			২০২২ অর্থ বছরে বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ে সরকারের ২১৪০৮৯২২/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত নিরীক্ষায় প্রকল্পের RDPP, অগ্রগতির প্রতিবেদন, প্রাক্কলন ও টেন্ডার অনুমোদনের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত ০৩টি প্যাকেজে আরডিপিপি তে বরাদ্দকৃত প্যাকেজঃ-০১ এ ৩,৭০,০০০০০/- টাকা, প্যাকেজ নং-০২ এ ৮,২৩,০০,০০০/-টাকা এবং প্যাকেজ নং-০৩ এ ৩,০০,০০,০০০/- টাকার পরিবর্তে ৪,২৫,৬৫,৫১২/-টাকা, ৮,৯৪,০৯,৪৫২/-টাকা ও ৩,৮৭,৩৩,৯৫৮/- টাকার দরপত্র অনুমোদন করায় বরাদ্দের অতিরিক্ত মোট(৫৫,৬৫,৫১২+ ৭১,০৯,৪৫২+ ৮৭,৩৩,৯৫৮) =২,১৪,০৮,৯২২/- টাকা অনুমোদন করা হয়েছে আরডিপিপিতে বরাদ্দ সমূহ একনেক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় উক্ত অনুমোদিত বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থে দরপত্র অনুমোদনের সুযোগ নেই। কিন্তু প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক RDPP'র নির্দেশনা লংঘন করায় সরকারের ২১৪০৮৯২২/-টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।		
			শিরোনামঃ প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ জ্ঞাপন ব্যতিরেকে বারংবার চুক্তি নবায়নপূর্বক ৫,৬২,০৫,৩৩০/- টাকার বিল পরিশোধ। অনিয়মের কারণঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর নিয়ন্ত্রনাধীন দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ জ্ঞাপন ব্যতিরেকে বারংবার চুক্তি নবায়নপূর্বক ৫,৬২,০৫,৩৩০/- টাকার বিল পরিশোধ। বিস্তারিত নিরীক্ষায় Consultancy নথি যাচাই কালে দেখা যায় যে, দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পে ২০১৮-২০১৯ আর্থিক সনে ১২ জন Individual Consultant নিয়োগের জন্য ২,৬৮,৮১,৩৯০/- টাকা চুক্তি মূল্যে ২ বছরের জন্য(০১/০৭/২০১৮-৩০/৬/২০২০) নিয়োগ প্রদান করা হয় চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ জ্ঞাপন ব্যতিরেকে প্রকল্প পরিচালক পুনরায় ২০২০-২০২১ আর্থিক সনে ১,৫২,০০,৯৪০/- টাকা, ২০২১-২০২২ আর্থিক সনে ১,৪১,২৩,০০০/-টাকা চুক্তি নবায়নের নামে বিল পরিশোধ করেন। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১০৪(ঘ)(৮)এবং ৭৪	আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রকল্প অফিস কর্তৃক জবাব প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে	আপত্তিটি নিষ্পন্ন হয়নি

ক্রঃনং	সম্পাদনের বছর	আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির শিরোনাম ও অর্থের পরিমাণ	গৃহীত ব্যবস্থা	নিষ্পত্তির পর্যায়
			(৪) মোতাবেক চুক্তি চলাকালীন সময়ে প্রয়োজনে চুক্তি মূল্যের ১৫% হতে ৫০% পর্যন্ত Variation করার বিধান রয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক চুক্তি শেষ হওয়ার পর বারংবার চুক্তি নবায়নের নামে বিল পরিশোধ করেন যা পিপিআর-২০০৮ এর বর্ণনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ এখতিয়ার বহির্ভূত।		

৩.১৫.১ প্রকল্পের টেকসই পরিকল্পনা

প্রকল্পের আওতায় বাজারের অবকাঠামো উন্নয়নের পর সরকারী হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা, পদ্ধতি এবং উহা হতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালার আলোকে স্থানীয় উপজেলা পরিষদ ও ক্ষেত্র বিশেষ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে উক্ত বাজারের বাজার কমিটি প্রস্তাবিত অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় মূখ্য ভূমিকা রাখবেন। বাজারের ইজারা লব্ধ অর্থ হতে নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাজার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৫%- ২৫% অর্থ ব্যয় করার কথা, কিন্তু ডিপিপিতে নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাজার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৫%- ৪৫% অর্থ ব্যয় করা হবে বলে উল্লেখ রয়েছে, যা সংযোজন করা প্রয়োজন। উপজেলা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রস্তাবিত হাটের নবনির্মিত ভবনের বিভিন্ন অংশের ইজারা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রদান করবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রকল্পের প্রায় ৬ (ছয়) বছর অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত কোন নীতিমালা প্রস্তুত হয়নি বিধায় প্রকল্পের নির্মিত মার্কেটগুলো চালু করা যাচ্ছে না। যথা শিঘ্রই নীতিমালা প্রস্তুতপূর্বক নির্মিত বাজারের দোকানগুলো বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন।

অংশ খঃ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্যসমূহের ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

৩.১৬ খানা পর্যায়ে প্রকল্পের সম্ভাব্য উপকারভোগীদের জরিপের ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

৩.১৬.১ আর্থ-সামাজিক বিষয়ক তথ্যাদি

৩.১৬.১.১ উত্তরদাতাদের বয়স সংক্রান্ত তথ্য

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মূল্যায়নে প্রকল্প এলাকা থেকে মোট ১৬৬৬ জন সুবিধাভোগীদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (২৭.৯%) যাদের বয়স ৪০-৪৯ বছর, ২৭.১% যাদের বয়স ৩০-৩৯ বছর, ২২.১% যাদের বয়স ৫০-৫৯ বছর, ৬০ বছরের বেশি বয়সের ৮% এবং ৩০ এর কম বয়স রয়েছে এমন উত্তরদাতা ১৪.৯%।

সারণি ৩.১৬.১.১: উত্তরদাতাদের বয়স সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

শ্রেণী	সংখ্যা	শতকরা
<৩০	২৪৮	১৪.৯
৩০-৩৯	৪৫১	২৭.১
৪০-৪৯	৪৬৪	২৭.৯
৫০-৫৯	৩৬৯	২২.১
৬০+	১৩৪	৮.০
মোট	১৬৬৬	১০০.০

৩.১৬.১.২ উত্তরদাতাদের পেশার পর্যালোচনা

প্রকল্পের সুফলভোগীগণের পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায় ৮০.৪% ব্যবসায়ী, ৩.৭% চাকুরী করেন, ০.৬% পেশাজীবী (ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি), ১.৪% ক্ষুদ্র ব্যবসা কুটির শিল্প/সেলাই ইত্যাদি, ১.৩% ক্ষুদ্র পেশা খামারী (কামার, কুমার, জেলে) ইত্যাদি, ৫.৮% কৃষিকাজ/খামারী, ১.৯% চালক (রিম্বা/ভ্যান/ঠেলাগাড়ী) ইত্যাদি, ০.৮% গৃহস্থালি, ১.৬% ছাত্র/ছাত্রী, ১.০% দিনমজুর/শ্রমিক, ১.৭% অন্যান্য পেশায় জরতিফলে উক্ত বিশ্লেষণে সকল পেশার পেশাজীবী অংশ গ্রহন করেছে বলা যায়।

সারণি: ৩.১৬.১.২ উত্তরদাতাদের পেশা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

শ্রেণী	সংখ্যা	শতকরা
চাকুরী	৬১	৩.৭
ব্যবসা	১৩৩৯	৮০.৪
পেশাজীবী (ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি)	১০	০.৬
ক্ষুদ্র ব্যবসা কুটির শিল্প/সেলাই ইত্যাদি	২৩	১.৪
ক্ষুদ্র পেশা খামারী (কামার, কুমার, জেলে) ইত্যাদি	২১	১.৩
কৃষিকাজ/খামারী	৯৬	৫.৮
চালক (রিম্বা/ভ্যান/ঠেলাগাড়ী) ইত্যাদি	৩১	১.৯
গৃহস্থালি	১৪	০.৮
ছাত্র/ছাত্রী	২৭	১.৬
দিনমজুর/শ্রমিক	১৬	১.০
অন্যান্য	২৮	১.৭
মোট	১৬৬৬	১০০.০

৩.১৬.২ বাজার সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা

৩.১৬.২.১ সুফলভোগীদের বাজারের অবকাঠামো নির্মাণ বিষয়ে অবগত এবং স্থান নির্বাচন বিষয়ের মতামত পর্যালোচনা।

প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৮বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৯২টি উপজেলার ৫০৭টি বাজারের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন/বাস্তবায়িত থাকায়, যে সকল জেলা ও উপজেলায় ইতিমধ্যে বাজারের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, সে সকল বাজার থেকে দ্বৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে ৩২টি জেলা এবং ৯৮টি উপজেলায় সমীক্ষা কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। সমীক্ষাভুক্ত এলাকার সুবিধাভোগীদের কাছে দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাজারের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে/হচ্ছে সে বিষয়ে তারা কিছু জানেন কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায়, ১০০% উত্তরদাতা জানিয়েছেন তারা বাজারের অবকাঠামো নির্মাণ বিষয়ে অবগত আছেন। অন্যদিকে অবকাঠামোটি যথাস্থানে নির্মাণ করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা এমন উত্তরেও দেখা যায় ১০০% সুবিধাভোগী বলেন বাজারের অবকাঠামো নির্মাণের স্থান নির্বাচন সঠিক হয়েছে।


সারণি ৩.১৬.২.১: বাজারের অবকাঠামো নির্মাণ বিষয়ে অবগত এবং স্থান নির্বাচন বিষয়ে সুফলভোগীদের মতামত বিশ্লেষণ।

বাজারের অবকাঠামো নির্মাণ বিষয়ে অবগত সংক্রান্ত তথ্য	শতকরা
হ্যাঁ	১০০
না	০.০
মোট	১০০
অবকাঠামোটি যথাস্থানে নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যের মতামত	শতকরা
হ্যাঁ	১০০
না	০.০
মোট	১০০

৩.১৬.২.২ বাজারের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে পূর্বের তুলনায় মাসিক গড় আয় বৃদ্ধি বিষয়ক মতামত পর্যালোচনা।

বাজারের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে মাসিক গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে বা পাবে কিনা এমন উত্তরে সুফলভোগীগণ জানিয়েছেন, ৬০.৮% তাদের মাসিক গড় আয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে এবং ৩৮.২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন তাদের আয় বৃদ্ধি পায়নি/পাবে না, অন্যদিকে ১% উত্তরদাতা কোন মতামত প্রকাশ করেননি বা জানেন না বলে মতামত প্রকাশ করেন।

লেখচিত্র ৩.১৬.২.১: বাজারের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে পূর্বের তুলনায় মাসিক গড় আয় বৃদ্ধি বিষয়ক মতামত বিশ্লেষণ।

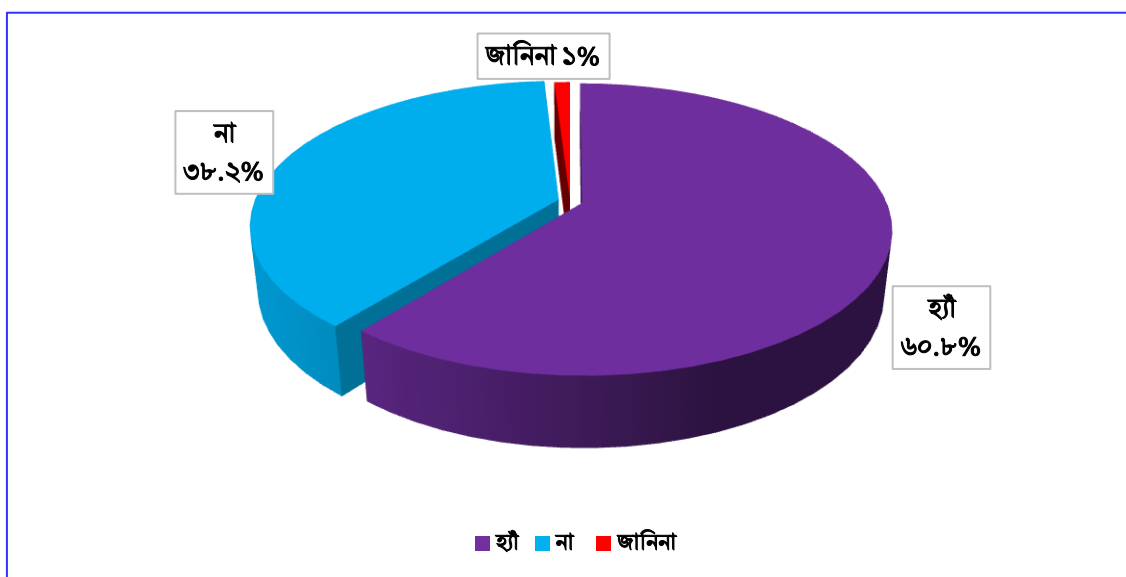

৩.১৬.২.৩ বাজারে নির্মিত অবকাঠামোর ভিতরের স্পেস ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদী বিষয়ক মতামত পর্যালোচনা

বাজারে নির্মিত অবকাঠামো/বিল্ডিংয়ের ভিতরের স্পেস ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদী বিষয়ে ৬৩.৬% উত্তরদাতা জানিয়েছেন বিল্ডিংয়ের ভিতরের স্পেস ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদী খুবই ভালো, ৩৪.৫% জানিয়েছেন ভালো এবং ১.৫% উত্তরদাতা বলেন মোটামুটি ভালো।

সারণি ৩.১৬.২.২: বাজারে নির্মিত অবকাঠামোর ভিতরের স্পেস ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদী বিষয়ক মতামত বিশ্লেষণ।

বিল্ডিংয়ের ভিতরের স্পেস ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদী মতামত	সংখ্যা	শতকরা
খুবই ভালো	৩৭৬	৬৩.৬
ভালো	২০৪	৩৪.৫
মোটামুটি	১১	১.৯
মোট	৫৯১	১০০

৩.১৬.২.৪ দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো নির্মাণে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা বিষয়ক মতামত পর্যালোচনা

বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা তৈরি হয়েছে বা হবে এমন প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় ১০০% সুফলভোগী জানিয়েছেন নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য সুলভ মূল্য পাওয়া যাবে, ৭৬.৭০% উপকারভোগী মনে করেন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে, ৭৭.৮০% সুবিধাভোগী মনে করেন ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি হয়েছে/হবে, ৮৩% সুবিধাভোগী জানিয়েছেন প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করতে পারবে, ১০০% উত্তরদাতা জানিয়েছেন তাদের উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা সম্ভব হবে।


৩.১৬.২.৩ সারণি: দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো নির্মাণে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা বিষয়ক মতামত বিশ্লেষণ।

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো নির্মাণে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা বিষয়ক তথ্য	শতকরা
নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য সুলভ মূল্য পাওয়া যাবে	১০০
কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে	৭৬.৭০
ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি হবে	৭৭.৮০
প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করতে পারবে	৮৩
উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা সম্ভব হবে	১০০
(একাদিক উত্তর) মোট	১০০

৩.১৬.২.৫ দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো নির্মাণের পূর্বে কৃষকের উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্য সামগ্রী বিক্রয় বিষয়ক মতামত পর্যালোচনা।

বাজারের অবকাঠামোটি নির্মাণের পূর্বে কৃষক তার উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্যগুলো কিভাবে বাজারজাত করত এমন উত্তরে দেখা যায়, ৬৬.৭০% উত্তরদাতা বলেন বাহিরে খোলা আকঁশের নিচে বসে বিক্রি করা হত, ৭৭.৫০% সুবিধাভোগী জানান অস্থায়ী দোকান ছিল এবং ২৫.৫০% সুবিধাভোগী জানান রাস্তার পাশে বসে কৃষি ও অকৃষি পণ্যগুলো বাজারজাত করা হতো।


লেখচিত্র-৩.১৬.২.২: দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো নির্মাণের পূর্বে কৃষকের উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্য সামগ্রী বিক্রয় বিষয়ক মতামত বিশ্লেষণ।

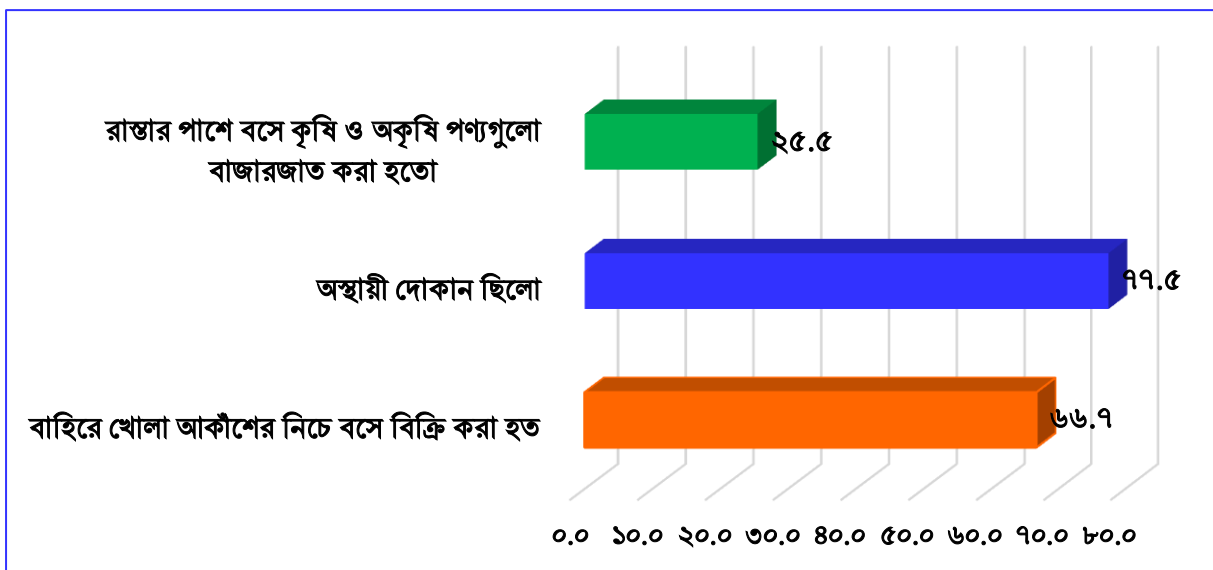

৩.১৬.২.৬ নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা বিষয়ক মতামত পর্যালোচনা

নির্মিত অবকাঠামোটির বর্তমান অবস্থা কেমন এমন প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায়, ৯৭.১ উত্তরদাতা জানিয়েছেন বর্তমানে অবকাঠামোটিতে বাজার বসার উপযুক্ত, অন্যদিকে ২.৯০% উত্তরদাতা মনে করেন অবকাঠামোটির নির্মাণ কাজে কিছু ত্রুটি রয়েছে যা মেরামত করা প্রয়োজন। কাজেই এখানে প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল বাজারের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, সে সকল বাজার দ্রুত বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন।

লেখচিত্র ৩.১৬.২.৩: নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হওয়া দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা বিষয়ক মতামত বিশ্লেষণ

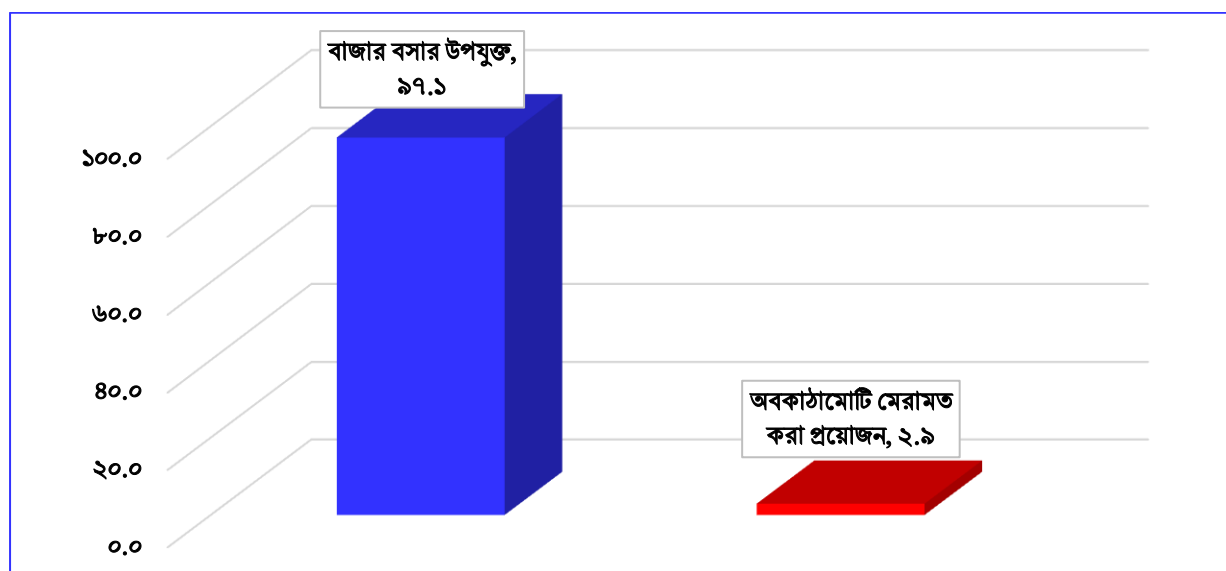

৩.১৬.২.৭ বাজারের অবকাঠামো নির্মাণে স্থানীয় কোন পক্ষ দ্বারা বাধাগ্রস্ত বিষয়ক মতামত পর্যালোচনা

বাজারের অবকাঠামো নির্মাণে স্থানীয় কোন পক্ষ দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছে/হচ্ছে কিনা এমন উত্তরে ৯৮.৯% উত্তরদাতা বলেন কোন বাধাগ্রস্ত হয়নি এবং ১.১% সুবিধাভোগী বলেন বাধাগ্রস্ত হয়েছে/হচ্ছে। যারা হ্যাঁ বলেছেন, তারা মনে

করেন স্থানীয় কিছু অসাধু ব্যক্তি নিজ নামে সরকারি জমি ভুয়া দলিল করে নিয়ে সেখানে স্থাপনা করেছেন, তাই এখন জমি ছাড়তে চাচ্ছেনা, মামলা সংক্রান্ত জটিলতাসহ বিভিন্ন ধরনের বাঁধা সৃষ্টি হচ্ছে।

সারণি ৩.১৬.২.৪: বাজারের অবকাঠামো নির্মাণে স্থানীয় কোন পক্ষ দ্বারা বাধাগ্রস্ত বিষয়ক মতামত বিশ্লেষণ

অবকাঠামো নির্মাণে স্থানীয় কোন পক্ষ দ্বারা বাধাগ্রস্ত বিষয়ে মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৮	১.১
না	১৬৪৮	৯৮.৯
মোট	১৬৬৬	১০০

৩.১৬.২.৮ বাজারের নতুন অবকাঠামোটি নির্মাণের পর/নির্মিত হলে স্থানীয় কৃষকগণ প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করতে পারছেন/পারবেন কিনা এ সংক্রান্ত পর্যালোচনা

স্থানীয় কৃষকগণের মতামত পর্যালোচনা করে দেখা যায় বাজারের নতুন অবকাঠামোটি নির্মাণের পর/নির্মিত হলে অত্র এলাকার স্থানীয় কৃষকগণ প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করতে পারছেন/পারবেন বলে ৯৯.১% মত প্রকাশ করেন, ০.৯% মনে করেন প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করতে পারবেন না। সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে বলা যায় কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিক্রয় করতে পারছেন/পারবেন বলা যায়।

সারণি ৩.১৬.২.৫: বাজারের নতুন অবকাঠামোটি নির্মাণের পর/নির্মিত হলে স্থানীয় কৃষকগণ প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করতে পারছেন/পারবেন কিনা এ সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা

প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় বিষয়ে মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৬৬৬	১০০
না	০.০	০.০
মোট	১৬৬৬	১০০

৩.১৬.২.৯ বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের তথ্য পর্যালোচনা

বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ১০০% গ্রামীণ জনগোষ্ঠী জানান তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে। ফলে বলা যায় এ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে।

সারণি ৩.১৬.২.৬: বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বিশ্লেষণ

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বিষয়ে মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৬৬৬	১০০
না	০.০	০.০
মোট	১৬৬৬	১০০

৩.১৬.২.১০ অবকাঠামোটি নির্মাণের পূর্বে কৃষক তার উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্যগুলো কিভাবে বাজারজাত করতেন সে তথ্যের পর্যালোচনা

এই অবকাঠামোটি নির্মাণের পূর্বে কৃষক তার উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্যগুলো কিভাবে বাজারজাত করতেন এ প্রশ্নের উত্তরে ৯৯.২% উত্তরদাতা জানান অস্থায়ী দোকান করে পণ্যগুলো বাজারজাত করতেন, ০.৭% ও ০.১% বলেছেন খোলা আকৌশের নিচে ও রাস্তার পাশে কৃষি ও অকৃষি পণ্যগুলো বাজারজাত করা হতো। কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, অবকাঠামোগুলো নির্মানের পর এখন ব্যবসায়ীগণ স্থায়ীভাবে পণ্য বাজারজাত করতে পারবেন।

সারণি ৩.১৬.২.৭: অবকাঠামোটি নির্মাণের পূর্বে কৃষক তার উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্যগুলো কিভাবে বাজারজাত করতেন এ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

অবকাঠামোটি নির্মাণের পূর্বে উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাত বিষয়ে মতামত	সংখ্যা	শতকরা
বাহিরে খোলা আকীশের নিচে বসে বিক্রি করা হত	৮	০.৭
অস্থায়ী দোকান ছিলো	১০৮৪	৯৯.২
রাস্তার পাশে বসে কৃষি ও অকৃষি পণ্যগুলো বাজারজাত করা হতো	১	০.১
মোট	১০৯৩	১০০

৩.১৬.২.১১ বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি বিষয়ে পর্যালোচনা

নিম্নের সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ১০০% উত্তরদাতা মনে করেন বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে/হবে। সুতরাং বলা যায় ব্যবসায়ীদের কাছে উক্ত প্রকল্পের অবকাঠামো গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং গ্রামীণ পর্যায়ে ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

সারণি ৩.১৬.২.৮: বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ বিশ্লেষণ

ব্যবসার পরিবেশ বিষয়ে মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৬৬৬	১০০
না	০.০	০.০
মোট	১৬৬৬	১০০

৩.১৬.২.১২ বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য সুলভ মূল্য সহজলভ্য হয়েছে/হবে বিষয়ে মতামত পর্যালোচনা

মাঠ পর্যায়ের সুফলভোগীদের উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ১০০% উত্তরদাতাই মনে করেন বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য সুলভ মূল্য সহজলভ্য হয়েছে/হবে। ফলে বলা যায় এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মানের পরিবর্তন সাধিত হবে।

সারণি ৩.১৬.২.৯: বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য সুলভ মূল্য সহজলভ্য হয়েছে/হবে কি না বিশ্লেষণ

নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য সুলভ মূল্য ও সহজলভ্য বিষয়ে মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৬৬৬	১০০
না	০.০	০.০
মোট	১৬৬৬	১০০

৩.১৬.২.১৩ নির্মিত/নির্মাধীণ বাজারের সাথে জেলা, উপজেলা ও অন্যান্য ইউনিয়ন, গ্রামের যোগাযোগ মাধ্যম/ব্যবস্থার পর্যালোচনা

নিম্নের সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ৪৫.৯% উত্তরদাতা জানান অত্র বাজারের সাথে উপজেলা ও জেলা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো। ৩৯.১% বলেন অত্র বাজারের সাথে উপজেলা ও জেলা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ভালো, ৯.৮% বলেন অত্র বাজারের সাথে উপজেলা ও জেলা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামুটি। সবচেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতা জানান অত্র বাজারের সাথে উপজেলা ও জেলা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না।

সারণি ৩.১৬.২.১০ সারণিঃ বাজারের সাথে যোগাযোগ মাধ্যম/ব্যবস্থা বিষয়ক তথ্যের বিশ্লেষণ

বাজারের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিষয়ে মতামত	সংখ্যা	শতকরা
ভালো	৭৬৪	৪৫.৯
খুবই ভালো	৬৫১	৩৯.১
মোটামুটি	১৬৪	৯.৮
ভালো না	৮৭	৫.২
মোট	১৬৬৬	১০০


৩.১৬.২.১৪ বাজারের নব নির্মিত অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা বিষয়ক মতামত পর্যালোচনা

নির্মিত অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা কেমন এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় ৬২.৭% বাজারের অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ চলমান। ৩৬.৮% অবকাঠামো বাজার বসার উপযুক্ত এবং ০.৫% অবকাঠামো মেরামত করা প্রয়োজন বলে উত্তরদাতারা জানান। যেসব অবকাঠামো বাজার বসার উপযুক্ত সেগুলোতে দ্রুত সময়ে বরাদ্দ দিতে না পারলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে বলে সুবিধাভোগীগণ মনে করেন।

সারণি ৩.১৬.২.১১: নির্মিত অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা বিষয়ক মতামত বিশ্লেষণ

শ্রেণী	সংখ্যা	শতকরা
বাজার বসার উপযুক্ত	৬১৩.০০	৩৬.৮
অবকাঠামোটি মেরামত করা প্রয়োজন	৮	০.৫
এখনো নির্মাণ কাজ চলছে।	১০৪৫	৬২.৭
মোট	১৬৬৬	১০০

লেখচিত্র-৩.১৬.৪: নির্মিত মার্কেটটিতে বাজার বসার উপযুক্ত কিনা সে বিষয়ক মতামত বিশ্লেষণ

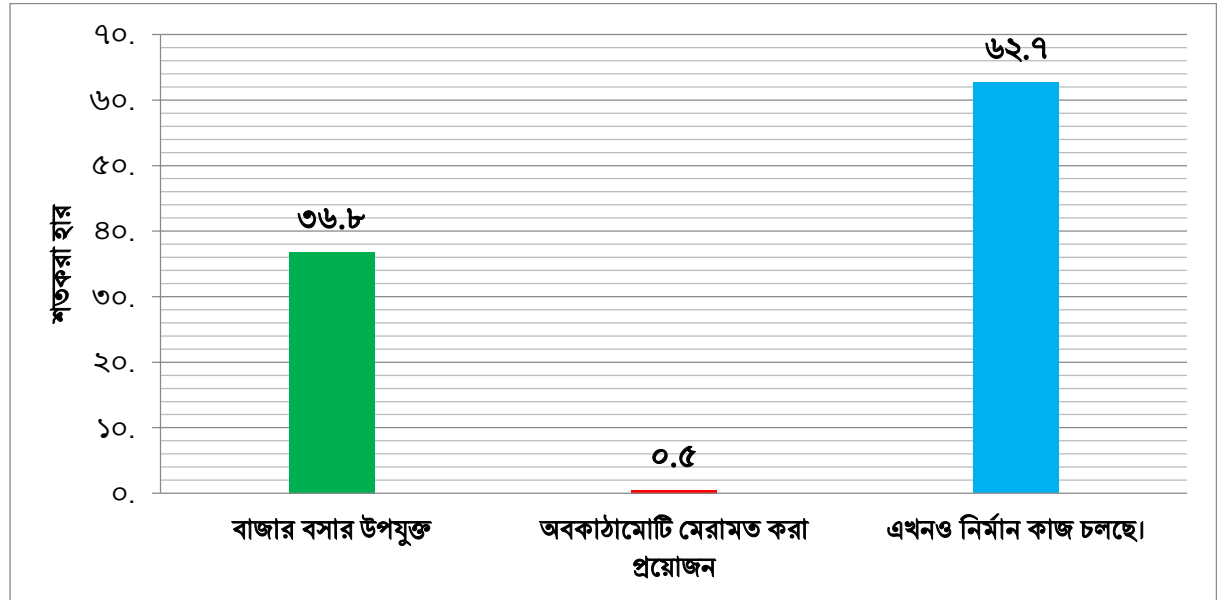

৩.১৭ স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালার ফলাফল পর্যালোচনা

গত ১৫/০৪/২০২৩ তারিখ রোজ শনিবার সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় দুপচাঁচিয়া উপজেলায়, উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে (ঝুমে) উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, এনডিসি, মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন, পরিচালক (যুগ্মসচিব), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। জনাব মোঃ নাজমুল হুসেইন খাঁন, উপপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। জনাব স্বপন কান্তি পাল, প্রকল্প পরিচালক, দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া ও জনাব মোঃ ফজলুল হক প্রামানিক, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া। কর্মশালায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সুমন জিহাদী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দুপচাঁচিয়া উপজেলা, বগুড়া। সভায় উপপরিচালক মহোদয়ের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এম এস ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস্ লিঃ এর সমীক্ষা টিম লিডার প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রমের উপর গৃহীত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পর্কে উপস্থাপন করেন। পরবর্তিতে সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মধ্যে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে গঠন মূলক আলোচনা ও মতামত প্রদান করা হয়। উক্ত কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ফলাফলসমূহ তুলে ধরা হলোঃ



চিত্র-৩.১৩: স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা, দুপচাঁচিয়া উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষ, বগুড়া, ১৫.০৪.২৩ খ্রি.

ফলাফলসমূহঃ

- কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পের অধীনে বাজার অবকাঠামো নির্মাণ হওয়ার/বাস্তায়ন হওয়ার কারণে স্থানীয় ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, কৃষক ও ভোক্তা সাধারণের অনেক উপকার হয়েছে/হবে। প্রকল্পটি অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করার জন্য তাঁরা বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও জানান যে, সমগ্র দেশে বাজার অবকাঠামো নির্মাণের ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, কৃষকগণের আয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে। সভায় উপস্থিত বেশিরভাগই জানান, বাজার অবকাঠামো নির্মাণ কাজের গুণগতমান ভাল হয়েছে এবং নির্মাণ কাজের তদারকি যথাযথ হয়েছে, তবে ভবিষ্যতে বাজারটি যাতে রক্ষণাবেক্ষণ সঠিকভাবে হয় সেদিকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে গুরুত্ব দিতে হবে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন।
- কর্মশালায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ জানান, বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে এবং হাটবাজার রয়েছে এগুলো পরিবেশ রক্ষা করে যাতে ব্যবসা পরিচালনা করা হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসমে সাধারণ মানুষের বাজার করতে বিব্রান্তি সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। যে স্থানে বাজার

অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে/হচ্ছে সেখানে যাতে রাস্তা-ঘাটের সমস্যা না থাকে। ফলে দেশবাসী ও সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে।

- গণমাধ্যম কর্মীগণ জানান, যেখানে বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে/হচ্ছে, সেখানে পূর্বের স্থাপনাসমূহ রয়ে গেছে, তা যদি অপসারণ না করা হয় তাহলে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ব্যবসা করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। গ্রামকে শহরে পরিনত করার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি হবে। অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ করার জন্য লোক নিয়োগ দিতে হবে।
- সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ জানান, উপজেলায় খোলা আকাশের নিচে, রাস্তার পাশে বাজার বসে, সাধারণ মানুষ অনেক কষ্ট ও ঝুঁকি নিয়ে সেখানে বাজার করতে যায়। দুপচাঁচিয়া উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এর পাশে একটি খাঁলি জায়গা রয়েছে সেখানে বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা হলে উপজেলা ও সদর ইউনিয়নের সাধারণ মানুষ ঝুঁকি এড়িয়ে বাজার করতে পারবে ও কৃষকগণও অনেক উপকৃত হবে।
- তালুছ বাজার নির্মাণ হওয়ায় প্রায় ২৬টি গ্রামের কৃষক তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাত করতে পারবে। এই বাজার নির্মাণের মাধ্যমে ভোক্তারা ন্যায্য মূল্যে সরাসরি কৃষক থেকে পণ্য ক্রয় করতে পারবে। এছাড়াও বাজারকে কেন্দ্র করে কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে।
- সমাজসেবা কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজের জনগণ জানান, বাজার বাস্তবায়নের পর ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী শৃঙ্খল ভাবে কেনাকাটা করতে পারবে। তবে স্কুল/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্নে যাতে এই ধরনের বাজার নির্মাণ না করা হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন বাজার থাকলে সকল ধরনের ক্রেতা বিক্রেতাদের সমাগমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ও পরিবেশগত সমস্যা হতে পারে।
- উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ জানান, বাজার নির্মাণের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অনেক বড় ভূমিকা রাখবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলায় প্রয়োজনীয় বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা যায়, তাহলে দেশের ৬৪টি জেলার কৃষক ও ভোক্তারা খুব সহজে বেচা-কেনা করতে পারবে একই সাথে জিডিপি-তেও অনেক ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। বিশেষ করে স্থানীয় কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।
- ব্যবসায়ীগণ জানান, নির্মিত বাজারের দোকানসমূহ কিভাবে বরাদ্দ দেয়া হবে, কাদেরকে এখানে অগ্রাধিকার দেয়া হবে, কি ধরনের দোকানপাট এখানে অগ্রাধিকার পাবে সে বিষয়ে স্পষ্ট নীতিমালা তৈরি করে দ্রুত বাজারের দোকানগুলো বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সাধারণ ব্যবসায়ীদের নীতিমালা বিষয়ে অবগত করতে হবে।

৩.১৮ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII)

প্রকল্পের গুরুত্ব পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রদানকারী জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলীগণের সাথে নিবিড় সাক্ষাতকার পরিচালনা করা হয়েছে। নিবিড় আলোচনা সাক্ষাৎকার থেকে পাওয়া তথ্যসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।



চিত্র-৩.১৪: কেআইআই সাক্ষাৎকার, প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ

কেআইআই হতে প্রাপ্ত সারাংশ

- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী ও উপজেলা প্রকৌশলীগণের কাছে গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়নের যৌক্তিকতা, উপযোগিতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তারা জানান, এক সময় খোলা আকাশের নিচে ত্রিপুর টানিয়ে ব্যবসায়ীগণ তাদের পরিচালনা করত। সামান্য বৃষ্টিপাত ও ঝড়ে ব্যাপক সমস্যায় পড়ে যেতো। এমন আধুনিক সুবিধাসমৃদ্ধ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে ব্যবসায়ীরা অনেক সুবিধা পাবে।
- বাজার অবকাঠামোর নির্মাণের ফলে কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আয় বৃদ্ধি পাবে, জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হবে ফলে বেকারত্ব হ্রাস পাবে। পাশাপাশি স্থানীয় কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী সহজে ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করে লাভবান হতে পারবে।
- বাজারজাতকরণ সহজ হওয়ার ফলে কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ কমবে, ভোক্তাগণও সুলভ মূল্যে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করতে সক্ষম হবে।
- প্রকল্পের স্থাপনাসমূহ টেকসইকরণ স্থাপনাসমূহের যথাযথ ব্যবহার বিষয়ে প্রকৌশলীগণ জানান, যে সকল অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে এমন মার্কেট ভবনগুলো দ্রুত সময়ে হস্তান্তরের ব্যবস্থা ও বরাদ্দ দেওয়া হলে জনগণ সুফল পাবে, বরাদ্দের ক্ষেত্রে বেকার ও গরীব লোকদেরকে অগ্রাধিকার দিলে প্রকল্প ফলপ্রসূ হবে।
- প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের অধীনে ৫০৭টি বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করার কথা থাকলেও মে, ২৩ পর্যন্ত ৮৭টি বাজারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, তন্মধ্যে ২৮টি বাজার হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১৯১টি বাজার অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ভূমি ও মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ৭৭টি বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে স্থান সমস্যা জনিত যে ৭৭টি বাজার নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। উক্ত বাজার নির্মাণের জন্য নতুন করে স্থান নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- প্রকল্পের অধীনে নির্মিত যে সকল বাজার ইতিমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে, কিন্তু উক্ত বাজারগুলির দোকান এখনও বরাদ্দ না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, জাতীয় সংসদে হাট বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন ২০২৩ গৃহীত হওয়ায় গত ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২৩ তারিখে গেজেট প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয়ে উক্ত আইনের বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নির্মিত ভবনের দোকানগুলো বরাদ্দের জন্য

মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় মহোদয়ের বরাবরে মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় মহোদয় একটি ডি.ও পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত ডি.ও পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাট ও বাজার স্থাপন, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান অডিন্যান্সকে আইনে রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০২২ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আইনটি ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় সংসদে আইনটি পাশ হওয়ার পর পরেই নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। নতুন বিধিমালা প্রণয়নের পূর্বে এতদসংক্রান্ত কোন পরিপত্র জারি না করে বিদ্যমান বিধি বিধান অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করাই সংগত হবে।

- তারা আরো জানান, সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে এই প্রকল্প টেকসই করা সম্ভাব্য হবে, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ জনগনের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে, প্রতিটা উপজেলায় একাধিক অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে, তারা আরো জানান, ভবনগুলোতে পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলীগণের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকারে তারা জানান, গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের যে সব বাজারগুলোর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে সে সব বাজার গুলোতে দ্রুত সময়ে বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, তা-না হলে ব্যবহার না করার ফলে ভবন গুলো নষ্ট হয়ে যাবে।
- বেকার সমস্যা সমাধানে মার্কেটের দোকান বরাদ্দের ব্যাপারে নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলীগণ বলেন বরাদ্দের ক্ষেত্রে বেকার ও গরীব লোকদেরকে অগ্রাধিকার দিলে প্রকল্প ফলপ্রসূ হবে।
- প্রকৌশলীগণ জানান প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় এবং সংগ্রহে এর প্রচলিত বিধিমালা মেনে করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে কোন সমস্যা/ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়নি।
- নির্মাণ কাজের গুণগতমান রক্ষার ক্ষেত্রে মাটি পরীক্ষা, সিলিন্ডার টেস্ট, সিমেন্ট টেস্ট, পানি টেস্ট (ডালাই এবং কিউরিং এর পানি), রড টেস্ট, কংক্রিট এর স্লাম্প টেস্ট, পাথর, বালি, ইটের পরীক্ষার যথাযথভাবে করা হয়েছে। এসব টেস্ট গুলো বুয়েট অথবা চুয়েট থেকে করানো হয়েছে।
- বেশির ভাগ ঠিকাদারগণ জানান, কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর যথাসময়ে সাইট বুকে পেয়েছেন তবে কিছু ঠিকাদার জানান তারা যথাসময়ে সাইট বুকে পায়নি, এরকারণ হলো, জায়গা দখলে নেয়া যাচ্ছিল না, পূর্বের স্থাপনা/দোকানপাট সড়াতে বিলম্ব হওয়ায় ৮-১০ মাস পরে তারা সাইট বুকে পেয়েছেন।
- ঠিকাদারগণ বলেন, প্রকল্পের ড্রইংসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথাসময়ে সকল ঠিকাদারগণ পেয়েছেন।
- প্রকল্পের সাইটগুলোর নির্মাণ কাজ যথা সময়ে সম্পন্ন হবে কিনা, এমর উত্তরে ঠিকাদারগণ জানান, এই মুহূর্তে দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি, অনুমোদন প্রাপ্তিতে বিলম্বকে মূল চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করছেন তারা।

৩.১৯ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII)

প্রকল্পের গুরুত্ব পর্যালোচনার জন্য প্রকল্পের স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রদানকারীগণের সাথে (KII) সাক্ষাৎকার বা নিবিড় আলোচনা করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান, বাজার সমিতির সভাপতি/সেক্রেটারী, নারী প্রতিনিধিগণের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হয়েছে। নিবিড় আলোচনা সাক্ষাৎকার থেকে পাওয়া তথ্যসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।



চিত্র-৩.১৫: কেআইআই সাক্ষাৎকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চরফ্যাশন, ভোলা এবং চেয়ারম্যান, পোড়ারহাট, তালা উপজেলা সাক্ষীরা।

কেআইআই হতে প্রাপ্ত সারাংশ

- দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের যৌক্তিকতা এবং উপযোগিতা বিষয়ে কর্মকর্তাগণ জানান, বাজার অবকাঠামোগুলো নির্মাণ করার কারণে স্থানীয় ভাবে কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও ভোক্তা সাধারণের অনেক উপকার হয়েছে হবে। ঝড় বৃষ্টি হতে ব্যবসায়ীদের মালামালগুলো রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে/হবে। বিশেষ করে বাজার অবকাঠামোকে কেন্দ্র করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ক্রমান্বয়ে বেকারত্ব হ্রাস পাবে। এছাড়াও অত্যন্ত নিরাপত্তার সাথে সাধারণ মানুষ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কেনা বেচা করতে পারবেন।
- বাজার উন্নয়ন/অবকাঠামো নির্মাণের ফলে অত্র এলাকার কর্মস্থানের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে। বিশেষ করে অবকাঠামো নির্মাণের কারণে পূর্বের তুলনায় অনেকেই স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসা পরিচালনার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এছাড়াও প্রকল্পের অধীনে নির্মিত দোকানগুলো বরাদ্দ হলে অত্র এলাকার কৃষি ও অকৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা সম্ভব হবে, এতে করে প্রান্তিক কৃষকদের পণ্য বাজারজাতকরণে যে ভোগান্তি ছিলো তা অনেকাংশেই লাঘব হবে।
- দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের নির্মাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে কর্মকর্তাগণ বলেন, যে সমস্ত বাজার অবকাঠামোগুলো ইতিমধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, উক্ত বাজারের মধ্যে বেশির ভাগ অবকাঠামোরই অগ্রগতি সন্তোষজনক ছিলো। তবে কিছু কিছু স্থানে জমি সংক্রান্ত জটিলতা, নির্মাণস্থলে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষাদি, কোথাও পুরাতন ভবন, বিদ্যুতের খুঁটি, কিংবা ধর্মীয় স্থাপনা থাকায় তা অপসারণ করে নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে সময়ের প্রয়োজন হওয়ায় ঐসমস্ত অবকাঠামোগুলোর কাজের অগ্রগতি কিছুটা ধীর ছিলো।
- নিবিড় সাক্ষাৎকারে কর্মকর্তাগণ জানান, অবকাঠামো/ভবনটি নির্মাণকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ নিয়মিত সাইট পরিদর্শন করেছেন। এছাড়াও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত প্রকৌশলীগণ তাদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করেছে/করছেন বলে অবহিত করেন। কর্মকর্তাগণ জানান, বাজার উন্নয়নে পরিবেশের উপর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রভাব পড়ে নাই।

- উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চেয়ারম্যান ও বাজার কমিটির প্রতিনিধিগণ জানান, বাজার উন্নয়নে জমি নিয়ে কিছু কিছু স্থানে জটিলতা রয়েছে, যেমন: কোথাও কোথাও বাজার করার মত সরকারি খাস জমি ছিলনা/নেই, আবার দেখা যায়, কিছু স্থানে জমি থাকলেও পরিমাণে কম, মামলা সংক্রান্ত জটিলতা, ডিসি অফিস থেকে এনওসি না পাওয়াসহ ইত্যাদি কিছু জটিলতা রয়েছে। তারা আরও বলেন, যেখানে যেখানে এধরনের সমস্যা রয়েছে সেখানে অন্য/বিকল্প স্থানে বাজার করার মত সরকারি জমি রয়েছে, চাইলে প্রকৌশল অধিদপ্তর সেখানে বাজারের অবকাঠামো নির্মাণ করতে পারেন।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চেয়ারম্যান ও বাজার কমিটির প্রতিনিধিগণ জানান, কিভাবে বাজারের দোকানগুলো বরাদ্দ দেয়া হবে, সে বিষয়ে নীতিমালা চূড়ান্ত হয়নি বিধায় এখন পর্যন্ত প্রকল্পের অধীনে নির্মিত বাজারগুলোর দোকান বরাদ্দ দেয়া যায়নি। দ্রুত নীতিমালা চূড়ান্ত করে বাজারের নির্মিত অবকাঠামোর দোকানগুলো বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.২০ দলীয় আলোচনা (FGD)

প্রকল্প এলাকায় মোট ৩২টি (বত্রিশ) এফজিডি করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডি'তে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, স্কুল শিক্ষক, চাকুরীজীবী ও সাধারণ জনগণ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী, কৃষক, সমাজ সেবকসহ বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র-৩.১৬: দলীয় আলোচনা, মদন হাট বাজার, হাটহাজারী উপজেলা, চট্টগ্রাম এবং নানিয়ারচর উপজেলা, রাঙ্গামাটি।

এফজিডি হতে প্রাপ্ত সারাংশ

- বেশিরভাগ লোকজন জানান, তার গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার, বাজার কমিটি ও এলজিডির লোকদের মাধ্যমে বাজার ভবনের কথা জানতে পারেন।
- ব্যবসায়ীগণ জানান, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরবর্তীতে অত্র এলাকার কৃষি ও অকৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা সম্ভব সম্ভব হবে এবং কৃষক ন্যায্য মূল্য পাবে।
- বাজারের ভবন/অবকাঠামোর নির্মাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে ব্যবসায়ী, স্থানীয় জনগণ জানান কাজের অগ্রগতি মোটামুটি ভালো, তবে কিছু কিছু জায়গায় অগ্রগতি ভালো নয় বলে তারা জানান। কারণ হিসেবে বলেন যে ঠিকাদার উপকরণের দাম বাড়ার অজুহাতে কাজ বন্ধ রাখে। আবার কিছু কিছু জায়গায় জমি সংক্রান্ত সমস্যাও রয়েছে বলে তারা অবহিত করেন।
- বাজারের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে/নির্মিত হলে দোকানসূহ কিভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হবে এবিষয়ে অনেকেই তেমন কিছু জানেন না বলে জানান; তবে কিছু ব্যবসায়ীগণ বলেন জেলা প্রশাসক মহোদয় দোকান বরাদ্দ দিবেন বলে জানিয়েছেন, কিন্তু এখনও নীতিমালা তৈরি হয়নি বিধায় বরাদ্দ হচ্ছে না।
- এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের বক্তব্য হচ্ছে যে, প্রকল্পটি শুরু করার আগে তাঁদের সাথে পরামর্শ করা উচিত ছিল। প্রকল্প শেষে হস্তান্তরের সময় তাঁদের সাথে যোগাযোগ করা হলেও, তা গ্রহণ করা ও দোকান বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাবে তা দেরি হচ্ছে। খুব শীঘ্রই ভূমি মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করবে বলে জানা গেছে।
- ব্যবসায়ীগণ জানান, বাজারের নতুন অবকাঠামো নির্মাণের পর/নির্মিত হওয়ায় অত্র এলাকার স্থানীয় কৃষকগণ প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করতে পারছেন/পারবেন। তারা বলেন, বিক্রয় কেন্দ্র না থাকায় কৃষক অল্প মূল্যে বিক্রয় করতে হতো, ভবিষ্যতে এমনটা হবে না বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন।
- দলীয় আলোচনায় প্রায় সকলে মনে করেন বাজার অবকাঠামো নির্মাণ ও বরাদ্দ দেওয়া হলে স্থানীয় কৃষি, অকৃষি পণ্য বাজারজাত করা সহজ হবে। এতে একদিকে তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে, সাথে সাথে বেকার সমস্যা কমে আসবে, গ্রামীণ জনজীবন মান উন্নয়ন হবে। বাজার ভবনটি আধুনিক মানের হওয়ায় পরিবেশের ওপর কোন ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়েনি বলে তারা জানান।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা

৪.১ SWOT বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে, প্রকল্পটির সার্বিক SWOT বিশ্লেষণ; অর্থাৎ সবলতা (Strengths), দুর্বলতা (Weaknesses), সুযোগ (Opportunities) এবং ঝুঁকি (Threats) বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণত, কোন প্রকল্পের সবলতা (Strengths) ও দুর্বলতা (Weaknesses) প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। অপর দিকে সুযোগ (Opportunities) প্রকল্পের ভিতর ও বাইরের উভয় নিয়ামক, এবং ঝুঁকি (Threats) প্রকল্পের বাইরের নিয়ামকের সাথে সংশ্লিষ্ট। এদেরকে চিহ্নিত করার জন্য তাই দু'ভাবে প্রকল্পটির বিভিন্ন অঙ্গ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী বিবেচনা করা হয়েছেঃ (১) প্রকল্প-লেভেলের SWOT (Project-level SWOT), এবং (২) প্রকল্প-পরবর্তী বিশ্লেষণ-ধর্মী SWOT (Post-Project SWOT)। নিম্নে বর্তমান প্রকল্পটির SWOT বিশ্লেষণ নির্দেশকের আলোকে মতামত বা মন্তব্য প্রদান করা হলো।

সারণিঃ ৪.১ SWOT বিশ্লেষণ ও দিক নির্দেশনার সারাংশ

সবলদিকসমূহ (Strengths)	দুর্বলতা (Weaknesses)
- দোকান বরাদ্দ পেতে জনগনের চাহিদা - শ্রমিক প্রাপ্যতা - প্রকল্পটি বাস্তবায়নে স্থানীয় লোকজনের সম্পৃক্ততা	- প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে দুর্বলতা - স্থান নির্বাচন ও ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা - দোকান বরাদ্দের নীতিমালা - প্রকল্প ব্যবস্থাপনা
সুযোগ (Opportunities)	ঝুঁকি (Threats)
- গ্রামীণ পর্যায়ে ব্যবসার সুযোগ - রাজস্ব আয় বৃদ্ধি - কর্মসংস্থানের সুযোগ - কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ	- প্রাকৃতিক দুর্যোগ/ মহামারি - নির্মাণ উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি

৪.২ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের সবলদিকের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণ
১।	প্রকল্পের অধীনে নির্মিত অবকাঠামোগুলিতে দোকান বরাদ্দ পেতে জনগনের চাহিদা রয়েছে	দেশব্যাপী গ্রামীণ হাট-বাজারের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে স্থানীয় কৃষক তাদের উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্য সামগ্রী ন্যায্য মূল্যে সহজে বাজারজাত করতে পারবে এবং ভোক্তাগণও ন্যায্য মূল্যে ও সহজলভ্য ক্রয় করতে পারবে, ফলে স্থানীয় কৃষক ও ব্যবসায়ীদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ত্বরান্বিত হবে।
৩।	শ্রমিক প্রাপ্যতা	বাজার অবকাঠামো নির্মাণে স্থানীয় শ্রমিকের প্রাপ্যতা পর্যাপ্ত আছে
৬।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজনের ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা	‘বটম-আপ’ পদ্ধতিতে এলজিইডি লোকজনের সাথে আলোচনা ও তাঁদের চাহিদা মোতাবেক প্রকল্প নিয়ে থাকে। ফলে এক্ষেত্রে, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ সর্বদা প্রকল্পগুলির অগ্রগতি বিষয়ে খোঁজ-খবর রেখে থাকে বিধায়, দ্রুত কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

৪.৩ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের দুর্বলদিকের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণ
১।	স্থান নির্বাচন ও ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা	ভূমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ৫০৭টি বাজারের মধ্যে ৭৭টি বাজার অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ করতে না পারা। বেশ কিছু স্থানে বাজারের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমি না থাকা সত্ত্বেও সে সকল স্থানকে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।
২।	প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে দুর্বলতা	ভালো ভাবে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই হলে, স্থান সংক্রান্ত সমস্যাগুলি এতটা জটিল হত না।
৩।	দোকান বরাদ্দের নীতিমালা	প্রকল্পের প্রায় ৬বছর সময় অতিবাহিত হতে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত বাজারের দোকানগুলো কিভাবে বরাদ্দ দেয়া হবে সে বিষয়ে কোন নীতিমালা প্রস্তুত করতে না পারা।
৪।	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	পর্যাপ্ত সংখ্যক পিআই সি /পি এস সি মিটিং ও অডিট না হওয়া।

৪.৪ প্রকল্পের সুযোগসমূহ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের সুযোগ নির্দেশক	পর্যবেক্ষণ
১।	গ্রামীণ পর্যায়ে ব্যবসার সুযোগ	গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কৃষকগণ ন্যায্য মূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী সহজে বাজারজাত করতে পারবে।
২।	রাজস্ব আয় বৃদ্ধি	প্রকল্পের নির্মিত বাজার অবকাঠামোর মাধ্যমে গ্রামীণ অঞ্চলে ব্যবসার প্রসার ঘটলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হবে।
৩।	কর্মসংস্থানের সুযোগ	নির্মিত মার্কেটের দোকানগুলো বরাদ্দ হলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত হবে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
৪।	কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ	দারিদ্র হ্রাস করার পূর্বশর্ত হলো মানুষের আয় বৃদ্ধি করা। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কৃষিজাত ও অকৃষি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং বাজারজাতকরণ সহজতর হবে, গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি পাবে এবং দারিদ্রতা হ্রাস পাবে।

৪.৫ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের ঝুঁকি নির্দেশক	পর্যবেক্ষণ
১।	প্রাকৃতিক দুর্যোগ/ মহামারি	কোভিড-১৯ মহামারি বা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা প্রকল্পের গতি পিছিয়ে দিতে পারে;
২।	নির্মাণ উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি	সাম্প্রতিক সময়ে নির্মাণ উপকরণের মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রকল্পের ধারাবাহিকতা শ্লথ করে দিতে পারে;

পঞ্চম অধ্যায়

পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৫.০ প্রকল্পের সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৫.১ প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন ও বাস্তবায়নকাল

- প্রকল্পটির মূল ডিপিপি ১৭৩০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রথম বার জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১ সময় বৃদ্ধি করা হয়।
- গত ২৫.০৭.২০২১ তারিখে প্রকল্পের ২.২৫% ব্যয় হ্রাস করে প্রথম সংশোধনী হিসেবে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে যথাযথ সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে দ্বিতীয় বার জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়। এতে প্রকল্পের মোট সময় বৃদ্ধি পায় মূল পর্যায়ের তুলনায় ৬০ মাস বা ১৬৬.৬৭% এবং হ্রাস পায় ৩৯০০.০০ লক্ষ টাকা বা ২.২৫%।

৫.২ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ পর্যবেক্ষণ

- প্রকল্পভুক্ত ১১০টি বাজারের জায়গাতে অস্থায়ী স্থাপনা রয়েছে ও ৩৫টি বাজার স্থায়ী স্থাপনা থাকায় স্থাপনাসমূহ সহজে অপসারণ করা যাচ্ছে না, কিছু জায়গায় মামলা জনীত সমস্যাও রয়েছে, যার ফলে খালি জায়গা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হচ্ছে।
- ডিপিপিতে অনুমোদিত ৮০টি বাজারের জায়গা সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে, কারণ উক্ত বাজারসমূহের সংশ্লিষ্ট উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।
- কিছু জেলায় জেলা প্রশাসন হইতে মার্কেট নির্মাণের অনুমতি প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় নির্মাণ কাজ শুরু করতে বিলম্ব হচ্ছে।
- ডিপিপিতে অনুমোদিত ১৩টি বাজারে মার্কেট নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় তা বাদ দেয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছে।
- মার্কেট ভবন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত বাজারসমূহে প্রস্তাবিত জমির আকৃতি, ধরন ও সয়েল কন্ডিশন ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় প্রতিটি মার্কেট ভবনের জন্য Need Based আলাদা আলাদা ডিজাইন ও ড্রইং প্রস্তুত এবং সাইট পরিবর্তন হওয়ায় পরিবর্তিত সাইটের ডিজাইন ও ড্রইং প্রস্তুত করতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হওয়া;
- প্রকল্পের অধীনে ৫০৭টি বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করার কথা থাকলেও মে, ২৩ পর্যন্ত ৮৭টি বাজারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, তন্মধ্যে ২৮টি বাজার হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১৯১টি বাজার অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ভূমি ও মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ৭৭টি বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে স্থান সমস্যাজনিত যে ৭৭টি বাজার নির্মাণ করা সম্ভব হবে না, উক্ত বাজার নির্মাণের জন্য নতুন করে স্থান নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- জাতীয় সংসদে হাট বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন ২০২৩ গৃহীত হওয়ায় গত ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২৩ তারিখে গেজেট প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয়ে উক্ত আইনের বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নির্মিত ভবনের দোকানগুলো বরাদ্দের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় মহোদয়ের বরাবরে মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় মহোদয় একটি ডি.ও পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত ডি.ও পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাট ও বাজার স্থাপন, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান অডিন্যান্সকে আইনে রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০২২ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আইনটি ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় সংসদে আইনটি পাশ হওয়ার পর পরেই নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হবে।

৫.৩ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ

- প্রকল্পের আরডিপিপি'তে মোট ৫ (পাঁচ) অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা রয়েছে (অনুচ্ছেদ-১.৯)। কিন্তু প্রকল্পটির শুরুতেই ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাংশিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি, এর মূল কারণ হলো ডিজাইন প্রস্তুতে বিলম্ব হয়েছিল।
- প্রকল্পের ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১, ২০২১-২২ অর্থবছরেও কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অগ্রগতি অনেকাংশই কম। প্রকল্প অফিসের ভাষ্যমতে বাজার অবকাঠামো নির্মাণে জমি সংক্রান্ত জটিলতা, মামলাজনিত কারণ, কিছু স্থানে জেলা প্রশাসন থেকে অনাপত্তি না পাওয়া, বরাদ্দ স্বল্পতা এবং পরবর্তীতে কোভিড-১৯ এর কারণে সারাদেশে লকডাউন থাকায় সরকারি বিধি নিষেধে ঠিকাদার ও নির্মাণ শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রকল্প স্থলে যেতে না পারায় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অগ্রগতি কিছুটা কম হয়েছে।

৫.৪ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

- জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৯৪০২.৭৯ লক্ষ টাকা বা ২৩.৩০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪০%। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের আরএডিপির বরাদ্দ রয়েছে ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং অর্থছাড় হয়েছে ১৭০০০.০০ লক্ষ টাকা, অর্থ ছাড়ের বিপরীতে মে-২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৬৩১৪.৮৩৭ লক্ষ টাকা। অগ্রগতি বিবেচনায় প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না মর্মে প্রতীয়মান হয়।
- প্রকল্পের এ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জীভূত আর্থিক অগ্রগতি মে-২৩ পর্যন্ত ৫৫৭১৭.৬২৭ লক্ষ টাকা বা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৩২.৯৪% শতাংশ এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৭%।
- ভূমি অধিগ্রহণ ১ একরের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ১০০ লক্ষ টাকা, যেহেতু সরকারি খাস জমিতে বাজারের অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে, তাই এখন পর্যন্ত এই অঙ্গের খরচের প্রয়োজন হয়নি।

৫.৫ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

- ডিপিপি/আরডিপিপি অনুসারে ১৪টি পণ্য প্যাকেজ রয়েছে, বাস্তবে ১০টি পণ্য প্যাকেজেরই দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ১০টি এবং ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে ০৯টি।
- সিভিল ওয়ার্কের ৫০৭টি, তন্মধ্যে ৩৬৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, ৩৪৮টি প্যাকেজের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং ৮৭টি প্যাকেজের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ও ১৯১টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- সেবা প্যাকেজের আওতায় (ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ) ২০টি প্যাকেজ রয়েছে, বাস্তবে ১৯টি প্যাকেজেরই দরপত্র আহ্বান ও চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।
- প্রায় প্যাকেজেই দেখা যায়, ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য এবং দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা অনেকাংশ কমেই চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। পিপিআর-০৮ অনুযায়ী ওএসটিইএম ক্রয় পদ্ধতিতে দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য অধিক হ্রাস হলে কোন সমস্যা নেই, তবে এক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র দাখিলকারীর নিকট যৌক্তিক ব্যাখ্যা চাইতে পারে, সন্তোষজনক জবাবের ভিত্তিতে NOA প্রদান করা যেতে পারে। অর্থাৎ এখানে পিপিআর-০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়নি। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ: প্যাকেজ নং- CRMIDP/GABN/W-57, সংশোধিত ডিপিপি মূল্য ২৯৫.০০ লক্ষ টাকা, দাপ্তরিক মূল্য ৩৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ২৮১.১১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এখানে দেখা যায় দাপ্তরিক মূল্য থেকে ১৭.৩২% কমে এবং প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ৪.৭১% কমে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, এপ্যাকেজটির বর্তমানে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- প্যাকেজ নং CRMIDP/HBG/W-375, সংশোধিত ডিপিপি মূল্য ৩০০.০০ লক্ষ টাকা, দাপ্তরিক মূল্য ৩৭৩.০০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ৩৬৪.৩৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এখানে দেখা যায় দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা ২.৩২% কম এবং ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ২১.৪৫% বেশি। পিপিআর-০৮ অনুযায়ী ওএসটিইএম ক্রয় পদ্ধতিতে দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা চুক্তি মূল্য অধিক হ্রাস হলে কোন সমস্যা নেই, তবে এক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটি

দরপত্র দাখিলকারীর নিকট যৌক্তিক ব্যাখ্যা চাইতে পারে, সন্তোষজনক জবাবের ভিত্তিতে NOA প্রদান করা যেতে পারে। অর্থাৎ এখানে পিপিআর-০৮ এর কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।

- প্রায় বেশি সংখ্যক প্যাকেজেই দেখা যায়, কোভিড-১৯, ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা, মামলা জনিত কারণ, এনওসি পেতে বিলম্ব, পুরাতন স্থাপনা এবং অস্থায়ী দোকানপাট, বৃক্ষাদি অপসারণে বিলম্বসহ ইত্যাদি কারণে চুক্তির সময় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.৬ সরেজমিনে মার্কেটসমূহ পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ

- কাজের মান ভাল পাওয়া গেছে। বাজারের স্থাপত্য ডিজাইন দৃষ্টিনন্দন ও আধুনিক। তবে, বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে।
- শাহজালাল বাজার, সিলেট সদর এই বাজার অবকাঠামোর প্লিন্স লেভেলে বেশ কিছু ফাটল দেখা গেছে যেগুলো নীট সিমেন্ট পেস্ত দ্বারা ভরাট করে ফিনিশিং দেয়া হয়েছে।
- রামপুর বাজার, মেঘনা উপজেলা, কুমিল্লা। গ্রাউন্ড ফ্লোরে যথাযথ কিউরিং এর অভাবে কিছু স্থানের কনক্রিটে সংকোচন-জনিত ফাটল (Shrinkage cracks) পরিলক্ষিত হয়েছে।
- ভোলা জেলা, চরফ্যাশন উপজেলা, উত্তর ইছা বাজারে অবস্থিত অবকাঠামোটি ২০২১ সনের জুলাই মাসের ০৫ তারিখ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিডি) এর মাধ্যমে সমাপ্তকৃত হাটের মার্কেট ভবনটি হস্তান্তর ও গ্রহণ করা হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ভবনের নিচ তলার মেঝেতে প্লাস্টার উঠে নিচের ব্রিক দেখা যাচ্ছে, দেয়ালের প্লাস্টার ফেটে গিয়েছে। বেসিং ও ওয়াশরুম গুলো দীর্ঘদিন যাবত অপরিষ্কার থাকায় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।
- ভোলা জেলা, লালমোহন উপজেলা, কর্তারহাট বাজারে অবস্থিত নির্মাণাধীন অবকাঠামোটির সিঁড়ি ও ২য় তলার কিছু স্থানে টাইলস ফিটিংস ভালো হয়নি। ওয়াশরুমের দরজা, টাইলসসহ অন্যান্য ফিটিংস নিম্নমানের ব্যবহার করতে দেখা যায়।
- ভোলা জেলা, তজুমদ্দিন উপজেলা, শম্ভুপুর নতুনহাটে অবস্থিত অবকাঠামোটির নির্মাণ কাজ ২০২১ সালে সম্পূর্ণ হয়েছে। নির্মাণাধীন ভবনের জমির দলিল সংক্রান্ত সমস্যার কারণে এখন পর্যন্ত ভবনটি হস্তান্তর ও এলজিইডি কর্তৃক বুঝে নেয়া সম্ভব হয়নি।
- নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলাতেও নির্মাণকাজ সম্পন্ন হবার পরও তা হস্তান্তর সম্ভব হচ্ছে না।
- বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলায় তালুছ বাজারের নিজ তলায় নির্মাণ কাজের ফিনিশিং ভালো হয়নি। নিচ তলায় খোলা বাজারে বিভিন্ন স্থানে Shrinkage cracks দেখা যায়। উপরোক্ত বাজারগুলোর ত্রুটিসমূহের জন্য নির্মাণ কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

৫.৭ ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ

- নির্ধারিত সিমেন্ট ও স্টিল বার সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে। বেশিরভাগই টেস্ট সিলড অবস্থায় করানো হয়েছে, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রেই আনসিলড অবস্থায় টেস্ট করা হয়েছে।
- কংক্রিট এবং স্টিল বারের শক্তি নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়েছে, যা বুয়েট কর্তৃক প্রদত্ত। প্রতিটি রিপোর্টের ফলাফল ভাল ছিল।

৫.৮ প্রকল্প পিআইসি ও পিএসসি কমিটির সভার পর্যবেক্ষণ

পরিকল্পনা বিভাগের পরিপত্র ও ডিপিপি অনুযায়ী, প্রকল্প পরিচালনার জন্য প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজনের বিধান রয়েছে। সে অনুযায়ী জুলাই ২০১৭ হতে মে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে মোট ৭০ (সত্তর) মাসে ২৩টি পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজন করার কথা, বাস্তবে প্রকল্পের প্রায় ৬ বছরে ০২টি পিআইসি ও ০৪টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, ডিপিপি ও পরিকল্পনা কমিশনের পরিপত্র অনুযায়ী সবগুলো সভার আয়োজন করা হয়নি।

৫.৯ প্রকল্পের পরিচালনা কাঠামো ও লোকবল সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

- ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট মোট ১৮টি পদে জনবল নিয়োগের প্রবিশন রয়েছে, তন্মধ্যে হিসাব রক্ষক ব্যতীত ১৭ জন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। হিসাব রক্ষকের পদটি শূণ্য অবস্থায় আছে।
- প্রকল্প পরিচালনা, বাস্তবায়ন ও প্রকল্প পরবর্তী দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মহোদয়'কে সভাপতি করে ১৪ সদস্যের একটি 'প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)' গঠন করা হয়েছে।

৫.১০ প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান পর্যবেক্ষণ

- বাজারের অবকাঠামো উন্নয়নের পর সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা, পদ্ধতি এবং উহা হতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালার আলোকে স্থানীয় উপজেলা পরিষদ ও ক্ষেত্র বিশেষ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে উক্ত বাজারের অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা রাখবেন।
- বাজারের ইজারা লব্ধ অর্থ হতে নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাজার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৫%- ৪৫% অর্থ ব্যয় করবেন।

৫.১১ সুবিধাভোগীদের মতামতের ফলাফল পর্যবেক্ষণ

- সুফলভোগীদের মধ্যে ১০০% উত্তরদাতাই মনে করেন বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য সুলভ মূল্য সহজলভ্য হয়েছে/হবে।
- সুফলভোগীদের মধ্যে ১০০% উত্তরদাতা মনে করেন বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে/হবে।
- সমীক্ষায় দেখা যায়, ৯৯.২% উত্তরদাতা বলেন এই অবকাঠামোটি নির্মাণের পূর্বে কৃষক তার উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্যগুলো অস্থায়ী দোকান করে বাজারজাত করতেন
- বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে বলে ১০০% উত্তরদাতা মতামত প্রকাশ করেন।
- অবকাঠামোটি নির্মাণের পর/নির্মিত হলে স্থানীয় কৃষকগণ প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করতে পারছেন/পারবেন বলে ৯৯.১% মত প্রকাশ করেন।
- সুবিধাভোগীদের ৯৭.১% উত্তরদাতা জানিয়েছেন বর্তমানে অবকাঠামোটিতে বাজার বসার উপযুক্ত, অন্যদিকে ২.৯০% উত্তরদাতা মনে করেন অবকাঠামোটির নির্মাণ কাজে কিছু ত্রুটি রয়েছে যা মেরামত করা প্রয়োজন।
- বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে যে সকল সুযোগ সুবিধা তৈরি হয়েছে বা হবে এমন মতামত পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১০০% সুফলভোগী জানিয়েছেন নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য সুলভ মূল্য পাওয়া যাবে, ৭৬.৭০% উপকারভোগী মনে করেন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে, ৭৭.৮০% সুবিধাভোগী মনে করেন ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি হয়েছে/হবে, ৮৩% সুবিধাভোগী জানিয়েছেন প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করতে পারবে এবং ১০০% উত্তরদাতা জানিয়েছেন তাদের উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা সম্ভব হবে।
- বাজারের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে মাসিক গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে বা পাবে কিনা এমন মতামত পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৬০.৮% সুফলভোগী জানিয়েছেন, তাদের মাসিক গড় আয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশ ও উপসংহার

৬.১ সুপারিশসমূহ

- ৬.১.১ এধরনের বড় প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এলজিইডি'কে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি, সম্ভাব্যতা যাচাই গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন ছিল। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে দুর্বলতার কারণে প্রকল্পের অধীনে ৫০৭টি বাজারে মধ্যে বিভিন্ন জটিলতায় ৭৭টি বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ভবিষ্যতে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেয়ার অনুরোধ রইল।
- ৬.১.২ প্রকল্পের আওতায় যে ৭৭টি বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না, উক্ত বাজারগুলি ডিপিপি থেকে বাদ দিয়ে খরচ কমিয়ে নতুন আর আরডিপিপি প্রণয়ন অথবা বিকল্প স্থানে বাজার নির্মাণ করা যেতে পারে।
- ৬.১.৩ প্রকল্পের আট বছর মেয়াদের মধ্যে প্রায় ছয় বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে - এপর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩২.৯৪% যা আশানুরূপ নয়। সমস্যা চিহ্নিতকরণ পূর্বক দ্রুত সমাধানের মাধ্যমে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে বাস্তবানুগভাবে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক এটি সঠিক ভাবে অনুসরণের মাধ্যমে অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ৬.১.৪ বাজারের স্থানের জন্য অনুমতি, জমি অধিগ্রহণ ও নির্মাণ পরবর্তীতে হস্তান্তর — এই সকল ক্ষেত্রেই জেলা প্রশাসনের সাথে এলজিইডির সমন্বয়ের অভাব লক্ষণীয়, যা প্রকল্পটির দীর্ঘসূত্রিতার একটি কারণ বটে। সমন্বয়ের জন্য উভয় পক্ষকে একসাথে বসা প্রয়োজন।
- ৬.১.৫ বেশ কিছু বাজার মূল জনবহুল পূর্বের স্থান অপেক্ষা বেশ দূরে কিছুটা ফাঁকা যায়গায় নির্মাণ করা হচ্ছে। আবার, মূল সড়কের স্তাহে সংযোগ সড়ক নাই। ডেইনেজের সুব্যবস্থা নেই। বাস্তবানুগ স্থান নির্বাচন আর দূরের বাজারগুলির জন্য রাস্তার সংযোগ আর ডেইনেজের ব্যবস্থা করা উচিত।
- ৬.১.৬ এখন পর্যন্ত অনেক বাজারে মার্কেট ভবন নির্মাণে জায়গা নির্বাচন করা এবং অস্থায়ী স্থাপনা/প্রাচীন গাছ অপসারণ করা সম্ভব হয়নি। সেগুলির বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসহ জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় জোরদার করতে হবে।
- ৬.১.৭ ইতিমধ্যে যে সকল বাজারে মার্কেটগুলোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তার একটি বড় অংশ জেলা প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় দেরি হচ্ছে। হস্তান্তর দ্রুততর করা উচিত।
- ৬.১.৮ অনেক ক্ষেত্রে নির্মিত মার্কেটগুলো হস্তান্তরের পরও, দোকান বরাদ্দ দিতে দেরি হচ্ছে। নীতিমালা প্রণয়নে দেরিকে কারণ বলা হচ্ছে। অনতিবিলম্বে নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক উক্ত বাজারের দোকানগুলো বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
- ৬.১.৯ অনেক মার্কেট নির্মিত হয়েছে অথচ হস্তান্তর হয়নি, মার্কেটগুলি স্থানীয়দের অধীনে চালু আছে। নীতিমালা প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত, এক্ষেত্রে 'এড-হক' ভিত্তিতে পূর্বের গাইড লাইন অনুসরণ করে বরাদ্দের মাধ্যমে মার্কেটগুলি চালু করা যেতে পারে।
- ৬.১.১০ ভবিষ্যতে অনাপত্তি পত্র পাওয়ার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা প্রশাসন হতে অনাপত্তি পত্র না নিয়ে এ সকল অবকাঠামো নির্মাণের ফলে বরাদ্দ প্রদানে যে বিলম্ব ও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তা জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে বিশেষ সভা আয়োজন করে এবং নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান করা যেতে পারে।
- ৬.১.১১ বেশ কিছু স্থানে দৃশ্যমান নির্মাণ ত্রুটি পাওয়া গেছে। তাছাড়া সাটারিং এর মান অনেক ক্ষেত্রেই খারাপ ছিল। সার্বিক তদারকি আরও বাড়ানো উচিত।

- ৬.১.১২ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ড্রইং এর সাথে নির্মিত স্থাপনার আকার/মাপে পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। এক্ষেত্রে যথাযথ অনুমতি নিয়ে ড্রইং সংশোধন করা যেতে পারে।
- ৬.১.১৩ মার্কেটগুলো পুরনো বাজারের মধ্যে নির্মাণ হচ্ছে, তাই নির্মাণকালীন সময় বিএনবিসি-২০২০ অনুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনসহ পথচারীদের নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।
- ৬.১.১৪ প্রকল্পের এ পর্যন্ত প্রায় ৬ (ছয়) অর্থবছর সমাপ্ত হতে যাচ্ছে, কিন্তু এ পর্যন্ত অডিট কার্যক্রম সংগঠিত হয়েছে একটি, পরবর্তী বছরগুলোতে অডিট সম্পাদনের বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- ৬.১.১৫ প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক পিআইসি ও পিএসসি সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় প্রকল্পটিকে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানপূর্বক প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ে তদারকি আরও নিবিড় করাসহ সঠিক সময়ে সভাগুলির আয়োজন করা যেতে পারে।

৬.২ উপসংহার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, সরেজমিন পরিদর্শন, পণ্য ও কাজের গুণগতমান পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নোত্তর জরিপ, কেআইআই সাক্ষাৎকার ও কর্মশালা ইত্যাদি কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাতের সুবিধা প্রদান, গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টিসহ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়িত হবে মর্মে আশা করা যায়।

তথ্যপুঞ্জি

১. Kish, L. (1995) Survey Sampling, Wiley Inter. Science.
২. Cochran, W.G. (1963, 1977) Sampling Techniques, Wiley, New York.
৩. প্রকল্পের ডিপিপি ও সর্বশেষ আরডিপিপি পর্যালোচনা।
৪. প্রকল্পের পিইসি, পিআইসি ও পিএসসি কমিটির সভার কার্যবিবরণী/প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা।
৫. প্রকল্পের হালনাগাদ অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৬. প্রকল্পের টেন্ডার কার্যক্রম পর্যালোচনা।
৭. প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন নির্মাণ কাজের অনুমোদিত ড্রইং/ডিজাইন পর্যালোচনা।
৮. প্রকল্পের বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা।
৯. প্রকল্পের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা।
১০. প্রকল্পে দায়িত্বরত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে কেআইআই আলোচনা।
১১. প্রকল্পে ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট পর্যালোচনা।
১২. মাঠ পর্যায়ের তথ্যাদি।
১৩. দলীয় আলোচনা হতে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা।
১৪. সরজমিনে পরিদর্শনের স্থীরচিত্র।

পরিশিষ্ট-১: মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকৃত চলমান ও সমাপ্ত হওয়া মার্কেট ভবনের চিত্র



কেদারগঞ্জ হাট, মুজিবনগর, মেহেরপুর



রেইচা বাজার, সদর, বান্দরবান



খাসের হাট, শিবচর, মাদারীপুর।



পাইশকা হাট, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।



পাঁচবাড়ী হাট, সদর, দিনাজপুর



বানুরগাছী বাজার, মধুপুর, টাঙ্গাইল



তত্তারচানা বাজার, সখিপুর, টাঙ্গাইল (চলমান কাজ)



ঘাটাইল হাট, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল

পরিশিষ্ট-২: পূর্ত কাজ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পূর্ত কাজ (গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন) CRMIDP/ W :1-507 (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ):										
রাজশাহী										
CRMIDP/BOG/W-60	পল্লী মঞ্চাল হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩/০২/২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/BOG/W-61	বিহীগ্রাম হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬৫.০০	২৩/৫/২০১৯	০১/০৯/১৯	২৮/০২/২০২২
CRMIDP/BOG/W-62	খাটিয়ামারি হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩১৩.০০	২৩/৫/২০১৯	০৮/০৮/১৯	০৮/০১/২১
CRMIDP/BOG/W-63	তালুচ হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৫.০০	২৩/৫/২০১৯	২০/৮/২০১৯	২৮/০২/২০২২
CRMIDP/BOG/W-528	ধাপের হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮/০৭/২৩	১১/০১/২৩	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/BOG/W-64	মহিষাবান হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮০.০০	২২/৭/২০২০	১১/০১/২০	২৯/০৩/২০২২
CRMIDP/BOG/W-65	দুর্গাপুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩১০.০০	১৬/০৯/২০২১	২৮/০২/২০২২	১৪/০৩/২০২৩
CRMIDP/BOG/W-529	কাহালু বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮/০৭/২৩	১১/০১/২৩	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/BOG/W-530	মালঞ্চা (কোলের) হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮/০৭/২৩	১১/০১/২৩	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/BOG/W-66	হাটকড়ই হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৬০.০০	১৫/০২/২০২১	০৮/০৩/২১	১৫/০৯/২০২২
CRMIDP/BOG/W-67	সারিয়াকান্দি হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৫০.০০	০৮/০৭/২৩	১১/০১/২৩	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/CNWG/W-96	সন্ন্যাসীতলা(মেডিকেল মোড়) বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮৭.০০	০৯-০৩-২০	১২-০২-২১	১৮/১২/২০২২
CRMIDP/CNWG/W-97	সন্তোষপুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২০১.০০	২১/১১/২০১৯	১৮/০২/২০২০	২৩/০৮/২০২১
CRMIDP/CNWG/W-98	গোলাবাড়ী হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬৯.০০	০৯-১২-১৯	২৯/১২/২০১৯	০৭-০৪-২১
CRMIDP/CNWG/W-99	সুপ্রাজিতপুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৫০.০০	১৯/১/২০২০	১৭/৬/২০২০	২৩/১২/২০২১
CRMIDP/PBN/W-100	তারাবাড়ীয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৪০.০০	১৮/৪/২০১৯	২২/৭/২০১৯	২৯/৭/২০২০
CRMIDP/PBN/W-101	কয়জুরি হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/PBN/W-475	মাসুদিয়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/PBN/W-103	ময়দান দিঘী হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	১৬৭.০০	১৮/৪/২০১৯	১৪/৭/২০১৯	১৪/৭/২০২০
CRMIDP/PBN/W-104	মথুরাপুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৭০.০০	২৭/৬/২০১৯	২১/১০/২০১৯	২৮/৯/২০২০
CRMIDP/PBN/W-107	সোনাতলা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২০০.০০	১৮/৪/২০১৯	২৩/৭/২০১৯	৩০/৭/২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/PBN/W-108	বনকলা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২১৪.০০	২৬/৮/২০১৯	২১/১১/২০১৯	২৮/১১/২০২০
CRMIDP/RAJ/W- 109	মনিগ্রাম হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৫.০০	২০/৮/২০১৯	২১/১১/২০১৯	৩০/৩/২০২১
CRMIDP/RAJ/W- 110	বীরকুংসা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/RAJ/W- 111	নন্দনগাছী সহাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯০.০০	০৮-০৭-১৯	৩০/১০/২০১৯	১৫/০৬/২০২১
CRMIDP/RAJ/W- 112	কালিগঞ্জ হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/RAJ/W- 113	রাজাবাড়ী হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৭০.০০	২৪/১১/২০১৯	১৩/০২/২০২০	২০/৮/২০২০
CRMIDP/RAJ/W- 114	কাঁকন হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৭০.০০	২৪/১১/২০১৯	১৯/২/২০২০	৩০/৮/২০২০
CRMIDP/RAJ/W- 115	বসন্তকেদরা হাট (বিদিরপুর)	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮০.০০	০৮-১২-২০	২৪/১১/২০২০	০৮-১১-২২
CRMIDP/RAJ/W- 116	হরিপুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৩০.০০	০৩-০৭-২২	০৮-০১-২২	৩১/০৭/২০২৩
CRMIDP/RAJ/W- 117	কাঁতিকপাড়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৫.০০	১৫/১/২০২০	২৭/৫/২০২০	০৪-০৬-২১
CRMIDP/RAJ/W- 118	বিল্লি হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৭০.০০	০১-০৯-২০	২৭/৫/২০২০	১০-০৬-২১
CRMIDP/SRG/W- 119	চন্ডিদাসগিতি হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮০.০০	০৯-০৩-১৯	১২-০৮-১৯	১৪/৫/২০২১
CRMIDP/SRG/W- 120	সমেশপুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮৫.০০	১৫/০১/২০২৩	২৫/০৪/২০২৩	৩০/১২/২০২৪
CRMIDP/SRG/W- 491	এনায়তপুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SRG/W- 122	পাইকশা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০২.০০	০৪-০৫-২২	২৮/০৫/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
CRMIDP/SRG/W- 123	জাজিরা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SRG/W- 124	ঘুড়কা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SRG/W- 125	ডায়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SRG/W- 513	ডুগলি আমতলা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SRG/W- 127	গুন্টা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২০০.০০	১২-০২-১৯	১৯/২/২০২০	৩০/৮/২০২১
CRMIDP/SRG/W- 128	প্রতাপ হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২০০.০০	১২-০২-১৯	১৮/২/২০২০	৩০/৮/২০২১
খুলনা										
CRMIDP/BGRH/W-129	সিএন্ডবি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২২৫.০০	১২-১২-২২	০৪-০২-২৩	০৯-০৪-২৪
CRMIDP/BGRH/W-130	শৈলদাহ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৫৫.০০	০১-০২-২৩	০৪-০২-২৩	০৯-০৪-২৪

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/BGRH/W-517	বেতাগা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২০৫.০০	১২-১২-২২	০৪-০২-২৩	০৯-০৪-২৪
CRMIDP/BGRH/W-132	তালেশ্বর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৫৮.০০	০২-০৩-২০	০২-০৬-২০	৩০/০৬/২০২২
CRMIDP/BGRH/W-133	চুনখোলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৫৮.০০	০১-১২-২১	২২/০৪/২০২১	২৮/০৯/২০২২
CRMIDP/BGRH/W-521	কদুবুনিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/BGRH/W-135	কালিবাড়ী বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/BGRH/W-136	ভোজপাতিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮০.০০	২১/০২/২০২২	২৭/০৬/২০২২	০৭-০৩-২৩
CRMIDP/BGRH/W-137	বান্ধাঘাটা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/CHND/W-138	কাথুলি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/CHND/W-139	ওসমানপুর প্রাগপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬৫.০০	১৫/০৪/২০২৩	১৩/০৭/২০২৩	০১-০২-২৫
CRMIDP/CHND/W-140	কুড়ুলগাছী বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/CHND/W-141	রায়পুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/JSR/W-142	রূপদিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/JSR/W-143	নোয়াপাড়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/JSR/W-144	ছাতিয়ানতলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২২৫.০০	১৮/০৫/২০২২	০৮-১০-২২	০৯-০৯-২৩
CRMIDP/JSR/W-145	সান্ধাডাংগা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২০০.০০	১৫/১২/২০১৯	০৩-০৫-২০	০৯-০৭-২১
CRMIDP/JSR/W-146	কুল্লা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৪৫.০০	১১-০৯-২২	২৭/১১/২০২২	১২-০৩-২৩
CRMIDP/JSR/W-147	পাজিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	১৪/০৫/২০২৩	০৮-০৭-২৩	০২-০২-২৫
CRMIDP/JSR/W-148	দুর্বাডাঙ্গা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২২৩.০০	১৩/৫/২০১৯	০৮-০৮-১৯	১৩/১/২০২১
CRMIDP/JSR/W-149	গোগা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/JNDH/W-150	নগর বাথান বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৫০.০০	০৬-০৬-২১	০৯-০৬-২১	০৯-১১-২২
CRMIDP/JNDH/W-151	বার বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৪৪.০০	১৭/১১/২০১৯	০৪-০২-২০	১০-০৪-২১
CRMIDP/JNDH/W-152	সাকারিদহ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২১০.০০	০৩-০৫-২০	২৩/৬/২০২০	২৮/৬/২০২১
CRMIDP/JNDH/W-153	সাফদারপুর গ্রোথ সেন্টার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	১৪/০৫/২০২৩	০৮-০৭-২৩	০২-০২-২৫
CRMIDP/JNDH/W-154	ভৈরবা গ্রোথ সেন্টার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	১৪/০৫/২০২৩	০৮-০৭-২৩	০২-০২-২৫
CRMIDP/JNDH/W-155	শেখপাড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৫.০০	২৩/৮/২০২০	৩০/১১/২০২০	১২-০৫-২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/KHL/W-156	হাটবাড়ী হাট জিসি	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৫০.০০	১৭/৮/২০২০	১৩/১২/২০২০	২১/১১/২০২১
CRMIDP/KHL/W-157	খোজুরিয়া তালুকদার বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৭০.০০	০২-০৯-২০	১৭/৫/২০২০	২৩/১১/২০২১
CRMIDP/KHL/W-158	কলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২২৫.০০	১৫/৯/২০২০	৩০/১২/২০২০	১১-০৫-২১
CRMIDP/KHL/W-525	মাইল হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KHL/W-161	অস্তাবুনিয়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KHL/W-162	কাসিমনগর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০৫.০০	২২/৭/২০২০	২৮/১০/২০২০	০৩-০৭-২২
CRMIDP/KHL/W-163	শীরমনি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KHL/W-164	পালের হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KHL/W-165	সচিয়াদাহো হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩২২.০০	২৬/৮/২০১৯	১২-০৪-১৯	০৬-১০-২১
CRMIDP/KST/W-166	বলিয়াপাড়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৫.০০	০৪-০৬-২০	০৯-০৭-২০	১৪/৭/২০২১
CRMIDP/KST/W-167	গোপাল নগর	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KST/W-168	সোনাই কুন্ডি পশুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KST/W-169	খোকসা জানিপুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KST/W-527	জয়বাংলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KST/W-171	মশান হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/MHPR/W-172	শ্যামপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২০৫.০০	১৬/১২/২০২২	২৮/৩/২০২৩	২৮/১০/২০২৪
CRMIDP/MHPR/-173	কেদারগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২১৫.০০	১৪/৬/২০১৯	১৬/৯/২০১৯	২২/৩/২০২১
CRMIDP/MHRP/W-174	ভাটপাড়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২২০.০০	১৪/৬/২০১৯	১৬/৯/২০১৯	১০-০৩-২১
CRMIDP/MGR/W-175	ভাবনহাটি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬০.০০	০৯-০৯-২০	১২-০২-২০	১২-০৮-২১
CRMIDP/MGR/W-533	বনগ্রাম বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/MGR/W-177	আড়পাড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/MGR/W-178	নাকোল বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২২০.০০	২৪/৪/২০১৯	১৬/৭/২০১৯	২০/৭/২০২০
CRMIDP/NRL/W-179	হোগল ডাংগা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/NRL/W-180	দিগলীয়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/NRL/W-181	চাচুরি হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SATK/W-182	ঘোনা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৩.০০	১২-১১-১৯	১৪/০৪/২০২০	১৩/১০/২০২১
CRMIDP/SATK/W-183	মষিয়াডাংগা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SATK/W-184	সখিপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬০.০০	১৯/১/২০২০	১৮/০৬/২০২০	২০/১০/২০২১
CRMIDP/SATK/W-185	দমদম হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮০.০০	১২-১১-১৯	০৪-০৮-২০	১০-০৭-২১
CRMIDP/SATK/W-186	খান জিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SATK/W-187	কালবাড়ী হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SATK/W-188	পোরার হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৪০.০০	১০-০৮-২০	২৮/০১/২০২১	২৭/০১/২০২২
বরিশাল										
CRMIDP/BAR/W-189	আমিরগঞ্জ হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/BAR/W-190	ছয়গ্রাম বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৩০.০০	১২-০৫-২১	০৩-১২-২০	১৯/০৯/২০২১
CRMIDP/BAR/W-191	বাবুগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/BAR/W-192	নিয়ামতি বন্দর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৪২৪.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/BAR/W-193	জাম ভিটা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩২৫.০০	২৮/১১/২০১৯	০৩-১২-২০	১৯/৯/২০২১
CRMIDP/BAR/W-126	বানারি পাড়া বন্দর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৯০.০০	১৩/১১/২০২২	২০/০৩/২০২৩	২০/০৯/২০২৪
CRMIDP/BAR/W-194	পিংলাকাঠি বন্দর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/BAR/W-534	মেমোনিয়া টেকের হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/BAR/W-196	বাদামতলী বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৩১.০০	১৪/১/২০২০	২৮/৫/২০২০	০৬-০৫-২১
CRMIDP/BAR/W-197	টেকেরহাট সোনামুদ্দিন বন্দর বাজার বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/BAR/W-198	শিকারপুর হাট ও বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২২০.০০	০৬-০৯-২০	২২/১০/২০২০	২২/০৪/২০২১
CRMIDP/BRGN/W-199	গৌরিচন্না বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/BRGN/W-200	কালগাছিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৪৮০.০০	১৬/০৪/২০২৩	১৬/০৮/২০২৩	০২-০২-২৫
CRMIDP/BRGN/W-201	বুকাবুনিয়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	১৬/০৪/২০২৩	১৬/০৮/২০২৩	০২-০২-২৫
CRMIDP/BRGN/W-202	চান্দুখালি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬৮.০০	২৩/১২/২০১৯	০৪-১২-২০	১৯/৪/২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/BRGN/W-203	ঘুটাবাছা কমিউনিটি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮০.০০	২২/১/২০২০	০৬-০২-২০	১৩/৪/২০২১
CRMIDP/BRGN/W-204	হরিণখোলা চরপাড়া নতুন বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৪৮০.০০	১৬/০৪/২০২৩	১৬/০৮/২০২৩	০২-০২-২৫
CRMIDP/BHL/W-205	দক্ষিনদিগদি শান্তির হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৫.০০	২৭/৫/২০১৯	১৪/৮/২০১৯	১৩/৮/২০২০
CRMIDP/BHL/W-537	ভেলুমিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/BHL/W-206	কুঞ্জের হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	১৯০.০০	১৭/২/২০২০	০৬-০৪-২০	১২-০৩-২১
CRMIDP/BHL/W-207	উত্তর ইছা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৩১.০০	১৫/৫/২০১৯	১৪/৮/২০১৯	১৩/৮/২০২০
CRMIDP/BHL/W-208	নুরমিয়ার হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০৩.০০	২৪/৪/২০১৯	১৪/৮/২০১৯	১৩/৮/২০২০
CRMIDP/BHL/W-209	কর্তার হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩২৮.০০	২৪/৪/২০১৯	২৫/৮/২০১৯	২৪/৮/২০২০
CRMIDP/BHL/W-210	নতুন বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/BHL/W-211	শম্ভুপুর নতুন হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮৭.০০	১৬/০৬/২০১৯	২৫/৮/২০১৯	২৪/৮/২০২০
CRMIDP/JHAL/W-212	শেখের হাট বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৪০.০০	০৬-০৩-১৯	২১/১০/২০১৯	২৭/৪/২০২১
CRMIDP/JHAL/W-539	কীর্তিপাশা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/JHAL/W-213	মরিচবুনিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬০.০০	১৫/০২/২০২১	০৪-১১-২১	০৪-১২-২১
CRMIDP/JHAL/W-214	কুমারখালী বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৪৮.০০	০৬-০৩-১৯	০৭-০৭-১৯	১৫/৪/২০২১
CRMIDP/JHAL/W-215	বাঘরি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৫২.০০	০৬-০৩-১৯	২২/১০/২০১৯	২৮/৪/২০২১
CRMIDP/PATU/W-216	পুকুরজনা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/PATU/W-217	কনকদিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৮৫.০০	০২-১২-২০	২৬/৭/২০২০	৩০/১/২০২১
CRMIDP/PATU/W-218	নগরের হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬৭.০০	০৫-১০-২০	০৮-০৩-২০	০২-০৯-২২
CRMIDP/PATU/W-220	বেতাগি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৪৪০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/PATU/W-221	আজ্জারিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/PATU/W-222	ডাকুয়া ব্রিজ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩২২.০০	২৯/০৯/২০২১	২০/০৩/২০২২	১৫/০২/২০২৩
CRMIDP/PATU/W-223	লাল সবুজ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/PATU/W-224	গাজির হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/PATU/W-225	মোড়ুবি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮০.০০	০২-১২-২০	০৮-০৬-২০	০২-০৫-২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/PRIP/W-226	পাঁচপাড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২২০.০০	০১-১০-২৩	২৮/০৩/২০২৩	২৮/০৯/২০২৪
CRMIDP/PRIP/W-227	সেনের হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৫-০৭-১৯	২৫/০৮/২০১৯	০৩-০১-২১
CRMIDP/PRIP/W-228	জুনিয়া খবিরউদ্দিন হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩২১.০০	০৫-০৭-১৯	২৫/০৮/২০১৯	০৩-০১-২১
CRMIDP/PRIP/W-229	তালুকদার হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/PRIP/W-230	সাফা বাজর	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৬০.০০	২২/১০/২০২১	২৭/০৬/২০২২	০৭-১২-২৩
CRMIDP/PRIP/W-232	বাবুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৩০.০০	০৯-০৩-১৯	২২/১২/২০১৯	২৮/৬/২০২১
CRMIDP/PRIP/W-233	মিয়ার হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/PRIP/W-234	পথের হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৫.০০	১২-০৬-২২	২৮/০৩/২০২৩	২৮/০৯/২০২৪
ময়মনশিংহ										
CRMIDP/JML/W-235	নান্দিনা বাজর	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২০০.০০	০৫-০৫-২০	০৭-০২-২০	০৭-০৭-২১
CRMIDP/JML/W-236	শাহাবাজপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩২০.০০	২৩/১২/২০২০	১৬/০৩/২০২১	২১/০৩/২০২২
CRMIDP/JML/W-237	সূর্য নগর হাট (নাইম মিয়ার হাট)	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	১৪৩.০০	১৬/৮/২০১৯	১৬/৬/২০১৯	২১/৬/২০২০
CRMIDP/JML/W-238	কাঠার বিল বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	১৫১.০০	১৬/৮/২০১৯	১৬/৬/২০১৯	২১/৬/২০২০
CRMIDP/JML/W-239	ধর্ম কুড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৪৮.০০	২২/০৩/২০২১	২৭/০৭/২০২১	১৯/০৬/২০২২
CRMIDP/JML/W-240	বালিজুরি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৫২৪.০০	২৫/৮/২০২০	১০-০৬-২০	০৩-০২-২২
CRMIDP/JML/W-241	শ্যামগঞ্জ কালি বাড়ী (রায়গঞ্জ) বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/JML/W-242	চরপলিশা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/JML/W-244	জগন্নাথগঞ্জ বাজর	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৩৯.০০	০৯-০৩-১৯	১২-০২-১৯	২৮/১০/২০২১
CRMIDP/MYM/W-245	সুতিয়া খালি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/MYM/W-246	সুটিয়া বাজর	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৭৪.০০	১৫/০৩/২০২১	২৮/০৭/২০২১	০৮-০৩-২২
CRMIDP/MYM/W-247	বওলা বাজর	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২০৮.০০	০৯-০৩-১৯	২০/২/২০২০	০৭-০৮-২১
CRMIDP/MYM/W-248	কালি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২০০.০০	০৯-০৩-১৯	২০/২/২০২০	০৭-০৮-২১
CRMIDP/MYM/W-249	দানিকহোলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২০০.০০	০১/১২/২০২০	২৮/০২/২০২১	০৩-০৬-২২
CRMIDP/MYM/W-250	বাতিতোলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৭৬.০০	১৮/৮/২০২০	১৩/১২/২০২০	১১-১১-২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/MYM/W-251	পাশার বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২১৬.০০	০৯-০৩-১৯	০৬-০২-২০	০৫-০১-২১
CRMIDP/MYM/W-252	চাড়াবাড়ীয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/MYM/W-253	বাবুগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯০.০০	১২-০১-২০	১৪/০৩/২০২১	২০/০৩/২০২২
CRMIDP/MYM/W-254	আছিম বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৩৩.০০	২৩/১২/২০১৯	৩০/০৯/২০২১	৩১/০৩/২০২২
CRMIDP/MYM/W-255	চারুয়াপাড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৫০.০০	১৫/০৩/২০২১	২৩/০৮/২০২১	০৪-০২-২২
CRMIDP/MYM/W-256	মাহামুদপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	১৮৪.০০	১৪/৫/২০২০	২৭/৯/২০২০	১৯/৮/২০২১
CRMIDP/MYM/W-257	কালিবাড়ি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৭৪.০০	২১/০৯/২০২১	০১-০৯-২২	১৫/০১/২০২৩
CRMIDP/MYM/W-258	তারাকান্দি দক্ষিন বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	১৯৫.০০	২৭/৫/২০১৯	১১-০৪-১৯	২৮/৯/২০২০
CRMIDP/NETR/W-259	মুক্তিযোদ্ধা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/NETR/W-260	বঙ্গ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৪০০.০০	১৬/১২/২০২২	১৪/০৩/২০২৩	১৪/০৯/২০২৪
CRMIDP/NETR/W-261	সুরিশতলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২১০.০০	২৯/৯/২০২০	১৬/০২/২০২১	১৬/০১/২০২২
CRMIDP/NETR/W-262	মোহনগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২১০.০০	০২-১০-২০	০৬-০১-২০	২৯/১১/২০২১
CRMIDP/NETR/W-623	জয়বাংলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/NETR/W-264	বড়ন্দ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/NETR/W-265	পঞ্চহাট বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৪.০০	২১/৭/২০২০	১৩/১০/২০২০	১২-০৪-২২
CRMIDP/NETR/W-266	বিপেনগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/NETR/W-267	দুওজ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬৪.০০	২৭/১০/২০২০	২৮/০৩/২০২১	২৩/০২/২০২২
CRMIDP/NETR/W-268	দেওপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SRP/W-269	ভীমগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৫৭.০০	০৯-০২-১৯	১২-০৯-২০	০৫-০৮-২১
CRMIDP/SRP/W-270	কুন্ডুয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৪৫.০০	২৪/৯/২০১৯	১৮/০৮/২০২১	০৬-০২-২২
CRMIDP/SRP/W-271	বাউশা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২১৩.০০	০৯-০২-১৯	১২-০৯-২০	০৫-০৮-২১
CRMIDP/SRP/W-272	পাইকুরা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২২১.০০	১২-১০-১৯	২৫/২/২০২০	২০/১/২০২১
CRMIDP/SRP/W-273	ঘাগপাড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৫১.০০	২২/৭/২০১৯	৩০/১০/২০২০	৩০/৩/২০২১
টাকা										
CRMIDP/KSR/W-274	আমির গঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/KSR/W-275	দেলালপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KSR/W-276	পাকুন্দিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৪০.০০	২৬/০২/২০২৩	১৬/০৬/২০২৩	১২-০২-২৪
CRMIDP/KSR/W-277	নিকলি পুরাতন বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KSR/W-278	কাউখালী বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KSR/W-279	মিঠামইন বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯০.০০	২৬/০২/২০২৩	১৬/০৬/২০২৩	১২-০২-২৪
CRMIDP/KSR/W-280	প্রতাব বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KSR/W-281	মানিক খালি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KSR/W-282	ঝাউতলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KSR/W-283	ধনপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KSR/W-284	আব্দুল্লাহপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KSR/W-285	তারিচর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/KSR/W-286	হাজীপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৪১০.০০	২৬/০২/২০২৩	১৬/০৬/২০২৩	১২-০২-২৪
CRMIDP/DHK/W-287	আটি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/DHK/W-288	আগলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/DHK/W-289	কুশরা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩২৯.০০	১৩/৯/২০২০	১২-০৬-২০	১৪/১০/২০২১
CRMIDP/DHK/W-290	পালামগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৭৫.০০	১২-০৩-১৯	০৪-০৪-২০	১০-০৩-২১
CRMIDP/DHK/W-291	নৈহাটি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৩৪.০০	০৮-০৮-১৯	২৮/১১/২০১৯	০৬-০৪-২১
CRMIDP/FARD/W-292	সাদিয়া কৃষি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/FARD/W-294	বারাংখোলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৬৫.০০	১৮/১২/২০১৯	০৩-১০-২০	১৬/৯/২০২১
CRMIDP/FARD/W-295	বসুনাডক্ষিণদিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৮.০০	২১/১২/২০২০	০৪-০৩-২০	১৫/১০/২০২১
CRMIDP/FARD/W-296	হেলেক্ষা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/FARD/W-297	পুলিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৫৭৩.০০	২৩/০৯/২০২১	০৩-০১-২২	৩০/০৬/২০২৩
CRMIDP/FARD/W-298	চরআরিয়ালখা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৭০.০০	২৬/০৪/২০২২	৩১/০৭/২০২২	০৮-০৬-২৩
CRMIDP/FARD/W-299	রসুলপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/FARD/W-300	ঝাটুরদিয়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৬০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজ বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/FARD/W-301	আমিন খার হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/GAZ/W-302	পিরোজআলী হাটখোলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬০.০০	০১-১১-২৩	১৫/০৪/২০২৩	১৪/১১/২০২৪
CRMIDP/GAZ/W-303	ফুলবাড়ীয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩২০.০০	২৮/১১/২০২২	১৫/০৩/২০২৩	১৪/১০/২০২৪
CRMIDP/GAZ/W-304	বাসাইর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/GAZ/W-305	আমরাইদ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮২.০০	২১/৮/২০১৯	২১/১১/২০১৯	০৬-০৪-২১
CRMIDP/GAZ/W-374	আড়াল বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/GAZ/W-306	কাউরাইদ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২০৪.০০	২১/১২/২০২০	১৯/৮/২০২০	২০/৫/২০২১
CRMIDP/GPL/W-307	চন্দ্রদিঘলিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬১.০০	২৩/৮/২০১৯	১৪/০৭/২০১৯	৩১/১২/২০২০
CRMIDP/GPL/W-308	মাজড়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৪০.০০	২৫/১২/২০২২	১৫/০৩/২০২৩	১৪/১০/২০২৪
CRMIDP/GPL/W-309	রামদিঘি হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯০.০০	২৭/১২/২০২২	১৫/০৪/২০২৩	১৪/১১/২০২৪
CRMIDP/GPL/W-310	ভাংগার হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০৯.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/GPL/W-311	উজনি হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৮৫.০০	২৩/১২/২০২০	১৫/০৩/২০২১	১৪/০৩/২০২২
CRMIDP/GPL/W-312	খান্দারপাড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯০.০০	১৫/০৩/২০২১	০৯-১২-২১	২৩/০৭/২০২২
CRMIDP/GPL/W-313	সিংগীপাড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/MDR/W-314	ছিরার চর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৫৮.০০	০৯-০২-১৯	০২-০২-২০	০২-০৮-২১
CRMIDP/MDR/W-315	উত্তর রমজানপুর নতুন হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৭৫.০০	২৫/৯/২০১৯	০২-১০-২০	১৬/৬/২০২১
CRMIDP/MDR/W-316	আমিগ্রাম বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	১৮০.০০	২৪/৬/২০১৯	১৩/১০/২০১৯	১৯/১০/২০২০
CRMIDP/MDR/W-317	দত্তপাড়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩২৭.০০	১৬/৬/২০১৯	১৫/১২/২০১৯	২১/১২/২০২০
CRMIDP/MDR/W-318	খাসের হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৪২৩.০০	০৭-০১-১৯	১৪/৯/২০১৯	২৪/৯/২০২০
CRMIDP/MNK/W-319	ডাউটিয়া হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৪৫.০০	১৯/১০/২০১৯	০২-০৪-২০	০৮-০৮-২১
CRMIDP/MNK/W-320	ধামশ্বর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/MNK/W-321	প্যাচারকান্দা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/MNK/W-535	কাষ্টাপাড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/MNK/W-323	বালিয়াটি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৫২.০০	৩১/৮/২০২০	১২-১২-২০	১৬/০৪/২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজ বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/MNK/W-324	মহাদেবপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬০.০০	০১-০৫-২০	৩১/০৫/২০২০	০৯-০৮-২১
CRMIDP/MNK/W-325	চান্দহর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	৪৫-০২-২৫	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/MUNSI/W-326	চিতুলিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/MUNSI/W-327	ভাটেরচর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/MUNSI/W-428	ভবের চর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/MUNSI/W-328	কলিকতা ভোগদিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৪৯.০০	১৫/০৩/২০২১	১০-০৩-২১	০৩-০৬-২৩
CRMIDP/MUNSI/W-329	খারসুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/MUNSI/W-330	বাগড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬০.০০	১৩/০৩/২০২২	৩০/০৬/২০২২	০৭-০৬-২৩
CRMIDP/MUNSI/W-331	নতুন বাজার দিঘীরপাড়	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮০.০০	১৩/০৩/২০২২	৩০/০৬/২০২২	০৭-০৬-২৩
CRMIDP/RJBR/W-332	বসন্তপুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৭০.০০	১৩/১১/২০১৯	০৩-০৪-২০	০৯-১০-২১
CRMIDP/RJBR/W-333	বহরপুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২১০.০০	১৭/৭/২০১৯	১১-০৪-১৯	০৫-১০-২১
CRMIDP/RJBR/W-334	জামতলা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	১৪০.০০	২২/৭/২০২০	১১-০৪-২০	০৫-১০-২২
CRMIDP/RJBR/W-335	বাগড়ুলি হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯০.০০	২৭/৮/২০২০	১২-০১-২০	১২-০৮-২১
CRMIDP/RJBR/W-336	মদাপুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৪০.০০	১৬/৬/২০২০	০৮-০৩-২০	১৩/২/২০২২
CRMIDP/NYNG/W-337	ফতুল্লা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	১৯০.০০	০৭-০৬-২০	২০/৯/২০২০	২৬/৯/২০২১
CRMIDP/NYNG/W-338	দুপতারা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৭০.০০	২৮/৭/২০১৯	১০-০১-১৯	০৪-০৭-২১
CRMIDP/NYNG/W-339	ডান্ডি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৩০.০০	২৩/৪/২০১৯	০৭-০৮-১৯	০৭-১০-২১
CRMIDP/NYNG/W-340	লাংগলবন্ধ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৩.০০	২২/১২/২০১৯	১৬/২/২০২০	২৩/৮/২০২১
CRMIDP/NYNG/W-341	আতলাপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SRP/W-342	চন্দ্রপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৫২.০০	২৪/৩/২০২০	১৬/৭/২০২০	২৩/১/২০২১
CRMIDP/SRP/W-343	নুরুমাঝির বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SRP/W-344	মডের হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SRP/W-345	ইদিলপুর নতুন বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SRP/W-346	ঘড়িসার বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SRP/W-347	ডুবিশিবার বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৫৬.০০	১৫/০৩/২০২১	২৫/০৮/২০২১	০১-০৯-২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/TNGL/W-348	তোরাবগঞ্জ হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮০.০০	০৬-০৩-১৯	২৯/৮/২০১৯	০৩-০৫-২১
CRMIDP/TNGL/W-349	করটিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/TNGL/W-350	বাথুলিসাদি হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২২০.০০	২০/৭/২০২০	১০-১১-২০	১৭/৮/২০২২
CRMIDP/TNGL/W-351	নিকরাইল জিসি	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৩৬.০০	২৭/৬/২০১৯	১৯/১১/২০১৯	২৫/৫/২০২১
CRMIDP/TNGL/W-352	দেলদুয়ার বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/TNGL/W-353	ঘাটাইল হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮৫.০০	১৬/১১/২০২০	২৬/০১/২০২১	০১-০১-২২
CRMIDP/TNGL/W-538	জার্মা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/TNGL/W-355	ব্রাহ্মণশাসন বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/TNGL/W-356	হাদিরা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬৬.০০	২২/৫/২০১৯	২২/৮/২০১৯	২৮/২/২০২১
CRMIDP/TNGL/W-357	রতনগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৫০.০০	৩০/৯/২০১৯	২৯/১২/২০১৯	০৭-০৮-২১
CRMIDP/TNGL/W-358	ককদহরা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮৫.০০	০৭-১১-১৯	১৯/১১/২০১৯	২৫/৫/২০২১
CRMIDP/TNGL/W-359	বানুরগাছী হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬৭.০০	০৬-০৩-১৯	০৯-০৫-১৯	০৩-১১-২১
CRMIDP/TNGL/W-360	গেরামারা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯০.০০	২২/৫/২০১৯	০৯-০২-১৯	০৩-০৮-২১
CRMIDP/TNGL/W-361	ফতেহপুর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৫.০০	০৯-০২-২০	১৮/১১/২০২০	২৪/০৮/২০২১
CRMIDP/TNGL/W-362	গয়হাটা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/TNGL/W-363	তুকতেরচালা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৫.০০	১১-০১-২০	০২-০২-২১	০২-০৮-২২
CRMIDP/TNGL/W-364	পাইশকা হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩২৩.০০	০৬-০৩-১৯	২৯/৮/২০১৯	০৩-০৫-২১
CRMIDP/NARS/W-365	খরিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/NARS/W-366	বেলাব বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৪০.০০	৩১/১০/২০১৯	১৮/২/২০২০	২৩/০৮/২০২১
CRMIDP/NARS/W-367	চালাক চর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৭০.০০	২৬/০১/২০২৩	১৬/০৫/২০২৩	১৫/১১/২০২৪
CRMIDP/NARS/W-431	মনোহরদি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/NARS/W-368	চরসিদ্ধু বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৯.৫০	২৭/১১/২০১৯	০৩-০২-২০	৩১/৮/২০২১
CRMIDP/NARS/W-369	রাধাগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২০০.০০	১৮/১২/২০১৯	০৪-০২-২০	২৩/৩/২০২১
CRMIDP/NARS/W-370	শিবপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২২০.০০	৩১/১০/২০১৯	১৭/২/২০২০	২২/৮/২০২১
সিলেট										

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/HBG/W-371	পুরাইখলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৭০.০০	৩১/১২/২০১৯	২৫/৩/২০২০	২৯/৯/২০২১
CRMIDP/HBG/W-373	মহাশয়ের বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৩৫.০০	১২-১০-১৯	০২-১২-২০	১৬/৮/২০২১
CRMIDP/HBG/W-375	কাজির হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৮০.০০	২২/১২/২০২১	০৬-০৯-২২	১৪/০৬/২০২৩
CRMIDP/HBG/W-540	বুল্লা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/HBG/W-378	পানীউমদা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৬৭.০০	১৫/০৩/২০২১	১৫/০৭/২০২১	২১/০৭/২০২২
CRMIDP/MOLV/W-379	অফিস বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩১৫.০০	০৬-০১-২০	৩০/৯/২০২০	২২/২/২০২২
CRMIDP/MOLV/W-380	শাহাবাজপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০২.০০	০৯-০৪-১৯	০৫-০১-২০	০৬-০৬-২১
CRMIDP/MOLV/W-381	টিলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৫০.০০	২০/০৯/২০২০	১০-১২-২১	২৩/১২/২০২১
CRMIDP/MOLV/W-382	বৃন্দারানী দীঘিপাড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৫০.০০	০৬-০১-২০	১০-০৬-২০	০৪-০৫-২২
CRMIDP/MOLV/W-383	ঐছতগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬৫.০০	১৭/৭/২০১৯	১২-০৮-১৯	০৬-১২-২১
CRMIDP/MOLV/W-384	গোপেন্দ্রগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/MOLV/W-385	ফুলতলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	১৮৫.০০	১৮/১১/২০২০	১৮/০২/২০২১	২৪/০২/২০২২
CRMIDP/SNMG/W-386	বিটগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	১৫/০৩/২০২১	১৫/০৬/২০২১	১৪/০৬/২০২২
CRMIDP/SNMG/W-387	কারেন্টার বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৪৭.০০	১৮/১১/২০১৯	০২-১১-২০	৩১/৭/২০২১
CRMIDP/SNMG/W-388	মোহাম্মদগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৪১.০০	১৭/১০/২০২০	২৭/০১/২০২১	১৫/০১/২০২২
CRMIDP/SNMG/W-389	রতনগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SNMG/W-390	মধ্যনগর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SNMG/W-391	বজ্রবন্ধু বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৪৫৭.০০	৩০/১২/২০২০	১৩/০৪/২০২১	২৮/০২/২০২২
CRMIDP/SNMG/W-392	লামাটুকের বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SNMG/W-393	লালা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/SNMG/W-394	ঘুঞ্জিরগাও বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩২৯.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/SNMG/W-395	বাদাঘাট বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/SNMG/W-396	ভমভমি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৪০.০০	১৪/৮/২০১৯	১১-১১-১৯	৩১/৫/২০২১
CRMIDP/SYL/W-398	শাহজালাল বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৩৫.০০	২১/৯/২০১৯	০১-০৫-২০	০৭-০৫-২১
CRMIDP/SYL/W-400	খানা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/SYL/W-402	তুকের বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৭০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/SYL/W-404	পরগুনা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩১০.০০	০৮-১২-২২	০৭-০৭-২২	১৩/০৭/২০২৩
CRMIDP/SYL/W-406	আসামপাড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৫১.০০	২০/৮/২০২০	২৭/৫/২০২০	১৪/৮/২০২১
CRMIDP/SYL/W-407	আন্দরমুখ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/SYL/W-408	নাজির বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/SYL/W-469	বাবুল বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৪৮০.০০	০২-০২-২৩	০৮-১০-২৩	১০-১০-২৪
CRMIDP/SYL/W-410	বুরুজা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/SYL/W-419	শিবের বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৯৫.০০	০৮-০২-২০	০৭-১২-২০	০১-১১-২২
CRMIDP/SYL/W-420	মাদ্রাসা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৬৫.০০	০১-০১-২৩	০৮-১০-২৩	১০-১০-২৪
CRMIDP/SYL/W-493	হাকুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৬২.০০	৩১/১২/২০২২	০৮-১০-২৩	১০-১০-২৪
CRMIDP/SYL/W-496	রতনগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৭০.০০	১০-১০-২০	০১-১১-২১	২৩/১১/২০২২
CRMIDP/SYL/W-499	মুফতির বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৫৩.০০	০১-০১-২৩	০৮-১০-২৩	১০-১০-২৪
চট্টগ্রাম										
CRMIDP/BNDR/W-411	রেইচা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৮২.২৯	০২/০৮/২০২০	১৯/০৭/২০২০	৩১/০১/২০২২
CRMIDP/BNDR/W-412	রেফারপাড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	১৫/০৩/২০২১	১৫/০৫/২০২১	১৫/০৫/২০২২
CRMIDP/BNDR/W-413	গাজালিয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	১৫/০৩/২০২১	১৫/০৫/২০২১	১৫/০৫/২০২২
CRMIDP/BNDR/W-414	বাইশারি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৩৮.০০	০৮/১০/২০২০	১৫/০৩/২০২০	১৫/০৮/২০২১
CRMIDP/BNDR/W-415	কছপতলি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	১৫/০৩/২০২১	১৫/০৫/২০২১	১৫/০৫/২০২২
CRMIDP/BRMN/W-418	মজলিশপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২১৮.০০	৩১/১২/২০১৯	১৪/৮/২০২০	২০/৮/২০২১
CRMIDP/BRMN/W-541	কর্ণেল বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/BRMN/W-542	আশুগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/BRMN/W-421	সোনারামপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩১৩.০০	২৮/১০/২০২০	০২-০৮-২১	০২-১০-২২
CRMIDP/BRMN/W-422	মন্দাভাগ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২২৪.০০	২৬/১২/২০১৯	২০/৮/২০২০	১৯/৩/২০২১
CRMIDP/BRMN/W-423	বাইশ মৌজা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২২৬.০০	১২-১১-১৯	২৯/৩/২০২০	২৮/৯/২০২১
CRMIDP/RNGM/W-510	মানিক নগর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৮০.০০	২১/১২/২০২১	১৯/০৫/২০২২	২৫/০৫/২০২৩
CRMIDP/BRMN/W-424	নাসির নগর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২১৮.০০	২১/১২/২০২১	১৬/০৫/২০২২	২২/০৫/২০২৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/BRMN/W-425	সরাইল সকাল বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	১৬৩.০০	০৫-১১-২০	২৬/৭/২০২০	০৮-০২-২১
CRMIDP/BRMN/W-426	বিষ্ণুপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	১৯৬.০০	০৪-১১-২২	২৯/০৮/২০২২	০৯-০৪-২৩
CRMIDP/CHND/W-427	হরিণা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/CHND/W-429	জনতা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২১০.০০	১১-০২-১৯	২০/২/২০২০	২৭/৮/২০২০
CRMIDP/CHND/W-543	চেঙ্গাতলী বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/CHND/W-432	সাচার বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/CHND/W-433	মতলব বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬৪.০০	২৫/০২/২০২২	২৩/০৫/২০২২	৩০/০৫/২০২৩
CRMIDP/CHND/W-434	কালিপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৭৫.০০	৩১/১২/২০১৯	০৪-০৫-২০	১০-১১-২১
CRMIDP/CHND/W-435	উনকিলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/CHT/W-436	সরকার হাট বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮৫.০০	১৬/০৬/২০২০	১৫/১১/২০২০	২২/০৫/২০২২
CRMIDP/CHT/W-437	চাম্বল বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৭০.০০	২৮/১/২০২০	২০/৫/২০২০	২৭/১১/২০২১
CRMIDP/CHT/W-438	চান্দের হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০৫.০০	২৬/১২/২০১৯	১৯/৩/২০২০	২৫/৯/২০২১
CRMIDP/CHT/W-439	খান হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৫.০০	১৪/১১/২০২০	১৯/০৪/২০২১	২৬/০৪/২০২২
CRMIDP/CHT/W-440	আজাদি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/CHT/W-441	মদন হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৬০১.০০	২৪/৪/২০১৯	২৪/১০/২০১৯	৩০/৪/২০২১
CRMIDP/CHT/W-442	চম্বার নয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/CHT/W-443	করমআলী বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৫৬০.০০	১২-০১-১৯	১৬/৩/২০২০	২৩/৯/২০২১
CRMIDP/CHT/W-444	শান্তির হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৯০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/CHT/W-445	ধামির হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩১৫.০০	২৪/২/২০২০	২৩/০৬/২০২০	১৪/১/২০২২
CRMIDP/CHT/W-446	নওয়াজেশপুর নতুন হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৬৫৫.০০	২৭/১২/২০১৯	১৩/০৪/২০২০	২৭/১০/২০২১
CRMIDP/CHT/W-447	মৌলবি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	১৮৬.০০	২৪/৪/২০১৯	২৭/৭/২০১৯	২৯/৭/২০২০
CRMIDP/CHT/W-448	দেও দিঘী (ডেপুটি) বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/CHT/W-450	ফকিরনি হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৫০.০০	২৯/০৯/২০২১	০৮-০৬-২২	০৬-০২-২৩
CRMIDP/COM/W-451	বানাসুয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/COM/W-452	ঝালম বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৫০.০০	০৪-০৮-২২	২৮/০৭/২০২২	০৮-০৪-২৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/COM/W-453	ব্রাহ্মণপাড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৭৭.০০	২৫/১১/২০২১	২১/০৩/২০২২	১৩/০৩/২০২৩
CRMIDP/COM/W-454	ছয়গ্রাম বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/COM/W-455	শ্রীমন্তপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৪০৭.০০	২৮/০৩/২০২১	১০-০৭-২১	১৩/১০/২০২২
CRMIDP/COM/W-456	গুনবতী বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/COM/W-457	কাদইর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০৫.০০	১৮/৪/২০১৯	০৮-০৭-১৯	১৩/১২/২০২০
CRMIDP/COM/W-458	মুন্সীর হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৫১০.০০	১৮/৪/২০১৯	০৮-০৬-১৯	০২-১২-২১
CRMIDP/COM/W-459	গৌরীপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৪৪৫.০০	১১-১০-২০	০২-১১-২১	০১-০৩-২২
CRMIDP/COM/W-460	মোহনপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/COM/W-461	ঘারমোড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/COM/W-462	বিজরা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৫৫৫.০০	১৩/৪/২০২০	১৬/৭/২০২০	২২/১/২০২২
CRMIDP/COM/W-463	রামপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২০৮.০০	১৬/১/২০২০	৩০/৬/২০২০	০৭-০৬-২১
CRMIDP/COM/W-464	চন্দনপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৮০.০০	১৮/১২/২০২১	০৬-০১-২২	০৬-০৭-২৩
CRMIDP/COM/W-465	মুরাদনগর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/COM/W-466	শ্রী রামপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/COM/W-467	হেসাখাল বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৬৩.০০	১৮/৪/২০১৯	১৬/৯/২০১৯	০২-০২-২১
CRMIDP/COM/W-468	চড়িয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০৭.০০	১৮/৪/২০১৯	০৮-০৮-১৯	১৪/২/২০২১
CRMIDP/COM/W-470	বিজয়পুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/COM/W-471	হাসনাবাদ জিসি	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৯৫.০০	২৯/০১/২০২২	২৯/০৬/২০২২	০৬-০৬-২৩
CRMIDP/COM/W-472	বাগমারা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৯২০.০০	১৪/০২/২০২১	০৮-০২-২১	৩১/০৭/২০২৩
CRMIDP/COXB/W-473	ঈদগাঁও গ্রোথসেন্টার বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৪১৮.০০	১৯/০১/২০২৩	০৪-১০-২৩	১০-১০-২৪
CRMIDP/COXB/W-474	মগ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩২৫.০০	১৭/১/২০২০	২৩/৭/২০২০	৩০/১/২০২২
CRMIDP/COXB/W-476	বড়খোপ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৭০.০০	০১-০২-২০	০৩-০৩-২০	০৩-০৪-২১
CRMIDP/COXB/W-477	বড় মহেশখালী নতুন বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/COXB/W-478	জোয়ারিয়ানালা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩১৬.০০	০৩-০১-২০	২৪/৭/২০২০	৩১/১/২০২২
CRMIDP/COXB/W-479	শাপলাপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩২০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/COXB/W-480	কোট বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/COXB/W-481	পেকুয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/FEN/W-482	আফতাববিবির হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯০.০০	২২/০২/২০২২	০৬-১২-২২	১২-১১-২৩
CRMIDP/FEN/W-483	ফাজিলপুর বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯১.০০	৩০/১/২০২০	০৫-১২-২০	১৪/৪/২০২১
CRMIDP/FEN/W-484	চাঁদগাজী বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৩.০০	১০-০৬-১৯	০২-০৬-২০	৩০/৭/২০২১
CRMIDP/FEN/W-485	মৃধা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৫.০০	১০-০৬-১৯	০২-০৬-২০	৩০/৭/২০২০
CRMIDP/FEN/W-486	মাতুভুয়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯৫.০০	৩০/১/২০২০	১৯/৫/২০২০	৩০/৭/২০২১
CRMIDP/FEN/W-487	সুবার হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/FEN/W-488	ওলামা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৪০৬.০০	৩০/১/২০২০	১৯/৫/২০২০	১০-১১-২১
CRMIDP/FEN/W-489	নতুন মুন্সীর হাট বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৪৩০.০০	২২/০২/২০২২	০৬-১২-২২	২২/১০/২০২৩
CRMIDP/KHGR/W-490	ভাইবোনছড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৯০.০০	২৭/২/২০২০	২৮/০৫/২০২০	২৫/১১/২০২১
CRMIDP/KHGR/W-492	লক্ষিছড়ি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২২৫.০০	০২-০৫-২১	০৮-০১-২১	০৮-০৭-২২
CRMIDP/KHGR/W-494	যোগ্যহোলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২২৮.০০	১২-১০-২১	২৪/০২/২০২২	০৩-০৩-২৩
CRMIDP/KHGR/W-495	বরনাল ডাক বাংলা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৩৪.০০	০২-১০-২৩	২০/০৪/২০২৩	২০/১০/২০২৪
CRMIDP/KHGR/W-497	রামগড়া বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	১৮৫.০০	১০-০৯-২০	০১-০৪-২১	১৩/১১/২০২১
CRMIDP/KHGR/W-498	সিন্দুকছড়ি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/LKSM/W-501	রামগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৩০.০০	২৩/৩/২০২০	২৪/৬/২০২০	১৭/৫/২০২১
CRMIDP/LKSM/W-502	রামগতি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৫৫.০০	২৩/৩/২০২০	০৬-০৯-২০	১৬/১২/২০২১
CRMIDP/NOAK/W-504	বৌধের হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	০৮-০৭-২৩	১১-০১-২৩	০২-০১-২৫
CRMIDP/NOAK/W-505	পৌরগবিবি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৪০০.০০	১৪/১২/২০২১	৩১/০৩/২০২২	০৪-০৬-২৩
CRMIDP/NOAK/W-506	পান্না বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/NOAK/W-507	পূর্বচাপরাশির বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/NOAK/W-508	হাজারী হাট	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৩৫.০০	০৯-০৪-১৯	১৫/১২/২০১৯	০৫-১২-২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
CRMIDP/NOAK/W-509	তমরদি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/NOAK/W-511	ভুইয়ার হাট বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/NOAK/W-512	ইসলামগঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩২৫.০০	১১-০৭-২০	১৪/০৩/২০২১	২৩/০১/২০২২
CRMIDP/NOAK/W-514	কুতুবের বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৪২.০০	০৫-০৪-২১	১০-০৫-২১	৩০/০৬/২০২২
CRMIDP/RNGM/W-515	চাপরশিরহাট বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৮৩.০০	২৯/১০/২০১৯	২৮/০১/২০২০	২৭/০৬/২০২১
CRMIDP/RNGM/W-516	কুতুবছড়ি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩০০.০০	২১/১১/২০২৩	০৩-০২-২৪	৩০/০৫/২০২৫
CRMIDP/RNGM/W-517	মাহিনা বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৫২.০০	১৫/০৩/২০২১	১৩/০৭/২০২১	২০/০৭/২০২২
CRMIDP/RNGM/W-518	চাক্রোরই বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	৩৬০.০০	১৯/১২/২০২১	০৪-১২-২২	২১/০৩/২০২৩
CRMIDP/RNGM/W-522	কলাপাকুঞ্জ বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২৫০.০০	১০-১২-২০	০১-১১-২১	২০/১১/২০২১
CRMIDP/RNGM/W-523	ঘিলাছড়ি বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২০০.০০	০৫-০৫-২১	১০-১২-২১	২৯/০৮/২০২২
CRMIDP/RNGM/W-524	রাজস্থলী বাজার	টি	১	ওএসটিইএম	হোপ	জিওবি	২১৫.০০	১১-০৮-২০	৩১/০১/২০২১	১২-০২-২১
পূর্ত মোট ক্রয় মূল্য :		টি	৫০৭				১৫০১৮০.০০০			
OE/1-4	Outsourcing Employee	জন	৭৮	এনওটিএম	হোপ	জিওবি	২৮২৩.০০০	২৮-১০-২০১৭	৩১-১০-২০১৭	৩০-০৬-২০২২
						মোট ক্রয়মূল্য	১৫৩৫৫৪.০০০			

তথ্য সূত্রঃ ডিপিপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

আইডি নং

--	--	--

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার
সুফলভোগীদের জন্য নমুনা জরিপ প্রশ্নমালা

সম্মতি পত্র	
পরিচিতি ও নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্য বর্ণনা আসসালামু আলাইকুম/নমস্কার। আমি..... ঢাকায় অবস্থিত এমএস ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস্ লিঃ নামক একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন রকম সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বর্তমানে আমরা দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পক্ষে আপনাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার জরিপ কাজের তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছি। আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এই জরিপ কাজ ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার করা হবে না। আমি আপনাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত করছি যে আপনি যা বলবেন আমরা অবশ্যই তা গোপন রাখবো। আমরা আশা করবো আপনি সঠিক তথ্য দিয়ে সহায়তা করবেন। আপনার সঠিক তথ্যের উপর নির্ভর করছে আমাদের কাজের সফলতা এই সাক্ষাতে আনুমানিক ৩০ মিনিট সময় ব্যয় হবে। আপনি সম্মতি প্রদান করলে আমরা শুরু করতে পারি।	
০১.	উত্তর দাতার নামঃ-----
০২.	উত্তরদাতার লিঙ্গঃ পুরুষ-----১ মহিলা-----২
০৩.	গ্রাম/রোড/ওয়ার্ড----- ইউনিয়ন/পৌরসভাঃ-----
০৪.	উপজেলাঃ----- জেলাঃ-----বিভাগঃ-----
০৫.	বাজারের নামঃ
০৬.	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ
০৭.	উত্তরদাতার মোবাইল নম্বরঃ
০৭.	সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ সুপারভাইজরের নামঃ
	মোবাইল নং- মোবাইল নং-
	স্বাক্ষরঃ স্বাক্ষরঃ

ক্রঃনং	প্রশ্ন	উত্তরসহ কোড	নির্দেশনা
সেকশন-০১: আর্থ-সামাজিক তথ্যাদি			
০১	উত্তরদাতার বয়স?	-----বছর	
০২	উত্তরদাতার পেশা?	চাকুরী ১ ব্যবসা ২ পেশাজীবী (ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি) ৩ ক্ষুদ্র ব্যবসা কুটির শিল্প/সেলাই ইত্যাদি ৪ ক্ষুদ্র পেশা খামারী (কামার, কুমার, জেলে) ইত্যাদি ৫ কৃষিকাজ/খামারী ৬ চালক (রিক্সা/ভ্যান/ঠেলাগাড়ী) ইত্যাদি ৭ গৃহস্থালি ৮ ছাত্র/ছাত্রী ৯ দিনমজুর/শ্রমিক ১০ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----- ১১	
০৩	উত্তরদাতার পড়াশোনার স্তর?	নিরক্ষর ১ ১ম-৫ম শ্রেণী ২ ৬ম-১০ম শ্রেণী ৩ এসএসসি পাশ ৪ এইচএসসি/সমমান ৫ অনার্স/ডিগ্রী/মাস্টার্স ৬ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----- ৭	
০৪	আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত জন?	পুরুষ-----জন মহিলা-----জন মোট -----জন	
০৫	আপনার পরিবারের আয়কারী সদস্য সংখ্যা কত জন?	১ জন ১ ২ জন ২ ৩ বা ৩ জনের অধিক ৩	
০৬	আপনার পরিবারের মাসিক গড় আয় কত?	-----টাকা	
০৭	আপনার পরিবারের মাসিক গড় ব্যয় কত?	-----টাকা	

গ্রামীণ বাজারের অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রঃনং	প্রশ্ন	উত্তর	কোড	নির্দেশনা
০১.	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অত্র বাজারে একটি ভবন/অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে/হচ্ছে আপনি সে সম্পর্কে কিছু জানেন কি?	হ্যাঁ ১ না ২		
০২.	যদি হ্যাঁ হয়, তবে ভবন/অবকাঠামোটি যথাস্থানে যথাযথ ভাবে নির্মাণ হয়েছে/হচ্ছে কিনা?	হ্যাঁ ১ না ২		
০৩	উত্তর না হলে, যথাস্থানে নির্মাণ না হওয়ার কারণ কি বলে মনে করেন?	বাজারে মধ্যে জমি অধিগ্রহণ করতে পারে নাই ১ মালিকানা জমি, কিছু বিক্রি করতে রাজি হচ্ছে না/হয়নি ২ বাজারের মধ্যে ভবন নির্মাণের মত সংকুলান ৩		

ক্রঃনং	প্রশ্ন	উত্তর	কোড	নির্দেশনা
		নেই/ছিলনা		
		অন্যান্যঃ	৪	
০৪	বাজারের নতুন অবকাঠামোটি নির্মাণের পর/নির্মাণ হলে অত্র এলাকার কৃষি ও অকৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা সম্ভব হবে/হচ্ছে কিনা?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
০৫	উত্তর না, হলে কি কারণে সহজে বাজারজাত করা সম্ভব হচ্ছে না/ হবে না বলে মনে করেন?	যেখানে অবকাঠামোটি নির্মাণ করা হবে, ঐস্থানের পূর্বের স্থাপনা সড়াতে পারছে না	১	
		কাজের অনেক ধীর গতি থাকায় কখন নির্মাণ কাজ শেষ হবে তা বলা যাচ্ছে না	২	
		বাজার যারা ইজারা নিয়েছেন, তাদের খাম-খেয়ালীর কারণে কেউ কৃষি পণ্য বাজারজাত করতে আসতে চাইনা/আসে না	৩	
		বাজারের দোকান বরাদ্দ পেতে অনেক বেগ পেতে হয়/হচ্ছে	৪	
		বাজারের যাতায়াত ব্যবস্থা সুবিধা না	৫	
		অন্যান্যঃ	৬	
০৬	বাজারের ভবন/অবকাঠামোটির নির্মাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি কেমন বলে আপনার কাছে মনে হয়?	অগ্রগতি খুবই ভালো	১	
		অগ্রগতি ভালো	২	
		অগ্রগতি কম	৩	
	(নির্মাণ কাজ চলমান হলে)	জানিনা	৪	
০৭	অগ্রগতি কম হলে, তার কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?	নির্মাণ কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি	১	
		পূর্বের স্থাপনা অপসারণ না করতে পারায় নির্মাণ কাজ শুরু করা যাচ্ছে না	২	
	(নির্মাণ কাজ চলমান হলে)	ঠিকাদার ঠিক মত কাজ করছেন না	৩	
		কাজের তদারকি কম	৪	
		সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী/ইঞ্জিনিয়ারগণ নিয়মিত সাইটে আসেন না	৫	
		অন্যান্যঃ	৬	
০৮	বাজারের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে/নির্মিত হলে দোকানসূহ কিভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে/হবে এ বিষয়ে কিছু জানেন কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
০৯	আপনি কোন দোকান বরাদ্দ পেয়েছেন কিনা? (নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে প্রশ্নটি প্রযোজ্য হবে)	হ্যাঁ	১	
		না	২	
১০	হ্যাঁ হলে কিভাবে বরাদ্দ পেয়েছেন?	----- -----		
১১	না হলে, বর্তমানে এখানে ব্যবসা পরিচালনা করতে কোন অর্থ ব্যয় করতে হয়/হয়েছে কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
১২	হ্যাঁ হলে, বর্তমানে এখানে ব্যবসা পরিচালনার জন্য কিভাবে অর্থ পরিশোধ করেছেন/করেন?	----- -----		
১৩	অত্র স্থানে বাজার উন্নয়ন/অবকাঠামো নির্মাণের ফলে আপনার কর্মস্থানে কোন প্রভাব পড়েছে কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	

ক্রঃনং	প্রশ্ন	উত্তর	কোড	নির্দেশনা
		জানিনা	৩	
১৪	হ্যাঁ হলে, কিভাবে এবং কি ধরনের প্রভাব পড়েছে বলে মনে করেন?	----- -----		
১৫	বাজারের অবকাঠামোটি নির্মাণের ফলে আপনার মাসিক গড় আয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানিনা	৩	
১৬	বাজারের অবকাঠামো বা বাজার উন্নয়নে পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়েছে কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানিনা	৩	
১৭	বাজারে নির্মিত অবকাঠামো/বিল্ডিংয়ের ভিতরের স্পেস ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদী কেমন বলে আপনার কাছে মনে হয়? (নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে প্রশ্নটি প্রযোজ্য হবে)	খুবই ভালো	১	
		ভালো	২	
		মোটামুটি	৩	
		ভালো না	৪	
১৮	উত্তর যদি মোটামুটি বা ভালো না হয়, তবে নির্মিত অবকাঠামো/বিল্ডিংয়ের ভিতরের স্পেস ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাতে কি কি সমস্যা রয়েছে বলে মনে করেন? (নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে প্রশ্নটি প্রযোজ্য হবে)	দোকানের স্পেস কম	১	
		হাটা-চলার স্পেস অপ্রতুল	২	
		প্রয়োজনের তুলনায় দোকানের স্বপ্নতা	৩	
		ওয়াশরুমগুলো আধুনিক মানের নই	৪	
		পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা ওয়াশরুম নেই	৫	
		খাবার পানির সুব্যবস্থা রাখা হয়নি	৬	
		অবকাঠামোটি আধুনিক মানের নই	৭	
		ইত্যাদি	৮	
১৯	বাজারের নতুন অবকাঠামোটি নির্মাণের পর/নির্মিত হলে অত্র এলাকার স্থানীয় কৃষকগণ প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করতে পারছেন/পারবেন কিনা?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
২০	এই অবকাঠামোটি নির্মাণের পূর্বে কৃষক তার উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্যগুলো কিভাবে বাজারজাত করতেন? (নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে প্রশ্নটি প্রযোজ্য হবে)	বাহিরে খোলা আকাশের নিচে বসে বিক্রি করা হত	১	
		অস্থায়ী দোকান ছিলো	২	
		রাস্তার পাশে বসে কৃষি ও অকৃষি পণ্যগুলো বাজারজাত করা হতো	৩	
		অন্যান্যঃ	৪	
২১	বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য সুলভ মূল্য সহজলভ্য হয়েছে/হবে কি না?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
২২	বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে কিনা?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
২৩	বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে/হবে কিনা?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
২৪	বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে/হবে কিনা?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
২৫	উপজেলা ও জেলা শহরের সাথে অত্র বাজারের যোগাযোগ	ভালো	১	

ক্রঃনং	প্রশ্ন	উত্তর	কোড	নির্দেশনা
	মাধ্যম/ব্যবস্থা কেমন বলে আপনার মনে হয়?	খুবই ভালো	২	
		মোটামুটি	৩	
		ভালো না	৪	
২৬	নির্মিত অবকাঠামোটির বর্তমান অবস্থা কেমন? (নির্মিত হলে)	বাজার বসার উপযুক্ত	১	
		অবকাঠামোটি মেরামত করা প্রয়োজন	২	
		এখনো নির্মাণ কাজ চলছে।	৩	
২৭	স্থানীয় কোন পক্ষ দ্বারা বাজারের ভবন/অবকাঠামোটি নির্মাণে/নির্মাণের সময় নির্মাণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়েছে/হচ্ছে কিনা?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
২৮	হ্যাঁ হলে, কী ধরনের বা কিভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে/হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?	----- -----		
২৯	ভবিষ্যতে বাজারের অবকাঠামোটি রক্ষাবেক্ষণ করার জন্য আপনার পরামর্শ/সুপারিশ কী? ----- -----			

জরীপকার্য সম্পাদনকারী

প্রশ্ন-পত্রটি পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ গিয়ে থাকলে উত্তরদাতাকে আবারও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিকভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে জরীপ কাজে অংশগ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তরদাতাকে আবারও ধন্যবাদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার

প্রকল্প পরিচালক, উপ প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে নিবিড় আলোচনার (KII)

গাইডলাইন :

নাম----- পদবি-----শাখা-----

দপ্তর----- ফোনমোবাইল/-----তারিখ-----

১. আপনার যোগদানের তারিখ -----
২. প্রকল্প বিষয়ে যৌক্তিকতা এবং উপযোগিতা সম্পর্কে আপনার মতামত প্রদান করুন?-----

৩. (ক) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না
(খ) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কোন দুর্বলতা ছিল কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না
(গ) হ্যাঁ হলে কী ধরনের দুর্বলতা ছিল বলে মনে করেন?-----
(ঘ) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই না করা হলে তার কারণ কী ছিল বলে মনে করেন?

৪. (ক) সময়মত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না
(খ) দেরিতে নিয়োগ করা হয়ে থাকলে, দেরিতে নিয়োগ করার কারণসমূহ কী?

৫. (ক) ভূমি অধিগ্রহণ বা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
(খ) হ্যাঁ হলে কী ধরনের জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন?

৬. (ক) প্রকল্পের ৫০৭টি বাজারের অবকাঠামো উন্নয়নের মধ্যে কতটি অবকাঠামোর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে-----
এবং কতটি অবকাঠামোর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা যায়নি-----ও কতটি অবকাঠামোর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন
হবে না বলে মনে করেন?

(খ) যে অবকাঠামোগুলোর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা যায়নি, তার কারণ কী? দয়া করে ব্যাখ্যা করুন

(গ) যে অবকাঠামোগুলোর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ সম্ভব হচ্ছেনা কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে বেগ পেতে হচ্ছে, সে অবকাঠামোগুলো
নির্মাণে বিকল্প ব্যবস্থা কী? -----
৭. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এবং নির্মিতব্য বাজারের মালিকানা কার হবে এবং বাজার রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে করা হবে?

৮. (ক) দীর্ঘ দিন ধরে ২০১৭-২০২৫ মেয়াদে প্রকল্পের কাজ চলমান থাকলে এর উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হতে পারে কিনা এবং

উপকারভোগী প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এর সুফল সঠিকভাবে পেয়েছে/পাবে বলে মনে করেন কি?

১. হ্যাঁ ২. না

৯. প্রকল্পে কতটি প্যাকেজের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে? (১) পণ্য-----টি, (২) পূর্ত কাজ-----টি

১০. (ক) যে প্যাকেজগুলোতে কাজ শুরু কিংবা দরপত্র আহবান করা যায়নি সেই প্যাকেজগুলোর নাম উল্লেখ করুন?

(খ) যে প্যাকেজগুলোতে কাজ শুরু কিংবা দরপত্র আহবান করা যায়নি তার কারণ কী?

১১. (ক) প্রকল্প শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ এবং অর্থ ছাড়ে কোন সমস্যা হয়েছে কি?

১. হ্যাঁ ২. না

হলে, বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে?

(গ) কীভাবে সমস্যাগুলো মোকাবেলা করেছেন?

১২. (ক) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় এবং সংগ্রহে (Procurement) এর প্রচলিত বিধিমালা (যেমন: PPA-06/PPR-08) অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা/ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

(খ) হ্যাঁ হলে, কীভাবে সেগুলো মোকাবেলা করেছেন বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

১৩. (ক) ডিপিপি ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুসারে প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোগুলো নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে কিনা?

১. হ্যাঁ ২. না

(খ) যদি না হয়ে থাকে, ডিপিপি ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুসারে কোন কোন ভৌত অবকাঠামোগুলো নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না বা হয়নি বলে মনে করেন?

১৪. (ক) ডিপিপি/আরডিপিপি'তে উল্লেখিত ডিজাইন, টেন্ডার ডকুমেন্টে প্রদানকৃত ডিজাইন, কার্যক্ষেত্রে প্রদত্ত ওয়ার্কিং ডিজাইন এবং সম্ভাব্য As Built ডিজাইন – এগুলোর মাঝে মিল রয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

(খ) গরমিল থাকলে, গরমিলগুলো কী?

(গ) ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশনের পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পের কাজের গতি ও কাজের মানে কোন প্রভাব পড়ে থাকলে তা কী কী? ব্যাখ্যা করুন।

১৫. (ক) ডিপিপি/আরডিপিপি'তে টেকনিক্যাল সাপোর্টের জন্য কনসালটেন্ট/পরামর্শক নিয়োগের প্রবিশন ছিল কিনা?

১. হ্যাঁ ২. না

(খ) যথাযথভাবে কনসালটেন্ট/পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে কিনা?

১. হ্যাঁ ২. না

(গ) কনসালটেন্ট/পরামর্শক নিয়োগ না হয়ে থাকলে প্রকল্পের কাজের গতি এবং কাজের মানে কোনো প্রভাব ফেলেছে বলে আপনি মনে করেন কী?

(ঘ) কনসালটেন্ট/পরামর্শক নিয়োগে ডিপিপি/আরডিপিপি ও টেন্ডার ডকুমেন্টে কোন ধরনের সীমাবদ্ধতা আছে কিনা? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

১৬. (ক) প্রকল্পের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী প্রকৌশলী ও কারিগরি জনবল রয়েছে কি?

১. হ্যাঁ ২. না

(খ) না থাকলে তার কারণসমূহ কী?

(গ) জনবল সংক্রান্ত বিষয়ে ডিপিপি/আরডিপিপি ও টেন্ডার ডকুমেন্টে কোনো ধরনের সীমাবদ্ধতা ছিল/আছে কিনা?

১.হ্যাঁ ২. না

(ঘ) জনবল সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো সীমাবদ্ধতা থেকে থাকলে সে কারণে প্রকল্পের কাজের গতি ও কাজের মানে কী ধরনের প্রভাব পড়েছে বলে আপনি মনে করেন?-----

১৭. (ক) যথাযথ স্থানে অবকাঠামোগুলি নির্মাণে স্থানীয় পর্যায়ে কোন বাধা/বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে কি?

১. হ্যাঁ ২. না

(খ) হ্যাঁ, কী ধরনের বাধা/বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে?

১৮. বাজার নির্মাণের ফলে পরিবেশের কোন ক্ষতি হয়েছে/হচ্ছে কিনা? দয়া করে মতামত প্রদান করুন।

১৯. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো বাজার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন। -----

২০. (ক) প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতে এবং টেন্ডার ডকুমেন্টস প্রস্তুতকালে কোন রোট শিডিউল (PWD/RHD/LGED) অনুসরণ করা হয়েছে। -----

(খ) যে সমস্ত আইটেমে নির্ধারিত রোট শিডিউল অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি সে সমস্ত আইটেমের বাজার দরের যৌক্তিক বিশ্লেষণমূলক তথ্যাদি (ডিপিপি/আরডিপিপি/ক্রয় সংক্রান্ত ডকুমেন্টস) সংযুক্ত আছে কিনা? ১.হ্যাঁ ২. না

২১. (ক) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামালগুলোর তালিকা রেজিস্টার করা হয় কি? ১.হ্যাঁ ২. না

(সংগৃহীত মালামালগুলোর তালিকা প্রদান করুন)

(খ) সংগৃহীত মালামালগুলো কোন ব্র্যান্ডের এবং কোন ব্র্যান্ডের কী পরিমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন?

২২. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবার গুণগতমান এবং পরিমাণ কীভাবে যাচাই করা হয়?

২৩. বিএনবিসি অনুযায়ী প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগত মান রক্ষার ক্ষেত্রে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে?

(ক) মাটি পরীক্ষা

(খ) সিলিন্ডার টেস্ট

(গ) সিমেন্ট টেস্ট

(ঘ) পানি টেস্ট (ঢালাই এবং কিউরিং এর পানি)

(ঙ) রড টেস্ট

(চ) কংক্রিট এর স্লাম্প টেস্ট

(ছ) পাথর,বালি ইত্যাদি টেস্ট

(জ) অন্যান্য (যদি থাকে)

(দয়া করে বিভিন্ন টেস্ট রিপোর্টের কপি প্রদান করুন)

২৪. (ক) উপরে লেখিত উপকরণ সমূহের (সিমেন্ট, রড, বালি, পাথর,) টেস্ট কোন প্রতিষ্ঠান থেকে করা হয়েছে? -----

(খ) উপকরণ সমূহ কোন ব্রান্ড/কোম্পানির ছিল?-----

(গ) উপকরণ সমূহ Sealed/Unsealed কী অবস্থায় টেস্ট করা হয়েছিল?-----

(ঘ) Unsealed অবস্থায় টেস্ট এর জন্য প্রেরণ করা হয়ে থাকলে এর কারণ কী?

২৫. ভৌত নির্মাণ কাজে কোনো ধরনের কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কি? ১.হ্যাঁ ২. না
হ্যাঁ' হলে কী ধরনের কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?
(ক) ডিজাইনে অস্পষ্টতা
(খ) মাটির মান নিম্ন মানের
(গ) অন্যান্য-----
২৬. প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগতমান রক্ষার ক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ নিলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন?

২৭. (ক) ঠিকাদার কর্তৃক সঠিক সময়ে কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
(খ) হ্যাঁ হলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন?-----

২৮. নির্মাণ কাজের জন্য নিয়োজিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান তাদের চুক্তিপত্র ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছে কিনা?

২৯. (ক) ঠিকাদারের দাখিলকৃত দর BoQ Estimate এর সাথে ঠিক আছে কিনা? ১.হ্যাঁ ২. না
(খ) না থাকলে BoQ Estimate এ কতটুকু ভেরিয়েশন হয়েছে?

(গ) প্রকল্পে এই পর্যন্ত BoQ'র কোন কোন আইটেমে ভেরিয়েশন হয়েছে এবং কোন আইটেমে কত পারসেন্ট ভেরিয়েশন হয়েছে?

(ঘ) প্রকল্পে এই পর্যন্ত BoQ'র সার্বিক ভেরিয়েশন কত?-----
৩০. (ক) যে কোন উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর মনিটরিং সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ কীভাবে মনিটরিং করা হয়/হচ্ছে?-----

(খ) সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং হচ্ছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না
(গ) মনিটরিং রেজিস্টার যথাযথভাবে বজায় রাখা হচ্ছে কিনা এবং সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসমূহ লিপিবদ্ধ রাখা হচ্ছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না
(ঘ) নির্দেশনাসমূহ মোতাবেক কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে/হচ্ছে?-----

(ঙ) আরো কীভাবে মনিটরিং করা হলে চলমান প্রকল্পে সফল বাস্তবায়ন সম্ভব বলে মনে করেন?

৩১. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী কী বাধা/বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন? -----

৩২. (ক) লগ-ফ্রেম Time bound, input, output, measureable indicator realistic কি না? ১. হ্যাঁ ২. না
(খ) এ বিষয়ে আপনার কোন পর্যবেক্ষণ আছে কিনা? থাকলে ব্যাখ্যা করুন -----

৩৩. (ক) প্রকল্পের PIC, PSC কমিটির সভাগুলো ডিপিপি অনুযায়ী নিয়মিত আয়োজন করা হয় কি না? ১. হ্যাঁ ২. না
(PIC এবং Steering Committee meeting রেজুলেশন প্রদান করুন)
(খ) নিয়মিত না হলে ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী PIC, Steering Committee meeting গুলো না হওয়ার কারণ উল্লেখ করুন?-----

৩৪. (ক) PIC ও তত্ত্বাবধান কমিটির মন্তব্য ও সুপারিশগুলো যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না? ১. হ্যাঁ ২. না
(PIC ও তত্ত্বাবধান কমিটির মিটিং এর সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়নকৃত রেজুলেশনটি প্রদান করুন)

(খ) PIC ও তত্ত্বাবধান কমিটির সুপারিশের আলোকে কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হয়ে থাকলে কারণগুলো কী?

৩৫. (ক) আইএমইডি'র সুপারিশগুলো যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না? ১. হ্যাঁ ২. না

(খ) উদাহরণসহ কয়েকটি সুপারিশ উল্লেখ করুন?-----

৩৬. (ক) প্রকল্পটি আইএমইডি'র পিএমআইএস'এ যুক্ত হয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

(খ) প্রতি মাসে আপডেট করা হয় কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

(গ) যদি না হয়ে থাকলে, তাহলে কেন আপডেট করা হয় না বলে আপনি মনে করেন?-----

৩৭. এই সময়ে প্রকল্পের কাজের আর্থিক এবং ভৌত অগ্রগতি কতটুকু? -----আর্থিক-----ভৌত

৩৮. (ক) বর্তমান কাজের অগ্রগতি বিবেচনায় নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে বলে মনে করেন কি না? ১. হ্যাঁ ২. না

(খ) না হলে, নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন না হওয়ার কারণগুলো কী?-----

৩৯. (ক) বৈশ্বিক কোভিড-১৯ সংকটকালীন পরিস্থিতিতে প্রকল্পের কাজ কখনো বন্ধ ছিল কি? ১. হ্যাঁ ২. না

(খ) যদি বন্ধ হয়ে থাকে সেটা কখন এবং কতটা সময় ধরে ঘটেছিল?-----

৪০. (ক) এ'যাবত কয়টি (ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল) অডিট হয়েছে?

ইন্টারনাল-----সংখ্যা

এক্সটারনাল-----সংখ্যা

(খ) অডিটে কোন আপত্তি ছিল কি না? ১. হ্যাঁ ২. না

(গ) হ্যাঁ হলে, আপত্তিগুলো কী ধরনের ছিল?-----

(ঘ) অডিটে কয়টি আপত্তি ছিল?

-----সংখ্যা

(ঙ) অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পন্ন হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

(নিষ্পন্নর কপি প্রদান করুন)

(চ) কোন অডিট আপত্তি অমীমাংসিত থাকলে সে সম্পর্কে বলুন।

৪১. স্বাক্ষর ফলপ্রসূ এবং টেকসইকরণে আপনার মন্তব্যগুলো ব্যাখ্যা করুন।

তথ্য প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ

তারিখঃ

সীল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার

নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে নিবিড় আলোচনার (KII)

গাইডলাইন :

নামঃ-----পদবিঃ-----

দপ্তরঃ-----উপজেলাঃ-----জেলাঃ-----

ফোনমোবাইল/ঃ-----তারিখঃ-----

১. আপনার যোগদানের তারিখ -----
২. প্রকল্প বিষয়ে যৌক্তিকতা এবং উপযোগিতা সম্পর্কে আপনার মতামত প্রদান করুন?-----

৩. (ক) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না
(খ) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কোন দুর্বলতা ছিল কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না
(গ) হ্যাঁ হলে কী ধরনের দুর্বলতা ছিল বলে মনে করেন?-----

(ঘ) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই না করা হলে তার কারণ কী ছিল বলে মনে করেন?

৪. (ক) সময়মত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না
(খ) দেরিতে নিয়োগ করা হয়ে থাকলে, দেরিতে নিয়োগ করার কারণসমূহ কী?

৫. (ক) ভূমি অধিগ্রহণ বা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
(খ) হ্যাঁ হলে কী ধরনের জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন?

৬. প্রকল্পে কতটি প্যাকেজের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে? (১) পণ্য-----টি, (২) পূর্ত কাজ-----টি
৭. যে প্যাকেজগুলোতে কাজ শুরু কিংবা দরপত্র আহবান করা যায়নি সেই প্যাকেজগুলোর নাম উল্লেখ করুন?

৮. (ক) প্রকল্প শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ এবং অর্থ ছাড়ে কোন সমস্যা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
হলে, বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে?

(গ) কীভাবে সমস্যাগুলো মোকাবেলা করেছেন?

৯. (ক) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় এবং সংগ্রহে (Procurement) এর প্রচলিত বিধিমালা (যেমন: PPA-06/PPR-08) অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা/ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়েছে কী? ১. হ্যাঁ ২. না
(খ) হ্যাঁ হলে, কিভাবে সেগুলো মোকাবেলা করেছেন বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।
১০. (ক) ডিপিপি/আরডিপিপি'তে উল্লেখিত ডিজাইন, টেন্ডার ডকুমেন্টে প্রদানকৃত ডিজাইন, কার্যক্ষেত্রে প্রদত্ত ওয়ার্কিং ডিজাইন এবং সম্ভাব্য As Built ডিজাইন – এগুলোর মাঝে মিল রয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না
(খ) যদি না হয়ে থাকে, ডিপিপি/আরডিপিপি ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুসারে কোন কোন ভৌত অবকাঠামোগুলো নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না বা হয়নি বলে মনে করেন?
১১. (ক) ডিপিপি/আরডিপিপি'তে উল্লেখিত ডিজাইন, টেন্ডার ডকুমেন্টে প্রদানকৃত ডিজাইন, কার্যক্ষেত্রে প্রদত্ত ওয়ার্কিং ডিজাইন এবং সম্ভাব্য As Built ডিজাইন – এগুলোর মাঝে মিল রয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না
(খ) গরমিল থাকলে, গরমিলগুলো কী? -----
(গ) ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশনের পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পের কাজের গতি ও কাজের মানে কোন প্রভাব পড়ে থাকলে তা কী কী? ব্যাখ্যা করুন।-----
১২. (ক) প্রকল্পের অবকাঠামোগুলি নির্মাণে স্থানীয় পর্যায়ে কোন বাধা/বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
(খ) হ্যাঁ, কী ধরনের বাধা/বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে?
১৩. (ক) প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতে এবং টেন্ডার ডকুমেন্টস প্রস্তুতকালে কোন রোট শিডিউল (PWD/RHD/LGED) অনুসরণ করা হয়েছে। -----
(খ) যে সমস্ত আইটেমে নির্ধারিত রোট শিডিউল অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি সে সমস্ত আইটেমের বাজার দরের যৌক্তিক বিশ্লেষণমূলক তথ্যাদি (ডিপিপি/আরডিপিপি/ক্রয় সংক্রান্ত ডকুমেন্টস) সংযুক্ত আছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না
১৪. (ক) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামালগুলোর তালিকা রেজিস্টার করা হয় কি? ১. হ্যাঁ ২. না
(সংগৃহীত মালামালগুলোর তালিকা প্রদান করুন)
(খ) সংগৃহীত মালামালগুলো কোন ব্র্যান্ডের এবং কোন ব্র্যান্ডের কী পরিমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন?
১৫. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবার গুণগতমান এবং পরিমাণ কীভাবে যাচাই করা হয়?
১৬. বিএনবিসি অনুযায়ী প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগত মান রক্ষার ক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে?
(ক) মাটি পরীক্ষা
(খ) সিলিন্ডার টেস্ট
(গ) সিমেন্ট টেস্ট

(ঘ) পানি টেস্ট (ঢালাই এংং কিউরিং এর পানি)

(ঙ) রড টেস্ট

(চ) কংক্রিট এর স্লাম্প টেস্ট

(ছ) পাথর, বালি ইত্যাদি টেস্ট

(জ) অন্যান্য (যদি থাকে)

১৭. (ক) উপরেলেখিত উপকরণ সমূহের (সিমেন্ট, রড, বালি, পাথর,) টেস্ট কোন প্রতিষ্ঠান থেকে করা হয়েছে? -----

(খ) উপকরণ সমূহ কোন ব্রান্ড/কোম্পানির ছিল?-----

(গ) উপকরণ সমূহ Sealed/Unsealed কী অবস্থায় টেস্ট করা হয়েছিল?-----

(ঘ) Unsealed অবস্থায় টেস্ট এর জন্য প্রেরণ করা হয়ে থাকলে এর কারণ কী?

১৮. ভৌত নির্মাণ কাজে কোনো ধরনের কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কি? ১.হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ' হলে কী ধরনের কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?

(ক) ডিজাইনে অস্পষ্টতা

(খ) মাটির মান নিম্ন মানের

(গ) অন্যান্য-----

১৯. প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগতমান রক্ষার ক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ নিলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন?

২০. (ক) ঠিকাদার কর্তৃক সঠিক সময়ে কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

(খ) হ্যাঁ হলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন?-----

২১. নির্মাণ কাজের জন্য নিয়োজিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান তাদের চুক্তিপত্র ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছে কিনা?

২২. (ক) যে কোন উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর মনিটরিং সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ

ক্ষেত্রে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ কীভাবে মনিটরিং করা হয়/হচ্ছে?-----

(খ) সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং হচ্ছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

(গ) মনিটরিং রেজিস্টার যথাযথভাবে বজায় রাখা হচ্ছে কিনা এবং সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসমূহ লিপিবদ্ধ রাখা হচ্ছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

(ঘ) নির্দেশনাসমূহ মোতাবেক কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে/হচ্ছে?-----

(ঙ) আরো কীভাবে মনিটরিং করা হলে চলমান প্রকল্পে সফল বাস্তবায়ন সম্ভব বলে মনে করেন?

২৩. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী কী বাধা/বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন? -----

২৪. এই সময়ে প্রকল্পের কাজের আর্থিক এবং ভৌত অগ্রগতি কতটুকু? -----আর্থিক-----ভৌত
২৫. (ক)বর্তমান কাজের অগ্রগতি বিবেচনায় নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে বলে মনে করেন কি না? ১. হ্যাঁ ২. না
(খ) না হলে, নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন না হওয়ার কারণগুলো কী?-----
২৬. (ক) বৈশ্বিক কোভিড-১৯ সংকটকালীন পরিস্থিতিতে প্রকল্পের কাজ কখনো বন্ধ ছিল কি? ১. হ্যাঁ ২. না
(খ) যদি বন্ধ হয়ে থাকে সেটা কখন এবং কতটা সময় ধরে ঘটেছিল?-----
২৭. স্নকে ফলপ্রসূ এবং টেকসইকরণে আপনার মন্তব্যগুলো ব্যাখ্যা করুন।

তথ্য প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ

তারিখঃ

সীল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান/ইউপি চেয়ারম্যান, বাজার সমিতির সভাপতি/সেক্রেটারি
সাথে নিবিড় আলোচনার (KII) গাইডলাইন :

নাম-----পদবি-----শাখা-----
দপ্তর-----উপজেলা-----জেলা-----
ফোনমোবাইল/-----তারিখ-----

১.	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে অত্র বাজারে অবকাঠামো নির্মাণ/বাজার উন্নয়নের উপযোগীতা বিষয়ে আপনার মতামত প্রদান করুন?
২.	অত্র স্থানে বাজার উন্নয়ন/অবকাঠামো নির্মাণের ফলে অত্র এলাকার কর্মস্থানের উপর কোন প্রভাব পড়েছে কি? হ্যাঁ হলে কিভাবে?
৩.	প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরবর্তীতে অত্র এলাকার কৃষি ও অকৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা সম্ভব হবে/হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন কিনা? হ্যাঁ হলে, কিভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।
৪.	(ক) অত্র উপজেলায় দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের নির্মাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি কেমন বলে আপনার কাছে মনে হয়? দয়া করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন। (খ) ধীরগতি হয়ে থাকলে তার কারণ কি বলে মনে করেন?-----
৫.	আপনার জানামতে অবকাঠামো/ভবনটি নির্মাণকালে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী/ইঞ্জিনিয়ারগণ নিয়মিত সাইট পরিদর্শন করেন কি?
৬.	বাজারের ভিতরে অবকাঠামো/ভবনটি নির্মাণের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে কিনা? এ'ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন কি? না হলে, কি ধরনের ব্যত্যয়/সমস্যা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
৭.	বাজারের অবকাঠামো বা বাজার উন্নয়নে পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়েছে কি? দয়া করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।
৮.	আপনার মতে বাজার উন্নয়নে জমি নিয়ে কোন জটিলতাতা আছে কিনা? হ্যাঁ হলে, কি ধরনের জটিলতা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন? দয়া করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।
৯.	(ক) বাজারের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে/নির্মিত হলে কিভাবে দোকানগুলো বরাদ্দ দেয়া হয়েছে/হবে এ বিষয়ে দয়া করে বিস্তারিত মতামত পেশ করুন। (খ) বরাদ্দের জন্য কোন নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে কি? হ্যাঁ হলে নীতিমালায় বরাদ্দের বিষয়ে কি কি শর্ত আরোপ করা হয়েছে এবং বরাদ্দের নিয়মাবলীগুলো কি? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন। (গ) নীতিমালা প্রস্তুত/চূড়ান্ত না হলে, কবে নাগাদ প্রস্তুত/চূড়ান্ত করা হবে বলে আপনি মনে করেন? (ঘ) নীতিমালা চূড়ান্ত না হলে বর্তমানে অবকাঠামোর ভিতরে যারা ব্যবসা পরিচালনা করতেন, তাদেরকে কি হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করতে দেয়া হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
১০.	যে স্থানে বাজারের অবকাঠামো উন্নয়ন হচ্ছে/হয়েছে সেখানে পূর্বে কি ছিল? পূর্বের স্থাপনাসমূহ সড়াক/উচ্ছেদ করতে কোন ধরনের সমস্যা হয়েছে কি? হ্যাঁ হলে, কি ধরনের সমস্যা হয়েছে/হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার
সুফলভোগী, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান/স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে দলীয় আলোচনার গাইডলাইন

সভার স্থান-----তারিখ-----

উপজেলা-----বিভাগ-----জেলা-----

	নাম	পেশা	ঠিকানা/দপ্তর	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১.					
২.					
৩.					
৪.					
৫.					
৬.					
৭.					
৮.					
৯.					
১০.					
১১.					
১২.					

- ১ দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অত্র বাজারে একটি ভবন/অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে/হচ্ছে আপনারা সে সম্পর্কে কিছু জানেন কিনা? হলে কিভাবে?
- ২ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরবর্তীতে এই অত্র এলাকার কৃষি ও অকৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা সম্ভব হবে/হচ্ছে বলে আপনারা মনে করেন কি? হ্যাঁ হলে, কিভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।
- ৩ যে স্থানে অবকাঠামোটি নির্মাণ করা হচ্ছে/নির্মিত হয়েছে সেখানের পূর্বের স্থাপনাসমূহ সরাতে/উচ্ছেদ করতে কোন ধরনের সমস্যা হয়েছে কি? হ্যাঁ হলে, কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে/হয়েছিল বলে আপনারা মনে করেন?
- ৪ বাজারের ভবন/অবকাঠামোটির নির্মাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি কেমন বলে আপনাদের কাছে মনে হয়? কম হলে তার কি? দয়া করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।
- ৫ বাজার উন্নয়নে জমি নিয়ে কোন জটিলতাতা আছে কি? হ্যাঁ হলে, কি ধরনের জটিলতা রয়েছে বলে আপনারা মনে

করেন?

- ৫ বাজারের অবকাঠামো নির্মাণে আপনাদের কারো কোন জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে কি? হ্যাঁ হলে, জমি অধিগ্রহণের টাকা আপনারা বুঝে পেয়েছেন কি? না হলে, না পাওয়ার কারণ কি?
- ৬ বাজারের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে/নির্মিত হলে দোকানসূহ কিভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে/হবে এ বিষয়ে আপনারা কিছু জানেন কি? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।
- ৭ অত্র স্থানে বাজার উন্নয়ন/অবকাঠামো নির্মাণের ফলে এলাকার কর্মস্থানে কোন প্রভাব পড়েছে কি? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।
- ৮ আপনাদের মতে বাজারের অবকাঠামো বা বাজার উন্নয়নের ফলে পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়েছে কি? হ্যাঁ হলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।
- ৯ বাজারের নতুন অবকাঠামোটি নির্মাণের পর/নির্মিত হওয়ায় অত্র এলাকার স্থানীয় কৃষকগণ প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করতে পারছেন/পারবেন বলে আপনারা মনে করেন কি?
- ১০ এই অবকাঠামোটি নির্মাণের পূর্বে কৃষক তার উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্যগুলো কিভাবে বাজারজাত করতেন? (ভবনটি নির্মিত হলে)
- ১১ আপনাদের মতে বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে/হতে পারে বলে মনে করেন কি?
- ১২ আপনাদের মতে উন্নত বাজার/বাজারের অবকাঠামোকে কেন্দ্র করে নগর ও গ্রাম এর মধ্যে দূরত্ব ও দারিদ্র ক্রমশ হ্রাসের মাধ্যমে শহরমুখী মানুষের যাতায়াত কমবে/কমেছে কি? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।
- ১৩ বাজারের উন্নয়ন এবং অবকাঠামো নির্মাণের আগে বাজার ব্যবসায়ী বা জমির মালিকদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে কি? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।
- ১৪ বাজারের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে/নির্মিত হলে দোকানসূহ কিভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে/হবে এ বিষয়ে আপনারা কিছু জানেন কি?
- ১৫ যে স্থানে বাজারের অবকাঠামো উন্নয়ন হচ্ছে/হয়েছে সেখানে পূর্বে কি ছিল? পূর্বের স্থাপনাসমূহ সড়াতে/উচ্ছেদ করতে কোন ধরনের সমস্যা হয়েছে কি? দয়া করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার
সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশ্নমালা।

সাধারণ তথ্যাবলী

০১	উত্তর দাতার নামঃ	পদবীঃ
০২	উত্তরদাতার লিঙ্গঃ	পুরুষ -----১ মহিলা -----২-----
০৩	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নামঃ	
০৪	প্রকল্প এলাকার নামঃ	
০৫	ওয়ার্ড/মহল্লা/রাস্তা/	থানা/উপজেলাঃ
০৬	জেলাঃ	বিভাগঃ
০৭	উত্তর দাতার মোবাইল নং	

নির্মাণ কাজ ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	উত্তরসহ কোড	নির্দেশনা
১	আপনার প্রতিষ্ঠান কত তারিখে প্রকল্পের কাজটি পেয়েছে?	দিন-----মাস-----বছর-----	
২	কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর যথাসময়ে সাইট বুকে পেয়েছেন কি?	হ্যাঁ ১ না ২	
৩	না হলে কত দিন পরে বুকে পেয়েছেন?	দিন-----মাস-----বছর-----	
৪	দেরি হওয়ার কারণ কী ছিল?	যায়গা দখল নেয়া যাচ্ছিল না ১ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক আদেশ প্রদানে ধীরগতি ২ অনিবার্য কারণে আদেশ প্রদানে জটিলতা ৩ অন্যান্য..... ৪	
৫	আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অত্র প্রকল্পের কতটি প্যাকেজে নির্মাণ কাজ করছে?	-----টি	
৬	প্রকল্পের ডাইংসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সঠিক সময়ে পেয়েছেন কি?	হ্যাঁ ১ না ২	
৭	না' হলে সঠিক সময়ে বুকে না পাওয়ার কারণগুলো কী?	ডিজাইন ও ডাইং প্রস্তুত হয়নি ১ সমস্বয়ের অভাব ও ধীরগতি ২ অন্যান্য..... ৩	
৮	অর্থ-ছাড় কিংবা বিল প্রাপ্তি যথাসময়ে হয়েছে কি?	হ্যাঁ ১ না ২	
৯	না' হলে বিল প্রাপ্তিতে কী ধরনের সমস্যা হয়েছিল?	অর্থ ছাড় সম্পন্ন হয়নি ১ কাজের মান নিয়ে আপত্তি ২ স্থানীয় সরকার বিভাগের কাজের ধীরগতি ৩ অন্যান্য..... ৪	
১০	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে কোন বাধা/বিপত্তির	হ্যাঁ ১	

	সম্মুখীন হয়েছেন কি?	না	২	
১১	হ্যাঁ হলে কী ধরনের বাধা/বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন?	মালামাল আনা নেয়ায় বাঁধা	১	
		স্থানীয় লোকজন কর্তৃক বাঁধা	২	
		মালামাল চুরি ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া	৩	
		কোভিড-১৯ সংক্রান্ত কারণে	৪	
		অন্যান্য.....		
১২	প্রকল্পের শর্তানুযায়ী আপনার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রকৌশলী ও কারিগরি জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
১৩	কারিগরি জনবলের সংখ্যা পদবি ও তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বর্ণনা করুন।	-----		
১৪	শ্রমিকের সংখ্যা, ধরণ ও তাদের কর্ম দক্ষতা বর্ণনা করুন।	-----		
১৫	এই মুহূর্তে অত্র সাইটে কাজের অগ্রগতি কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক পর্যায়ে আছে কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
১৬	না' হলে বিলম্বের কারণগুলো কী?	সঠিক সময়ে বিল না পাওয়া	১	
		কোভিড-১৯ সংক্রান্ত কারণে	২	
		রাষ্ট্রীয় গোলযোগ যথা হরতাল ও ধর্মঘটের জন্য কাজে বিঘ্ন	৩	
		ডিজাইন ও কারিগরি নির্দেশনা প্রাপ্তিতে দেরি	৪	
		অন্যান্য.....		
১৭	বর্তমান কাজের অগ্রগতি অনুযায়ী কবে নাগাদ সম্পন্ন করতে পারবেন বলে মনে করেন?	দিন-----মাস-----বছর-----		
১৮	প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগত মান রক্ষার ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন? (দয়া করে বিভিন্ন টেস্ট রিপোর্টের কপি প্রদান করুন)	মাটি পরীক্ষা	১	
		সিলিন্ডার টেস্ট	২	
		সিমেন্ট টেস্ট	৩	
		পানি টেস্ট (ঢোলাই এবং কিউরিং এর পানি)	৪	
		রড টেস্ট	৫	
		কংক্রিট এর স্লাম্প টেস্ট	৬	
		পাথর, বালি ইত্যাদি টেস্ট	৭	
		অন্যান্য-----	৮	
১৯	ভৌত নির্মাণ কাজে কোন ধরনের কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
২০	হ্যাঁ হলে কী ধরনের কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?	ডিজাইনে অস্পষ্টতা	১	
		মাটির মান নিম্ন মানের	২	
		অন্যান্য-----	৩	
২১	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং সাহায্য সহযোগিতা যথার্থ ছিল কী?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
২২	না হলে কোন পর্যায়ে সহযোগিতা যথার্থ ছিল না বলে মনে করেন?	সঠিক সময়ে মনিটরিং এর অভাব	১	
		ডিজাইনের অপরিপূর্ণ ব্যাখ্যা	২	
		যথেষ্ট সংখ্যক মিটিং ও ফিডব্যাক তথা নির্দেশনা সময়মত না পাওয়া	৩	
		অন্যান্য-----	৪	
২৩	প্রকল্পের Specification যথার্থ ছিল কি?	হ্যাঁ	১	

		না	২	
২৪	না' হলে কেন মনে করেন Specification যথার্থ ছিল না?			
২৫	প্রকল্পটির কারিগরি নকশা ও কর্ম-পরিবল্লনা যথার্থ ছিল বলে মনে করেন কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
২৬	না' হলে কারিগরি নকশা ও কর্ম-পরিবল্লনায় কি ধরনের সমস্যা ছিল বলে মনে করেন?			
২৭	টেন্ডার প্রক্রিয়া ও কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াটি যথার্থ ছিল বলে মনে করেন কী?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
২৯	না' হলে কী ধরনের অসংগতি ছিল বলে মনে করেন?			
৩০	এই মুহুর্তে প্রকল্পটি সঠিক সময়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জগুলো কী বলে মনে করেন?			

সাক্ষাৎ প্রদানকারীর স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ

তথ্য প্রদানে সার্বিক সহায়তার জন্য ধন্যবাদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার
ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট
(প্রতিটি প্যাকেজের জন্য আলাদা আলাদা চেক লিস্ট ব্যবহার করা হবে)

ক্রমিক নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১	প্রকল্পের নাম	
২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে)	
৫	ক্রয় পদ্ধতি/টেন্ডারিং অনুসৃত পদ্ধতি	
৬	ডিপিপি/আরডিপিপি'র প্রবিশন কী ছিল?	
৭	ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ	(১) অন-লাইন (২) অফ-লাইন
৮	দরপত্র দলিল [বা প্রস্তাব] প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ না
৯	বিনির্দেশ প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ না
১০	বিনির্দেশ প্রস্তুতকরণে সিপিটিউ কর্তৃক প্রকাশিত স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্টস ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ না
	(ক) হলে তাঁর ধরণ	
১১	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)	১। পত্রিকার নামঃ (বাংলা)-----তারিখঃ----- ২। পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি)-----তারিখঃ----- ৩। সিপিটিউ ওয়েব সাইট -----তারিখঃ-----
১২	১ কোটি টাকার অধিক মূল্যের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিউ ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ না
১৩	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষের তারিখ ও সময়	শুরু-----শেষ-----তারিখঃ সময়ঃ
১৪	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	-----টি
১৫	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	-----টি
১৬	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	তারিখঃ সময়ঃ
১৭	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	-----জন
১৮	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	/ /
১৯	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	----- জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা-----জন
২০	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	----- জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা-----জন
২১	দরপত্রের জামানত জমা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি)	হ্যাঁ না
২২	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	----- টি
২৩	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	----- টি

২৪	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ (Approval of Award)		
২৫	Notification of Award প্রদানের তারিখ	-----তারিখ	
২৬	Notification of Award এর Validity Period এর মধ্যে Contact Signing হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
		না	
২৭	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় [প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)]	-----টাকা	
	দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়		
২৮	চুক্তি মূল্য	-----টাকা	
২৯	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম		
৩০	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ		
৩১	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ		
৩২	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ		
৩৩	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ		
৩৪	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ		
৩৫	☐ সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি? ☐ হলে কতদিন বৃদ্ধি ; এবং ☐ বৃদ্ধির কারণ;		
৩৬	সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি ছিল কি ?	হ্যাঁ	
		না	
৩৭	ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছিল কি না ?	হ্যাঁ	
		না	
৩৮	যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুন		
৩৯	ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ?	হ্যাঁ	
		না	
৪০	ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি		
৪১	ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
		না	
৪২	হ্যাঁ হলে অডিট আপত্তি ছিল কিনা?	হ্যাঁ	
		না	
৪৩	অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি ছিল এবং কতটি নিষ্পন্ন হয়েছে?	আপত্তির সংখ্যা-----টি নিষ্পন্ন সংখ্যা-----টি	
৪৪	অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন না হয়ে থাকলে তার কারণ?	----- -----	



এমএস ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস্ লিঃ

বাড়ি-৫৪৭ (ফ্ল্যাট ১/এ), মনিপুর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

ই-মেইল: msdassociates17@gmail.com

ওয়েব সাইট: www.msda ltd.com

ফোন: +৮৮০২ ৫৫০৭৭৬৮০, ০১৫৩১-৯৪৭৪৮৪
