

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রকল্প পরিবীক্ষণ ছক

পরিদর্শনের তারিখ: ১০/০৫/২০১৮ খ্রি:

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: পুলক কান্তি বড়ুয়া, পদবী: পরিচালক (উপসচিব) সেক্টর: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

১. প্রকল্পের নাম: ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এ্যান্ড কমিশনিং অফ নিউ ৩৩ কেভি ১X২০/২৮, ৩৩ কেভি জিআইএস, ১১ কেভি এআইসে ইউথ মেটারিয়ালস এট তেজগাঁও ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন; মেইনটেনেন্স এ্যান্ড এনারজাইজেশন অফ মগবাজার তেজগাঁও এক্সিস্টিং (ওভারহেড+আন্ডারগ্রাউন্ড) ৩৩ কেভি লাইন এ্যান্ড ওয়ান ফ্লোর ভাটিক্যাল এক্সটেনশন অফ তেজগাঁও ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন টু দি নিউ বিল্ডিং অন টার্নকী বেসিস।
২. প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা): বিনিয়োগ
- ৩.
- ৩.১ অর্থায়নের উৎস (জিওবি/ প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন/অন্যান্য): স্ব অর্থায়ন
- ৩.২ উন্নয়ন সহযোগী: প্রযোজ্য নয়
- ৪.
- ৪.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বিদ্যুৎ বিভাগ; বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ৪.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ।

৫. (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	*পরিবর্তন(+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	৭০১৪৮২৯২.২২ টাকা				মার্চ ২০১৬- জুন ২০১৮	৮ মার্চ ২০১৬		
সংশোধিত (১ম) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)								
সংশোধিত (২য়) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)								
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম, ২য়প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)								

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): প্রযোজ্য নয়

(গ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): প্রযোজ্য নয়

৬. প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
ঢাকা	ঢাকা		ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত): ঢাকা শহরে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও গ্রাহক সেবার উন্নয়নের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

৮. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকা)

ক্র: নং	অংশের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সর্বশেষ ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি				
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭				
			বাস্তব (পরিমাণ /সংখ্যা)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)		
					১০	১০	৮০	৭০	৯০	৮০

৯. অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা: প্রযোজ্য নয়

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)

১০. (ক) ডিপিপি/টিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: প্রযোজ্য নয়

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্যাকেজ (১,২,৩...)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	

১১. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):

প্রকল্প পরিচালক-এর আইডি নং	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
S-141606	গ্রীড ওএসএম সার্কেল (নর্থ), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০৪/০৪/২০১৮	নিয়মিত	না	

১২. ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে): প্রযোজ্য নয়

১৩. অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: প্রযোজ্য নয়

১৪. স্টিয়ারিং/পিআইসি সভা সংক্রান্ত: প্রযোজ্য নয়

১৫. Project Management Information System (PMIS)/অনলাইনে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের তারিখ (পিএমআইএস চালু হলে): ৩০/০৪/২০১৮

গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ:

১৬. (ক) পরিদর্শনকৃত এলাকা: তেজগাঁও, ঢাকা।

(খ) পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারীর নাম ও তারিখ: প্রযোজ্য নয়

১৭. পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:

ক. অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান প্রতিপালন:

খ. পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় প্রচলিত আইন/বিধি অনুসরণ:

গ. গুণগতমান (প্রয়োজনে ল্যাব-টেস্টিং-এর ফলাফলের মাধ্যমে যাচাইকৃত):

- সম্পাদিত কাজ: পাওয়ার ট্রান্সফরমার ও সংশ্লিষ্ট সুইচগিয়ার চালু করা হয়েছে।
- ব্যবহৃত পণ্য/ উপকরণ: পাওয়ার ট্রান্সফরমার, গ্যাস ইন্সুলেটেড সুইচগিয়ার, এয়ার ইন্সুলেটেড সুইচগিয়ার

ঘ. সাইট বই পর্যালোচনা (ভৌত কাজের ক্ষেত্রে):

ঙ. বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত নতুন ঝুঁকি/ বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে):


চ. সুবিধাভোগীর মতামত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

ছ. অন্যান্য বিষয় (যদি থাকে):

১৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

আইএমইডি'র পরিচালক জনাব পুলক কান্তি বড়ুয়া কর্তৃক গত ১০/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে কাঁটাবনস্থ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় এবং তেজগাঁও এলাকার সাবস্টেশনের বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয়। এ সময় প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, তেজগাঁও এ ৩ টি ব্রেকার ১টি বাস কাপলার, ট্রান্সফরমার ব্রেকার ও লাইন ব্রেকার আছে। বর্তমানে সাবস্টেশনে ৪০ মে:ও: লোড বিদ্যমান। প্রকল্প সমাপ্ত হলে এর ক্ষমতা ৬০ মেওয়াটে উন্নীত হবে। তাছাড়া প্রকল্প সমাপ্তে এখানে ২৬টি ১১ কেভি এআইএস এবং ৯টি জিআইএস প্যানেল থাকবে। এই প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত। ইতোমধ্যে ওয়ারিং এর কাজ শুরু হয়েছে এবং সহসাই কমিশনিং করা হবে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান অপারেশন অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরম্ভ হবে।

১৯. প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির/ ভিডিও চিত্র ও বর্ণনা:

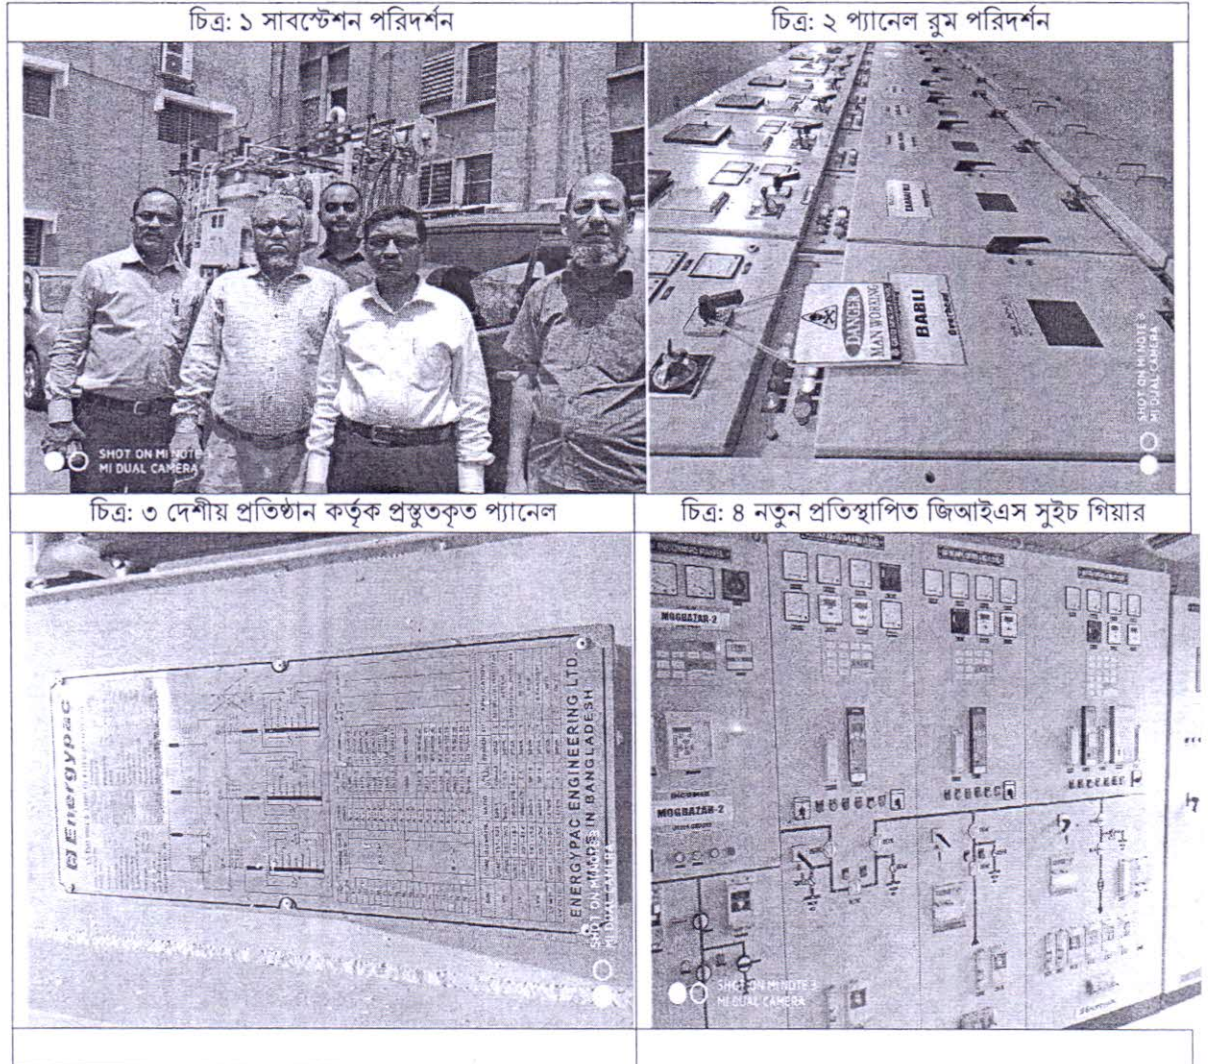

২০১

২০. সুপারিশ/মতামত:

- ২০.১ প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৮ এর মধ্যে শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে প্রকল্প শেষ করতে হলে কাজের গতি আরো বাড়িয়ে দিতে হবে;
- ২০.২ প্রকল্প শেষে যাতে ব্রেকার, ট্রান্সফরমারসহ অন্যান্য সহায়ক যন্ত্রপাতি নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে সেই জন্য সংস্থা/মন্ত্রণালয় পর্যায়ে মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে;
- ২০.৩ স্থাপনকৃত বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;
- ২০.৪ প্রকল্পের অডিট যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে;
- ২০.৫ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয়ে পর্যায়ে যথাসময়ে মনিটরিং কাজ সম্পন্ন করতে হবে;
- ২০.৬ উপরোক্ত সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাাদি গ্রহণপূর্বক এ সম্পর্কে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিসীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কে অবহিত করতে হবে।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা

স্বাক্ষর.....
নাম: পুলক কান্তি ষড়ুয়া
পদবী: পরিচালক
তারিখ: ১০/৬/২০১৮
ফোন নম্বর : ৯১১০৪১৩
