



নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা প্রতিবেদন

সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১

জুন ২০২১

সূচিপত্র

নির্বাহী সারসংক্ষেপ		i
শব্দ সংক্ষেপ		iii
প্রথম অধ্যায়: প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা		
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্প পরিচিতি	১
১.২.১	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	২
১.২.২	প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধি	২
১.২.৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	২
১.২.৪	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ	২
১.২.৫	প্রকল্পের আউটপুট	৩
১.৩	প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন	৩
১.৪	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	৫
১.৫	উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা	৬
১.৬	প্রকল্পের লগফ্রেম	১৩
১.৭	Exit Plan	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা		
২.১	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কার্যপরিধি (ToR)	১৪
২.২	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কৌশল	১৫
২.২.১	তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের টুলস সমূহ	১৭
২.২.২	প্রাসঙ্গিক দলিলসমূহ পর্যালোচনা	১৭
২.২.৩	নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য উত্তরদাতা ও গবেষণার একক	১৮
২.২.৪	মিশ্র পদ্ধতির প্রয়োগ	১৮
২.২.৫	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা এলাকা নির্বাচন	১৯
২.২.৬	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের ধারণা ও তথ্যাদি পর্যালোচনা	২০
২.২.৭	সমীক্ষা পদ্ধতি	২১
২.৩	প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা	২২
২.৪	নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ	২৩
২.৫	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি	২৫
২.৬	সমীক্ষা ও উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রণ	২৬
২.৭	তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি	২৭
২.৮	সংখ্যাগত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ পরিকল্পনা	২৭
২.৯	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কর্ম-পরিকল্পনা	২৮
তৃতীয় অধ্যায়: সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা		
৩.১	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	২৯
৩.২	সংশোধিত ও অনুমোদিত ব্যয়	২৯
৩.৩	ডিপিপি সংশোধনের কারণসমূহ	২৯
৩.৩.১	প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণসমূহ	৩০
৩.৪	অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি	৩১

৩.৪.১	খাত ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও অগ্রগতি	৩২
৩.৪.২	রাজস্ব খাতের অগ্রগতি বিশ্লেষণ	৩২
৩.৪.৩	মূলধন খাতের অগ্রগতি	৩৩
৩.৪.৪	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি	৩৩
৩.৫	পিআইসি ও পিএসসি সভা	৩৪
৩.৬	অডিট বিষয়	৩৪
৩.৭	ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা	৩৫
৩.৮	লগফ্রেমের ভিত্তিতে উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা	৪০
৩.৯	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৪০
৩.৯.১	প্রকল্প পরিচালকদের কার্যকাল	৪১
৩.১০	প্রকল্পের সাই পরিদর্শন প্রতিবেদন	৪৩
৩.১০.১	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে দলীয় আলোচনা (FGD)	৪৮
৩.১০.২	মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (KII)	৪৯
৩.১১	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল	৫০
৩.১২	ভবন ভাড়া সম্পর্কে তথ্য	৫৯
৩.১২.১	ভবনের ভাড়া, আসবাবপত্র ও অন্যান্য অবস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য	৬০
৩.১৩	স্থানীয় পর্যায়ে মত বিনিময় সভা	৭২
৩.১৪	ভবন ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা	৭৪
চতুর্থ অধ্যায় প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ পর্যালোচনা		৭৫
পঞ্চম অধ্যায় পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ		৭৭
ষষ্ঠ অধ্যায় সুপারিশসমূহ ও উপসংহার		৭৮
সংযুক্তি		
সংযুক্তি -১ সাইট পরিদর্শন প্রতিবেদন		
সংযুক্তি -২ টেষ্ট রিপোর্ট		
সংযুক্তি -৩ ভবন হস্তান্তর বিষয়ক তথ্য		
সংযুক্তি -৪ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের টুলস		

বীর মুক্তিযোদ্ধারা দেশের সূর্যসন্তান। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের সময় বীর মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তিশালী মানসিকতা, লড়াকু ও সাহসী মনোবল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করেছিল। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নয়নে বর্তমান সরকার বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি ৮ ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ সালে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তর যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা সফল ভাবে বাস্তবায়নের জন্য গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ জন্য কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে ১২০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাথে জরিপ করা হয়েছে। পাশাপাশি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ১৬টি Focus Group Discussion (FGD) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত ব্যক্তি, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অংশীজনের সাথে ২৮ টি Key Informant Interview (KII) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন করে ১৬টি ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত গুণগত বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের নথি পত্র পর্যবেক্ষণ করে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি, প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ও বরাদ্দের ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রকল্পটি মোট ২ বার সংশোধন করা হয়েছে। সময় বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬৭%। মূল ডিপিপি অনুসারে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ১১৮৭৮.০৬ লক্ষ টাকা। প্রথম সংশোধিত ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৩০২০.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১০%। পুনঃরায় ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৫২৬৬.৭৬ লক্ষ টাকা। যা মূল ডিপিপি'র চেয়ে ২৮.৫% বেশী এবং সংশোধিত ডিপিপি'র চেয়ে ১৭.৩% বেশী। তথ্য অনুযায়ী ৬৪ টি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের মধ্যে ৬৩টি ভবন হস্তান্তর করা হয়েছে এবং একটি ভবন (ঢাকা) চলতি মাসেই হস্তান্তর করা হবে। প্রকল্পটি প্রাথমিক অবস্থায় ৪৮ জেলায় এবং পরবর্তীতে ১৬ টি জেলা অন্তর্ভুক্ত করে মোট ৬৪ টি জেলায় সংস্থান রেখে ডিপিপি অনুমোদন করা হয়। এছাড়া ৬৪ জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের জন্য যন্ত্রপাতি ও ফার্নিচার ক্রয়, গণপূর্ত অধিদপ্তরের তিন বার রোট সিডিউল (২০০৮, ২০১১ ও ২০১৪) পরিবর্তন, সকল ভবনের জন্য কনফারেন্স টেবিল, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন, বীরশ্রেষ্ঠদের ভাস্কর্য, মুক্তিযুদ্ধের বই, সিডি, তৈল চিত্র এবং ২৮ ইঞ্চি LED/LCD টেলিভিশন সংস্থান রাখার জন্য ডিপিপি সংশোধন করা হয় ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

প্রকল্পটি ভূমি অধিগ্রহণ করতে বিলম্ব হওয়ায় বাস্তবায়নকাল বিলম্ব হয়েছে। ঠিকাদারদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের সময় ক্ষেপন হয়েছে। নির্মাণ কাজের জন্য বার বার সময় বৃদ্ধি করার ফলশ্রুতিতে প্রতিটি ভবন নির্মাণে গড়ে ৩-৪ বছর সময় বেশী লেগেছে।

প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫২৬৬.৭৬ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩৩২৪.৮৫ লক্ষ টাকা। প্রাক্কলনের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৭.২৮%। এদের মধ্যে মূলধনী খাতের ব্যয় হয়েছে ৮৭.৭৩% এবং রাজস্ব খাতের ব্যয় হয়েছে ৬৭.২৮%।

কোন কোন ভবনের স্থাপত্য ও ইমারতের নকশা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বেশীরভাগ ভবনের নির্মাণকালীন সময়ে নির্মাণ সামগ্রীর প্রয়োজনীয় টেস্ট রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই। ঠিকাদার কর্তৃক Program of Works এর কোন নথি পাওয়া যায়নি। কোন কোন ভবনের বিভিন্ন স্থানে প্লাস্টারে ফাটল দেখা দিয়েছে, পানি ও বৈদ্যুতিক লাইনে সমস্যা বিদ্যমান। এছাড়া রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিভিন্ন ধরনের ফিটিংস, ফার্নিচার ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাই (৯৯.৩%) তাদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী ৪৪% বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ তাদের কল্যাণের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের কথা বলেছেন, ২৫.৩% বীর মুক্তিযোদ্ধারা বিনা সুদে লোন প্রদানের কথা বলেছেন।

প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নের জন্য পৃথক সময়/আলাদা প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। Materials Test এর জন্য আলাদা বাজেট চুক্তিপত্রে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজে সময় বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় বিধি অনুসরণ করা প্রয়োজন এবং বর্ধিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত না হলে Contractor কে Penalty (সরকারি নিয়ম অনুযায়ী) করা আবশ্যিক। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন ভাড়াটিয়ারা তাদের সুবিধামত বিভিন্ন ফ্লোর আর্কিটেকচারাল প্লান পরিবর্তন করছে, এ ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে ভবনের মূল নকশা (ডিপিপি তে অনুমোদিত) পরিবর্তন করা হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে করতে হবে এবং অনুমোদনের কপি সংশ্লিষ্ট অফিসে সংরক্ষণ করা অত্যাাবশ্যিক। ভবন নির্মাণ কাজ শেষ না হলে আসবাবপত্র ক্রয় করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। DPP ও RDPP তৈরী করার সময় লগফ্রেম তৈরী এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ যেন লগফ্রেমে প্রতিফলন হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স এবং শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে তাদের পরিবর্তে তাদের সন্তানদের জন্য আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের আয় থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম (স্বাস্থ্য সেবা, আর্থিক সাহায্য) প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

শব্দ সংক্ষেপ

AE	: Assistant Engineer
DC	: Deputy Commissioner
DPD	: Deputy Project Director
DPM	: Direct Procurement Method
DPP	: Development Project Proposal
FGD	: Focus Group Discussion
E-GP	: Electronic Government Procurement
EE	: Executive Engineer
GoB	: Government of Bangladesh
IGA	: Income Generation Activities
IMED	: Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	: Key informant Interview
M&E	: Monitoring and Evaluation
MoLWA	: Ministry of Liberation War Affairs
MOV	: Means of Verification
OTM	: Open Tendering Method
OVI	: Objectively verifiable Indicators
PD	: Project Director
PIC	: Project Implementation Committee
PPA	: Public Procurement Act-2006
PPR	: Public Procurement Rules-2008
PWD	: Public Works Department
PSC	: Project Steering Committee
RDPP	: Revised Development Project Proposal
SRDPP	: Special Revised Development Project Proposal
SPSS	: Statistical Package for Social Science
SWOT	: Strength, Weakness, Opportunity and Threat
TEC	: Tender Evaluation Committee
ToR	: Terms of Reference
UNO	: Upazila Nirbahi Officer

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

আমাদের প্রিয় স্বাধীন মাতৃভূমি বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে এক মহান যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা বিশ্বের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী পুরুষ, মহিলা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, শিক্ষক, ছাত্র, সাংবাদিক, যুবক বিশেষ করে সকল শ্রেণির মানুষ একত্রিত হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের স্থানীয় দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে একত্রিত হয়েছিল। ২৫ শে মার্চ, ১৯৭১ সালে দখলদার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গণহত্যা শুরু করে যা ইতিহাসে একটি ন্যাকারজনক অধ্যায় তৈরী করেছিল। তারা বাঙালী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে চেয়েছিল। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ বাংলাদেশী পুরুষ, মহিলা, বীর মুক্তিযোদ্ধা এমনকি ছোট শিশুদের কে হত্যা করা হয়েছিল এবং অগণিত নারীকে ধর্ষণ করেছিলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকার আলবদর। বাংলাদেশের সকল শ্রেণির মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে দখলদার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এক পতাকার নিচে সমবেত হয়েছিল। সংঘবদ্ধ যুদ্ধের মাধ্যমে মাত্র ৯ মাসের মধ্যেই ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশের জন্য সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছিল, তাদের মধ্যে অনেকে জীবন উৎসর্গ করেছিল, অনেকেই গুরুতর আহত হয়েছিলো, এমনকি মহান স্বাধীনতা অর্জনের পথে অনেক মা, বোন তাদের সপ্তম হারিয়েছেন। তবে এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমরা আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছি।

২৩ অক্টোবর ২০০১ ইং সালে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার পর, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়েছিল। “মুক্তিযোদ্ধা সংসদ” হচ্ছে এমন একটি সংস্থা যার মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের আবেগ, অনুভূতি, দুঃখ এবং সুখ ভাগাভাগি করে নিতে পারে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের জন্য জেলা পর্যায়ে অবকাঠামোগত ব্যবস্থা রয়েছে। জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বহুবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি ১১,৮৭৮.০৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করে জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ০৮/০২/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধারা দুই ভাবে উপকৃত হবেন। প্রথমত, জেলা কার্যালয় "জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ" সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি নতুন ভবন/অফিস পাবে। দ্বিতীয়ত, "জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ" মার্কেটের দোকান এবং হল রুম ভাড়া দিয়ে নিজস্ব তহবিল গঠন করতে পারবে।¹

১.২ প্রকল্প পরিচিতি

সারণি ১.১: প্রকল্প পরিচিতি

i	প্রকল্পের নাম	:	সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।
ii	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
iii	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তর।
iv	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ	:	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
v	প্রকল্প এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ (৬৪ টি জেলায়)

¹ ডিপিপি ও আরডিপিপি

১.২.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল

প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল মূল এবং সংশোধনসহ নিম্নের সারণিতে ১.২ এ দেয়া হলো।

সারণি ১.২: প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল

ডিপিপি'র ধরণ	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
মূল	জুলাই, ২০১০	জুন, ২০১৩
সংশোধিত (১ম)	জুলাই, ২০১০	জুন, ২০১৪
সংশোধিত (২য়)	জুলাই, ২০১০	জুন, ২০১৫
আন্তঃ খাত সমন্বয় (১ম)	জুলাই, ২০১০	জুন, ২০১৭
প্রাইস কনটিনজেন্সি	জুলাই, ২০১০	জুন, ২০১৮
আন্তঃ খাত সমন্বয় (২য়)	জুলাই, ২০১০	জুন, ২০২১

১.২.২. প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত অনুমোদিত ব্যয় নিম্নের সারণি ১.৩ এ দেয়া হলো।

সারণি ১.৩: প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি

লক্ষ টাকা

	প্রকৃত ব্যয়	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত)	প্রাক্কলিত ব্যয় (২য় সংশোধিত)	পার্থক্য (৩-২)	
				টাকায়	শতকরা হার
১	২	৩		৪	৫
মোট	১১,৮৭৮.০৬	১৩,০২০.০০	১৫,২৬৬.৭৬	২,২৪৬.৭৬	১৭.২৬
জিওবি	১১,৮৭৮.০৬	১৩,০২০.০০	১৫,২৬৬.৭৬	২,২৪৬.৭৬	১৭.২৬
প্রকল্প অনুদান	-	-	-	-	-
নিজস্ব অর্থ	-	-	-	-	-
অন্যান্য	-	-	-	-	-

১.২.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জোরদার এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে দেশের ৬৪টি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ। প্রকল্পের আওতায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অফিস সংস্থান, দোকান এবং হল রুম ভাড়া দিয়ে তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে তাঁদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমুখী কাজ করা।

বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ

- ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিকে ধরে রাখা।
- সকল জেলা সদরে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা।
- মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের উপার্জন থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা।
- জাতীয় দিবসে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা।
- অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা, এবং
- তথ্য-প্রযুক্তি, আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১.২.৪. প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ

- দেশের সকল জেলায় ১টি করে ৫ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন নির্মাণ করা।
- ভবনের প্রতি ফ্লোরের মোট আয়তন ২৫০০ বর্গফুট।
- ভবনের নীচ তলা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাড়া দেয়ার জন্য ৯টি দোকান এবং ২য় তলায় অফিস/ব্যাংক/কমিউনিটি

সেন্টার প্রভৃতি হিসেবে ভাড়া দেয়ার জন্য কমন স্পেস এবং টয়লেট নির্মাণ করা।

- ৩য় তলায় জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও ডেপুটি কমান্ডারের অফিস এবং সভা সেমিনার ইত্যাদি কক্ষ নির্মাণ করা। ভবনের চারদিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, প্রাচীরের প্রধান ফটকে নাম ফলক এবং দেয়ালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন করা, এবং
- প্রতিটি ভবনের জন্য ১টি ফটোকপি মেশিন, ১টি কম্পিউটার, ১টি লেজার প্রিন্টার, ১টি ইউপিএস, ১টি এয়ারকন্ডিশন, ১টি ল্যাপটপ, ১টি ক্যামেরা, ১টি স্ক্যানার, ১টি প্রজেক্টর, ১টি ফ্যাক্স মেশিন, টেলিফোন সেট, ৪০টি সিলিং ফ্যান, চেয়ার এবং টেবিলসহ অন্যান্য আসবাবপত্র সরবরাহ করা।

১.২.৫ প্রকল্পের আউটপুট

বাংলাদেশের সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যে সকল আউটপুটসমূহ অর্জন হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলো:

- সকল জেলায় (৬৪ টি জেলায়) মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।
- ভূমি অধিগ্রহণ।

১.৩ প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন

প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন নিম্নের সারণি ১.৪ এ দেয়া হলো।

সারণি ১.৪: বছর ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন

লক্ষ টাকা

আর্থিক বছর	প্রকল্প সংস্করণ	জিওবি (এফএফ)	মোট
১	২	৩	৪
বছর - ১ (২০১০-১১)	আন্তঃখাত সমন্বয়	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
	প্রাইস কনটিনজেন্সি সমন্বয়	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
	আন্তঃখাত সমন্বয়	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
	২য় সংশোধিত	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
	১ম সংশোধিত	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
	মূল	৫০০.০০	৫০০.০০
বছর - ২ (২০১১-১২)	আন্তঃখাত সমন্বয়	১,৩৮৭.৪৯	১,৩৮৭.৪৯
	প্রাইস কনটিনজেন্সি সমন্বয়	১,৩৮৭.৪৯	১,৩৮৭.৪৯
	আন্তঃখাত সমন্বয়	১,৩৮৭.৪৯	১,৩৮৭.৪৯
	২য় সংশোধিত	১,৩৮৭.৪৯	১,৩৮৭.৪৯
	১ম সংশোধিত	১,৫০০.০০	১,৫০০.০০
	মূল	৫,৬৯০.০২	৫,৬৯০.০২
বছর - ৩ (২০১২-১৩)	আন্তঃখাত সমন্বয়	২,৬৬৭.৭৪	২,৬৬৭.৭৪
	প্রাইস কনটিনজেন্সি সমন্বয়	২,৬৬৭.৭৪	২,৬৬৭.৭৪
	আন্তঃখাত সমন্বয়	২,৬৬৭.৭৪	২,৬৬৭.৭৪
	২য় সংশোধিত	২,৬৬৭.৭৪	২,৬৬৭.৭৪
	১ম সংশোধিত	৬,৪৫০.৬৮	৬,৪৫০.৬৮
	মূল	৫,৬৮৮.০৪	৫,৬৮৮.০৪
বছর - ৪ (২০১৩-১৪)	আন্তঃখাত সমন্বয়	২,৮১৭.৪৭	২,৮১৭.৪৭
	প্রাইস কনটিনজেন্সি সমন্বয়	২,৮১৭.৪৭	২,৮১৭.৪৭
	আন্তঃখাত সমন্বয়	২,৮১৭.৪৭	২,৮১৭.৪৭
	২য় সংশোধিত	২,৮১৭.৪৭	২,৮১৭.৪৭
	১ম সংশোধিত	৫,০৩২.৬৫	৫,০৩২.৬৫
	মূল	-	-
	আন্তঃখাত সমন্বয়	১,৮৩৬.২৪	১,৮৩৬.২৪

আর্থিক বছর	প্রকল্প সংস্করণ	জিওবি (এফএফ)	মোট
বছর – ৫ (২০১৪-১৫)	প্রাইস কনটিনজেন্সি সমন্বয়	১,৮৩৬.২৪	১,৮৩৬.২৪
	আন্তঃখাত সমন্বয়	১,৮৩৬.২৪	১,৮৩৬.২৪
	২য় সংশোধিত	৮,৩৫৭.৩৯	৮,৩৫৭.৩৯
	১ম সংশোধিত	-	-
	মূল	-	-
বছর – ৬ (২০১৫-১৬)	আন্তঃখাত সমন্বয়	১,২৭৩.৪৯	১,২৭৩.৪৯
	প্রাইস কনটিনজেন্সি সমন্বয়	১,২৭৩.৪৯	১,২৭৩.৪৯
	আন্তঃখাত সমন্বয়	১,২৭৩.৪৯	১,২৭৩.৪৯
	২য় সংশোধিত	-	-
	১ম সংশোধিত	-	-
	মূল	-	-
বছর – ৭ (২০১৬-১৭)	আন্তঃখাত সমন্বয়	১,৯২১.৪৭	১,৯২১.৪৭
	প্রাইস কনটিনজেন্সি সমন্বয়	১,৯২১.৪৭	১,৯২১.৪৭
	আন্তঃখাত সমন্বয়	৫,২৪৭.৬৬	৫,২৪৭.৬৬
	২য় সংশোধিত	-	-
	১ম সংশোধিত	-	-
	মূল	-	-
বছর – ৮ (২০১৭-১৮)	আন্তঃখাত সমন্বয়	৬৯৭.২৩	৬৯৭.২৩
	প্রাইস কনটিনজেন্সি সমন্বয়	৩,৩২৬.১৯	৩,৩২৬.১৯
	আন্তঃখাত সমন্বয়	-	-
	২য় সংশোধিত	-	-
	১ম সংশোধিত	-	-
	মূল	-	-
বছর – ৯ (২০১৮-১৯)	আন্তঃখাত সমন্বয়	৭১৭.১৯	৭১৭.১৯
	প্রাইস কনটিনজেন্সি সমন্বয়	-	-
	আন্তঃখাত সমন্বয়	-	-
	২য় সংশোধিত	-	-
	১ম সংশোধিত	-	-
	মূল	-	-
বছর – ১০ (২০১৯-২০২০)	আন্তঃখাত সমন্বয়	১৬৬.৪০	১৬৬.৪০
	প্রাইস কনটিনজেন্সি সমন্বয়	-	-
	আন্তঃখাত সমন্বয়	-	-
	২য় সংশোধিত	-	-
	১ম সংশোধিত	-	-
	মূল	-	-
বছর – ১১ (২০২০-২০২১)	আন্তঃখাত সমন্বয়	১,৭৪৫.৩৭	১,৭৪৫.৩৭
	প্রাইস কনটিনজেন্সি সমন্বয়	-	-
	আন্তঃখাত সমন্বয়	-	-
	২য় সংশোধিত	-	-
	১ম সংশোধিত	-	-
	মূল	-	-
সর্বমোট	আন্তঃখাত সমন্বয়	১৫,২৬৬.৭৬	১৫,২৬৬.৭৬
	প্রাইস কনটিনজেন্সি সমন্বয়	১৫,২৬৬.৭৬	১৫,২৬৬.৭৬
	আন্তঃখাত সমন্বয়	১৫,২৬৬.৭৬	১৫,২৬৬.৭৬
	২য় সংশোধিত	১৫,২৬৬.৭৬	১৫,২৬৬.৭৬
	১ম সংশোধিত	১৩,০২০.০০	১৩,০২০.০০
	মূল (লক্ষ টাকায়)	১১,৮৭৮.০৬	১১,৮৭৮.০৬

সূত্র: সংশোধিত ডিপিপি

১.৪ প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা

সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পটির অনুমোদিত অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন নিম্নের সারণি ১.৫ এ দেয়া হল।

সারণি ১.৫: প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা

লক্ষ টাকা

অঙ্গের বিবরণ	পরিমাণ	জিওবি	টাকা
১	২	৩	৪
রাজস্ব খাত			
মূল বেতন (অফিসার)	২ জন	৫৯.০০	৫৯.০০
মূল বেতন (কর্মচারী)	৪ জন	১০৪৯.০০	১০৪৯.০০
ভাতাদি	৬ জন	৪৭৮০.০০	৪৭৮০.০০
ভ্রমণ ভাতা		১৪.০০	১৪.০০
আউটসোর্সিং		৫৫.০০	৫৫.০০
ওভারটাইম		৬.৫০	৬.৫০
সরঞ্জামাদি		০.১০	০.১০
ডাক		০.২৫	০.২৫
টেলিফোন/টেলিগ্রাম		১.৫০	১.৫০
ইন্টারনেট/ ফ্যাক্স/ টেলেক্স		০.০৫	০.০৫
পানি		০.৩০	০.৩০
বিদ্যুৎ		০.০৫	০.০৫
পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট		৭.০০	৭.০০
গ্যাস ও জ্বালানী		১৬.০০	১৬.০০
মুদ্রন ও বাধাই		৭.০০	৭.০০
স্টাম্প ও সিল		১৫.০০	১৫.০০
অন্যান্য মনিহারি		১০.০০	১০.০০
প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়		৩.০০	৩.০০
সেমিনার এন্ড কনফারেন্স		১.০০	১.০০
এন্টারটেইনমেন্ট		১.০০	১.০০
সম্মানী		৩.০০	৩.০০
সার্ভে		০.০৫	০.০৫
অনুলিপি ব্যয়		১৬.৫০	১৬.৫০
কম্পিউটার সরঞ্জামাদি		১২.০০	১২.০০
অন্যান্য খরচ		১৫.৫০	১৫.৫০
বই এবং সাময়িকী		১৪.৫৩	১৪.৫৩
রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন		২০.১৭	২০.১৭
উপ মোট		৩৩৬.৫২	৩৩৬.৫২
খ) মূলধন			
মোটরযান	১	৫০.৮৮	৫০.৮৮
একুইজিশন অব এ্যাসেট	৬৪৯	৮৪০.৯০	৮৪০.৯০
আসবাবপত্র	৬৪৮৯	৬৮৪.৩৪	৬৮৪.৩৪
অন্যান্য	-	১৭১.৭২	১৭১.৭২
পূর্ত কাজ	৬৪	১৩,১৬৭.০০	১৩,১৬৭.০০
পিডার্লিউডি এর কনটিনজেন্সি		১৫.৪০	১৫.৪০
মূলধন ব্যয় মোট (ক+খ)		১৪,৯৩০.২৪	১৪,৯৩০.২৪
গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি		-	-
ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি		-	-
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		১৫,২৬৬.৭৬	১৫,২৬৬.৭৬

সত্র: সংশোধিত ডিপ্লিপি

১.৫ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী – ৩ (ক)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তর (পিডাব্লিউডি)
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট -	১৫২৬৬.৭৬
জিওবি -	১৫২৬৬.৭৬
পিএ -	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি / আরডিপিপি অনুসারে ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (ওয়াকস)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং প্রকার	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিল উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতার জন্য আমন্ত্রণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তি সমাপ্তি তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-০১	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, ঢাকা	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	৩৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৯.০৫.২০১৬	১৮.১০.২০১৬	৩১.০৩.২০২১
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-০২	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, শেরপুর	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৫১.১৮	প্রযোজ্য নয়	১৫.০৬.২০১২	১৫.০৯.২০১২	১৫.১২.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-০৩	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, জামালপুর	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	২০৪.০০	প্রযোজ্য নয়	২৮.০১.২০১৩	২৮.০৪.২০১৩	২৮.০৪.২০১৬
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-০৪	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, নেত্রকোনা	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	২০৪.৬২	প্রযোজ্য নয়	০১.১১.২০১২	০১.০২.২০১৩	০১.১০.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-০৫	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, ময়মনসিংহ	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	২২৫.৬৬	প্রযোজ্য নয়	০৭.০১.২০১৩	০৭.০৪.২০১৩	০৭.০৮.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-০৬	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, কিশোরগঞ্জ	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৬৬.২৫	প্রযোজ্য নয়	০১.১২.২০১২	০১.০৩.২০১৩	০১.০৭.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-০৭	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, টাঙ্গাইল	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	২৮৫.৫০	প্রযোজ্য নয়	২১.০৭.২০১৫	২১.০৯.২০১৫	২১.১২.২০১৭
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-০৮	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, গাজীপুরে	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	২৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫.১২.২০১৫	১৫.০৩.২০১৬	১৫.০৩.২০১৭

প্যাকেজ নং	ডিপিপি / আরডিপিপি অনুসারে ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (ওয়ার্ডস)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং প্রকার	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিল উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতার জন্য আমন্ত্রণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তি সমাপ্তি তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-০৯	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, নরসিংদী	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৪৮.৭৭	প্রযোজ্য নয়	০৭.০৮.২০১২	০৭.১১.২০১২	০৭.০৮.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-১০	মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবন, মানিকগঞ্জ	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৭৯.৪৩	প্রযোজ্য নয়	১৪.০৯.২০১২	১৪.১২.২০১২	১৪.০৩.২০১৬
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-১১	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, নারায়ণগঞ্জ	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	২৪৫.০০	প্রযোজ্য নয়	২৮.০৩.২০১৫	২৮.০৫.২০১৬	২৮.১২.২০১৭
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-১২	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, রাজ বাড়ী	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	২০৮.১২	প্রযোজ্য নয়	০৩.০৩.২০১৬	০৩.০৬.২০১৬	০৩.১১.২০১৭
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-১৩	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, মুন্সিগঞ্জ	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৯৭.১৬	প্রযোজ্য নয়	১৫.১০.২০১২	১৫.০১.২০১৩	১৫.০৮.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-১৪	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, ফরিদপুর	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	২৬৩.৪৫	প্রযোজ্য নয়	০৭.০৬.২০১৪	০৭.০৮.২০১৪	০৭.০৮.২০১৭
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-১৫	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন শরিয়তপুর	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৪৯.৮৫	প্রযোজ্য নয়	২১.০৯.২০১২	২১.১২.২০১২	২১.১০.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-১৬	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, মাদারীপুর	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৫৫.৫৫	প্রযোজ্য নয়	১৪.১০.২০১২	১৪.০১.২০১৩	১৪.০৮.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-১৭	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, গোপালগঞ্জ	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৭১.৬০	প্রযোজ্য নয়	১৫.০৪.২০১২	১৫.০৭.২০১২	১৫.০৩.২০১৬
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-১৮	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, পাবনা	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	২৩৯.৮০	প্রযোজ্য নয়	২৭.০৬.২০১৬	০৭.১২.২০১৬	২৩.০৩.২০১৮
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-১৯	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, সিরাজগঞ্জ	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	২১৫.৮০	প্রযোজ্য নয়	২১.১২.২০১২	২১.০৩.২০১৩	২১.০৭.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-২০	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নাটোর	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৬৫.৬৮	প্রযোজ্য নয়	০১.০৩.২০১২	০১.০৬.২০১২	০১.১০.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-২১	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, রাজশাহী	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৫২.৫০	প্রযোজ্য নয়	২২.০৮.২০১২	২২.১১.২০১২	২২.০৮.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-২২	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, বগুড়া	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৮৭.৬৬	প্রযোজ্য নয়	১৫.০৪.২০১৬	১৫.০৭.২০১৬	০৯.১২.২০১৭

প্যাকেজ নং	ডিপিপি / আরডিপিপি অনুসারে ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (ওয়ার্ডস)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং প্রকার	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিল উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতার জন্য আমন্ত্রণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তি সমাপ্তি তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-২৩	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, নবাবগঞ্জ	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৫৬.০৭	প্রযোজ্য নয়	২৭.০৫.২০১৫	২৭.০৮.২০১৫	২৭.০৬.২০১৭
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-২৪	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, নওগাঁ	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	২২৫.০০	প্রযোজ্য নয়	০১.০৩.২০১৬	০১.০৬.২০১৬	১৫.০৯.২০১৯
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-২৫	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, জয়পুরহাট	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১২৬.৩৯	প্রযোজ্য নয়	০৭.১২.২০১২	০৭.০৩.২০১৩	০৭.০৮.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-২৬	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, গাইবান্ধা	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৮১.৬০	প্রযোজ্য নয়	১৪.১২.২০১২	১৪.০৩.২০১৩	১৪.০৯.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-২৭	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, রংপুর	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৩৭.৯৭	প্রযোজ্য নয়	২৮.০১.২০১১	২৮.০৩.২০১১	২৮.০৮.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-২৮	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, কুড়িগ্রাম	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	২৪৭.৫০	প্রযোজ্য নয়	২১.০৫.২০১৬	২১.০৮.২০১৬	২১.১২.২০১৭
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-২৯	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, দিনাজপুর	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৪৯.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫.০৯.২০১১	১৫.০১.২০১২	১৫.১০.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৩০	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, লালমনিরহাট	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৪৪.৫০	প্রযোজ্য নয়	০৭.০৯.২০১১	০৭.১২.২০১১	০৭.০৭.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৩১	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, নীলফামারী	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৮২.৬০	প্রযোজ্য নয়	২৮.০৮.২০১১	২৮.১১.২০১১	২৮.০৮.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৩২	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, ঠাকুরগাঁও	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৭২.৭৬	প্রযোজ্য নয়	২১.০৫.২০১২	২১.০৮.২০১২	২১.১১.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৩৩	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, পঞ্চগড়	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৩৯.৫০	প্রযোজ্য নয়	১৮.০৬.২০১২	১৮.০৯.২০১২	১৮.১২.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৩৪	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, মেহেরপুর	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৬৯.৬৫	প্রযোজ্য নয়	১৪.০৯.২০১১	১৪.১২.২০১১	১৪.০২.২০১৫
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৩৫	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, কুষ্টিয়া	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৭৭.৮৬	প্রযোজ্য নয়	০৫.০৪.২০১২	০৫.০৭.২০১২	০৫.১০.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৩৬	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, চুয়াডাঙ্গা	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৮৫.১১	প্রযোজ্য নয়	২১.০৩.২০১৬	২১.০৬.২০১৬	২১.১২.২০১৭
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৩৭	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, ঝিনাইদহ	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৫৯.১০	প্রযোজ্য নয়	০১.০৯.২০১০	০১.১২.২০১২	০১.০৯.২০১৪

প্যাকেজ নং	ডিপিপি / আরডিপিপি অনুসারে ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (ওয়ার্ডস)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং প্রকার	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিল উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতার জন্য আমন্ত্রণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তি সমাপ্তি তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ডার্লিউ (পিডার্লিউডি)/ এমএসসি-৩৮	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, মাগুরা	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডার্লিউডি	জিওবি	১৪৭.৬০	প্রযোজ্য নয়	২৮.১০.২০১২	২৮.০১.২০১৩	২৮.১২.২০১৭
ডার্লিউ (পিডার্লিউডি)/ এমএসসি-৩৯	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, নড়াইল	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডার্লিউডি	জিওবি	২০২.৫০	প্রযোজ্য নয়	১৪.০৭.২০১২	১৪.১০.২০১২	১৪.০৭.২০১৪
ডার্লিউ (পিডার্লিউডি)/ এমএসসি-৪০	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, যশোর	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডার্লিউডি	জিওবি	১৪১.৯১	প্রযোজ্য নয়	০৭.০৪.২০১১	০৭.০৭.২০১১	০৭.০৮.২০১৪
ডার্লিউ (পিডার্লিউডি)/ এমএসসি-৪১	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, খুলনা	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডার্লিউডি	জিওবি	২০৬.৫০	প্রযোজ্য নয়	১৫.০৯.২০১৪	১৫.১২.২০১৫	১৫.১০.২০১৭
ডার্লিউ (পিডার্লিউডি)/ এমএসসি-৪২	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, সাতক্ষীরা	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডার্লিউডি	জিওবি	১৭৯.২০	প্রযোজ্য নয়	২১.০৯.২০১৫	২১.১২.২০১৫	২১.১২.২০১৭
ডার্লিউ (পিডার্লিউডি)/ এমএসসি-৪৩	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, বাগেরহাট	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডার্লিউডি	জিওবি	১৭১.২১	প্রযোজ্য নয়	০১.০৫.২০১১	০১.০৮.২০১১	০১.১০.২০১৪
ডার্লিউ (পিডার্লিউডি)/ এমএসসি-৪৪	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, বরিশাল	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডার্লিউডি	জিওবি	২২৪.৩৯	প্রযোজ্য নয়	২৮.০৫.২০১২	২৮.০৮.২০১২	২৮.১২.২০১৪
ডার্লিউ (পিডার্লিউডি)/ এমএসসি-৪৫	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, পিরোজপুর	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডার্লিউডি	জিওবি	২৪৬.৪১	প্রযোজ্য নয়	২৮.১২.২০১৫	২৮.০৩.২০১৬	২৮.০৬.২০১৮
ডার্লিউ (পিডার্লিউডি)/ এমএসসি-৪৬	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, বালকাঠি	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডার্লিউডি	জিওবি	১৯২.৮৬	প্রযোজ্য নয়	০১.০৬.২০১২	০১.০৯.২০১২	০১.১২.২০১৪
ডার্লিউ (পিডার্লিউডি)/ এমএসসি-৪৭	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, পটুয়াখালী	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডার্লিউডি	জিওবি	১৭৮.২৫	প্রযোজ্য নয়	১৫.০৪.২০১২	১৫.০৭.২০১২	১৫.০৮.২০১৪
ডার্লিউ (পিডার্লিউডি)/ এমএসসি-৪৮	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, ভোলা	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডার্লিউডি	জিওবি	২৬৫.০০	প্রযোজ্য নয়	২১.০৩.২০১৬	২১.০৬.২০১৬	২১.০৬.২০১৯
ডার্লিউ (পিডার্লিউডি)/ এমএসসি-৪৯	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, বরগুনা	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডার্লিউডি	জিওবি	২০৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	১৪.০১.২০১৩	১৪.০৪.২০১৩	১৪.১২.২০১৫
ডার্লিউ (পিডার্লিউডি)/ এমএসসি-৫০	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, সিলেট	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডার্লিউডি	জিওবি	২৫২.৫০	প্রযোজ্য নয়	২৮.০৬.২০১৪	২৮.০৮.২০১৪	১৮.০৮.২০১৬
ডার্লিউ (পিডার্লিউডি)/ এমএসসি-৫১	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, সুনামগঞ্জ	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডার্লিউডি	জিওবি	২০১.৯০	প্রযোজ্য নয়	০৮.০৩.২০১৩	০৮.০৬.২০১৩	০৮.১১.২০১৪
ডার্লিউ (পিডার্লিউডি)/ এমএসসি-৫২	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, মৌলভীবাজার	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডার্লিউডি	জিওবি	১৮৬.৪১	প্রযোজ্য নয়	২১.০৬.২০১১	২১.০৯.২০১১	২১.১০.২০১৪

প্যাকেজ নং	ডিপিপি / আরডিপিপি অনুসারে ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (ওয়ার্ডস)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং প্রকার	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিল উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতার জন্য আমন্ত্রণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তি সমাপ্তি তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৫৩	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, হবিগঞ্জ	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৭৮২.২৫	প্রযোজ্য নয়	০৭.০৯.২০১২	০৭.১২.২০১২	০৭.০৮.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৫৪	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, বি- বাড়িয়া	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৩৮.৯০	প্রযোজ্য নয়	১৫.০৯.২০১২	১৫.১২.২০১২	১৫.০৭.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৫৫	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, কুমিল্লা	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	২৬৪.৬০	প্রযোজ্য নয়	২৮.০২.২০১৬	২৮.০৫.২০১৬	২৮.১২.২০১৭
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৫৬	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, চাঁদপুর	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	২১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১.১২.২০১৫	০১.০৩.২০১৬	০১.০৬.২০১৮
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৫৭	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, লক্ষ্মীপুর	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১২৪.৫৫	প্রযোজ্য নয়	১৪.১১.২০১২	১৪.০২.২০১৩	১৪.০২.২০১৫
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৫৮	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, ফেনী	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	২০৪.৯১	প্রযোজ্য নয়	২৮.০৮.২০১১	২৮.১১.২০১১	২৮.১২.২০১৪
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৫৯	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, নোয়াখালী	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৬৫.৯২	প্রযোজ্য নয়	০৭.০৪.২০১১	০৭.০৭.২০১১	০৭.০১.২০১৫
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৬০	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, খাগড়াছড়ি	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৭৪.৩৪	প্রযোজ্য নয়	২১.০৫.২০১২	২১.০৮.২০১২	২১.০৮.২০১৫
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৬১	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, রাঙ্গামাটি	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৩২.৫০	প্রযোজ্য নয়	০১.০৫.২০১৩	০১.০৮.২০১৩	০১.০৮.২০১৫
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৬২	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, বান্দরবান	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	২৭৩.১৪	প্রযোজ্য নয়	২৮.০২.২০১৬	২৮.০৫.২০১৬	২৮.০৫.২০১৯
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৬৩	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, চট্টগ্রাম	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	২১৬.৫০	প্রযোজ্য নয়	০৭.০৬.২০১৫	০৭.০৯.২০১৫	০৭.০৮.২০১৭
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৬৪	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, কক্সবাজার	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	তহাবধায়ক প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি	জিওবি	১৮৯.২৬	প্রযোজ্য নয়	০৭.০৯.২০১৩	০৭.১২.২০১৩	০৭.০৬.২০১৫
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৬৫	বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল নির্মাণ, স্টেইনলেস নেম প্লেট, ফায়ার ফাইটিং এবং অন্যান্য	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	সচিব	জিওবি	৬৯৬.৮০	প্রযোজ্য নয়	২১.০৩.২০১৩	২১.০৬.২০১৩	৩০.০৩.২০১৯
ডাব্লিউ (পিডাব্লিউডি)/ এমএসসি-৬৬	বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল নির্মাণ	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	সচিব	জিওবি	১৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫.১০.২০২০	১৫.১২.২০২০	১৫.০৩.২০২১
সর্বমোট ক্রয় পরিকল্পনা -							১৩১৬৭.০০				

১.৫.১ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী – ৩ (খ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তর (পিডার্লিউডি)
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট -	১৫২৬৬.৭৬
জিওবি -	১৫২৬৬.৭৬
পিএ -	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি / আরডিপিপি অনুসারে পণ্য (Goods) প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং প্রকার	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিল উৎস	আনুমানিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতার জন্য আমন্ত্রণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
জি (পিডি)/ এমএসসি -০১	ফটোকপিয়ার, কম্পিউটার এবং প্রিন্টার সরবরাহ	সংখ্যা	১৯৫	ওটিএম (এনসিটি)	সচিব	জিওবি	৪৮৮.৭৩	প্রযোজ্য নয়	০৩.১০.২০১৭	৩১.১২.২০১৭	২৯.০৩.২০১৮
জি (পিডি)/ এমএসসি -০২	২৮ ইঞ্চি এলসিডি টেলিভিশন সরবরাহ	সংখ্যা	৬৪	ওটিএম (এনসিটি)	সচিব	জিওবি	৩২.০০	প্রযোজ্য নয়	২১.০৯.২০২০	২১.১২.২০২০	৩০.০১.২০২১
জি (পিডি)/ এমএসসি -০৩	প্রকল্প পরিচালকের জন্য গাড়ি সরবরাহ	সংখ্যা	১	ডিপিএম (এনসিটি)	সচিব	জিওবি	৫০.৮৮	প্রযোজ্য নয়	০৩.১০.২০১৭	৩১.১২.২০১৭	২৯.০৩.২০১৮
জি(পিডি)/ এমএসসি -০৪	প্রতিটি জেলায় অফিসে আসবাবপত্র সরবরাহ	সংখ্যা	১	ওটিএম (এনসিটি)	সচিব	জিওবি	৫৯৯.০৯	প্রযোজ্য নয়	০৩.১০.২০১৭	৩১.১২.২০১৭	২৯.০৩.২০১৮
জি (পিডি)/ এমএসসি -০৫	রং ও অন্যান্য	সংখ্যা	৫১২	ওটিএম (এনসিটি)	সচিব	জিওবি	১০৭.৭২	প্রযোজ্য নয়	১১.১০.২০২০	১১.০১.২০২১	২১.০৪.২০২১
জি (পিডি)/ এমএসসি -০৬	বই এবং মুক্তিযুদ্ধের সিডি সরবরাহ	সংখ্যা	-	ওটিএম (এনসিটি)	সচিব	জিওবি	৮৮.৮৩	প্রযোজ্য নয়	০৭.১১.২০২০	০৭.০২.২০২১	১৪.০৩.২০২১
জি (পিডি)/ এমএসসি -০৭	কনফারেন্স টেবিল ও চেয়ার সরবরাহ	সংখ্যা	১৩৪৪	ওটিএম (এনসিটি)	সচিব	জিওবি	২৮৮.০০	প্রযোজ্য নয়	১৩. ০৫. ২০২০	১৩. ০৬.২০২০	২৩.০৬.২০২০
জি (পিডি)/ এমএসসি -০৮	কনফারেন্স সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহ	সংখ্যা	৬৪	ওটিএম (এনসিটি)	সচিব	জিওবি	৩২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫.১২.২০২০	১৫.০৩.২০২১	২৫.০৬.২০২১
	মোট সম্পদ ক্রয়						১৭৮৬.৬৭				

১.৫.২ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী – ৩ (গ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তর (পিডার্লিউডি)
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট -	১৫২৬৬.৭৬
জিওবি -	১৫২৬৬.৭৬
পিএ -	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি / আরডিপিপি অনুসারে সেবা প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং প্রকার	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিল উৎস	আনুমানিক ক্রয় মূল্য (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতার জন্য আমন্ত্রণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
এস (পিডি)/ এমএস -০১	জনশক্তি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা সংগ্রহ (কম্পিউটার অপারেটর -১, ড্রাইভার -১, এমএলএস -১)	১	০৩	ওটিএম (এনসিটি)	পিডি	জিওবি	৪৩.০০	প্রযোজ্য নয়	০১.০৭.২০১৭	০২.১০.২০১৭	৩০.০৬.২০২১
মোট সম্পদ ক্রয়							৪৩.০০				

১.৬ প্রকল্পের লগফ্রেম

সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের লগফ্রেম নিম্নে দেয়া হলো। এই লগফ্রেমের যাচাই এর সূচক মাপক হিসেবে ব্যবহার করে বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকের অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়েছে।

ক) প্রকল্প শুরুর তারিখ : জুলাই ২০১০

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২১

সারণি ২.৫: প্রকল্পের লগফ্রেম।

১	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption)
১	২	৩	৪	৫
লক্ষ্য	<ol style="list-style-type: none"> একটি সংস্থার মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করা; ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি গৌরবময় করা; জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ পুনরুজ্জীবিতকরণ ও সমর্থন সৃষ্টি করা; 	<ol style="list-style-type: none"> বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দেশব্যাপী কল্যাণমূলক কার্যক্রম করা; 	<ol style="list-style-type: none"> পরিদর্শন এবং সাধারণ মানুষের মন্তব্যের রেকর্ড। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেকর্ড 	
উদ্দেশ্য	<ol style="list-style-type: none"> আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; অ-স্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে; 	<ol style="list-style-type: none"> নাজুক অবস্থার মধ্যে থাকা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন সমূহ পুনর্নির্মাণ করা; 	<ol style="list-style-type: none"> মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক অফিস 	<ol style="list-style-type: none"> প্রয়োজনীয় তহবিল এর সংস্থান আছে
আউটপুট	<ol style="list-style-type: none"> ৬৪ টি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে; ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে 	<ol style="list-style-type: none"> জুন ২০২১ সালের মধ্যে প্রকল্পটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে; 	<ol style="list-style-type: none"> পিআইসি মনিটরিং প্রতিবেদন সরেজমিনে পরিদর্শন; প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন আইএমইডি'র মনিটরিং প্রতিবেদন 	<ol style="list-style-type: none"> প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করা এবং সমাপ্ত করা;
ইনপুট	<ol style="list-style-type: none"> ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় বিভিন্নধরনের নির্মাণ কাজ; নির্মাণ সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি; স্থাপত্য বিষয়ক উপকরণ, সেবা এবং জনবল ও তহবিল 	<ol style="list-style-type: none"> ভবন নির্মাণ ১৩১৬৭.০০ লক্ষ টাকা মটরযান ৫০.৮৮ লক্ষ টাকা আসবাব ৬৯৪.৩৪ লক্ষ টাকা যন্ত্রপাতি ৮৪০.৯০ লক্ষ টাকা অন্যান্য ১৭১.৭২ লক্ষ টাকা <p>মোট = ১৫২৬৬.৭৬ লক্ষ</p>	<ol style="list-style-type: none"> খরচের খাত সমূহ টাকা ছাড়করণের হিসাব সংরক্ষণ নির্মাণ কাজের বিল, গৃহীত দরপত্র নথি এবং পরিবীক্ষণ কাজের প্রতিবেদন; ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির প্রতিবেদন; 	<ol style="list-style-type: none"> সময়মত আর্থ ছাড়করণ; প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং আনুমানিক মূল্যে পাওয়া যাবে; যথাসময় ক্রয় করা হয়েছে; যথাসময় জনবল নিয়োগ; অনুকূল পরিবেশ

১.৭ প্রস্থান পরিকল্পনা (Exit Plan): প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি ও সংশোধিত ডিপিপি) কোন Exit Plan নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনা পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের কার্যপরিধি

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য আইএমইডি প্রদত্ত Terms of Reference (ToR) নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ২.১.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি উদ্দেশ্য অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রয়োজ্য তথ্য) পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা।
- ২.১.২ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় এর বিস্তারিত অঙ্কভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যম উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ২.১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও ডিপিপি'র লগফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।
- ২.১.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লেখিত ক্রয় পরিকল্পনা, বার্ষিক হালনাগাদকৃত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।
- ২.১.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা পিপিআর অনুযায়ী ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে কিনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।
- ২.১.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।
- ২.১.৭ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।
- ২.১.৮ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে), অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।
- ২.১.৯ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।
- ২.১.১০ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান।
- ২.১.১১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয় অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS।
- ২.১.১২ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- ২.১.১৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।
- ২.১.১৪ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়বালি।


২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কৌশল

প্রকল্পটি চলমান বিধায় প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের অগ্রগতি এবং ক্রয় প্রক্রিয়া যাচাই বাছাই করার জন্য এই নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে পরামর্শকের সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন, কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও সুপারিশ প্রদানের গুরুত্ব অপরিসীম। যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা করা হয়েছে তা হলো:

- ১) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন, দলিল ও দস্তাবেজসমূহ পর্যালোচনা,
- ২) মাঠ পর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা,
- ৩) সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত ট্রায়্যাংগুলেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন আঙ্গিকে যাচাই (triangulate) করা, এবং
- ৪) প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।


প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনসমূহ content বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা বিন্যাস কাঠামো ক্রয়কারি প্রতিষ্ঠান, আইএমইডি'র সাথে পরামর্শক্রমে তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ও দস্তাবেজসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে: ১) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে, ২) ২৫ টি জেলা থেকে ১২০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জরিপের মাধ্যমে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, ৩) প্রকল্পের গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে দলীয় আলোচনা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অংশীজনের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে, এবং ৪) ১৬টি ভবন সরেজমিন পরিদর্শন করেও তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করা করা হয়েছে এবং প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য উপাত্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে যাচাই করে খসড়া প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটি, স্ট্রয়ারিং কমিটি ও জাতীয় কর্মশালার সুপারিশের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নোক্ত ফ্লো-চার্টের মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণ পদ্ধতির তাত্ত্বিক কাঠামো তুলে ধরা হলো।

ফ্লো-চার্ট ২.১: তাত্ত্বিক কাঠামো

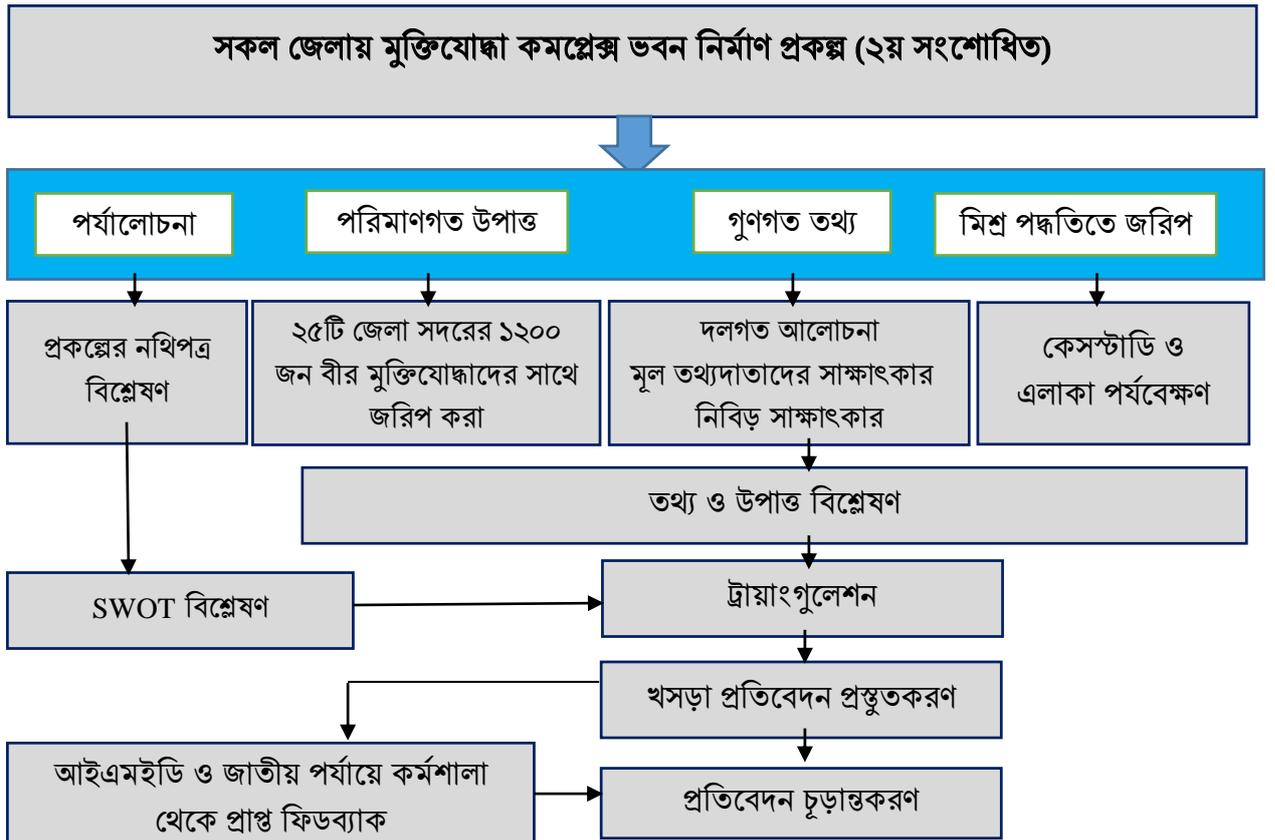

মাঠ পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে যে সব প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা ও গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে সেগুলোর উপযোগিতা মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের আগে যাচাই করা হয়েছে এবং ক্রয়কারি প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক্রমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্ধারিত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে জরিপের মাধ্যমে পরিমাণগত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত তথ্যসমূহ মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ফোকাস গ্রুপে আলোচনা ও মাঠ পর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি, গুণগতমান, এবং ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা এবং কর্মশালা থেকে সুপারিশসমূহ সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে। এভাবে সকল তথ্য ও উপাত্ত যাচাই বাছাই করে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। ফ্লো-চার্ট ২.২ এর মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণ পদ্ধতি দেখানো হলো।

ফ্লো-চার্ট ২.২: নিবিড় পরিবীক্ষণ পদ্ধতি

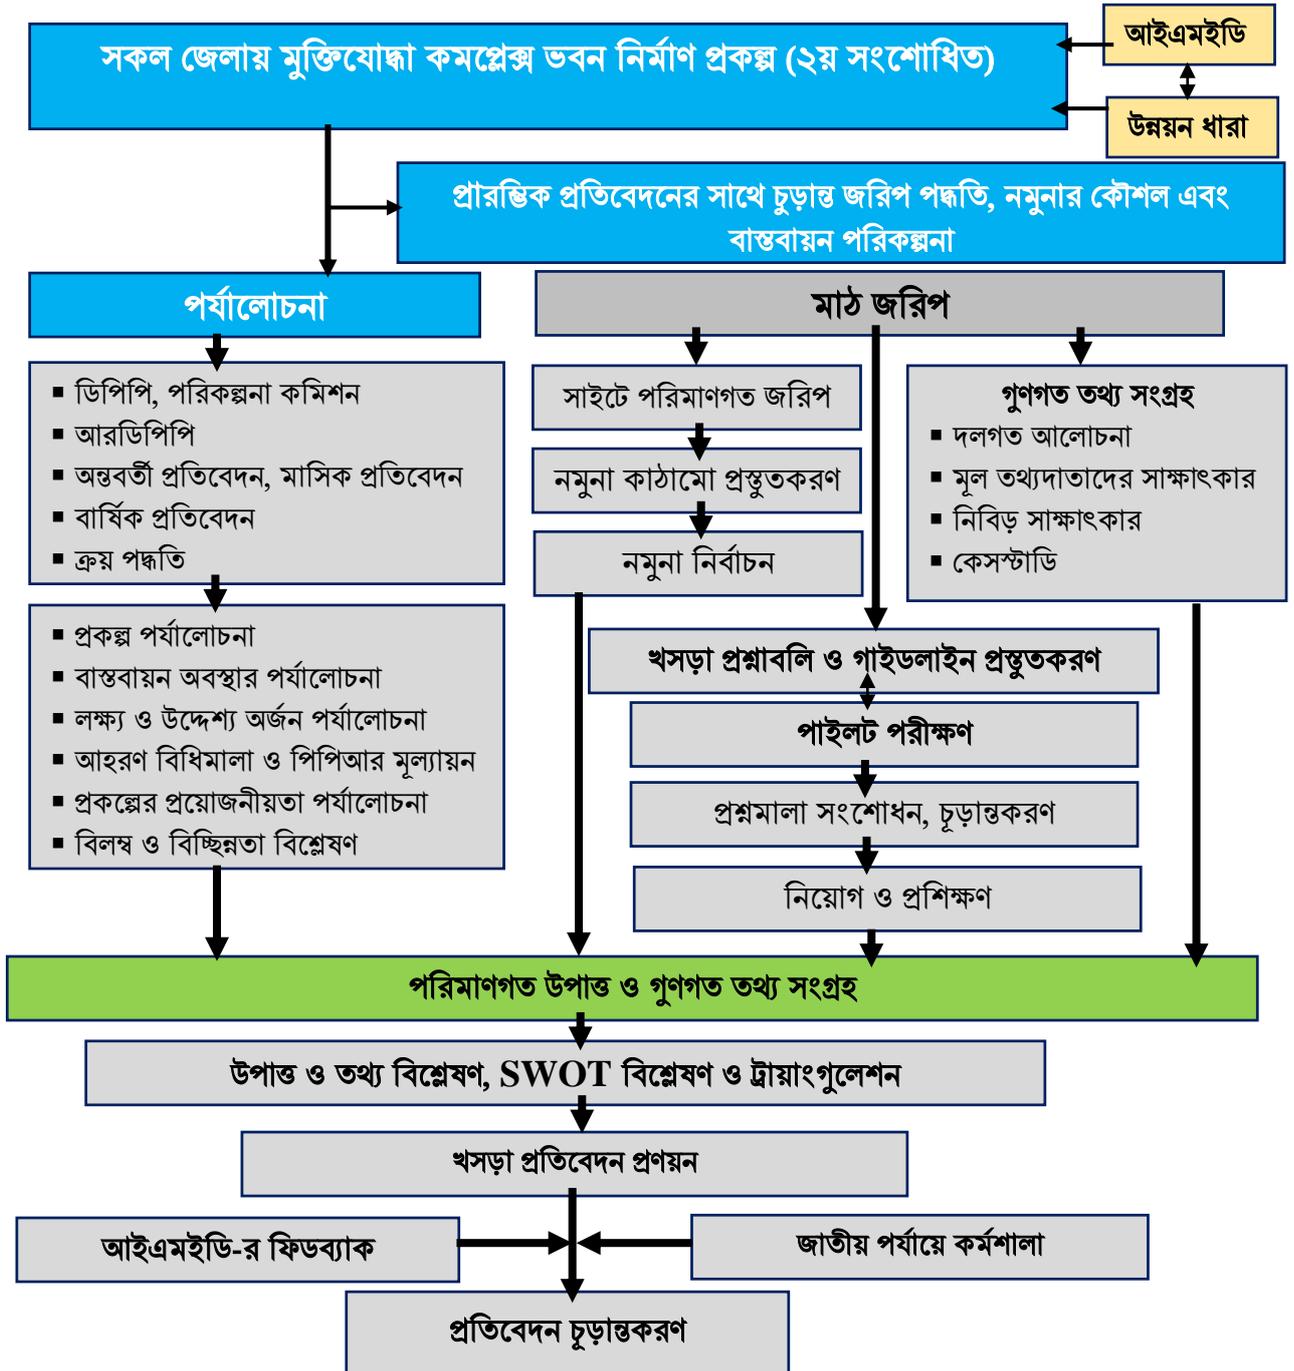

২.২.১ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের টুলসমূহ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় গুণগত ও পরিমাণগত উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য যে সকল উপকরণ এবং যে উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা সারণি ২.১ এ উল্লেখ করা হলো।

সারণি ২.১: তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের টুলস ও উৎসসমূহ

পরিবীক্ষণের মূল পরিসর	উপাত্ত/তথ্য সংগ্রহের টুলস ও উৎসাবলি	
	উপকরণ (টুলস)	উৎস
প্রকল্প পর্যালোচনা	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ;
বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যালোচনা	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; উপকারভোগীগণ
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন পর্যালোচনা	নথিপত্র পর্যালোচনা; শিক্ষার্থী জরিপ; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; দলগত আলোচনা	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; উপকারভোগীগণ
ক্রয় বিধিমালা ও পিপিআর মূল্যায়ন	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; মাধ্যমিক উপাত্ত সংকলন	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; মাধ্যমিক উপাত্ত সংগ্রহ	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; প্রকল্পের উপকারভোগীগণ
ক্রয়কৃত মালামালের গুণগত দিক মূল্যায়ন	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; দলগত আলোচনা; নিবিড় সাক্ষাৎকার	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; উপকারভোগীগণ
প্রকল্প বাস্তবায়নের বিলম্ব ও তার কারণ	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; কেসস্টাডি; মাধ্যমিক উপাত্ত সংগ্রহ	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
বাস্তবায়ন কর্মকান্ডের ফলাফল বিশ্লেষণ	নথিপত্র পর্যালোচনা; উপকারভোগী জরিপ; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; দলগত আলোচনা	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; প্রকল্পের উপকারভোগীগণ
SWOT বিশ্লেষণ	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; দলগত আলোচনা	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
আর্থ-সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা	উপকারভোগী জরিপ; দলগত আলোচনা;	প্রকল্পের উপকারভোগীগণ

২.২.১.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় ব্যবহৃত টুলসমূহ

সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য যে সকল টুলস/প্রশ্নপত্র ও গাইডলাইন ব্যবহার করা হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলো:

- জরিপ প্রশ্নমালা-উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ
- এফজিডি গাইডলাইন: উপকারভোগীদের সাথে দলীয় আলোচনা
- কেআইআই গাইডলাইন-মূল তথ্য দাতাদের সাথে নিবিড় আলোচনা
- চেকলিষ্ট- ক্রয় ও নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা

২.২.২ প্রাসঙ্গিক দলিলসমূহ পর্যালোচনা : প্রকল্পের বাস্তবায়ন দক্ষতা এবং অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির দিকসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রকল্পের কার্যকারিতায় ত্রুটি-বিচ্যুতি, সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদি চিহ্নিত করা। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি, আরডিপিপি ও অগ্রগতির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। সমীক্ষার জন্য প্রকল্প প্রয়োজনীয় দলিলাদি, তথ্য ও উপাত্ত সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা দল প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিল দস্তাবেজসমূহ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করেছে।

বিশ্লেষণের নিমিত্তে যে সব ডকুমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (DPP)।
- সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (RDPP)।
- আইএমইডি ও প্রকল্প পরিচালক অফিস কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন।
- নথিপত্র, ক্রয় আদেশ, বিল ইত্যাদি

২.২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য উত্তরদাতা ও গবেষণার একক

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জরিপে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলো:

ক. যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে

- যে সমস্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা বর্তমানে জেলা সদরে বসবাস করছেন।
- যে সমস্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা মানসিকভাবে সুস্থ আছেন।
- যে সমস্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা সাক্ষাৎকার দিতে রাজি আছেন।

খ. সমীক্ষায় যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় নাই


- যে সমস্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা বর্তমানে জেলা শহরে বসবাস করছেন না।
- যে সমস্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা শারীরিকভাবে সুস্থ নন।
- যে সমস্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হয়নি।

২.২.৪ মিশ্র পদ্ধতির প্রয়োগ

গুণগত ও সংখ্যাগত পদ্ধতির মিশ্র প্রয়োগ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার সমস্যা উপলদ্ধি করার জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে নীতি সম্পর্কিত অভ্যন্তরের পরিবীক্ষণের জন্য এবং পরিমাণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য। মিশ্র পদ্ধতির মাধ্যমে সকল ধরনের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্য ও উপাত্ত একত্রিত করে বিশ্লেষণের ব্যাপক সুযোগ থাকে। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করার উল্লেখ যোগ্য কারণ হলো উপাত্তের বিশ্বাসযোগ্যতা, সঠিকতা, পূর্ণতা ও প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তৈরী করা।

মিশ্র পদ্ধতির পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় চিন্তার গভীরে প্রবেশের উদ্দেশ্যে গুণগত এবং সংখ্যাগত পদ্ধতির উপাদান (যেমন গুণগত এবং পরিমাণগত দৃষ্টিভঙ্গি, তথ্যসংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও অনুমান কৌশল) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সচরাচর পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ একই সময়ে ঘটে, পরিবীক্ষণ সমাপ্তির পরে ফলাফল তুলনা করা হয়। এক্ষেত্রে উপাত্ত ট্রায়াংগুলেশনের মাধ্যমে যেভাবে কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে তা নিচের চিত্রে তুলে ধরা হ'ল।

ফ্লো-চার্ট ২.৩: উপাত্তের ট্রায়াংগুলেশন

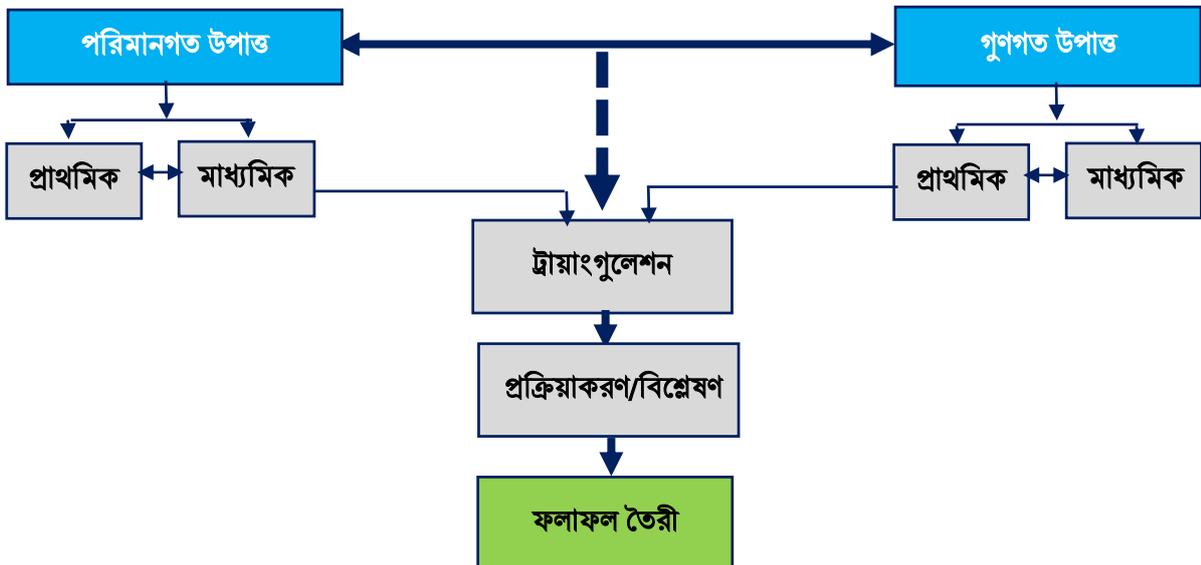

২.২.৫ নিবিড় পরিবীক্ষণ এলাকা নির্বাচন

সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, জেলা প্রশাসক, গণপূর্ত প্রকৌশলীদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেয়া হলো।

সারণি ২.১: যে সকল অংশীজনদের উপর জরিপ করা হয়েছে।

ক্রঃনং	তথ্যদাতার প্রকার	তথ্যদাতার সংখ্যা	তথ্যসংগ্রহ উপকরণ
১	বীর মুক্তিযোদ্ধা	১২০০ জন	কাঠামোগত প্রশ্নপত্র
২	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট <ul style="list-style-type: none">প্রকল্প পরিচালক-১প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর-১জেলা প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর -১০জেলা প্রশাসক-৮আইএমইডি-১বীর মুক্তিযোদ্ধা-৭	২৮ জন	KII গাইডলাইন
৪	বীর মুক্তিযোদ্ধা (প্রতি বিভাগে ২ টি এফজিডি)	প্রতি এফজিডিতে ৮-১২জন। এফজিডি-১৬	চেকলিস্টসহ এফজিডি
৫	১৬টি ক্রয় প্যাকেজ পরিবীক্ষণ করা হয়েছে	১৬	চেকলিস্ট
৬	মোট ৮ টি কেস স্টাডি উপস্থাপন করা হয়েছে (প্রতি বিভাগে ১টি)	৮	কেস স্টাডি গাইডলাইন
৭	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা: প্রকল্প অফিসের প্রতিনিধি, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং অন্যান্য অংশীজন-সরকারি ও বেসরকারি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ইত্যাদি।	১টি	সমীক্ষার বিষয়বস্তু উপস্থাপনসহ মুক্ত আলোচনা
৮	জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা: আইএমইডি ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ এবং জাতীয় পর্যায়ের অংশীজনের সমন্বয়।	১টি	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত সংগ্রহ

২.২.৬ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের ধারণা ও তথ্যাদি পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য টার্মস অব রেফারেন্স (ToR)এর শর্তসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে। পরিকল্পিত সকল কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কাজটি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন কোন কার্যক্রম যুগপৎ ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। কার্যক্রম গ্রহণের বিভিন্ন ধাপ ও পর্যায় সারণি ২.২ এ উল্লেখ করা হলো।


সারণি ২.২: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজের ধারণা

বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনা	➤ নিবিড় পরিবীক্ষণ টিমের সাথে মিটিং করা. দায়িত্ব কন্টন করা, এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। ➤ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটির বিদ্যমান দলিলাদি ও দস্তাবেজ যেমন: ডিপিপি, আরডিপিপি, জরিপ প্রতিবেদন, মনিটরিং প্রতিবেদন, বিভিন্ন প্রতিবেদন ইত্যাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।
প্রত্নত্বমূলক কাজ	➤ নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে। ➤ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নপত্র, চেকলিষ্ট এবং গাইডলাইন তৈরী করা হয়েছে। ➤ তথ্য সংগ্রহকারী, ডাটা এন্ট্রি-অপারেটর ও সুপারভাইজার নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ➤ প্রশ্নপত্র প্রাক-যাচাই করা হয়েছে এবং প্রাক-যাচাই এর আলোকে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে। ➤ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন তৈরী এবং আইএমইডিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।
তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং মান নিয়ন্ত্রণ	➤ মাঠ পর্যায় হতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সময়ানুযায়ী সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ)Face to face interview ,KII and FGD) করা হয়েছে। ➤ সুপারভাইজারগন মাঠ পর্যায়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহকারীদের কাজ প্রতিদিন তদারকি করেছেন। ➤ প্রায় ৫% তথ্য মাঠ পর্যায়ে যাচাই করা হয়েছে। ➤ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
ডাটা ব্যবস্থাপনা	➤ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যের ভুলত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। ➤ কোডিং ও কম্পিউটারে ধারণ এবং পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ➤ প্রাপ্ত ফলাফল সারণি ও লেখচিত্র ইত্যাদি আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। ➤ প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, ঝুঁকি এবং সুযোগসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
প্রতিবেদন তৈরী এবং উপস্থাপন	➤ প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে খসড়া প্রতিবেদন তৈরী করে আইএমইডির নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। ➤ খসড়া প্রতিবেদনের উপর যথাক্রমে টেকনিক্যাল ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা। ➤ কর্মশালা হতে প্রাপ্ত মতামত /পরামর্শ /সুপারিশের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে। ➤ চূড়ান্ত প্রতিবেদন ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে।

২.২.৭ সমীক্ষা পদ্ধতি

চলমান প্রকল্পটি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সমীক্ষায় পরোক্ষ গবেষণা বা ডকুমেন্ট রিভিউ ছাড়াও মাঠপর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য দুই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে: (ক) সংখ্যাগত জরিপ ও (খ) গুণগত সমীক্ষা। মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের সাথে কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে পরিসংখ্যান ভিত্তিক সংখ্যাগত জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। এই সমীক্ষার মূল তথ্যদাতার সাক্ষাতকার (KII) ও এফজিডি (FGD) এর মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সমীক্ষাটি মোট তিনটি পর্বে সম্পন্ন করা হয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

স্লো-চার্ট ২.৪: সমীক্ষা নকশার চার্ট

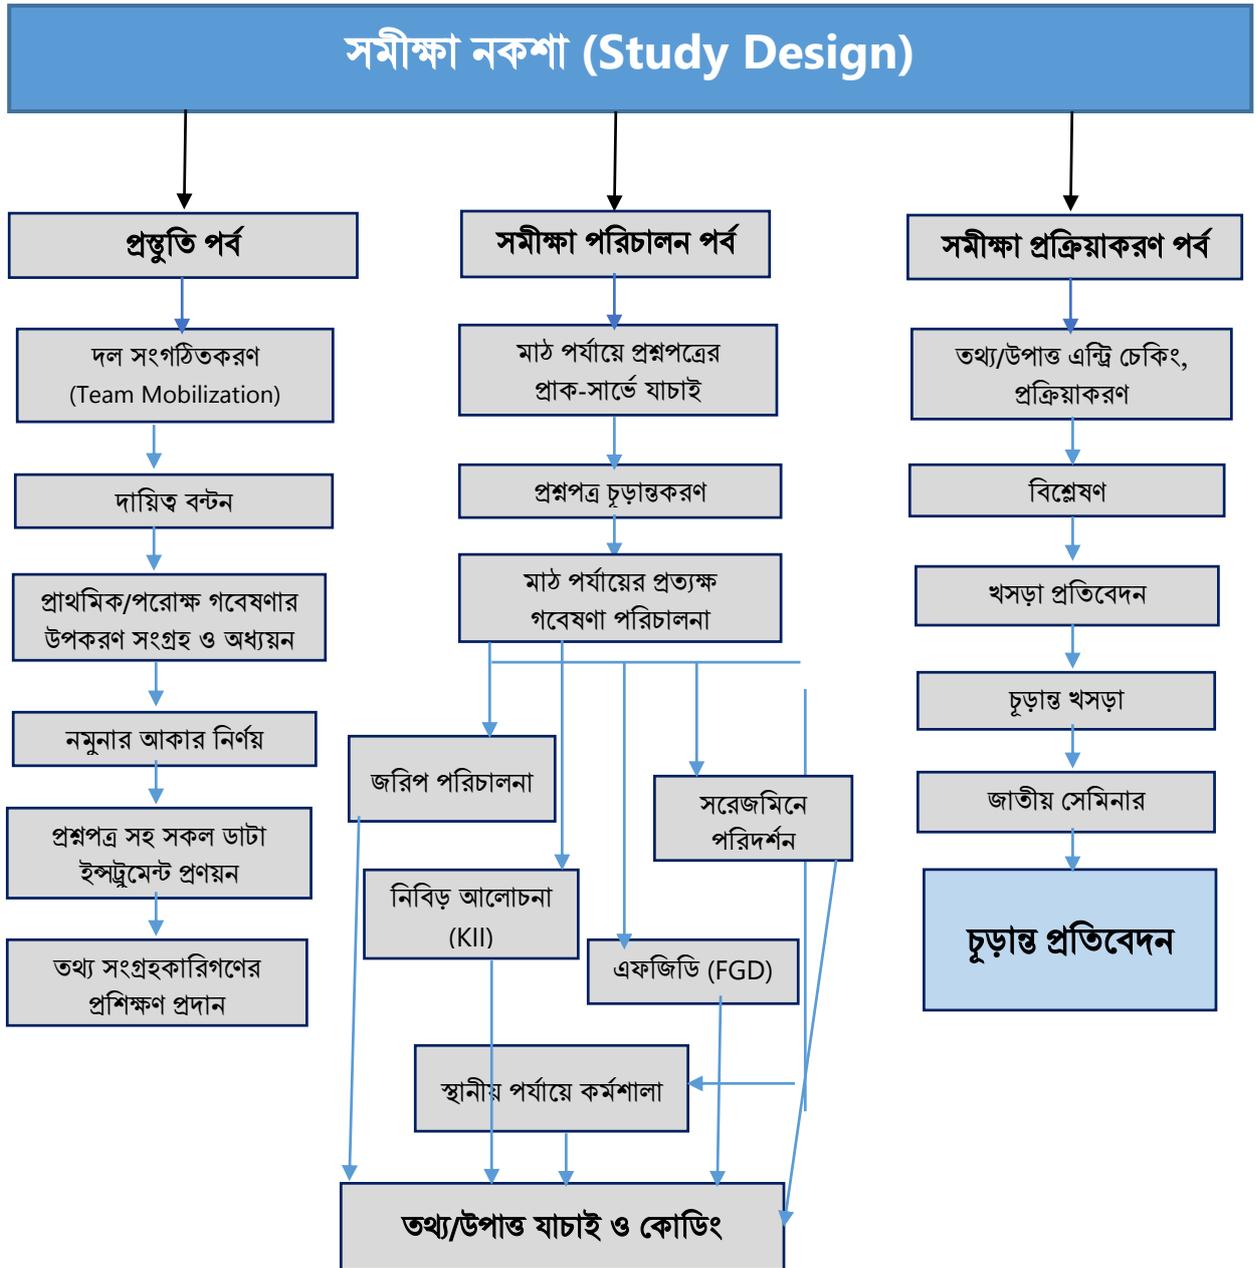

উপরে বর্ণিত নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার চলক/নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সঠিকভাবে সংগ্রহ ও যথাযথ বিশ্লেষণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে। এজন্য একটি আধুনিক মানসম্মত ও কার্যকরী সমীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

২.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় (জেলা সদর)

বিভাগ	জেলা	বিভাগ	জেলা
ঢাকা	ঢাকা	খুলনা	বাগেরহাট
	ফরিদপুর		চুয়াডাঙ্গা
	গাজীপুর		যশোর
	গোপালগঞ্জ		ঝিনাইদহ
	কিশোরগঞ্জ		খুলনা
	মাদারীপুর		কুষ্টিয়া
	মানিকগঞ্জ		মাগুরা
	মুন্সিগঞ্জ		মেহেরপুর
	নারায়নগঞ্জ		নড়াইল
	নরসিংদি		সাতক্ষীরা
	রাজবাড়ি		
	শরিয়তপুর		
	টাঙ্গাইল		
রাজশাহী	বগুড়া	বরিশাল	বরগুনা
	জয়পুরহাট		বরিশাল
	নওগাঁ		ভোলা
	নাটোর		বালকাঠি
	চাঁপাই নবাবগঞ্জ		পটুয়াখালী
	পাবনা		পিরোজপুর
	রাজশাহী		
	সিরাজগঞ্জ		
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	সিলেট	হবিগঞ্জ
	বি-বাড়িয়া		মৌলভীবাজার
	চাঁদপুর		সুনামগঞ্জ
	চট্টগ্রাম		সিলেট
	কুমিল্লা		
	কক্সবাজার		
	ফেণী		
	খাগড়াছড়ি		
	লক্ষ্মীপুর		
	নোয়াখালী		
রাঙ্গামাটি			
রংপুর	দিনাজপুর	ময়মনসিংহ	জামালপুর
	গাইবান্ধা		ময়মনসিংহ
	কুড়িগ্রাম		নেত্রকোনা
	লালমনিরহাট		শেরপুর
	নীলফামারি		
	পঞ্চগড়		
	রংপুর		
	ঠাকুরগাঁ		

২.৪ নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় ধরনের তথ্য প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প থেকে যে কোন ধরনের সেবা গ্রহণ করেছেন অথবা করণের এমন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়েছে।

- প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।
- উপকারভোগীদের সাথে গুণগত উপাত্ত সংগ্রহের জন্য দলীয় আলোচনা করা হয়েছে।
- মূল তথ্যদানকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।
- সফল বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থায় উন্নত এমন ৮টি ভবনের কেস স্টাডি করা হয়েছে।
- ফটোর মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন;
- এছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে

নমুনা আকার নির্ধারণ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় নির্বাচিত নমুনাসমূহ যেন প্রতিনিধিত্বমূলক হয় সেটি নিশ্চিত করার জন্য একটি বিজ্ঞানভিত্তিক নমুনার কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। cluster sampling পদ্ধতিতে sampling নির্বাচন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ৬৪ টি জেলা হচ্ছে ক্লাস্টার এবং Division কে strata হিসাবে ধরা হয়েছে। সবগুলো Division অর্থাৎ Stratum থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে ২৫টি cluster অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচনকৃত মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স থেকে Random Sampling Technique এর মাধ্যমে sample সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনার আকার নির্ণয়ে যে সূত্র অনুসরণ করা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। প্রকল্পের সম্ভাব্য উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বর্তমানে জেলা শহরে বসবাস করছে করছে তাদের নমুনার আকার নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানিক সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

$$n = \frac{z^2pq}{e^2} \times df$$

যেখানে, n = sample size

p = proportion/probability of success

q = 1-p, e = precision level এবং df= design effect

Assumptions:

z = 1.96 (value of the standard variation at 95% confidence level)

p = 0.5 এবং q = 1-p, অতএব q = 0.5

e = 0.05 (precision level = 4%, at 95% confidence level), df= ১.৫

$$(1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5$$

$$n = \frac{\quad}{(0.05)^2} \times 1.5$$


$$(0.05)^2$$

$$n=1200$$

সুতরাং নমুনার আকার, n = 1200 নির্ধারণ করা হয়েছে।

অতএব সংশ্লিষ্ট প্রকল্প থেকে মোট 1200 জন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে Systematic Sampling Technique-এর মাধ্যমে নির্বাচন করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.২ বাংলাদেশের সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের জরিপ কাজের জন্য নির্বাচিত জেলাসমূহ

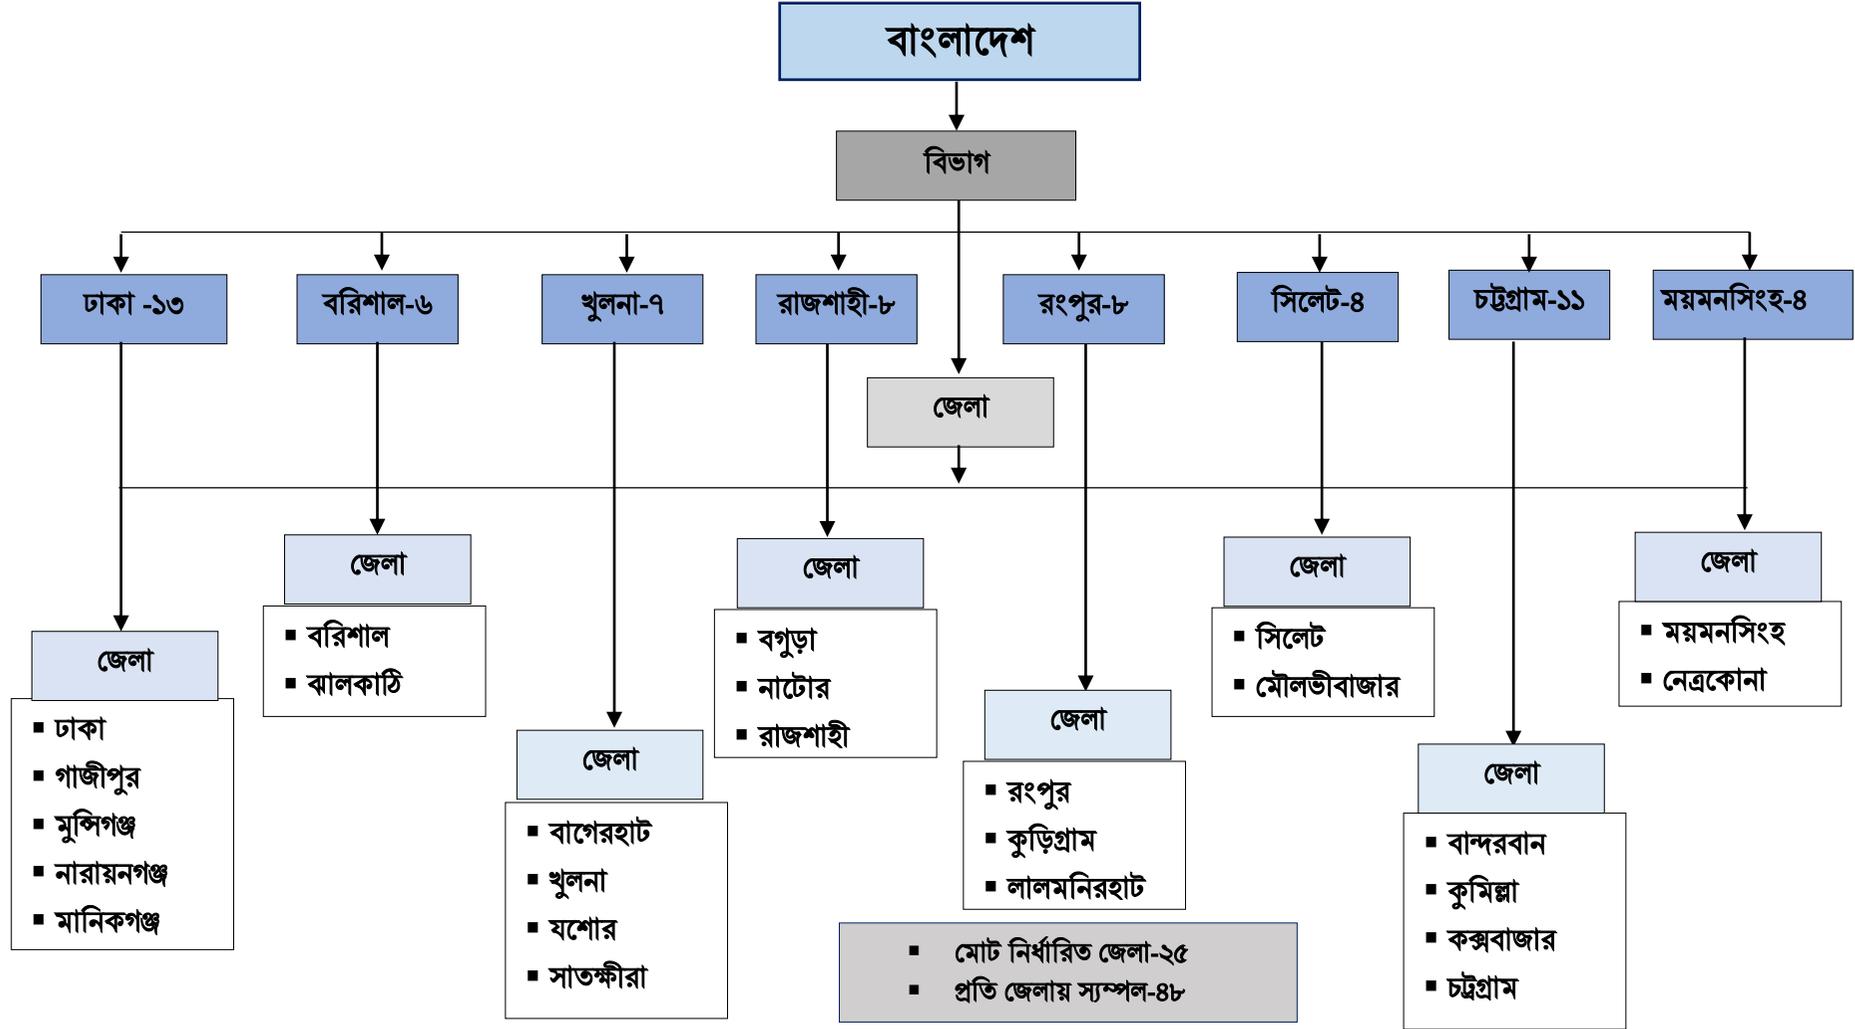

২.৫ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

২.৫.১ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার তথ্য ও উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সঠিক তথ্য সংগ্রহ, মাঠ পর্যায়ে তথ্য যাচাই, প্রতিটি প্রশ্নপত্রের আলাদা আইডি নম্বর প্রদান, কোডিং ও এন্ট্রি করানোর উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহকারী, সুপারভাইজার, কম্পিউটার কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ইত্যাদি নিয়োগ করা হয়েছিল। নিয়োগের ক্ষেত্রে যে বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে তা হলো: শিক্ষাগত যোগ্যতা, সমজাতীয় কাজের অভিজ্ঞতা, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে অভিজ্ঞতা, নিবিড় সাক্ষাতকার ও দলীয় আলোচনা পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। মোট ১৬ জন তথ্য সংগ্রহকারী (ছেলে-৮ এবং মেয়ে-৮ জন), ৪ জন সুপারভাইজার, ৪ জন কোডার ও ২ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীদের ২ দিন হাতে কলমে প্রশিক্ষণ এবং অর্ধবেলা মাঠ পর্যায়ে প্রাক-যাচাই করা হয়েছে। সুপারভাইজার ও নিবিড় সাক্ষাতকার ও দলীয় আলোচনা ফ্যাসিলিটেরদের আরো অর্ধবেলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মোট ১৮ কর্মদিবসের মধ্যে ১২০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জরিপ সম্পন্ন করা হয়। সমীক্ষায় ২৮ টি নিবিড় সাক্ষাতকার ও ১৬ টি দলীয় আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে।

২.৫.২ প্রশ্নপত্রের প্রাক-সার্ভে যাচাই

তথ্য সংগ্রহকারীগণ সমজাতীয় তথ্য-উপাত্ত দ্বারা খসড়া প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের ভুল-ত্রুটি ঘটনাস্থলেই চিহ্নিত করে ত্রুটিমুক্তভাবে প্রশ্নপত্র পূরণের প্রশিক্ষণ দেয়া ছাড়াও কিভাবে ভুল এড়াতে বা মোকাবেলা করতে হয় সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের আলোকে খসড়া প্রশ্নপত্রের ত্রুটি ও দুর্বলতা সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৫.৩ সাক্ষাতকার গ্রহণ

নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে উত্তরদাতাগণের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রেই উত্তর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, নিবিড় আলোচনা, এফজিডি ইত্যাদি পরিচালনার জন্য চেকলিস্ট/গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে।

২.৫.৪ গুণগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

প্রকল্পের অগ্রগতি গভীরভাবে উপলব্ধির জন্য গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করে গুণগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)।
- মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাতকার (KII)।
- কেসস্টাডি।
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা।

২.৫.৫ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি)

সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) শীর্ষক চলমান প্রকল্পের জেলা পর্যায়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এফজিডি'র মাধ্যমে প্রকল্পের “মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন” সম্পর্কে ধারণা, এর কার্যক্রম, অ-স্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডিতে ৮-১২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছেন। ৮টি বিভাগে মোট ১৬ টি এফজিডি'র আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি বিভাগে -২টি করে এফজিডি গাইডলাইন অনুসরণে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৫.৬ মূল তথ্যদাতাদের সাথে নিবিড় আলোচনা (কেআইআই)

সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্ণ বা আংশিক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রকল্পের অংশীজন, প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর, জেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক ও সমাজসেবক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সাথে নিবিড় আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা হলো: প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বাঁধাসমূহ, কিভাবে বাঁধাসমূহ জয় করা হয়েছে, আগামী সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং কিভাবে ঝুঁকি মোকাবিলা করা যায়, জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছেন ইত্যাদি। সর্বমোট ২৮ টি কেআইআই করা হয়েছে।

২.৫.৭ কেসস্টাডি

প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, কাজের গুণগতমান, বিভিন্ন মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ, সাইট অফিসে প্রকৌশলী ও ডিজাইন-ড্রইং এবং ভূমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি বিবেচনায় ৮ টি কেসস্টাডি সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৫.৮ নির্মাণ সাইট পরিদর্শন

নির্মাণ কাজের জন্য ১৬ টি সাইট পরিদর্শন করা হয়েছে এবং যে বিষয় সমূহ দেখা হয়েছে এবং সাইট থেকে যে সকল তথ্য উপাত্ত ও নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তা হলো:

- ঠিকাদারদের সাথে চুক্তি পত্র।
- চুক্তি অনুযায়ী জনবল নিয়োগ।
- নকশা অনুযায়ী কাজ হয়েছে কি না?
- অনুমোদিত নকশা-architectural, structural, electrical, plumbing, mechanical, firefighting.
- Soil test “report” dimensions of building, room, beam, column, reinforcement, slab, etc.
- Stock registrar for goods (electrical items, furniture, laboratory instruments, raw materials, etc.)
- Test reports on materials: brick, aggregate, cement, sand, reinforcement, concrete, mix design of concrete, slump test, etc.

২.৫.৯ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা গাজীপুর জেলায় ২০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অংশীজন নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিলো বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীর অংশীজনের সাথে মত বিনিময় করা এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করা।

২.৬ সমীক্ষা ও উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রণ

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় সুপারভাইজারগণ প্রতিটি প্রশ্নপত্র, গাইডলাইন ও চেকলিস্ট যথাযথভাবে পূরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখেছেন। গুণগত মান পরীক্ষার জন্য দৈবচয়নের মাধ্যমে ৫% প্রশ্নপত্র পূরণের পর পরই যাচাই করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে প্রশ্নপত্র পূরণে যখন কোন ভুল-ত্রুটি দেখা গেছে তা সমাধানের জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিটি প্রশ্নপত্রে আলাদা আইডি নম্বর প্রদান, কোডিং, তথ্য ও উপাত্ত কম্পিউটারে এন্ট্রি করানো এবং তথ্য উপাত্ত যাচাই করা হয়েছে।

২.৭ তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্দেশকসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাপ্ত তথ্যের ইনপুট-আউটপুট কাঠামো এমনভাবে স্তর বিন্যাস করা হয়েছে যেন তথ্যের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ SPSS সফটওয়্যার ও MS Excel ডাটাবেস এর সাহায্যে এন্ট্রি করা হয়েছে এবং যথাযথ পরিসংখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া যথাযথ Tabulation-এর সাহায্যে প্রক্রিয়াকৃত উপাত্ত ও ফলাফল সারণি, লেখচিত্র ও চার্ট আকারে উপস্থাপন এবং প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৮ সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পরিকল্পনা

সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রধানত ইউনি-ভ্যারিয়েট, বাই-ভ্যারিয়েট বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি ধাপে বিশেষ পরিসংখ্যান কৌশল ব্যবহার করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মূলত যে সব পরিসংখ্যান টুলস তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়েছে তা নিম্নরূপ।

নমিনাল এবং অর্ডিনাল চলক বিশ্লেষণ

- ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন (গনসংখ্যা নিবেশন) গ্রাফ ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন (সংখ্যা, অনুপাত ও শতকরা);

কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল

- পরিসংখ্যান (গড়, মধ্যক, প্রচুরক, এসডি, ভেরিয়েন্স, শতকরা ইত্যাদি)।
- সচিত্র উপস্থাপন।

গুণগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

- তথ্য-উপাত্ত কে ধারণায় বিন্যস্ত করা হয়েছে।
- প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৮.১ গুণগত তথ্য বিশ্লেষণের ধাপসমূহ: প্রকল্পের গুণগত তথ্য উপাত্তসমূহ বিভিন্ন ধাপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

নিম্নের সারণি ৪.২ এ দেয়া হলো।

সারণি ৪.২: গুণগত তথ্য বিশ্লেষণের ধাপ

ধাপ	ধাপ	কাজ
১	উপাত্ত সংগ্রহ	নির্বাচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা (এফজিডি) ও নিবিড় সাক্ষাৎকার করা হয়েছে।
২	ক্ষিপ্ত প্রত্নতত্ত্ব	সংগৃহীত উপাত্ত বিস্তারিত লেখা ক্ষিপ্ত আকারে রূপান্তরিত হয়েছে।
৩	অংশগুলো চিহ্নিতকরণ ও নির্ধারণ	গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি গবেষণার প্রশ্নাবলির সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে লিখিত ক্ষিপ্ত পাঠ করা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
৪	কোডিং, এডিটিং	নির্ধারিত অংশসমূহের সেটের মাধ্যমে কোডিং ও এডিটিং সম্পন্ন করা হয়েছে।
৫	পুনর্বিবেচনা	নতুন ফলাফল খুঁজে পাওয়া ও নির্ধারিত অংশসমূহের প্রেক্ষিতে ক্ষিপ্তগুলো পর্যালোচিত হয়েছে।
৬	পুনরায় কোড করা	পর্যালোচিত ক্ষিপ্তগুলোতে মতামত থাকলে কোডগুলো আবার দেখা হয়েছে। নতুন ফলাফলের প্রেক্ষিতে কোডিং ও এডিটিং সংশোধিত করা হয়েছে।
৭	গণনা	গুণগত উপাত্ত গণনা অনুসরণ করে পুনরায় কোড করা হয়েছে।
৮	হাইয়ার্কিক্যাল শ্রেণি পদ্ধতি সৃষ্টি করা	মূল দলের সদস্যগণের চিন্তাভাবনা মাধ্যমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এরূপ কোডিং পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে। এ পদ্ধতির প্রয়োগ বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় সুযোগ সৃষ্টি করে।
৯	মেমো তৈরি	যখন মতামত ধারণাসমূহ পাওয়া যাবে, এগুলো ধারণা হিসেবে লেখার জন্য অতিরিক্ত উপাত্ত হিসেবে বিশ্লেষণ করার জন্য স্মারকগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
১০	সম্পর্ক পরীক্ষণ উপাত্ত প্রদর্শন	সম্পর্ক পরীক্ষণ প্রক্রিয়া একটি মেট্রিক্সের আওতায় আনা হয়েছে, যা কিনা দেখায় কিভাবে বিভিন্ন ধারণাসমূহ সংযুক্ত হয় অথবা হতে পারে; কোন ফলাফলগুলো কোন কারণের সাথে যুক্ত।
১১	ফলাফল প্রতিস্থাপন বিশুদ্ধিকরণ	কর্মশালার শুদ্ধতা পরীক্ষণ, প্রাসঙ্গিক প্রক্রিয়ার অংশীজন ও ব্যক্তিবর্গের সাথে মিটিং এর মাধ্যমে ফলাফলের বৈধতা নিরূপণ করা হয়েছে।
১২	উপসংহারে উপনিত হওয়া	গুণগত উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে উপসংহার টানা হয়েছে এ বিষয় মনে রেখে ‘তথ্যাদি কতটা বিশ্বাসযোগ্য আর বিশুদ্ধ ছিলো।

২.৯ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কর্মপরিকল্পনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজটি চুক্তি সম্পাদনের পর হতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা পর্যন্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান যে সকল কাজ সম্পাদন করেছে, যেমনঃ ক. পরামর্শকদের দায়িত্ব বন্টন, খ. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার দলিলাদি/উপকরণ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা, গ. নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে sample population নির্ণয় করা, এবং ঘ. প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (Inception Report) প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রারম্ভিক প্রতিবেদন টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনক্রমে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে পুনরায় ২য় টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির কাছে উপস্থাপন এবং এদের অনুমোদনের পর জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপনের পর আবার ৩য় টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, নিম্নের ছকে কর্মপরিকল্পনা দেয়া হলো।

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ছক

#	বিষয়	কার্যক্রমের সময় (মাস ভিত্তিক) ২০২১				
		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে
১	পরামর্শক দলের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন					
২	খসড়া প্রস্তুত তৈরী ও ইনসেপশন রিপোর্ট প্রণয়ন					
৩	টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্টের উপর সুপারিশ প্রদান					
৪	স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্ট অনুমোদন					
৫	তথ্য সংগ্রহকারি নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ					
৬	সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ					
৭	উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের তদারকি					
৮	KII & FGD সেশন পরিচালনা করা					
৯	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা করা					
১০	সংগৃহীত উপাত্ত সম্পাদনা করা					
১১	ডাটা এন্ট্রি ও যাচাইকরণ					
১২	টেবুলেশন সম্পন্নকরণ					
১৩	ডাটা বিশ্লেষণ করা					
১৪	টেকনিক্যাল কমিটিতে ১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল					
১৫	খসড়া প্রতিবেদন টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা					
১৬	স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক প্রথম খসড়া প্রতিবেদন অনুমোদন					
১৭	জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত সংগ্রহ					
১৮	সেমিনারের মতামতের ভিত্তিতে টেকনিক্যাল কমিটিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন দাখিল ও পর্যালোচনা					
১৯	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন স্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে অনুমোদন					
২০	স্টিয়ারিং কমিটির মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও প্রতিবেদন বাংলা ও ইংরেজিতে দাখিল					

তৃতীয় অধ্যায়

পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ফলাফল পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার মাধ্যমে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য উপাত্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিম্নে পর্যালোচনাসমূহ দেয়া হলো।

৩.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল

প্রকল্পের ডিপিপি'র তথ্য অনুসারে প্রকল্পটি ৮ ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৩। প্রকল্পটি ১ম সংশোধনের পর এর বাস্তবায়নকাল ১ বছর বৃদ্ধি করে জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৪ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ২য় সংশোধনে পর এর বাস্তবায়নকাল ১ বছর বৃদ্ধি করে জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৫ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পটি ২ বার আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়। ফলে ১ম আন্ত:খাত সমন্বয় করে এর মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি করে জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এ ছাড়া প্রাইস কনটিনজেন্সি সমন্বয় করে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করে জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। সবশেষে, ২য় আন্ত:খাত সমন্বয় করে এর প্রকল্পের মেয়াদ ৩ বছর বৃদ্ধি করে জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথম মেয়াদে ৩৩%, ২য় মেয়াদে ৩৩%, ৩য় মেয়াদে ৬৭%, ৪র্থ মেয়াদে ৩৩% এবং ৫ম ও শেষ মেয়াদে ১০০% সময় বৃদ্ধি করা হয়। এ ক্ষেত্রে ক্রমপুঞ্জিত সময় বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬৭% (মূল ডিপিপি'র সাথে মোট সময় বৃদ্ধির তুলনা করা হয়েছে), সারণি ১.২।

৩.২ প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয়

মূল ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের জন্য মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১১৮৭৮.০৬ লক্ষ টাকা। প্রথম সংশোধিত ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১৩০২০.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় বৃদ্ধি প্রায় ১০%। আবার, ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৫২৬৬.৭৬ লক্ষ টাকা। যা মূল ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ২৮.৫% বেশী এবং ১ম সংশোধিত ডিপিপি'রে চেয়ে ১৭.৩% বেশী। উল্লেখ্য প্রকল্পের সকল ব্যয়ই জিওবি সংস্থান করছে, সারণি ১.৩।

৩.৩ ডিপিপি সংশোধনের কারণসমূহ

প্রকল্পটি ডিপিপি মোট ২ বার সংশোধন করা হয়েছে। এ ছাড়া ২ বার আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়। ডিপিপি সমন্বয়ের কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- **মূল ডিপিপি:** প্রাথমিক অবস্থায় মোট ৪৮টি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এর সংস্থান রেখে ডিপিপি একনেক সভায় উপস্থাপন করা হয়। একনেক সভায় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা অনুযায়ী অবশিষ্ট ১৬ টি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের সংস্থান রেখে পুনরায় ডিপিপি উপস্থাপন করা হয়। বিগত ৮ ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ সালে একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।
- **১ম সংশোধন:** মূল ডিপিপি অনুসারে পিডি অফিসের জন্য শুধুমাত্র যন্ত্রপাতির সংস্থান রাখা হয় (ফটোকপি, কম্পিউটার, ফার্নিচার উত্যাাদি। পরবর্তীতে ৬৪ জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এর জন্য এই সকল যন্ত্রপাতি ও ফার্নিচার এর সংস্থান রাখা হয়। অপরদিকে ৩২ টি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এর জমি সংক্রান্ত সমস্যা ছিল। ফলে ডিপিপি সংশোধন করা হয়।
- **২য় সংশোধন:** যে সকল কারণে ২য় বার সংশোধন করা হয় তা'হলো: গণপূর্ত অধিদপ্তরের তিন বার রেট সিডিউল পরিবর্তন (২০০৮, ২০১১ এবং ২০১৪), প্রতিটি ভবনের জন্য সোলার পিভি সিস্টেম অন্তর্ভুক্তকরণ, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বেতন বৃদ্ধি, ৬৪ জেলার ভবনের জন্য কনফারেন্স টেবিল ও চেয়ার, বীরশ্রেষ্ঠদের ভাস্কর্য, মুক্তিযুদ্ধের বই, সিডি ও তৈল চিত্র এবং ২৮ ইঞ্চি LED/LCD টিভি সংস্থান রাখার জন্য ডিপিপি সংশোধন করা হয়।

- **আন্ত:খাত সমন্বয়-১ম :** নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে) মোট ৪৫ টি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। ১৮টি ভবনের কাজ চলমান ছিল এবং ১ টি ভবনের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন ছিল। অতএব, ব্যয় বৃদ্ধি না করে আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়।
- **আন্ত:খাত সমন্বয়-২য়:** ১ম আন্ত:খাত সমন্বয়ের নির্ধারিত সময় শেষে মোট ৬৩ টি ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। জমি সংক্রান্ত সমস্যার কারণে ঢাকার ভবনটির নির্মাণ কাজ শুরু করতে দেরী হয়েছে। সমীক্ষা চলাকালে নির্মাণ কাজ চলমান ছিল। অপরদিকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১৫টি মুরাল এর সংস্থান রাখা হয়। এর ফলে ব্যয় বৃদ্ধি না করে ২য় বার আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়।
- **প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি:** সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০শে জুন, ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। করোনা পরিস্থিতির কারণে এর বাস্তবায়নকাল ১ বছর বৃদ্ধি করা হলেও আরডিপিপি এর বছরভিত্তিক ব্যয় বিভাজনে ২০২০-২১ অর্থ বছরে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি।

৩.৩.১ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণসমূহ

যে সকল কারণে সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

- **মূল ডিপিপি:** প্রাথমিক অবস্থায় মোট ৪৮টি জেলায় ভবন নির্মাণ এর সংস্থান রেখে ডিপিপি একনেক সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা অনুযায়ী অবশিষ্ট ১৬ টি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের সংস্থান রেখে পুন:রায় ডিপিপি উপস্থাপন করা হয়। অতএব, এই ১৬টি ভবন অন্তর্ভুক্তির ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **১ম সংশোধন:** মূল ডিপিপি অনুসারে পিডি অফিসের জন্য শুধুমাত্র যন্ত্রপাতির সংস্থান রাখা হয়। পরবর্তীতে ৬৪ জেলার সকল ভবনের জন্য যন্ত্রপাতি ও ফার্নিচার এর সংস্থান রাখা হয়। ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
- **২য় সংশোধন:** গণপূর্ত অধিদপ্তর তিন বার রোট সিডিউল পরিবর্তন (২০০৮, ২০১১ এবং ২০১৪)। ফলে নির্মাণ কাজের ব্যয় ২০-২৫% বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া প্রতিটি ভবনের জন্য সোলার পিভি সিস্টেম অন্তর্ভুক্তকরণ, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে সাথে অফিসারদের বেতন বৃদ্ধি, ৬৪ জেলার ভবনের জন্য কনফারেন্স টেবিল ও চেয়ার, বীরশ্রেষ্ঠদের ভাস্কর্য, মুক্তিযুদ্ধের বই, সিডি ও তৈল চিত্র এবং ২৮ ইঞ্চি LED/LCD টিভি সংস্থান রাখার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
- **আন্ত:খাত সমন্বয় -১ম:** ব্যয় বৃদ্ধি না করে আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়।
- **আন্ত:খাত সমন্বয়-২য়:** ব্যয় বৃদ্ধি না করে ২য় বার আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়।

৩.৪ অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি

সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৫,২৬৬.৭৬ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৩,৩২৪.৮৫ লক্ষ টাকা। অগ্রগতি ৮৭.২৮%। এদের মধ্যে রাজস্ব খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৩৪৪.৫২ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৩১.৬৯৫ লক্ষ টাকা। অগ্রগতি ৬৭.২৮%। অপরদিকে, মূলধনী খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৪,৯২২.২৪ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩০৯২.৩৯ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে অগ্রগতির ৮৭.৭৩%।


সারণি ৩.১. অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতির চিত্র:

লক্ষ টাকা

ডিপিপি অনুযায়ী খাত সমূহ (পরিমাণ সহ)		প্রাক্কলিত ব্যয়	গত এপ্রিল, ২০২১-এ অর্জন		বর্তমান বছরের লক্ষ্যমাত্রা (২০২০-২১)	চলতি বছরের এপ্রিল ২০২১ এ পর্যন্ত অগ্রগতি	
বিবরণ	পরিমাণ	আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব (% অনুপাতে)	আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক (% অনুপাতে)
কর্মকর্তা বেতন (২০% সমন্বয়সহ)	৩	৫৯.০০	৪৬.৭৪	৭৯.২২%	৫.০০	০.০০	-
কর্মচারী বেতন (২০% সমন্বয়সহ)	-	১০.৯৪	৯.৯৭	৯১.১৩%	০.০০	০.০০	-
ভাতা	-	৪৭.০৮	৩৬.৩৭৫	৭৭.২৬%	১.৯৭	০.০০	-
সেবা ও সরবরাহ	-	২২০.০০	১৩২.০৬	৬০.০২%	৬১.৪১	২৭.৫০	৪৪.৭৮%
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	৭.৫০	৮.০২	১০৬.৯৩%	২.১২	-	-
মোট রাজস্ব খাত		৩৪৪.৫২	২৩১.৬৯৫	৬৭.২৮%	৮০.০০		
প্রকল্প পরিচালকের গাড়ি ও নিবন্ধন	১	৫০.৮৮	৫০.৮৮	১০০%	০.০০	-	-
সম্পত্তি ক্রয়	-	৯৭৪.৯৬	৪৬৮.১২	৪৮.০১%	৪৫৭.০০	-	৩৫.৬৮%
আসবাবপত্র ক্রয়	-	৯০০.০০	৩৮৭.৮২	৪৩.০৯%	৩০০.০০	-	৪৩.২১%
ভবন নির্মাণ কাজ	৬৪	১২,৬০৩.৯০	১২,১৭৬.৮৭	৯৬.৬১%	৪৫০.০০	১৭০.০০	১.৫২%
গণপূর্ত কন্টিনজেন্সি	-	৮.০০	৮.০০	১০০%	০.০০	০.০০	-
প্রাইস কন্টিনজেন্সি	-	০.০০	০.০০	০.০০%	-	-	-
অন্যান্য	-	-	-	-	১২৬.০০	-	-
উপমোট (মূলধন খাত)		১৪,৯২২.২৪	১৩,০৯২.৩৯	৮৭.৭৩%			
সর্বমোট		১৫,২৬৬.৭৬	১৩,৩২৪.৮৫	৮৭.২৮%	১,৪১৩.০০	১৯৭.৫০	


৩.৪.১ খাত ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও অগ্রগতি:

তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে রাজস্ব খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪৪.৫২ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৩১.৬৯৫ লক্ষ টাকা, এই সময় পর্যন্ত অগ্রগতি হয়েছে ৬৭.২৮%। অপরদিকে, মূলধনী খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় করা হয়েছে ১৪,৯২২.২৪ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩,০৯২.৩৯ লক্ষ টাকা। প্রাক্কলনের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৭.৭৩%।

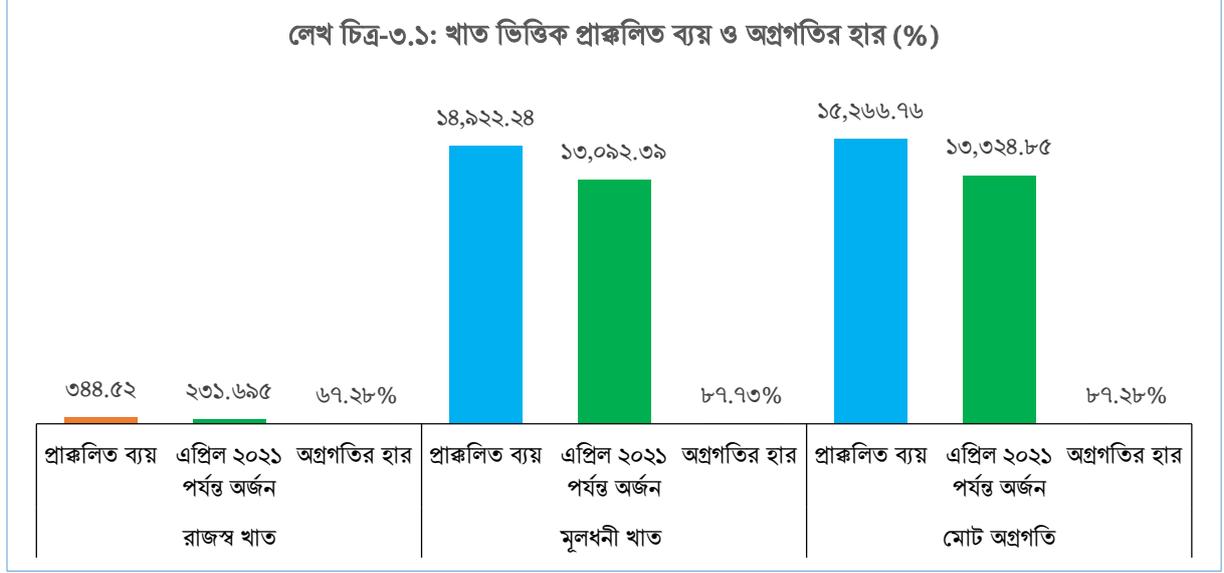


৩.৪.২ রাজস্ব খাতের অগ্রগতি বিশ্লেষণ: এপ্রিল ২০২১

তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, রাজস্ব খাতের সবচেয়ে বেশী ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে সেবা ও সরবরাহ খাতে এবং এর পরিমাণ ২২০.০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩২.০৬ লক্ষ টাকা। অগ্রগতি ৬০.০২%। অপরদিকে, সবচেয়ে কম ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে। এই খাতে মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৭.৫ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ৮.০২ লক্ষ টাকা। এই খাতে অগ্রগতি ১০৬.৯৩%।

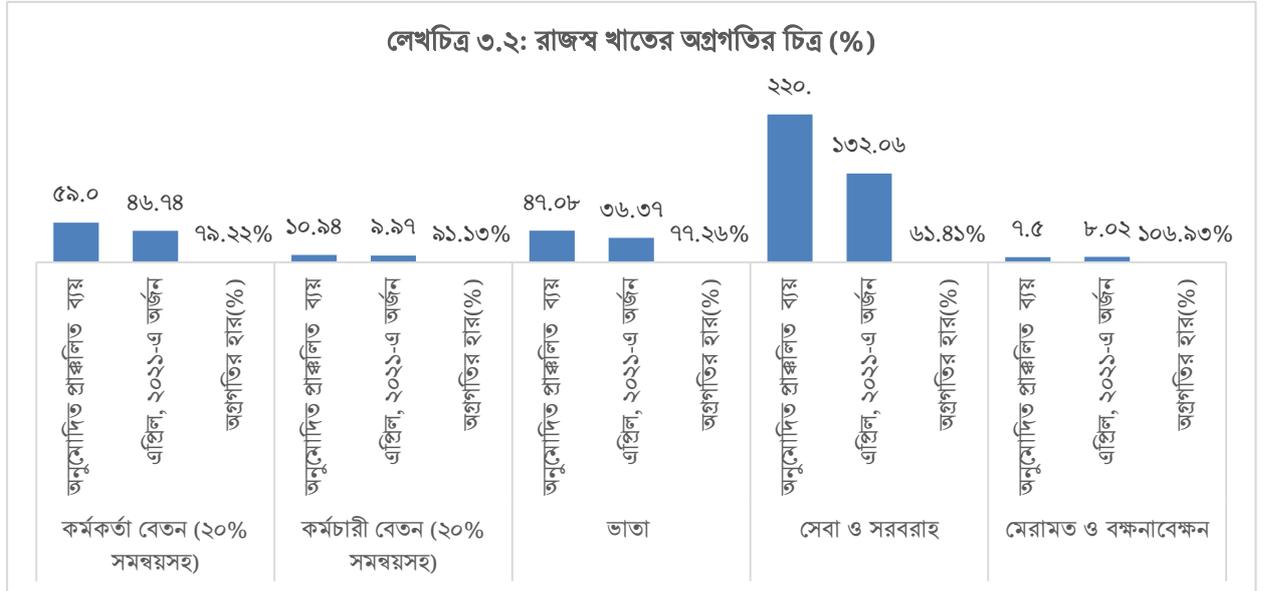

৩.৪.৩ মূলধন খাতের অগ্রগতি

তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মূলধন খাতের সবচেয়ে বেশী ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ভবন নির্মাণ কাজে এবং এর পরিমাণ ১২৬০৩.৯ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১২১৭৬.৮৭ লক্ষ টাকা। অগ্রগতি ৯৬.৬১%। অপরদিকে, সবচেয়ে কম ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে প্রকল্প পরিচালকের গাড়ি ক্রয় ও নিবন্ধন খাতে। এই খাতে মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫০.৮৮ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ৫০.৮৮ লক্ষ টাকা। এই খাতে অগ্রগতি ১০০%। অপরদিকে সম্পত্তি ক্রয় বাবদ ব্যয় হয়েছে ৪৮.০১%। উল্লেখ্য কোন কোন যেহেতু সরকারি সম্পত্তি নাম মাত্র মূল্যে অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাই এই খাতে খরচ কম হয়েছে। অপরদিকে আসবাবপত্র ক্রয়ের খাতে খরচ হয়েছে ৪৩.১%। এ ক্ষেত্রে ভবন নির্মাণে দেরী হওয়ায় আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়নি। বর্তমানে ভবন নির্মাণ শেষ হয়েছে তাই আসবাবপত্র ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান।

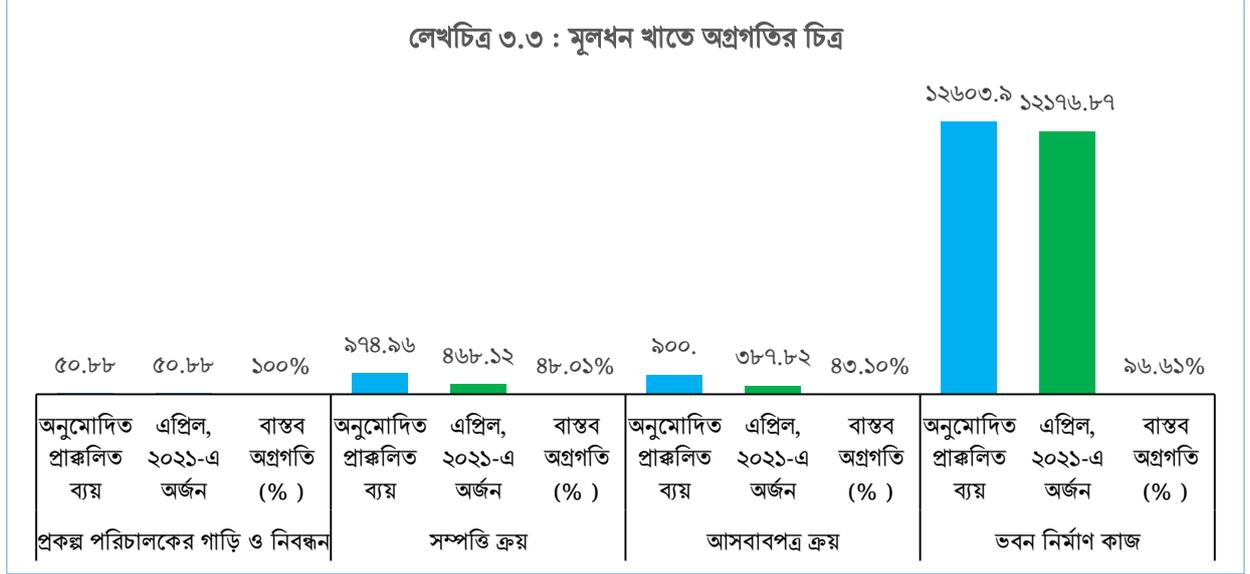

৩.৪.৪ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (এক নজরে)

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহের অগ্রগতি

সমীক্ষায় মোট ২৫ টি জেলা মুক্তিযোদ্ধা ভবনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহিত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নের সারণিতে প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহের বর্তমান অগ্রগতি উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ	অগ্রগতিসমূহ (%)	মন্তব্য
১	সকল জেলায় ১টি করে ৫ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন (৬৪ টি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন) নির্মাণ করা	১০০ %	
২	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের প্রতি ফ্লোরের মোট আয়তন ২৫০০ বর্গফুট হিসেবে নির্মাণ করা	১০০ %	
৩	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের নীচ তলা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাড়া (৯টি দোকান) এবং ২য় তলায় অফিস/ব্যাংক/কমিউনিটি সেন্টার প্রভৃতি হিসেবে ভাড়া দেয়া হয়েছে।	৫২%	সমীক্ষায় আওয়াজ ২৫ ভবনের মধ্যে ১৩টি ইতোমধ্যেই ভাড়া দেয়া সম্ভব হয়েছে।
৪	ভবন অদ্যবধি ভাড়া দেয়া সম্ভব হয় নাই (নীচ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাড়া দেয়ার জন্য ৯টি দোকান এবং ২য় তলায় অফিস/ব্যাংক/কমিউনিটি সেন্টার প্রভৃতি হিসেবে ভাড়া)।	৪৮%	সমীক্ষায় আওয়াজ ২৫ ভবনের মধ্যে ১২টি অদ্যবধি ভাড়া দেয়া সম্ভব হয় নাই।
৫	৩য় তলায় জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও ডেপুটি কমান্ডারের অফিস এবং সভা সেমিনার ইত্যাদি কক্ষ নির্মাণ করা।	১০০ %	

৬	ভবনের চারদিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	৯৬%	সমীক্ষার ২৫টি ভবনের মধ্যে ২৪ টির সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১টি (বান্দরবান) ভবনের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ অদ্যাবধি করা হয় নাই।
৭	প্রাচীরের প্রধান ফটকে নাম ফলক এবং দেয়ালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুরাল স্থাপন করা।	৮৮%	সমীক্ষার ২৫টি ভবনের মধ্যে ২২ টি ভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুরাল স্থাপন করা হয়েছে ৩টি (বেগুড়া, বান্দরবান, ঢাকা) টিতে অদ্যাবধি মুরাল স্থাপন করা হয় নাই।
৮	মেশিনারি ও আসবাবপত্র সরবরাহ: প্রতিটি ভবনের জন্য ১টি ফটোকপি মেশিন, ১টি কম্পিউটার, ১টি লেজার প্রিন্টার, ১টি ইউপিএস, ১টি এয়ারকন্ডিশন, ১টি ল্যাপটপ, ১টি ক্যামেরা, ১টি স্ক্যানার, ১টি প্রজেক্টর, ১টি ফ্যাক্স মেশিন, টেলিফোন সেট, ৪০টি সিলিং ফ্যান, চেয়ার এবং টেবিলসহ অন্যান্য আসবাবপত্র সরবরাহ করা;	৬৪%	সমীক্ষার ২৫টি ভবনের মধ্যে ১৬ টি ভবনে মেশিনারি ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে বাকী ৯টি ভবনের কাজ দেরীতে সম্পন্ন হওয়ায় অদ্যাবধি সরবরাহ করা হয় নাই।

৩.৫ পিএসসি/পিআইসি সভা

৩.৪.৪.১ প্রকল্পের Project Implementation Committee (PIC) এরং Project Steering Committee meeting (PSC)

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের PIC and PSC সভা অনুষ্ঠিত হয়। PSC সভায় যে সকল বিষয়সমূহ বিবেচনা করে তা হলো প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা, সমস্যা ও বাঁধাসমূহ চিহ্নিত করা এবং সমাধান করা এবং নীতি নির্ধারণ করা। অপরদিকে PIC সভায় প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। এছাড়া বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা PIC সভা এবং PSC সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়। বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী PIC এবং PSC সভায় পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়। তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় বিগত ১০ বছরে মোট ১০ PIC এবং ৮ টি PSC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে বর্তমান প্রকল্প পরিচালকের মেয়াদে বিগত ৯ মাসে ২টি PSC সভা এবং ২ টি PIC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩.৬ অডিট বিষয়

প্রকল্পটি বিগত ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১১ সালে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি ২০১৭-২০১৮ সালে একবার মাত্র অডিট হয়েছে। এই অডিটের মাধ্যমে প্রাপ্ত আপত্তিসমূহ নিম্নে দেয়া হলো।

- অনিয়মিতভাবে নির্মাণ কাজের সময় বৃদ্ধি করত: জরিমানা কর্তন ব্যতীত বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি ১,২১,৪৫,৭৬৪/- টাকা। PPA বিধি ৩৯(১) আ ৩৯(৩)-৪ জিসিসি ৭৩ মোতাবেক ৫-১০
- প্রকল্পের বরাদ্দের নির্দেশ উপেক্ষা করে অনিয়মিত ভাবে ৭০১৬ কোডের টাকা অন্য কোডে খরচ করায় ক্ষতি ৩,৭৯,৫৬৬ টাকা।
- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে বার বার মেয়াদ বৃদ্ধি করায় অতিরিক্ত খরচ ৩৩৮৮.৭০ লক্ষ টাকা।
- সিলেট জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজের আনুষঙ্গিক টেন্ডার ডকুমেন্ট এর নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণ কাজের বিল পরিশোধ করায় ক্ষতির পরিমাণ ৪,৯৩,৭৩৬ টাকা।
- সুনামগঞ্জ জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ৭০১৬ কোডের প্রকল্প খাতের টাকা অনিয়মিতভাবে ৪৯০০ কোডে (মেরামত খাতে) ব্যয় করা হয়েছে, ক্ষতির পরিমাণ ৯৮,৩৫০ টাকা

- সিলেট জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজে ঠিকাদার মোঃ মিজানুর রহমানকে ৪র্থ চলতি বিলে একই আইটেম দ্বিতীয়বার লিখে Double payment করায় রাজস্ব ক্ষতি ১,৯৭,৬০৭ টাকা।
- পিপিআর -২০০৮ এর বিধি ৭৯(২)(গ) উপেক্ষা করে নারায়নগঞ্জ জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ঠিকাদারের লিখিত আবেদন ব্যতীত অনিয়মিত ভাবে খোক ভেরিয়েশন কাজের অনুমতি প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি ১৫,১৬,৩১১ টাকা যা আদায় করা আবশ্যিক।
- সরবরাহকারী/ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট ও আয়কর কম কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ ৮,৩৪,৭৪৯ টাকা।
- পিপিআর -২০০৮ এর বিধি ৭৯(২)(গ) উপেক্ষা করে মেসার্স মাসুমা বেগমকে বগুড়া জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজে অনিয়মিত ভাবে Variation works অনুমোদন করত: ২১,২২,২৪৪ টাকা পরিশোধ করা হয়।
- বান্দরবান জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজে গণপূর্ত অধিদপ্তর ২০১৪ সালের সিডিউল অব রেইটস অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করতঃ বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি ৭,০৫,৪২৫ টাকা।
- সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্পের টাংগাইল জেলার কাজের হিসাব বাণিজ্যিক নিরীক্ষায় সরবরাহ করা হয় নি ২,৪৩,০০,০০০ টাকা।
- সিলেট জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণে ক্রুটিপূর্ণ কাজ করার জন্য ভবনটি কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি অথচ ঠিকাদারকে ২,৪০,০০,০০০/- টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে।
- সকল জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্পের বিভিন্ন ক্রুটিপূর্ণ কাজের চুক্তির উপর বীমা পলিসি না থাকায় প্রিমিয়াম ও ভ্যাট আদায় বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ ২৮,৩৫,৫২১/- টাকা

যে সকল জেলায় অডিট আপত্তি আছে তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৩.৭ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষন সমীক্ষার কার্যপরিধির মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে।

প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারী ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬) এবং সরকারী ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) প্রতিপালন এবং গুণগতমান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। কার্য পরিধি মোতাবেক ক্রয় কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

ডিপিপিতে পূর্ত কাজের (Civil Works) ৬৬টি প্যাকেজ রয়েছে। তন্মধ্যে ৬৪টি প্যাকেজ (৬৪ জেলায়) গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট ২টি প্যাকেজ প্রকল্প কার্যালয় থেকে দরপত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পূর্ত কাজের দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে ১৪টি জেলায় যোগাযোগ করা হয়েছে। কাজগুলো যেহেতু অনেক আগেকার তাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তৎকালীন কর্মকর্তা/কর্মচারী অন্যত্র বদলী হওয়ায় দরপত্র সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। যে কয়েকটি জেলায় কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে পরামর্শক সংস্থার পর্যালোচনা নিম্নরূপ।

১) ঢাকা জেলা

কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয় ২,৩৫,৬৮,৪৮৬.০০ টাকা। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দৈনিক সমকাল এবং The Independent পত্রিকায় ১১-০৫-২০১৬ তারিখে ও CPTU ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। দরপত্রে ৩টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্র. নং	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্ধৃত মূল্য	সংশোধিত মূল্য
1	M/S. Gathuni		

2	M/S. WTI-MBC JV	Tk. 1,81,03,472.00	Tk. 2,45,90,542.00
3	M/S. Monalisa	Tk. 2,59,49,851.00	

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, M/S. Gathuni কে work experince certificate, Average Annual Construction Turn over জমা না দেয়ায় এবং PW3-1 Form পূরণ না করায় নন-রেসপন্সিভ বিবেচনা করা হয়েছে। M/S. Monalisa কে Cash Flow / Liquid Asset দাখিল না করায় এবং অধিকাংশ দর কথায় না লেখায় নন রেসপনসিভ বিবেচনা করা হয়েছে।

M/S WTI-MBC JV কে রেসপন্সিভ বিবেচনা করা হয়েছে। উক্ত সংস্থার উদ্ধৃত মূল্য ছিল ১,৮১,০৩,৪৭২.০০ কিন্তু মূল্যায়নের সময় সংশোধিত মূল্য দাড়িয়েছে ২,৪৫,৯০,৫৪২.০০। সংশোধিত মূল্য ২,৪৫,৯০,৫৪২.০০ টাকায় উক্ত সংস্থা কার্যাদেশ পেয়েছে যা প্রাক্কলিত মূল্যের ৪.৩৪% বেশী।

কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার M/S WTI-MBC JV যৌথ উদ্যোগে (Joint Venture) দরপত্র দাখিল করেছে। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৫৪ মোতাবেক যৌথ উদ্যোগের শর্ত পূরণ করেছে কিনা এবং উপরে উল্লেখিত Experience Certificate, Average Annual Construction Turn over, Cash Flow/ Liquid Asset, PW 3-1 Form ইত্যাদি যাচাইয়ের জন্য Bidder দের দরপত্রগুলি চাওয়া হয়। ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৪ এর অধীনে কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত কার্যালয়ে দরপত্রগুলি পাওয়া যায়নি ফলে দরপত্র মূল্যায়নে পিপিআর-২০০৮ এর ব্যত্যয় হয়েছে কিনা সে বিষয়ে মতামত দেয়া সম্ভব হলো না। পিপিআর-২০০৮ তফসিল-২ বিধি ৪৩(১) এ উল্লেখ আছে যে, ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র কমপক্ষে ৫ বছর সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগ দরপত্র গুলো সংরক্ষণ না করায় উক্ত বিধির ব্যত্যয় হয়েছে।

২) কক্সবাজার জেলা

কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১,৪৩, ৭৬,৯৩০.৬৪ টাকা। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দৈনিক সমকাল এবং New Age পত্রিকায় ১৪-০১-২০১২ তারিখে প্রকাশিত হয়। দরপত্রে ৩টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্র.নং	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্ধৃত মূল্য	সংশোধিত মূল্য
1	M/S. Janata Enterprise	Tk. 1,29,00,000.00	Tk. 1,29,58,031.50
2	M/S. Prokolpo Bastabayan Ltd.	Tk. 1,15,75,000.00	Tk. 1,31,32,389.36
3	M/S. The Delta Engineers	Tk. 1,35,56,645.37	Tk. 1,47,19,769.03

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, M/S. Prokolpo Bastabayan Ltd. আর্থিকভাবে সর্বনিম্ম মূল্য ১,১৫,৭৫,০০০/- উদ্ধৃত করে কিন্তু মূল্যায়নের সময় সংশোধিত মূল্য দাঁড়ায় ১,৩১,৩২,৩৮৯.৩৬। ফলে উক্ত ফার্ম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এবং M/S. Janata Enterprise সর্বনিম্ম দরদাতা হিসেবে কার্যাদেশ পায়।

পরামর্শক সংস্থা দরপত্রের কাগজপত্র না পাওয়ায় পিপিআর-২০০৮ এর ব্যত্যয় হয়েছে কিনা সে বিষয়ে মতামত দেয়া সম্ভব হলো না।

৩) গাজীপুর জেলা

কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয় ২,৩৭,৮৭,৭৭৫.০০ টাকা। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দৈনিক আজকালের খবর এবং The News Today পত্রিকায় ১০-০৮-২০১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। দরপত্রে ২টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্র.নং	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্ধৃত মূল্য	সংশোধিত মূল্য
1	MDJ Associates	Tk. 2,37,78,513.34	Tk. 2,37,77,750.59
2	Liberty International	Tk. 2,09,913,87.06	--

এবিসি ইলেকট্রিক লাইসেন্স প্রদান না করায় Liberty International এর দরপত্র নন-রেসপন্সিভ বিবেচনা করা হয়। ফলে MDJ Association কে প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা বেশী মূল্যে কার্যাদেশ দেয়া হয়।

৪) চট্টগ্রাম জেলা

কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১,৯৫,৭১,৮২৬.৯২ টাকা। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দৈনিক খবর পত্রিকায় ২৮-০৬-২০১৪ এবং The New Nation পত্রিকায় ২৬-০৬-২০১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়। দরপত্রে ৭টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্র.নং	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্ধৃত মূল্য	সংশোধিত মূল্য
1	Continental Construction Co.	Tk. 1,75,78,752.00	Tk. 1,76,01,271.10
2	Delta Engineers & Consortium Ltd.	Tk. 1,60,17,938.00	Tk. 1,68,07,476.80
3	M/S. Quashem Construction	Tk. 1,54,70,108.49	Tk. 1,65,69,079.69
4	M/S. Enam Hossain	Tk. 1,86,14,435.65	--
5	M/S. Saleh Corporation	Tk. 1,71,51,103.21	Tk. 1,77,05,175.32
6	M/S. Maa Construction	Tk. 1,73,75,000.00	Tk. 1,82,35,768.06
7	Rafiq Construction Co. (Pvt.) Ltd.	Tk. 1,64,34,047.00	--

Rafiq Construction Co. (Pvt.) Ltd. দরপত্র জামানত হিসেবে Bank Guarantee (BG) জমা দিয়েছে। Bank Guarantee (BG) শর্তে না থাকায় নন-রেসপন্সিভ এবং M/S. Enam Hossain টার্ন ওভার পূরণ না করায় নন-রেসপন্সিভ হয়। M/S. Quashem Construction কে সংশোধিত মূল্যে ১,৬৫,৬৯,০৭৯.৬৮ টাকায় কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। দরপত্রের কাগজপত্র না পাওয়ায় যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

৫) বরিশাল জেলা

কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১,৯৯,৯৪,৮৩৮.০০ টাকা। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দৈনিক সমকাল পত্রিকায় ১১/০৮/২০১২ এবং The New Nation পত্রিকায় ১০-০৮-২০১২ তারিখে প্রকাশিত হয়। দরপত্রে ৪টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে তন্মধ্যে ১টি নন-রেসপন্সিভ বিবেচনা করা হয়। বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্র.নং	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্ধৃত মূল্য	সংশোধিত মূল্য
1	Alamgir Khan	Tk. 1,69,68,704.70	Tk. 1,85,23,286.46
2	Khan & Tipu (JV)	Tk. 1,86,26,636.00	Tk. 1,84,75,436.24
3	Project Builders Ltd.	Tk. 2,09,34,999.67	Tk. 2,06,17,007.96

Alamgir Khan এর উদ্ধৃত মূল্য ১,৬৯,৬৮,৭০৪.৭০ সর্বনিম্ন কিন্তু মূল্যায়নে সংশোধিত মূল্য দাঁড়ায় ১,৮৫,২৩,২৮৬.৪৬। Khan & Tipu (JV) এর উদ্ধৃত মূল্য ১,৮৬,২৬,৬৩৬.০০ কিন্তু মূল্যায়নে সংশোধিত মূল্য দাঁড়ায় ১,৮৪,৭৫,৪৩৬.২৪। Project Builders Ltd. এর উদ্ধৃত মূল্য ২,০৯,৩৪,৯৯৯.৬৭ কিন্তু মূল্যায়নে সংশোধিত মূল্য দাঁড়ায় ২,০৬,১৭,০০৭.৯৬। ঠিকাদারদের দাখিলকৃত দরপত্রগুলি না পাওয়ায় উদ্ধৃত মূল্য এবং সংশোধিত মূল্য যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

৬) মানিকগঞ্জ জেলা

কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১,৩০,৭৮,৫৫১.০০ টাকা। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দৈনিক যুগান্তর এবং New Nation পত্রিকায় ১৬-১০-২০১১ তারিখে প্রকাশিত হয়। দরপত্রে ২টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্র.নং	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্ধৃত মূল্য	সংশোধিত মূল্য
1	Shetu Construction	Tk 1,56,80,258.00	---
2	Lucky Construction	Tk 1,52,76,530.00	Tk 1,52,50,562.00

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, Shetu Construction দরপত্র জামানত এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা না দেয়ায় নন-রেসপন্সিভ হয়েছে। একমাত্র বিডার Lucky Construction কে ১,৫২,৫০,৫৬২.০০ টাকায় কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে যা প্রাক্কলিত মূল্যের ১৬.৬০% বেশী। দরপত্রের কাগজপত্র না পাওয়ায় পিপিআর-২০০৮ এর ব্যত্যয় হয়েছে কিনা সে বিষয়ে মতামত দেয়া সম্ভব হলো না।

৭) কুমিল্লা জেলা

কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয় ২,৩৫,৮৭,২৫৫.৬৫ টাকা। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দৈনিক ভোরের কাগজ এবং Financial Express পত্রিকায় ২৮-০৮-২০১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। দরপত্রে ৩টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্র.নং	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্ধৃত মূল্য	সংশোধিত মূল্য
1	M/S. Bhuiyan Builders	Tk. 2,51,75,115.79	Tk. 2,51,71,116.29
2	M/S. Buisness Assoc. International	Tk. 2,41,66,573.02	Tk. 2,41,38,108.71
3	M/S. Haque Enterprise	Tk. 2,44,44,388.66	Tk. 2,46,75,583.56

৩টি দরপত্রই রেসপন্সিভ বিবেচিত হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা M/S. Buisness Assoc. International কে ২,৪১,৩৮,১০৮.৭১ টাকায় কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। ঠিকাদারদের দাখিলকৃত দরপত্রগুলি না পাওয়ায় উদ্ধৃত মূল্য এবং সংশোধিত মূল্য যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

৮) বান্দরবান জেলা

কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয় ২,১১,৪১,৪৭৫.৩৫ টাকা। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দৈনিক মানবকণ্ঠ এবং The Observer পত্রিকায় ৩১-০১-২০১৭ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। দরপত্রে ৩টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্র.নং	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্ধৃত মূল্য	সংশোধিত মূল্য
1	M/S. Royal Association	Tk. 1,90,27,327.82	Tk. 1,90,90,770.89
2	M/S. Mohammad Yunus & Brothers	Tk. 1,90,79,907.35	Tk. 1,92,86,113.88
3	M/S. Delta Engineers & Construction	Tk. 1,90,23,733.80	Tk. 1,96,63,733.80

৩টি দরপত্রই রেসপন্সিভ বিবেচিত হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা M/S. Royal Association কে ১,৯০,৯০,৭৭০.৮৯ টাকায় কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। ঠিকাদারদের দাখিলকৃত দরপত্রগুলি না পাওয়ায় উদ্ধৃত মূল্য এবং সংশোধিত মূল্য যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

প্রকল্প কার্যালয় থেকে যেসব ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার আংশিক কাগজপত্র পাওয়া গেছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১) Mural of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Fire Fighting & Stainless Name Plate and other নির্মাণ/স্থাপন। দরপত্রে ৬টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে, যার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারী দরদাতা	উদ্ধৃত মূল্য
01	M/S. Taj Construction	Tk. 8,49,52,000/-
02	M/S. Tanzir Construction	Tk. 8,89,52,000/-
03	Asian Traffic Technology	Tk. 6,04,40,800/-
04	M.M. Builders & Engineers Ltd	Tk. 8,06,40,000/-
05	Ahsan Enterprise	Tk. 9,21,20,000/-
06	M/S Jaman Brother	Tk. 9,12,52,000/-

সুনির্দিষ্ট Specification সরবরাহ না করায় M/S. Taj Construction, M/S. Tanzir Construction এবং Ahsan Enterprise কে নন-রেসপন্সিভ বিবেচনা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩টির মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা Asian Traffic Technology কে ৬,০৪,৪০,৮০০/- টাকায় কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে।

ঠিকাদারদের দাখিলকৃত দরপত্রগুলি না পাওয়ায় এ বিষয়ে মতামত প্রদান করা সম্ভব হলো না।

২) Machinery and Equipment (Lot-1) এবং Furniture & Fixture (Lot-2) ক্রয়ের দরপত্র।

দরপত্রে ৫টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

নং	অংশগ্রহণকারী দরদাতা	উদ্ধৃত দর		
		Lot-1	Lot-2	Total
1	M/S Md. Matiar Rahaman	Tk. 5,97,76,000/-	Tk. 6,41,28,000/-	Tk. 12,39,04,000/-
2	Green Ever Technology Co. Ltd.	Tk. 5,05,85,600/-	Tk. 5,45,40,800/-	Tk. 10,51,26,400/-
3	Shamim Enterprise Pvt. Ltd	Tk. 6,27,20,000/-	Tk. 6,85,05,600/-	Tk. 13,12,25,600/-
4	M/S Sagor Builders	Tk. 5,54,68,800/-	Tk. 5,72,80,000/-	Tk. 11,27,48,800/-
5	MM Builders & Engineers Ltd	Tk. 4,78,59,200/-	Tk. 4,01,66,400/-	Tk. 8,80,25,600/-

সর্বনিম্ন দরদাতা MM Builders & Engineers Ltd কে ৮,৮০,২৫,৬০০/- টাকায় কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। ঠিকাদারদের দাখিলকৃত দরপত্রগুলি না পাওয়ায় এ বিষয়ে মতামত প্রদান করা সম্ভব হলো না।

নির্মাণ সামগ্রীর নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া গেছে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, গাজীপুর এবং বরিশাল জেলা থেকে। কাজগুলির BOQ (Bill of Quantity) / Specification না পাওয়ায় প্রাপ্ত ফলাফলের উপর মন্তব্য করা সম্ভব হলো না।

৩.৭.১ গাড়ি ক্রয়

সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের ব্যবহারের জন্য একটি মিতসুবিশি পাজেরো গাড়ি প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি: ক্রয় করা হয়। এর লং হইল বেস, ৫-দরজা, ৯-আসন (বিআরটিএ কর্তৃক ৮-আসন অনুমোদিত) বিশিষ্ট পেট্রোল জীপ, ৪X৪, ৪-সিলিন্ডার, মডেল কোড নং—ভি ৩১ ভিএইচএনডিআরবি, অশ্বশক্তি ৮৬কিঃওঃ/১১৭পিএস/৫৫০০-আরপিএম, ডান হস্তে চালিত, হার্ড টপ (মেটাল), ২৩৫০সিসি, হইলবেস-২৭২৫মি.মি, ডিজিটাল ঘড়ি, সিগারেট লাইটার, রেডিও-সিডি প্লেয়ার (১ডিস্ক), পাওয়ার স্টিয়ারিং, অতিরিক্ত চাকা-১টি (কভার সহ), আনুষঙ্গিক টুলস সহ, জাপান অরিজিন (বাংলাদেশে সংযোজিত-২০১১ইং)। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (DPM) ক্রয়ের জন্য গত ১৪ই জুন ২০১১ তারিখে মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। ০৯/০৫/২০১১ইং তারিখে গাড়ি ক্রয়ের জন্য প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং ০১/০৬/২০১১ইং তারিখে গাড়ি ক্রয় করা হয়।

যেহেতু গাড়িটি সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি সরবরাহকারী সংস্থা (প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ) থেকে ক্রয় করা হয়েছে এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে DPM পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হয়েছে। গাড়ি ক্রয়ের জন্য ডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৫১.০০ লক্ষ টাকা কিন্তু গাড়ী ক্রয়ের জন্য ব্যয় হয়েছে ৫০.০০ লক্ষ টাকা।

৩.৭.২ আউটসোর্সিং

প্রকল্প কার্যালয়ে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ৩ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়। এদের পদবিসমূহ এমএলএসএস, কম্পিউটার অপারেটর ও ড্রাইভার। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিলাদি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে “ফেম এন্ড ফেইথ” নামের একটি সংস্থার সাথে এক বছরের জন্য চুক্তি করা হয়। প্রকল্প কার্যালয়ের ক্রয় সংক্রান্ত শধু মাত্র চুক্তি পত্র ছাড়া অন্য কোন নথি পত্র পাওয়া যায় নাই। ক্রয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিল যেমন টেন্ডার ডাটা সিট, কতটি টেন্ডার জমা পড়েছে, রেসপন্সিভ টেন্ডারের সংখ্যা, টেন্ডার মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ব্যাংক গ্যারান্টি ও ব্যাংক সলভেন্সির সনদপত্র যাচাই করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে কোন দলিলাদি পাওয়া যায় নি। অতএব, আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় বিধি ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা বলা সম্ভব নয়।

৩.৮ লগফ্রেমের ভিত্তিতে উদ্দেশ্য অর্জন অবস্থা, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

প্রকল্পের লগফ্রেমের আলোকে অর্জন অবস্থা, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো।

বর্ণনা	অগ্রগতি	পর্যবেক্ষণ	পর্যালোচনা
উদ্দেশ্যসমূহ			
১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিকে উজ্জ্বল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জনগণের মাঝে তুলে ধরা।	-	ভবন নির্মাণের পর অস্থায়ী কমিটির হাতে ভবন হস্তান্তর করা হয়েছে। এই কমিটির প্রধান জেলা প্রশাসক।	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নির্বাচিত জেলা কমান্ড কাউন্সিল না থাকায় ভবনের উপার্জিত আয় দিয়ে এ জাতীয় কাজ শুরু করা হয়নি।
সকল জেলা সদরে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা।	১০০%	ঢাকা ব্যতিত সকল জেলার ভবন হস্তান্তর করা হয়েছে এবং আগামী ২০/৬/২০২১ তারিখে হস্তান্তরের পরিকল্পনা আছে।	সকল জেলায় সকল জেলা সদরে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের উপার্জন থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা	৫-১০%	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুর পর দাফন/সংকারে ব্যয়ভার বহন করা হয়েছে (বরিশাল, গাজীপুর)	কয়েকটি জেলায় এই ধরনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
জাতীয় দিবসে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা।	-	জাতীয় দিবসে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ শুরু হয়নি।	কোন জেলায় এই ধরনের কার্যক্রম শুরু হয় নাই।
অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা	-	অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের কাজ শুরু হয়নি।	কোন জেলায় এই ধরনের কার্যক্রম শুরু হয় নাই।
তথ্য-প্রযুক্তি, আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা	-	<ul style="list-style-type: none"> তথ্য-প্রযুক্তি, আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়নি। প্রশিক্ষণের পর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। 	কোন জেলায় এই ধরনের কার্যক্রম শুরু হয় নাই।
আউটপুট			
সকল জেলায় (৬৪ টি জেলায়) মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।	১০০%	ঢাকা ব্যতিত সকল জেলার ভবন হস্তান্তর করা হয়েছে এবং আগামী ২০/৬/২০২১ তারিখে হস্তান্তরের পরিকল্পনা আছে।	
ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।	১০০%	দেৱীতে হলেও সকল জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে।	সকল জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

৩.৯ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা


মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকল্পে বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এবং প্রকল্প পরিচালনা কমিটির (পিএসসি) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটির প্রতিদিনের পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ আছেন। প্রকল্প পরিচালক তার প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়বদ্ধ আছেন এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর এর ফিল্ড

অফিসের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখছেন। গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রকল্পের নির্মাণ অংশটি বাস্তবায়ন করেছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী তার বিদ্যমান জনশক্তি নিয়ে প্রতিদিনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত করেছে। প্রকল্পটি বিদ্যমান সরকারী বিধি ও পদ্ধতি অনুসরণ করে বাস্তবায়িত হয়েছে। কঠোর আর্থিক শৃঙ্খলা অবশ্যই সকল পক্ষের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। সর্বোপরি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করেছেন। গণপূর্ত অধিদপ্তর বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডএসপি) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর পিইসিইউ সার্কেল নির্মাণকাজের তদারকি করছেন এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে কার্যকর যোগাযোগ রেখেছেন।

প্রকল্প পরিচালক (পিডি) এর দায়িত্ব

- প্রকল্পটির দৈনন্দিন পরিচালনা করেছেন।
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের পরিচালনা, পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শকরণ।
- প্রকল্পের ডিপিপিতে বর্ণিত ইনপুটসমূহ সরবরাহ এবং
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এবং প্রকল্প পরিচালনা কমিটি (পিএসসি) কে নিয়মিত বিশেষভাবে উল্লেখ পূর্বক প্রতিবেদনের মাধ্যমে অগ্রগতির প্রতিবেদন করা হয়েছে।

পিআইইউ এর অর্গানগ্রাম

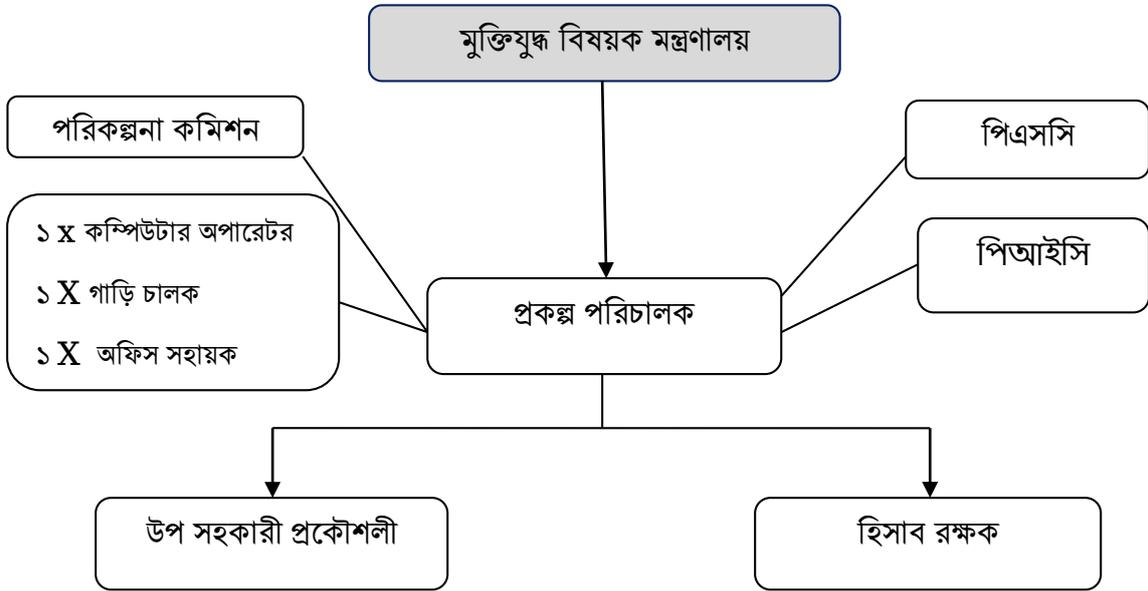

৩.৯.১ প্রকল্প পরিচালকদের কার্যকাল

সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের দায়িত্বকাল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রকল্প পরিচালকগণ সর্বনিম্ন ২০ দিন এবং সর্বোচ্চ ২ বছর ৪ মাস দায়িত্ব পালন করেছেন। তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১৫ জন প্রকল্প পরিচালকের মধ্যে ৯ জন প্রকল্প পরিচালক ১ বছরের কম সময় প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এদের মধ্যে প্রথম প্রকল্প পরিচালক ২ বছর ৪ মাস দায়িত্ব পালন করেন। ইনিই একমাত্র পরিচালক যে সবচেয়ে বেশী সময় প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। সবচেয়ে কম সময় দায়িত্ব পালন করেন ১ জন, ক্রমিক নং-৯, এর দায়িত্বকাল ছিল মাত্র ২০ দিন। লক্ষ্যনীয় যে, প্রায় ১০ বছরের একটি প্রকল্পে ১৫ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। এদের মধ্যে ৭ জন অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রকল্প পরিচালকদের দায়িত্ব পালনের কার্যকাল

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	যোগদানের তারিখ	প্রস্থানের তারিখ
১.	সৈয়দ মজিবুল হক (উপ প্রধান)	প্রকল্প পরিচালক	০২/০৫/২০১১	০৬/০৯/২০১৩
২.	মোঃ মিজান-উল-আলম (উপ সচিব)	অতিরিক্ত দায়িত্ব	২৬/০৯/২০১৩	০৫/১২/২০১৩
৩.	সালেহ আহমদ মোজাফফর (উপ সচিব)	প্রকল্প পরিচালক	০৫/১২/২০১৩	০৪/০৬/২০১৪
৪.	মাহমুদ হাসান (উপ সচিব)	প্রকল্প পরিচালক	০৪/০৬/২০১৪	০৬/০৪/২০১৫
৫.	মাহমুদ হাসান (যুগ্ম সচিব)	প্রকল্প পরিচালক	০৬/০৪/২০১৫	০৮/০৬/২০১৬
৬.	তুলসী রঞ্জন সাহা (যুগ্ম সচিব)	প্রকল্প পরিচালক	০৮/০৬/২০১৬	২৬/০৯/২০১৬
৭.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন (উপ সচিব)	অতিরিক্ত দায়িত্ব	০২/১০/২০১৬	২৯/১১/২০১৬
৮.	ড. মোঃ মইনুল হক আনসারী (উপ সচিব)	প্রকল্প পরিচালক	২৫/০৯/২০১৬	২৯/০৯/২০১৭
৯.	ড. মোঃ মইনুল হক আনসারী (উপ সচিব)	প্রকল্প পরিচালক	৩০/১১/২০১৭	২০/১২/২০১৭
১০.	ড. মোঃ মইনুল হক আনসারী (উপ সচিব)	প্রকল্প পরিচালক	২১/১২/২০১৭	৩১/০৩/২০১৯
১১.	মোঃ ফখরুল কবির (উপ সচিব)	অতিরিক্ত দায়িত্ব	৩১/০৩/২০১৯	২২/১০/২০১৯
১২.	মোঃ মোজাম্মেল হক (যুগ্ম সচিব)	অতিরিক্ত দায়িত্ব	২২/১০/২০১৯	১৫/১২/ ২০১৯
১৩.	আবুল হোসেন (উপ সচিব)	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১৫/১২/ ২০১৯	২১/০১/২০২০
১৪.	মোঃ আকবর আলী (সি: সহ: সচিব)	অতিরিক্ত দায়িত্ব	২১/০১/২০২০	১৭/০৮/২০২০
১৫.	ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ (উপ-সচিব)	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১৭/০৮/২০২০	চলমান

৩.১০ প্রকল্প সাইট পরিদর্শন প্রতিবেদন

কেস স্টাডি : ঝালকাঠি জেলা, বরিশাল

বিগত ২ মে ২০২১ সালে ঝালকাঠি জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এর তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। ভবনের জমির অবস্থান, মৌজা-কানুদাসকাঠি, জে এল নং ৩৯ এবং এল এ কেস নং ১/২০১৫-১৬। ঝালকাঠি জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন টি ২২ অক্টোবর ২০১৫ সালে উদ্বোধন করেন আলহাজ্ব আমির হোসেন আমু, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ভবনটি হস্তান্তর করার পর বিগত প্রায় ৫ বছর ৬ মাস অতিবাহিত হলেও ভাড়া দেয়া সম্ভব হয়নি। সরেজমিনে পরিদর্শন করে জানা যায় যে, মো: সামচুল ইসলাম, পিতা-মো: আবুল কালাম, ৬৭২ কৃষ্ণকাঠি, কবিরাজ বাড়ী রোড, ঝালকাঠি। তিনি ঝালকাঠি জর্জকোর্টে একটি মামলা করেন, মামলা নং ৫১৭। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ জারি করেন। ফলে ভবনটি ভাড়া দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এলাকায় বিভিন্ন লোকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়, বর্তমানে ভবনটি যেখানে অবস্থিত আছে সেই জায়গার মালিক গণপূর্ত অধিদপ্তর। সরকারি বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করে জায়গাটি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এর জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন করার পূর্বে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল ঝালকাঠি জেলা ইউনিট পুরাতন ভবনে ৫ টি দোকান ছিল এবং ৫ জন ভাড়াটিয়া ছিলেন। এদের মধ্যে মো: সামচুল আলম একজন ভাড়াটিয়া। নতুন ভবন নির্মাণের সময় পুরাতন ভবন ভাঙ্গার প্রয়োজন দেখা দেয়ায় ভাড়াটিয়াদের অন্যত্র চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু ভাড়াটিয়াদের জামানতের টাকা ফেরৎ দেয়ার মত টাকা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের তহবিলে ছিল না। বিগত ২০১০ সালে নব নির্বাচিত কার্যকরী সংসদ ভাড়াটিয়াদের জামানতের টাকা ফেরৎ দেয়ার প্রয়োজনে নতুন কমপ্লেক্স ভবনের ২য় তলা ভাড়া দেয়ার ঘোষণা করেন। মো: সামচুল আলমকে ২৭/৬/২০১২ সালের ৮ নং সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মো: সামচুল আলমের সাথে ২য় তলা ভাড়া দেয়ার শর্তে মোট ২০০০০০/- দুই লক্ষ টাকা জামানত হিসাবে গ্রহণ করে বিগত ০৮/০৭/২০২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। প্রাপ্ত অগ্রিম টাকা হতে বাকী ৪ জন ভাড়াটিয়াকে তাদের অগ্রিম জামানতের টাকা পরিশোধ করে দেয়া হয়। কিন্তু ভবনটি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর নিকট হস্তান্তরিত হওয়ার পর মি: সামচুল আলম তার দোকান বুঝিয়ে দেবার জন্য মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে অনুরোধ করেন। এই সময় মি: আলমকে দোকান না বুঝিয়ে দিয়ে দোকান ভাড়া দেয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এই অবস্থায় মি: আলম তার দোকান না পেয়ে তৎকালীন জেলা প্রশাসক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, গণপূর্ত বিভাগের নিকট সমাধানের জন্য অনুরোধ করেন। কোন ধরনের সমাধান না হওয়ায় মি: আলম জর্জকোর্টে মামলাটি করেন এবং মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য কোর্ট ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ জারি করেন। সেই আদেশ এখনো বলবৎ আছে বিধায় অদ্যাবধি দোকান ভাড়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

ক. প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার

বিগত ৫ এপ্রিল ২০২১ কক্সবাজার জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন টি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার, আর্থ-সামাজিক পরামর্শক এবং গণপূর্ত বিভাগের উপ সহকারী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। জনতা এন্টারপ্রাইজ নামে একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ভবনটি নির্মাণ কাজের জন্য চুক্তি করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ভবনের নির্মাণ কাজ শুরুর তারিখ ৪ আগস্ট ২০১২ এবং সমাপ্তির তারিখ ১৫ আগস্ট ২০১৫। বিগত ৫ এপ্রিল ২০২১ ইং তারিখে সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্টদের প্রকৌশলীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে প্রকল্পটি ইতোমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে।



পর্যবেক্ষণসমূহ

১. প্রকল্পের অগ্রগতির পরিমাণ ১০০%।
২. প্রয়োজনীয় পরিমাণ materials এর Test report পাওয়া যায়নি।
৩. ভবনটির নিচতলা থেকে তৃতীয় তলা পর্যন্ত ডিপিপির সকল ডিজাইন পরিবর্তন করা হয়েছে।
৪. ভবনের বর্তমান অবস্থা যাচাই করার জন্য ড্রইং প্রকল্প সাইটে পাওয়া যায়নি।
৫. সিড়ির স্কাই লাইটের পার্শ্ববর্তী ওয়াল এ Inclined অবস্থায় প্লাস্টারের মধ্যে ফ্রাক দেখা গিয়েছে।
৬. কক্সবাজার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের সাথে একটি স্টিলের সিড়ির মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী আরেকটি ভবনের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। যা ডিজাইনের বাইরে।
৭. ছাদের চিলেকোঠা কংক্রিট ছাদের পরিবর্তে টিন দিয়ে ছাউনি তৈরী করা হয়েছে বিধায় পানির ট্যাংক নিচে সংযোজন করা হয়েছে।
৮. ভবনের নকশা অনুসারে নিচ তলায় কোন টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়নি।
৯. ভবনের র‍্যাম্প করা হয়েছে তবে ব্যবহার হয় না।
১০. Stock Register পাওয়া যায়নি।
১১. দরপত্রের PCC (Particular Conditions of Contract) অনুচ্ছেদ ৪২ এ উল্লেখ আছে যে, চুক্তিনামা স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক Program of Works দাখিল করতে হবে যা ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে। এ বিষয়ক কোন নথি পাওয়া যায়নি।

খ. প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম

বিগত ৪ এপ্রিল ২০২১ চট্টগ্রাম জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন টি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার, আর্থ-সামাজিক পরামর্শক ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটির দরপত্র আহবান করা হয় ৫/১/২০১৪ সালে। কাশেম কনস্ট্রাকশন নামে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে বিগত ১/৪/২০১৪ সালে ভবনটি নির্মাণ কাজের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে ১৩/৮/২০১৭ সালে। সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে প্রকল্পটি হস্তান্তর করা হয়েছে। ভবনটি নির্মাণ কাজে ডায়মন্ড ব্র্যান্ডের সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়।



পর্যবেক্ষণসমূহ

১. প্রকল্পের অগ্রগতি হয়েছে ১০০%।
২. রড, সিমেন্ট, বালু ও স্টোন চিপস এর একবার মাত্র Test report পাওয়া গেছে।
৩. প্রয়োজনীয় পরিমাণ materials এর Test report পাওয়া যায়নি।
৪. তৃতীয় তলায় ডিপির ডিজাইন পরিবর্তন করে একটি রুম (মিউজিয়াম) করা হয়েছে।
৫. ভবনের ডিজাইন অনুসারে নিচ তলায় কোন টয়লেট ছিল না।
৬. টপ ছাদের উপরে পেটন স্টোন ঢালাই না করে নরমাল স্লাব কাস্টিং করা হয়েছে।
৭. মেইন ডোর এর চৌকাঠ ও পাল্লার কাঠ (সেগুন) এর পরিবর্তে ফরমিকার এবং পার্টেক্স বোর্ড সমন্বয়ে তৈরী করা হয়েছে।
৮. Stock Register পাওয়া যায়নি।
৯. ভবনের র‍্যাম্প করা হয়েছে তবে ব্যবহার হয় না।
১০. দরপত্রের PCC (Particular Conditions of Contract) অনুচ্ছেদ ৪২ এ উল্লেখ আছে যে, চুক্তিনামা স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক Program of Works দাখিল করতে হবে যা ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে। এ বিষয়ক কোন নথি পাওয়া যায়নি।

গ. প্রকল্প এলাকা: বান্দরবান

বিগত ৪ এপ্রিল ২০২১ বান্দরবান জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন টি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার, আর্থ-সামাজিক পরামর্শক এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটির দরপত্র আহবান করা হয় ২৯ জানুয়ারী ২০১৭ সালে। রয়েল এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিগত ৮ মে ২০১৭ সালে ভবনটি নির্মাণ কাজের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। কাজ সমাপ্ত হয়েছে ৩০ জুন ২০১৯ সালে। সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে প্রকল্পটি ইতোমধ্যে হস্তান্তর করার হয়েছে।



পর্যবেক্ষণসমূহ

১. প্রকল্পের অগ্রগতি হয়েছে ১০০%।
২. প্রয়োজনীয় পরিমাণ materials এর Test report পাওয়া যায়নি।
৩. নিচতলা থেকে তৃতীয় তলা পর্যন্ত ভবনের সকল ডিজাইন পরিবর্তন করা হয়েছে।
৪. টপ স্লাবে পেটেন স্টোন এর ঢালাই নেই ও রেইন ওয়াটার লাইন নেই।
৫. লিফট এর স্পেস আছে কিন্তু ওয়াল তুলে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।
৬. ভবনের বাহিরে এবং ভেতরের দুইটি দেয়ালে প্লাস্টারে ক্রাক দেখা দিয়েছে।
৭. প্লাস্টারের রংয়ের কাজ মানসম্মত না হওয়ার কারণে দেয়াল থেকে রং খসে পড়ছে।
৮. ভবনের মেইন রোড এর পার্শ্বে লেন্ডিং এর উপরে ফিঙ্কড গ্লাস লাগানোর কারণে সূর্যের আলো প্রবেশ করে কিন্তু ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা না থাকায় সিঁড়ি ঘরটি গরম থাকে (লুবার উইন্ডো থাকলে ভেন্টিলেশন যথাযথ হতো)।
৯. দরজার পাল্লায় লম্বালম্বি ফাটল দেখা দিয়েছে। অন্যান্য দরজার টোকাঠ বাঁকা হয়ে গিয়েছে।
১০. ভবনে বৈদ্যুতিক লাইন ও পানির ব্যবস্থা নাই।
১১. রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেনেটারী/প্লাস্টিং ফিটিংস ও ফ্লোরের টাইলস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
১২. রিং ওয়েল ৬০ ফিট পর পানি পাওয়া গিয়েছে।
১৩. Stock Register পাওয়া যায়নি।
১৪. দরপত্রের PCC (Particular Conditions of Contract) অনুচ্ছেদ ৪২ এ উল্লেখ আছে যে, চুক্তিনামা স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক Program of Works দাখিল করতে হবে যা ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে। এ বিষয়ক কোন নথি পাওয়া যায়নি।

ঘ. প্রকল্প এলাকা: রাজশাহী

গত ১১ এপ্রিল ২০২১ রাজশাহী জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন টি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার, আর্থ-সামাজিক পরামর্শক এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি হয়েছিল ১০/৭/২০১২ সালে। ভবনটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত এবং হস্তান্তর করা হয়েছে ২৩/৯/২০১৫ সালে। সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে ভবনটি যাদেরকে ভাড়া দেয়া হয়েছে তার ভবনটির নকশা পরিবর্তন করে অতিরিক্ত অংশ নির্মাণ করা হয়েছে।



ভবনের
আর্কিটেকচারাল
প্লান
পরিবর্তন
করা হয়েছে



ভবনের
আর্কিটেকচারাল
প্লান পরিবর্তন
করা হয়েছে

পর্যবেক্ষণসমূহ

১. প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির ১০০%।
২. ভবনের নিচতলা এবং দ্বিতীয় তলার আর্কিটেকচারাল প্লান পরিবর্তন করা হয়েছে (যার কোন ড্রইং পাওয়া যায়নি)।
৩. কলাম থেকে প্রপার্টি লাইন (বাউন্ডারী ওয়াল) পর্যন্ত প্রথম তলার স্লাব বর্ধিত করা হয়েছে যা ডিজাইন এবং ড্রইংয়ে নেই। কোন অনুমোদন নেই।
৪. ভবনের বাহিরে অতিরিক্ত কলাম ও স্লাব কাস্টিং করেছে যা পিডাব্লিউডি এর নির্বাহী প্রকৌশলী ও জেলা প্রশাসক মহোদয়ের অনুমতিক্রমে, উল্লেখ্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের (গণপূর্ত ও স্থাপত্য বিভাগ) জানা নেই।
৫. ভবনের প্লাস্টারের সারফেসে শ্যাওলা জন্মে ওয়ালে কালো রংয়ের দাগ তৈরী হয়েছে।
৬. ছাদের উপরে বিলবোর্ডের প্যানেল ভাড়া দেয়া আছে যা ভার্টিকেল এস্টেনশান করার সময় বাঁধা সৃষ্টি করবে। বিলবোর্ডের নিচের কলামের সার্পোর্টের জন্য ঢালাইকৃত কলামের কারণে রেইন ওয়াটার লাইনের পানি নিষ্কাশনের স্লোপে বাঁধা সৃষ্টি হচ্ছে।
৭. টয়লেটের হাই কমোডের এ্যাজেল স্টপ কক এর সহিত সংযুক্ত কানেকশন পাইপ খুলে বাইরে ফেলে রাখা হয়েছে।
৮. ছাদের উপরে পরিষ্কার না করার কারণে রেলিংয়ে এবং পাইপে আগাছা/গাছ জন্মেছে যার কারণে পাইপের গোড়া ফেটে গেছে।
৯. রেইন ওয়াটার লাইনের পানি নিষ্কাশন যথাযথভাবে না থাকার কারণে বৃষ্টির পানি উপর থেকে নিচে বিল্ডিংয়ে ছড়িয়ে পড়ে ফলে ভবনের বাহিরের ওয়াল এবং প্লাস্টার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
১০. ভবনের ছাদের উপরে একটি সোলার প্যানেল রয়েছে যা রক্ষণাবেক্ষণ না করার কারণে নষ্ট অবস্থায় আছে।
১১. ভবনের নিচতলা পুনর্নির্মাণ কাজ চলমান থাকার কারণে সকল দোকানের সার্টার ও চ্যানেল তৃতীয় তলার ছাদের উপর রাখা হয়েছে।

মাঠ পরিদর্শনের প্রতিবেদন সংযুক্তি ১

৩.১০.১ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে দলীয় আলোচনা (FGD)

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে নির্মিত মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন বিষয়ে বিভিন্ন জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে দলীয় আলোচনা করা হয়। আলোচনার ফলাফল সংক্ষেপে নিম্নে দেয়া হলো:

জাতীয় দিবসে কার্যক্রম

দলীয় আলোচনায় (এফজিডি) অংশগ্রহণকারী সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ একমত প্রকাশ করেন যে, জাতীয় দিবসে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণ, তরুন প্রজন্ম এবং শিক্ষার্থীরা মহান মুক্তিযুদ্ধ ও এর ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতে ২১ শে ফেব্রুয়ারী, ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৫ই আগস্ট ইত্যাদি দিবসে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই সকল দিবসে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন তা হলো: মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী তৈরী ও বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে সম্প্রচার করা। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস প্রাথমিক স্তর থেকে ইউনিভার্সিটির পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ ছাড়া বিভিন্ন দিবসগুলিতে লিফলেট বিতরণ, নাটক, যাত্রা পালা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বীর মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জনগণের মাঝে তুলে ধরা। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতে যে সকল স্থানে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল সেই সকল স্থানে স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে স্মৃতিচারণ করা। অপরদিকে বধ্যভূমিগুলো সংরক্ষণ করা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার পক্ষে সকলে মত প্রকাশ করেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণের সুযোগ করে দেয়া। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতে “আমরা যে উদ্দেশ্য, আদর্শ ও চেতনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম এবং যে ইতিহাস রচিত হয়েছিল তা মুছে যাবে”। মুক্তিযুদ্ধ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়ে সাধারণ জনগণ ও তরুন প্রজন্ম জানতে পারবে না। অনেক ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত হবে বলে তারা মনে করেন।

তরুন প্রজন্মের জন্য কার্যক্রম

তরুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উচিত তরুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জাগিয়ে তোলা। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে তা প্রচার করতে হবে। বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের আলোচনায় তরুনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। যার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জেনে এর চেতনা হৃদয়ে ধারণ করে মহান স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য বুঝে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রতিটি বীর মুক্তিযোদ্ধার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বই প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তরুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

অধিকাংশ বীর মুক্তিযোদ্ধাই অস্বচ্ছল ও ভূমিহীন। তাদের পক্ষে বড় পরিবার নিয়ে বসবাস করা কষ্টকর। অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এককালীন ভাতা প্রদান করা যেতে পারে। স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করলে তাদের অনেক উপকার হতো। তাদের মতে:

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ভাতা প্রদান ও তাদের সন্তানদের শিক্ষাভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এক কালীন আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করলে তারা স্বাবলম্বী হতে পারবে। ফলে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণসমূহ

তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধারা দু ধরনের মতামত প্রদান করেছেন। প্রায় অর্ধেক সংখ্যক অংশগ্রহণকারীদের মতে তাদের কম্পিউটার, ইন্টারনেট, কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। অপরদিকে ৪৫% বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতে, তাদের তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই। তাদের মতে বার্ষিক্যজনিত কারণে বীর মুক্তিযোদ্ধারা তথ্য-প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে না। তবে তাদের সন্তানদের জন্য কম্পিউটার, ইন্টারনেট, কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে বলে সকলে একমত প্রকাশ করেন। প্রায় ২০% উপস্থিতি মনে করেন যারা শিক্ষিত ও সক্ষম বীর মুক্তিযোদ্ধা তাদেরকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ

প্রায় ৮৫% বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতে, বয়স বেশী হওয়ায় তাদের পক্ষে ভারি কাজ করা সম্ভব নয়। তাদের মতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দৈহিক অবস্থা ও বয়স বিবেচনা করে যে সকল কাজে যুক্ত হলে আয় করতে পারে সে বিষয় প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গবাদি পশু পালন, মাছ চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁসমুরগী পালন, কৃষিকাজ, সজি চাষ ও নার্সারী ইত্যাদি আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। এছাড়া গরু মোটাতাজাকরণ, মাশরুম চাষ, কম্পোস্ট সার তৈরী, মধুচাষ, মৌসুমী ফলের চাষ, কোয়েল পাখির খামার সহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত

- স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পরিচালনা পর্ষদে একজন করে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে অন্তর্ভুক্ত করা।
- অ-স্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এককালীন ভাতার ব্যবস্থা করা।
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ৫% হারে ঋণের ব্যবস্থা করা।
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের শিক্ষা ভাতা প্রদান ও চাকুরির ব্যবস্থা করা।

৩.১০.২ মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (কেআইআই)

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য মোট ২৮ টি কেআইআই করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৮ জন জেলা প্রশাসক, ১০ জন জেলা পর্যায়ের গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, ১ জন প্রকল্প পরিচালক, ১জন প্রধান প্রকৌশলী-গণপূর্ত বিভাগ, ১জন আইএমইডি এর প্রতিনিধি ও ৭ জন জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। মূল তথ্যদাতাদের সাথে আলোচনার ফলাফল নিচে দেয়া হলো:

সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স সম্পর্কে মন্তব্য

- মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ ও কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে।
- এই ভবনের নিচ তলা ও ২য় তলা ভাড়া দিয়ে যে আয় হবে তা থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হবে।
- এই ভবনের মাধ্যমে অ-স্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আয়ের উৎস সৃষ্টি হবে।
- স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর পর বীর মুক্তিযোদ্ধারা একটি স্থায়ী জায়গা পেল যেখানে তারা অফিস করতে পারবে এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধারা একত্রিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

দুর্বল দিকসমূহ

- ভবনের পরিকল্পনায় ত্রুটি ছিল যেমন – নিচতলায় কোন বাথরুম দেয়া হয় নি।
- নীচ তলায় মার্কেট জন্য যে দোকানে নির্মাণ করা হয়েছে তা ভবনের সামনের প্রাচীরের কারণে দোকান ভাড়া দিতে সমস্যা হচ্ছে।

- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অফিসের জন্য ভবনের ৩য় তলায় নির্ধারণ করা হয়েছে কিন্তু বয়োবৃদ্ধ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উঠানামার জন্য কোন লিফট নাই।
- ভবনের সামনে যানবাহন পার্কিং করার জন্য কোন জায়গা নাই।
- যে সকল ভবন ভাড়া দেয়া যায়নি সেই সকল ভবনের কোন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না।

আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ

- এই প্রকল্পের ফলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- ভবনের নিচ তলা ও ২য় তলার ভাড়া দিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন খাতে আর্থিক সহযোগিতা করা।

যে সকল দিবস উদযাপন করা যায়

১. মহান স্বাধীনতা দিবস, মা দিবস, অন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান বিজয় দিবস ইত্যাদি দিবসে কর্মসূচি পালন করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে তথ্য

- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এই বয়সে আয়বর্ধন মূলক কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণের সক্ষমতা নেই।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরবর্তী জেনারেশনদের যে সকল প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে

- কারিগরি, আউটসোর্সিং, সেলাই, হস্তশিল্প, মাশরুমচাষ, মৎস্য চাষ, হাঁসমুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে কার্যক্রমসমূহ

- সুচিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- সুদবিহীন ঋণ প্রদান করা
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের পড়াশুনার জন্য শিক্ষা বৃত্তি দেয়া ও তাদের চাকুরির ব্যবস্থা করা

ভবন সম্পর্কে মতামত

১. এই প্রকল্প মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কে আরো বেশি তরাঙ্খিত করবে।
২. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বয়সের কথা চিন্তা করে প্রতিটি ভবনে একটি করে লিফট এর ব্যবস্থা করা উচিত।
৩. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নীচ তলায় অফিস রুম করা যেত এবং নিচ তলায় টয়লেট থাকলে ভাল হত।

৩.১১ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল

প্রকল্প এলাকায় (জেলা সদরে) যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন এমন ১২০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরদাতা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে যে বিষয়সমূহ জানতে চাওয়া হয়েছিল তা' হলো: বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক তথ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য করণীয় এবং প্রশিক্ষণ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করতে কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এ সংক্রান্ত তথ্য পরবর্তী অংশে নিচে দেখানো হলো

- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহের কারণসমূহ

১. বিভাগ ভিত্তিক বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বন্টন

সারণি থেকে যে, সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) এর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার আর্থ-সামাজিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য নমুনা বিভাগসমূহ (৮টি) থেকে সর্বমোট ১২০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা কে নির্বাচিত করা হয়। উল্লেখ্য, ৮টি বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক উত্তরদাতা ঢাকা বিভাগে ২৪০ জন (২০%) এবং সবচেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতা যথাক্রমে চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৯৬ জন (৮%)।

সারণি: ৩.১ বিভাগ ভিত্তিক বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সংগ্রহ বন্টন (%)

বিভাগের নাম	মুক্তিযোদ্ধা	
	সংখ্যা	%
ঢাকা	২৪০	২০
বরিশাল	৯৬	৮
খুলনা	১৯২	১৬
রাজশাহী	১৪৪	১২
রংপুর	১৪৪	১২
সিলেট	৯৬	৮
চট্টগ্রাম	১৯২	১৬
ময়মনসিংহ	৯৬	৮
মোট	১২০০	১০০

২. বৈবাহিক অবস্থা

উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা সারণি ৩.২ এ উল্লেখ করা হলো। সারণি থেকে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বর্তমানে বিবাহিত সর্বমোট ১১৩৬ জন (৯৪.৭%), অবিবাহিত ৯ জন (০.৮%), তালাকপ্রাপ্ত ১ জন (০.১%) এবং বিপন্নিক ৫৪ জন (৪.৫%)।

সারণি ৩.২: বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বৈবাহিক অবস্থা (%)

বৈবাহিক অবস্থা	বীর মুক্তিযোদ্ধা	
	সংখ্যা	%
বর্তমানে বিবাহিত	১১৩৬	৯৪.৭%
অবিবাহিত	৯	০.৮%
তালাকপ্রাপ্ত	১	০.১%
বিপন্নিক	৫৪	৪.৫%
মোট	১২০০	১০০.০%

৩. বয়স ভিত্তিক বন্টন

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বয়সের বন্টন সারণি ৩.৩ এ উল্লেখ করা হলো। সারণি থেকে দেখা যায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশের বয়স ৭০ বছর এর নিচে (৬৯.২%)। বর্তমানে ৭১ থেকে ৭৫ বছর বয়সী আছেন (২৩.৮%), ৭৬ থেকে ৮০ বছর বয়সী আছেন (৪.৫%) এবং ৮১ বছরের উর্ধে বয়সী আছেন (২.৯%)।

সারণি ৩.৩: বয়স ভিত্তিক উত্তরদাতাদের বন্টন (%)

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স	বীর মুক্তিযোদ্ধা	
	সংখ্যা	%
<= ৭০ বছর	৮৩০	৬৯.২%
৭১-৭৫ বছর	২৮১	২৩.৮%
৭৬-৮০ বছর	৫৪	৪.৫%
৮১ >= বছর	৩৫	২.৯%
মোট	১২০০	১০০.০%
গড় বয়স	৭০	

৪. বয়স ভিত্তিক বন্টন (মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়)


মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বয়সের বন্টন সারণি ৩.৩.১ এ উল্লেখ করা হলো। সারণি থেকে দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশের বয়স ২০ বছর এর নিচে (৬৯.৮%), ২১ থেকে ২৫ বছর বয়সী (২২.৬%), ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়সী (৪.৮%) এবং ৩১ বছরের বেশী বয়সী ছিলেন (২.৯%)।

সারণি ৩.৩.১: বয়স ভিত্তিক উত্তরদাতাদের বন্টন (%)

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স (১৯৭১)	বীর মুক্তিযোদ্ধা	
	সংখ্যা	%
<= ২০ বছর	৮৩৭	৬৯.৮%
২১-২৫ বছর	২৭১	২২.৬%
২৬-৩০ বছর	৫৭	৪.৮%
৩১ >= বছর	৩৫	২.৯%
মোট	১২০০	১০০.০%
গড় বয়স	২০	

৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শিক্ষা বিষয়ক তথ্য সারণি ১০৪ এ উল্লেখ করা হলো। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৫১%) বীর মুক্তিযোদ্ধার শিক্ষাগত যোগ্যতা ৬ষ্ঠ-এসএসসি পাশ। সবচেয়ে কম সংখ্যক (৪.৫%) উত্তরদাতা স্নাতকোত্তর পাশ এবং (৪.৭% কখনো স্কুলে যায় নি।



৬. পরিবারের লোকসংখ্যা

সারণি ৩.৩ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের লোক সংখ্যা বিষয়ক তথ্য উল্লেখ করা হলো। লেখচিত্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৪৯%) বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের লোক সংখ্যা ৪-৬ জন। সবচেয়ে কম সংখ্যক (১৫.১%) বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের লোক সংখ্যা ১ থেকে ৩ জন এছাড়াও (৩৫.৯%) পরিবারের লোক সংখ্যা ৭ জন বা এর বেশী।

সারণি ৩.৪ : পরিবারের লোকসংখ্যা

লোক সংখ্যা	বীর মুক্তিযোদ্ধা	
	সংখ্যা	%
১-৩ জন	১৮১	১৫.১%
৪-৬ জন	৫৮৮	৪৯.০%
≥৭ জন	৪৩১	৩৫.৯%
মোট	১২০০	১০০.০%
গড়		৬.৮

৭. পরিবারের প্রধান এর আয়ের তথ্য

বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার কি বর্তমানে আয়ের সাথে যুক্ত কিনা তা ৩.৫ এ উল্লেখ করা হলো। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সামগ্রিকভাবে (৭১.৭%) বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার প্রধান বর্তমানে কোন আয়ের সাথে যুক্ত নন। বাকী (২৮.৩%) বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার প্রধান বর্তমানে আয়ের সাথে যুক্ত আছেন। যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের প্রধান আয়ের সাথে যুক্ত তা ১০৭ এ উল্লেখ করা হলো। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সামগ্রিকভাবে (৪৬.৮%) বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার প্রধান বর্তমানে কৃষি কাজের সাথে যুক্ত আছেন। বাকী (২৮.৮%) ব্যবসা, (৮.৮%) চাকুরী, (৬.৫%) মৎস চাষ


এবং অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত আছেন। প্রায় এক-পঞ্চমাংশ উত্তরদাতা বলেছেন তাদের পরিবারের প্রধান পেনশন স্কীম এর মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করে।

সারণি ৩.৫: পরিবারের প্রধান এর আয়ের তথ্য বন্টন (%)

আয় করে কি না?	মোট	
	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৩৪০	২৮.৩%
না	৮৬০	৭১.৭%
মোট	১২০০	১০০.০%
কৃষি কাজ	১৫৯	৪৬.৮%
ব্যবসা	৯৮	২৮.৮%
চাকুরি	৩০	৮.৮%
হাঁস-মুরগি পালন	৬	১.৮%
মাছ চাষ	২২	৬.৫%
ইলেকট্রিক পণ্য মেরামত	৬	১.৮%
অন্যান্য (পেনশন)	১৯	৫.৬%
মোট	৩৪০	১০০.০%

৮. পরিবারের বর্তমান মাসিক আয়

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বর্তমান মাসিক আয় লেখচিত্র ৩.৫ এ উল্লেখ করা হলো। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক পরিবারের মাসিক গড় আয় (৬৮.৮%) এর ২০০০০ (বিশ হাজার) টাকার উপরে। (১৬.৮%) পরিবারের মাসিক আয় ১৫০০০ থেকে ২০০০০ টাকার মধ্যে এবং সবচেয়ে কমসংখ্যক (.৩%) পরিবারের মাসিক আয় ৫০০০ থেকে ১০০০০ টাকার মধ্যে। উল্লেখ্য সমীক্ষায় প্রতিটি বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মাসিক গড় আয় ৩১৭২০ টাকা।



৯: পরিবারের বর্তমান মাসিক ব্যয়

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বর্তমান মাসিক ব্যয় সারণি ৩.৬ এ উল্লেখ করা হলো। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক পরিবারের মাসিক গড় ব্যয় (৬০.৩%) এর ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকার উপরে। (২৫.৩%) পরিবারের মাসিক ব্যয় ১৫০০০.০০ থেকে ২০০০০.০০ টাকার মধ্যে, (১১.৬%) পরিবারের মাসিক ব্যয় ১৫০০০ থেকে ২০০০০ টাকার মধ্যে এবং সবচেয়ে কমসংখ্যক (২.৮%) পরিবারের মাসিক ব্যয় ৫০০০.০০ থেকে ১০০০০.০০ টাকার মধ্যে। উল্লেখ্য সমীক্ষায় বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মাসিক গড় ব্যয় ৩১,৯০৭.০০ টাকা।

সারণি ৩.৬: পরিবারের বর্তমান মাসিক ব্যয় বন্টন (%)

মাসিক ব্যয়	মোট	
	সংখ্যা	%
৫০০১ টাকা-১০,০০০ টাকা	৩৪	২.৮%
১০,০০১ টাকা-১৫,০০০ টাকা	১৩৯	১১.৬%
১৫,০০১ টাকা-২০,০০০ টাকা	৩০৩	২৫.৩%
২০,০০১ ≤ টাকা	৭২৪	৬০.৩%
মোট	১২০০	১০০.০%
গড় ব্যয়		৩১৯০৭

১০. আর্থিক সহায়তার তথ্য


সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) এর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার আর্থ-সামাজিক বিষয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন আছে কিনা? এই তথ্য সারণি ৩.৭ এ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যক উত্তরদাতা (৯৯.৫%) জানিয়েছেন তাদের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন, অন্য দিকে সবচেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতা (.৫%) জানিয়েছেন তাদের আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন নেই। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় চার-পঞ্চমাংশ বেশী (৮৮.৯%) বীর মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা বিষয়ে আর্থিক সহায়তার কথা বলেছেন। বসতবাড়ী নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তার কথা বলেছেন (৭২.৪%)। প্রায় (৫১%) পরিবারের ছেলে/মেয়েদের শিক্ষা/পড়াশুনা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা বিষয়ে আর্থিক সহায়তার কথা বলেছেন।

সারণি ৩.৭: আর্থিক সহায়তা বিষয়ে তথ্য বন্টন (%) (একাধিক উত্তর)

আর্থিক সহায়তার	মোট	
	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১১৯৪	৯৯.৫%
না	৬	.৫%
মোট	১২০০	১০০.০%
ক্ষুদ্র ব্যবসা	৬১৩	৫১.৩%
চিকিৎসা	১০৬২	৮৮.৯%
পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা/পড়াশুনা	৬১৯	৫১.৮%
বসতবাড়ী নির্মাণ করার জন্য	৮৬৪	৭২.৪%
অন্যান্য (মৎস চাষ, জমি ক্রয়)	১০২	৮.৫%
মোট	১১৯৪	

১০. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রমসমূহ

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন লেখচিত্র ৩.৬ এ উল্লেখ করা হলো। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় প্রায় সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাই (৯৯.৩%) তাদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন বলেছেন। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় (৪৪%) বীর মুক্তিযোদ্ধা তাদের কল্যাণের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করার কথা বলেছেন, (৩৬.৫%) বীর মুক্তিযোদ্ধা তাদের কল্যাণে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করে দেয়ার কথা বলেছেন, (২৫.৩%) বীর মুক্তিযোদ্ধা তাদের কল্যাণে বিনা সুদে লোন প্রদানের কথা বলেছেন, (২৪.৭%) বীর মুক্তিযোদ্ধা তাদের কল্যাণে ভাতা বৃদ্ধির কথা বলেছেন।



১১. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ফলে তাদের উপকারসমূহ

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে গৃহিত কার্যক্রমের ফলে উপকারসমূহ সারণি ৩.৮ এ তা উল্লেখ করা হলো। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় (৫১.১%) বীর মুক্তিযোদ্ধা আর্থিক ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে বলেছেন, (৩৫.৫%) বলেছেন গৃহিত কার্যক্রমের ফলে তাদের জীবন মান আরো ভালো হবে এবং বাকী (২৫.৩%) বলেছেন গৃহিত কার্যক্রমের ফলে তাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে।

সারণি ৩.৮: এই সকল কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ফলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উপকারসমূহ বন্টন (%)

কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ফলে উপকারসমূহ	মোট	
	সংখ্যা	%
আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত হবে	৬০৬	৫১.১%
বাসস্থান এর ব্যবস্থা হবে	৩০০	২৫.৩%
জীবন মান আরও ভাল হবে	৪২১	৩৫.৫%
মোট	১১৮৬	

১২. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম না হলে ক্ষতিসমূহ

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম না হলে কি কি ক্ষতি হতে পারে, সারণি ২০৭ এ তা উল্লেখ করা হলো। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় (৪৫.৪%) বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন পারিবারিক অস্থিরতা/সমস্যা দেখা দিতে পারে, (৩৭.৩%) বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন তাদের জীবন যাত্রার মান কমে যাবে, (২৫.৮%) বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন সূ-চিকিৎসার অভাব বোধ করবে/চিকিৎসা সেবা পাবেন না। (২৪.৯%) বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন তারা মানসিক অসুস্থতায় ভুগবেন।

সারণি ৩.৯: বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম না হলে কী কী ক্ষতি হতে পারে

কল্যাণমূলক কার্যক্রম না হলে ক্ষতিসমূহ	মোট	
	সংখ্যা	%
পারিবারিক অস্থিরতা/সমস্যা দেখা দিতে পারে	৫৪৫	৪৫.৪%
নিরাপদ আবাসনের অভাব অনুভব করবে	১৮০	১৫.০%
সূ-চিকিৎসার অভাব বোধ করবে/চিকিৎসা সেবা পাবে না	৩০৯	২৫.৮%
জীবনযাত্রার মান কমে যাবে/ কম থাকবে	৪৪৮	৩৭.৩%
মানসিক ভাবে ভেঙে পড়বে	২৯৯	২৪.৯%
মোট	১২০০	

১৩. অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে তথ্য

অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন আছে কি? যাতে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে, সারণি ৩.১০ এ তা উল্লেখ করা হলো। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বেশীরভাগ (৫২.৮%) বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন মনে করেন তাদের কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে (৪৭.২%) বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন তাদের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে যাতে তা হলো, ক্ষুদ্র ব্যবসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (৬৬.৩%)। হাঁস-মুরগী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (৫১.২%)। গরু ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (৪৫%) প্রয়োজন। গরু মোটা তাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (৩৮.৩%) এবং (৩৪.৪%) বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন তাদের জন্য মৎস চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

সারণি ৩.১০: প্রশিক্ষণ বিষয়ে তথ্য (একাধিক উত্তর)

প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ	মোট	
	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৫৬৭	৪৭.২%
না	৬৩৩	৫২.৮%
মোট	১২০০	১০০.০%
ক্ষুদ্র ব্যবসা	৩৭৬	৬৬.৩%
হাঁস-মুরগী পালন	২৯৪	৫১.৯%
গরু ছাগল পালন	২৫৫	৪৫.০%
গরু মোটাতাজাকরণ	২১৭	৩৮.৩%
মাছ চাষ	১৯৫	৩৪.৪%
মোট		

১৪. প্রশিক্ষণের ফলে উপকারসমূহ

অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ পেলে তাদের কি উপকার হতে পারে, সারণি ৩.১১ এ তা উল্লেখ করা হলো। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বেশীর ভাগ (৯৮.১%) বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন প্রশিক্ষণ পেলে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তারা তাদের পরিবার স্বচ্ছল করতে পারবেন, (৭০.৩%) বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন প্রশিক্ষণ পেয়ে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের মানসিক শান্তি আসবে।


সারণি ৩.১১: প্রশিক্ষণের ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের উপকারসমূহ বন্টন (%)

প্রশিক্ষণের ফলে উপকারসমূহ	মোট	
	সংখ্যা	%
আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবার স্বচ্ছল করতে পারবে	৫৫৬	৯৮.১%
আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসিক শান্তি আসবে	৪০০	৭০.৫%
সুস্থ থাকতে পারবে	২১৫	৩৭.৯%
অন্যান্য	৬	১.১%
মোট	১১৭৭	

১৫. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন কিনা? যাতে করে বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা স্বাবলম্বী হতে পারে, লেখচিত্র ৩.৭ এ তা উল্লেখ করা হলো। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বেশীরভাগ (৯৭.৯%) বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন তাদের সন্তানদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। আয়-বৃদ্ধি মূলক কাজের জন্য অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের কি প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে বলে বীর মুক্তিযোদ্ধারা মনে করেন, সারণি ৩.০৫ এ তা উল্লেখ করা হলো। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বেশীরভাগ (৪৬.৯%) বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন তাদের সন্তানদের জন্য কৃষি ও মৎস চাষ প্রশিক্ষণ যেতে পারে, (৪২.৩%) বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন তাদের সন্তানদের জন্য আইসিটি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে, (৪১.৬%) বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন তাদের সন্তানদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

লেখ চিত্র ৩.৭: প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ও প্রশিক্ষণের বিষয়



৩.১২ ভবন ভাড়া সংক্রান্ত তথ্য

মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এর একটি মূল উদ্দেশ্য হলো নীচতলা ও ২য় তলা ভাড়া দিয়ে যে আয় হবে তা দিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যবহার করা। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২১ সালে সমাপ্ত হওয়ার কথা। ইতোমধ্যে প্রকল্পের প্রায় অর্ধেকের বেশী ভবন ভাড়া দেয়া হয়েছে। নিম্নের সারণিতে ভাড়া সংক্রান্ত তথ্য দেয়া হলো।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় মোট ২৫ টি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, এর মধ্যে বর্তমানে ১৩টি ভবন ভাড়া দেয়া হয়েছে। দুটি ভবন (নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ) আংশিক (নিচতলা) ভাড়া দেয়া হয়েছে। ১৩টি ভবনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী টাকায় ভাড়া দেয়া হয়েছে বরিশাল জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি যার বাৎসরিক ভাড়ার অর্থের পরিমাণ =২৫,২০,০০০/- (পঁচিশ লাখ বিশ হাজার) টাকা এবং সবচেয়ে কম অর্থে ভাড়া দেয়া হয়েছে বাগেরহাট জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি যার বাৎসরিক ভাড়ার অর্থের পরিমাণ =১৮০,০০০/- (এক লাখ আশি হাজার) টাকা।

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বাৎসরিক ভাড়ার পরিমাণ
১	নারায়নগঞ্জ (নিচতলা)	৯৬০০০০.০০
২	মুন্সিগঞ্জ (নিচতলা)	৬০০০০০.০০
৩	গাজীপুর	১০৮০০০০.০০
৪	যশোর	৪৮০০০০.০০
৫	বাগেরহাট	১৮০০০০.০০
৬	বরিশাল	২৫২০০০০.০০
৭	ময়মনসিংহ	৯৭৪০০০.০০
৮	নেত্রকোনা	১১৬৪০০০.০০
৯	রংপুর	২৪০৭৪১৬.০০
১০	বগুড়া	২৪০০০০.০০
১১	মৌলভীবাজার	৪২০০০০.০০
১২	কক্সবাজার	ভবন ভাড়া হয়েছে তবে তথ্য পাওয়া যায় নাই
১৩	রাজশাহী	ভবন ভাড়া হয়েছে তবে তথ্য পাওয়া যায় নাই
১৪	ঢাকা	ভাড়া দেয়ার প্রক্রিয়া চলমান।
১৫	মানিকগঞ্জ	
১৬	চট্টগ্রাম	
১৭	বান্দরবান	
১৮	কুমিল্লা	
১৯	সাতক্ষীরা	
২০	খুলনা	
২১	ঝালকাঠি	
২২	দিনাজপুর	
২৩	সিলেট	
২৪	নাটোর	
২৫	মাদারিপুর	

৩.১২.১ ভবনের ভাড়া, আসবাবপত্র ও অন্যান্য অবস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য

১. মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন-সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি শহরের কেন্দ্র স্থলে অর্থাৎ পোস্ট অফিস মোড়ে অবস্থিত। ভবনের আশে-পাশে দোকানপাট, হোটেল ইত্যাদি অবস্থিত। ভবনের চারিপাশে সীমানা প্রাচীর আছে। ভবনের মূল ফটকে 'নাম ফলক' আছে। মূল ফটকের পাশে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল নাই। ৩ বছর ২ মাস আগে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সাতক্ষীরা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১৮ই জানুয়ারী ২০১৮ইং সালে ভবনটি উদ্বোধন করা হয়।

ভবনটিতে শুধুমাত্র ১ম তলায় র‍্যাম্প আছে। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটির নিচতলায় ১৯ টি দোকান আছে যা ভাড়া দেওয়া যায় নাই। কারণ: (১) দোকানগুলি খুবই ছোট সাইজের, (২) ছোট পরিসরে চলাফেরার সমস্যা (৩) সামনে জায়গা না থাকায় যানবাহন পার্কিং করা যায়না।

২য় তলায় টয়লেট আছে ৪টি (৩টি ভাল ও ১টি খারাপ), বেসিন আছে ১০টি (৮টি ভাল ও ২টি খারাপ), আয়না আছে ১০ টি, ২ ধরনের টয়লেট আছে (কমোড ও সাধারণ), কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে ভাড়া দিতে হলে রান্নার ব্যবস্থা, প্লেট-গ্লাস ধোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ১ বছর আগে আলোচনা সভার জন্য ১ দিনের জন্য ৩,০০০/- টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়। ভবনের ভাড়া জেলা প্রশাসক এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়।



৩য় তলায় জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, জেলা সহকারী মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, ৬টি টয়লেট, ১টি সেমিনার কক্ষ, একটি মিনি লাইব্রেরী আছে যেখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কোন বই নাই। বেসিন আছে ৫টি (৪টি ভাল ও ১টি খারাপ), আয়না আছে ৫টি। ০১/০৩/২০১৬ইং উদ্বোধনের আগেই আসবাবপত্র এসেছিল তাই জেলা প্রশাসক মহোদয় গ্রহণ করেছিলেন এবং তার দায়িত্বে ছিল। বর্তমানে আসবাবপত্রের অবস্থা খারাপ। মেসিনারী এবং অফিস সরঞ্জামাদি যা কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ: ফটোকপি মেসিন ১টি, কম্পিউটার ২টি, প্রিন্টার ২টি, এয়ার কুলার ৪টি, স্ক্যানার ১টি, ওভারহেড প্রজেক্টর ১টি, টেলিফোন ১টি, ফ্যাক্স মেসিন ১টি, এলসিডি টেলিভিশন, ফ্যান ৫১টি (৫টি ব্যবহৃত হচ্ছে)।

জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের জন্য আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদি যা কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ: সেক্রেটারিয়েট টেবিল ২টি (অব্যবহৃত), সেক্রেটারিয়েট চেয়ার ২টি (অব্যবহৃত), কুশন চেয়ার ২টি, স্টিল আলমারি ৩টি, ফাইল কেবিনেট ৩টি, কম্পিউটার টেবিল ২টি, কম্পিউটার চেয়ার ২টি (অব্যবহৃত), টেবিল ৫টি, ভিজিটর চেয়ার ৫০টি, সো-কেস-হট নট ২টি।

ভবনটিতে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র আছে ১২টি, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র নিয়মিত চেক করা হয় না। অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ। অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয় নাই।

২. মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন-রংপুর

রংপুরের মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি শহরের কেন্দ্র স্থলে অর্থাৎ শহীদ মুক্তার ইলাহী সড়কে অবস্থিত। ভবনের আশে-পাশে দোকানপাট, হোটেল, ইত্যাদি অবস্থিত। ভবনের চারিপাশে সীমানা প্রাচীর আছে। ভবনের মূল ফটকে 'নাম ফলক' আছে। মূল ফটকের পাশের বজ্রবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। ১লা আগস্ট ২০১৩ সালে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক রংপুরের মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১৫ই অক্টোবর ২০১৪ সালে ভবনটির উদ্বোধন করা হয়।

ভবনটির নিচতলায় র‍্যাম্প আছে তবে ব্যবহার হয়না। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটির নিচতলায় ৯ টি দোকান আছে যা গত ০১/০৮/২০১৩ ইং হতে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। দোকানগুলি হতে মোট মাসিক ৮৮,১৩৮/-টাকা এবং বার্ষিক মোট ১০,৫৭,৬৫৬/-টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। আদায়কৃত টাকা মুক্তিযোদ্ধা অফিস (মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ব্যাংক একাউন্টের) মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়।

২য় তলা ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড এর নিকট ভাড়া দেওয়া হয়েছে। ব্যাংক তার প্রয়োজন মাফিক সকল অবকাঠামো তৈরী করেছে। ২য় তলাটি গত আগস্ট, ২০১৩ইং হতে ভাড়া দেয়া হয়েছে। ভাড়া বাবদ মাসিক ১,১২,৪৮০/-টাকা এবং বার্ষিক ১৩,৪৯,৭৬০/-টাকা ভাড়া দেয়া হয়।

৩য় তলায় জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, জেলা সহকারি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, ৬টি টয়লেট, ১টি সেমিনার কক্ষ, একটি মিনি লাইব্রেরী আছে যেখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই নাই। মেসিনারী এবং অফিস সরঞ্জামাদি যা কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ: ফটোকপি মেসিন ১টি, কম্পিউটার ২টি (১টি ব্যবহার হয়, আরেকটি ইনটেক), প্রিন্টার ২টি (১টি ভাল, আরেকটি খারাপ), ইউ.পি.এস ২টি (দুইটি নষ্ট), এয়ার কুলার ২টি (১টি সচল অন্যটি অচল), ল্যাপটপ ১টি (অফিস সহকারীর বাসায় আছে) ক্যামেরা ১টি (ক্যামেরার কোয়ালিটি ভাল না), স্ক্যানার ১টি, ওভারহেড প্রজেক্টর ১টি (প্রজেক্টরের রিমোট নষ্ট প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়), টেলিফোন ১টি, ফ্যাক্স মেসিন ১টি, ফ্যান ১৬টি (১টি অচল), দেয়ালের টাইলস নষ্ট হয়েছে ১২টি এবং ভবনটি রং করা প্রয়োজন।

জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের জন্য আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদি যা কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ: সেক্রেটারিয়েট টেবিল ২টি (১টি ব্যবহার হয়, আরেকটি ইনটেক), সেক্রেটারিয়েট চেয়ার ২টি, কুশন চেয়ার ১০টি, স্টিল আলমারি ৪টি (তিনটির তালা নষ্ট), ফাইল কেবিনেট ৪টি (দুইটি তালা নষ্ট), কম্পিউটার টেবিল ২টি, কম্পিউটার চেয়ার ২টি (২টি ভাঙ্গা), টেবিল ৪টি (প্রত্যেকটির ডায়ার তালা নষ্ট), ভিজিটর চেয়ার ৫০টি, সো-কেস-হট নট ২টি (গ্লাস ও তালা নষ্ট)। ভবনটিতে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র আছে ৪টি, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ।



৩. মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন -বাগেরহাট

বাগেরহাট মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি শহরের কেন্দ্র স্থলে অর্থাৎ পুরাতন কোর্ট চত্বর, মেইন রোডে অবস্থিত। ভবনের আশে-পাশে দোকানপাট, হোটেল ইত্যাদি অবস্থিত। ভবনের চারিপাশে সীমানা প্রাচীর আছে। ভবনের মূল ফটকে 'নাম ফলক' আছে। মূল ফটকের পাশের বঙ্গবন্ধুর মুরাল স্থাপন করা হয়েছে। ২ বছর ৪ মাস পূর্বে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাগেরহাটের মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ২রা আগষ্ট ২০১৭ সালে ভবনটির উদ্বোধন করা হয়।



ভবনটিতে র‍্যাম্প আছে তবে ব্যবহার করা হয়না। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটির নিচতলায় ৯ টি দোকান আছে যা গত ০১/১১/২০১৮ইং হতে দোকান ভাড়ার চুক্তি পত্রের মাধ্যমে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। আশেপাশের দোকান ভাড়া তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি (ভাড়া দেওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি ভাড়া বাড়ানো হয়নি) দোকান গুলি হতে মোট মাসিক ১৫,০০০/-টাকা এবং বার্ষিক মোট ১৮০,০০০/- টাকা আদায় করা হয়।

২য় তলা ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর জন্য চুক্তিপত্রের মাধ্যমে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। ডায়াগনস্টিক সেন্টার তার প্রয়োজন মাফিক সকল অবকাঠামো তৈরী করেছে। ২য় তলাটি গত নভেম্বর, ২০১৮ইং হতে ডায়াগনস্টিক সেন্টারের নিকট ভাড়া দেয়া হয়েছে, ভাড়া বাবদ মাসিক ১৩,০০০/-টাকা এবং বার্ষিক ১৫৬,০০০/- টাকা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে যা জেলা প্রশাসক মহোদয়ের একটি নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবের (মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ব্যাংক একাউন্টের) মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। ২য় তলায় ৪টি টয়লেট আছে (২টি কমোড ও ২ টি সাধারণ), ২টি বেসিন আছে, ২টি আয়না আছে।

৩য় তলায় জেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, জেলা সহকারি বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, ১টি সেমিনার কক্ষ, একটি মিনি লাইব্রেরী আছে যেখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ১৫ টি বই আছে, ৫টি টয়লেট, ৪টি বেসিন আছে, ৪টি আয়না আছে। ভবনের জন্য গত ০৫/০২/২০১৮ইং তারিখে আসবাব পত্র গ্রহণ করা হয়। মেসিনারী এবং অফিস সরঞ্জামাদি যা কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় তা হলো: ফটোকপি মেসিন ১টি, কম্পিউটার ১টি, প্রিন্টার ১টি, এয়ার কুলার ২টি, ল্যাপটপ ১টি, ক্যামেরা ১টি, স্ক্যানার ১টি, ওভারহেড প্রজেক্টর ১টি, টেলিফোন ১টি, ফ্যাক্স মেসিন ১টি, ফ্যান – ২৬টি আছে (সবই ভাল অবস্থায় আছে), ছাদ সমান মাঝখানে উঁচু করা নাই।



জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের জন্য আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদি যা কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ: সেক্রেটারিয়েট টেবিল ২টি, সেক্রেটারিয়েট চেয়ার ২টি, কুশন চেয়ার ১০টি, স্টিল আলমারি ৪টি, ফাইল কেবিনেট ৪টি, কম্পিউটার টেবিল ১টি, কম্পিউটার চেয়ার ১টি, টেবিল ৪টি, ভিজিটর চেয়ার ৪০টি, কনফারেন্স চেয়ার ১০টি দেয়া হয়। এ ছাড়া সিডিউল অনুযায়ী কনফারেন্স টেবিল ১টি, বীরশ্রেষ্ঠদের পেইনটিং ৭টি, স্বাধীনতা যুদ্ধের পেইনটিং ১টি, বই এবং সিডি পাওয়া যায় নাই। ভবনটিতে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র আছে ৪টি, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ।

৪. মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন -যশোর

যশোরের মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি শহরের এক প্রান্তে অর্থাৎ মুন্সি মেহেরুল্লাহ সড়ক এলাকায় অবস্থিত। ভবনের আশে-পাশে জেলা দুর্নীতি দমন কমিশন, দোকানপাট, হোটেল, অফিস ইত্যাদি অবস্থিত। ভবনের চারিপাশে সীমানা প্রাচীর আছে। ভবনের মূল ফটকে 'নাম ফলক' আছে। মূল ফটকের পাশের বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করা নাই, ভবনের রাস্তার সাইডে স্থাপন করা হয়েছে। ৬বছর ৪ মাস পূর্বে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যশোরের মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ২৪ই নভেম্বর ২০১৪ সালে ভবনটির উদ্বোধন করা হয়।



ভবনটিতে শুধুমাত্র নীচতলায় র‍্যাম্প আছে তবে র‍্যাম্পের সাথে

রেলিং নাই। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটির নিচতলায় ৯ টি দোকান আছে যা গত ০১/০৯/২০১৫ ইং হতে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। দোকান গুলি হতে মোট মাসিক ২০,০০০/-টাকা এবং বার্ষিক মোট ২৪০,০০০/- টাকা আদায় করা হয়। আদায়কৃত টাকা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। আশে-পাশের দোকানের ভাড়া তুলনামূলকভাবে বেশি (বিগত ২-৩ বছরের মধ্যে কোন ভাড়া বৃদ্ধি/পরিবর্তন হয় নাই) নিচ তলায় কোন টয়লেট নাই তাই ভাড়াটিয়ারা ২য় তলার টয়লেট ব্যবহার করেন।

২য় তলা কোচিং সেন্টার এর নিকট চুক্তিপত্রের মাধ্যমে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। ২য় তলাটি গত এপ্রিল, ২০১৬ইং হতে কোচিং সেন্টারের কাছে ভাড়া দেয়া হয়েছে। ভাড়া বাবদ মাসিক ২০,০০০/-টাকা এবং বার্ষিক ২৪০,০০০/- টাকা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ভাড়ার অর্থ মুক্তিযোদ্ধা অফিস (মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ব্যাংক একাউন্টের) এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন কমপ্লেক্স ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে ভাড়া আদায় করা হয়।

৩য় তলায় জেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, জেলা সহকারি বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, ৪টি টয়লেট, ১টি সেমিনার কক্ষ, একটি মিনি লাইব্রেরী আছে যেখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ১২ টি বই আছে। ভবনের জন্য কত তারিখে আসবাব পত্র গ্রহণ করেছেন: ০৫/০২/২০১৩। উদ্বোধনের আগে এসেছিল তাই ডিসি সাহেব তার অফিসে গ্রহণ করেছিলেন। মেসিনারী এবং অফিস সরঞ্জামাদি যা কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ:

ফটোকপি মেসিন ১টি, কম্পিউটার ১টি, প্রিন্টার ১টি (১টি খারাপ), এয়ার কুলার ২টি (১টি সচল অন্যটি অচল), ল্যাপটপ ১টি (অফিস সহকারীর বাসায় আছে) ক্যামেরা ১টি (ক্যামেরার কোয়ালিটি ভাল না), স্ক্যানার ১টি, ওভারহেড প্রজেক্টর ১টি (প্রজেক্টরের স্ক্রীন সরবরাহ করা হয়নি), টেলিফোন ১টি, ফ্যাক্স মেসিন ১টি, ফ্যান ৩৭টি (সবগুলি ভাল এবং সচল)। ,

জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের জন্য আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদি যা কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ: সেক্রেটারিয়েট টেবিল ২টি (১টি ব্যবহার হয়, আরেকটি ইনটেক), সেক্রেটারিয়েট চেয়ার ২টি, কুশন চেয়ার ১২টি, স্টিল আলমারি ৫টি (তিনটির তালা নষ্ট), ফাইল কেবিনেট ৪টি (দুইটি তালা নষ্ট), কম্পিউটার টেবিল ২টি, কম্পিউটার চেয়ার ২টি (২টি ভাঙ্গা), টেবিল ৪টি (প্রত্যেকটির ড্রয়ার তালা নষ্ট), ভিজিটর চেয়ার ৫০টি, সো-কেস-হট নট ২টি (গ্লাস ও তালা নষ্ট), এ ছাড়া সিডিউল অনুযায়ী কনফারেন্স টেবিল ১টি, কনফারেন্স চেয়ার ২০টি, বীরশ্রেষ্ঠদের পেইনটিং ৭টি, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পেইনটিং ১টি, বই এবং সিডি ১টি পাওয়া যায় নাই। ভবনটিতে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র আছে ৮টি, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ।

৫. মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন- দিনাজপুর

দিনাজপুরের মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি শহরের এক প্রান্তে অর্থাৎ গাউছুল আযম চক্ষু হাসপাতালের সামনে অবস্থিত। ভবনের আশে-পাশে দোকানপাট, হোটেল, অফিস ইত্যাদি অবস্থিত। ভবনের চারিপাশে সীমানা প্রাচীর আছে। ভবনের মূল ফটকে নাম ফলক আছে। মূল ফটকের পাশের বজ্রবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করা নাই তবে রাস্তার পাশের সাইডে স্থাপন করা হয়েছে। অদ্যাবধি গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক দিনাজপুর মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিকট হস্তান্তর করা হয় নাই।




ভবনটিতে নীচতলায় র‍্যাম্প আছে। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটির নিচতলায় ৬ টি দোকান আছে।

২য় তলায় ২টি টয়লেট আছে, ২ খরণের টয়লেট আছে এবং ৪টি বেসিন আছে।

৩য় তলায় জেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, জেলা সহকারি বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, ৪টি টয়লেট, ১টি সেমিনার কক্ষ, একটি মিনি লাইব্রেরী আছে যেখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই নাই।

৬. মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন -নেত্রকোনা

নেত্রকোনা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি শহরের কেন্দ্র স্থলে অর্থাৎ মুক্তারপাড়া, পুরাতন কালেক্টরেট সংলগ্ন মাঠের পাশে অবস্থিত। ভবনের বামপাশে জেলা গ্রন্থাগার ও ডানপাশে জেলা বার কাউন্সিল মার্কেট, দোকানপাট, হোটেল ইত্যাদি অবস্থিত। ভবনের চারিপাশে সীমানা প্রাচীর আছে তবে এক পাশে তারকাটা দিয়ে বেড়া দেয়া। ভবনের মূল ফটকে 'নাম ফলক' আছে। মূল ফটকের পাশে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। ৫ বছর ৪ মাস পূর্বে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নেত্রকোনা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১৬ সালে ভবনটির উদ্বোধন করা হয়।

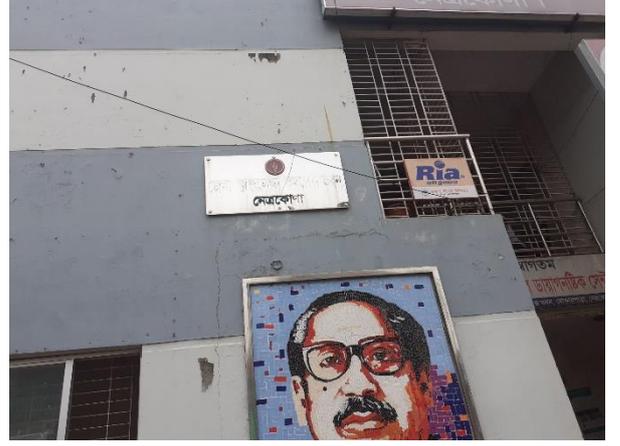

ভবনটিতে র‍্যাম্প আছে তবে ব্যবহার করা হয়না। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটির নিচতলায় ৯ টি দোকান আছে যা গত ০১/০৪/২০১৭ইং হতে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। দোকান গুলি হতে মোট মাসিক ৫২,০০০/-টাকা এবং বার্ষিক মোট ৬২৪,০০০/-টাকা আদায় করা হয়।

২য় তলাটি গত এপ্রিল, ২০১৭ইং হতে ব্যাংক এর নিকট ভাড়া দেওয়া হয়েছে। ব্যাংক তার প্রয়োজন মাফিক ভেতরে সকল অবকাঠামো তৈরী করেছে। ভাড়া বাবদ মাসিক ৪৫,০০০/-টাকা এবং বার্ষিক ৫৪০,০০০/- টাকা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে যা জেলা প্রশাসক মহোদয়ের একটি নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবের (মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ব্যাংক একাউন্টের) মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়।

৩য় তলায় জেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, জেলা সহকারি বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, ১টি সেমিনার কক্ষ, একটি মিনি লাইব্রেরী আছে যেখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কোন বই নাই, ৬টি টয়লেট, ৪টি বেসিন আছে, ৪টি আয়না আছে। ভবনের জন্য গত ০৫/০২/২০১৮ইং তারিখে আসবাব পত্র গ্রহণ করা হয়। মেসিনারী এবং অফিস সরঞ্জামাদি যা কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় তা হলো ফটোকপি মেসিন ১টি, কম্পিউটার ১টি, প্রিন্টার ১টি, ইউপিএস ১টি, এয়ার কুলার ২টি, স্ক্যানার ১টি, ওভারহেড প্রজেক্টর ১টি, ফ্যাক্স মেসিন ১টি, এলসিডি টেলিভিশন ১টি, ফ্যান ২৬টি আছে (সবই ভাল অবস্থায় আছে)। চিলেকোঠার ছাদ সমতল অবস্থায় করা হয়েছে মাঝখানে উঁচু করা নাই।

জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের জন্য আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদি যা কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ: সেক্রেটারিয়েট টেবিল ২টি, সেক্রেটারিয়েট চেয়ার ২টি, কুশন চেয়ার ১০টি, স্টিল আলমারি ৪টি, ফাইল কেবিনেট ৪টি, কম্পিউটার টেবিল ১টি, কম্পিউটার চেয়ার ১টি, টেবিল ৪টি, ভিজিটর চেয়ার ৪০টি, কনফারেন্স চেয়ার ১০টি। ভবনটিতে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র আছে ১১টি, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ।

৭. মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন -বগুড়া

বগুড়া মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি শহরের এক প্রান্তে অর্থাৎ নিশিন্দারা সান্তাহার রোডে অবস্থিত। ভবনের আশেপাশে ও সামনে দোকান আছে। ভবনের চারিপাশে সীমানা প্রাচীর আছে। ভবনের মূল ফটকে 'নাম ফলক' নাই। মূল ফটকের পাশের বজ্রবন্ধুর ম্যুরাল নাই। ২ বছর ৭ মাস পূর্বে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বগুড়া মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ৮ই আগস্ট ২০১৮ সালে ভবনটির উদ্বোধন করা হয়।



ভবনটিতে র‍্যাম্প আছে। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটির নিচতলায় ৯ টি দোকান আছে যা গত ১৫/০৩/২০২১ ইং হতে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। দোকানগুলি হতে মোট মাসিক ২০,০০০/-টাকা এবং বার্ষিক মোট ২৪০,০০০/- টাকা আদায় করা হয়। আদায়কৃত টাকা জেলা প্রশাসক মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে মুক্তিযোদ্ধা অফিস (মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ব্যাংক একাউন্টের) এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। সাম্প্রতিক কালে ভাড়া হওয়ায় শুধুমাত্র ভাড়ার অগ্রিম বাবদ ২৪০,০০০/-টাকা ব্যাংক একাউন্টে জমা দেওয়া হয়েছে।

২য় তলা ভাড়া দেওয়া হয় নাই। কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে ভাড়া দেয়ার জন্য রান্নার ব্যবস্থা, প্লেট-গ্লাস ধোয়ার ব্যবস্থা না থাকায় ভাড়া দিতে সমস্যা হচ্ছে। মার্চ ২০২১ থেকে ২০,০০০ টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়েছে তবে কি কাজে ব্যবহার হবে তা ঠিক জানা হয়নি।

৩য় তলায় জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, জেলা সহকারি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, ৬টি টয়লেট, ১টি সেমিনার কক্ষ, একটি মিনি লাইব্রেরী আছে যেখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই নাই। মেসিনারী এবং অফিস সরঞ্জামাদি যা কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ: ফটোকপি মেসিন ১টি, কম্পিউটার ২টি, প্রিন্টার ২টি, এয়ার কুলার ২টি (১টি সচল অন্যটি অচল), ক্যামেরা ১টি (ক্যামেরার কোয়ালিটি ভাল না), স্ক্যানার ১টি, ওভারহেড প্রজেক্টর ১টি, টেলিফোন ১টি, ফ্যাক্স মেসিন ১টি, ফ্যান ৪১টি।

জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের জন্য আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদি যা কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ: সেক্রেটারিয়েট টেবিল ২টি (১টি ব্যবহার হয়, আরেকটি ইনস্টেক), সেক্রেটারিয়েট চেয়ার ২টি, কুশন চেয়ার ১০টি, স্টিল আলমারি ৪টি (তিনটির তালা নষ্ট), ফাইল কেবিনেট ৪টি (দুইটি তালা নষ্ট), কম্পিউটার টেবিল ২টি, কম্পিউটার চেয়ার ২টি (২টি ভাঙ্গা), টেবিল ৪টি (প্রত্যেকটির ডায়ার তালা নষ্ট), ভিজিটর চেয়ার ৫০টি, সো-কেস-হট নট ২টি (গ্লাস ও তালা নষ্ট)। ভবনটিতে কোন অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র নাই।

৮. মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন -ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি শহরের কেন্দ্র স্থলে অর্থাৎ থানা ঘাটের পার্শ্বে অবস্থিত। ভবনের বামপাশে জেলা পরিষদ ভবন, ডাকবাংলো ভবন ও ডানপাশে মা ও শিশু চিকিৎসা কেন্দ্র। ভবনটি প্রধান সড়কে অবস্থিত অবস্থিত। ভবনের চারিপাশে সীমানা প্রাচীর আছে। ভবনের মূল ফটকে 'নাম ফলক' আছে। মূল ফটকের পাশে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। গত ০২-০২-২০১৬ইং তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ময়মনসিংহর মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ০৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১৬ সালে ভবনটি উদ্বোধন করা হয়।



ভবনটিতে র‍্যাম্প আছে। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটির নিচতলায় ১২ টি দোকান আছে যা গত ২৬/০২/২০১৭ইং হতে দোকান ভাড়া দেওয়া হয়েছে। দোকান গুলি হতে মোট মাসিক ৩৩,৭০০/-টাকা এবং বার্ষিক মোট ৪০৪,৪০০/- টাকা আদায় করা হয়।

২য় তলা গত ২৬/০২/২০১৭ইং হতে রূপালী ব্যাংককে নিকট ভাড়া দেওয়া হয়েছে। মাসিক ভাড়া ৪৭,৫০০/-টাকা এবং বার্ষিক ৫৭০,০০০/- টাকা। সকল ভাড়ার টাকা জেলা প্রশাসক মহোদয়ের রূপালী ব্যাংক হিসাবের (মুক্তিযোদ্ধা ভবন কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ ব্যাংক একাউন্টের) মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। ব্যাংক তার প্রয়োজন মাফিক সকল অবকাঠামো তৈরী করেছে। ২য় তলায় ৪টি টয়লেট আছে (১টি কমেড ও ৩টি সাধারণ টয়লেট), ৪টি বেসিন (১টি নষ্ট)।


৩য় তলায় জেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের ১টি অফিস কক্ষ, জেলা সহকারি বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের ১টি অফিস কক্ষ, ১টি সেমিনার কক্ষ, ১টি মিনি লাইব্রেরী আছে, যেখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ২৫০টি বই আছে, ৪টি টয়লেট, ২টি বেসিন আছে। ভবনের জন্য গত ২৬/০৮/২০১৫ইং তারিখে আসবাব পত্র, মেশিনারী এবং অফিস সরঞ্জামাদি গ্রহণ করা হয়। যন্ত্রপাতি এবং অফিস সরঞ্জামাদি যা কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় তা হলো:

ফটোকপি মেশিন ১টি, কম্পিউটার ১টি, প্রিন্টার ১টি, ইউপিএস ১টি, এয়ার কুলার ৪টি, ল্যাপটপ ১টি, ক্যামেরা ১টি, স্ক্যানার ১টি, ওভারহেড প্রজেক্টর ১টি, ফ্যাক্স মেশিন ১টি, এলসিডি টেলিভিশন ১টি, টেলিফোন ১টি, ফ্যান ২৬টি আছে (সবই ভাল অবস্থায় আছে)। ভবনের ছাদ সমান মাঝখানে উঁচু করা নাই।

জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের জন্য আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদি যা কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ: সেক্রেটারিয়েট টেবিল ২টি, সেক্রেটারিয়েট চেয়ার ২টি, কুশন চেয়ার ১০টি, স্টিল আলমারি ৩টি, ফাইল কেবিনেট ৩টি, কম্পিউটার টেবিল ২টি, কম্পিউটার চেয়ার ২টি, টেবিল ৪টি, ভিজিটর চেয়ার ৪০টি, কনফারেন্স চেয়ার ১০টি, সো-কেস-হটনট ২টি, কনফারেন্স টেবিল ১টি দেয়া হয়। ভবনটিতে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র আছে ০৬টি, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলি মেয়াদ উত্তীর্ণ।

৯. মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন -মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারের মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি শহরের চাঁদনীঘাট এলাকায় অর্থাৎ সৈয়ারপুর, মৌলভীবাজারে অবস্থিত। ভবনের সামনে একটি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ, তার পাশে সিএনজি স্ট্যান্ড এবং দলিত সম্প্রদায়ের বসবাস। ভবনের একপাশে অর্ধেক সীমানা প্রাচীর আছে। ভবনের মূল ফটকে 'নাম ফলক' আছে। ভবনের মূল ফটকের পাশে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। ০৭ বছর পূর্বে গণপূর্ত অধিদপ্তর মৌলভীবাজারের মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ০৯ই অক্টোবর ২০১৩ সালে ভবনটির উদ্বোধন করা হয়।

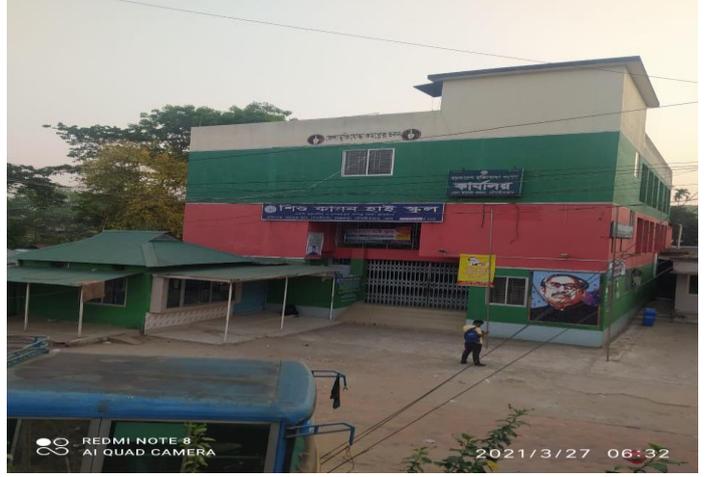

ভবনটিতে র‍্যাম্প নাই মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটির নিচতলায় ১ টি দোকান আছে যা গত ১৯/০১/২০২১ ইং হতে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। ভবনের ১ম তলা ও ২য়তলায় শিশুকানন নামক একটি বিদ্যালয় ১লা জানুয়ারী ২০২১ কে ভাড়া দেয়া হয়েছে। নিচ তলা ও ২য় তলা একত্রে মাসিক ভাড়া ৩৫,০০০/- টাকা। অগ্রীম জামানত হিসাবে ৫০০০০.০০ টাকা গ্রহণ করা হয়। উক্ত ভাড়ার টাকা মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল কমিটি গ্রহণ করছে। ২য় তলায় ৪টি টয়লেট (৪টি কমোড) আছে, ২টি বেসিন আছে। এখানে রান্নাঘর ও রান্নার জন্য চুলার ব্যবস্থা নাই।

৩য় তলায় জেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, জেলা সহকারি বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, ৪টি টয়লেট (২টি কমোড ও ২টি সাধারণ), ১টি সেমিনার কক্ষ, একটি মিনি লাইব্রেরী আছে যেখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ৪৫টি বই আছে। অফিস মেশিনারী এবং অফিস সরঞ্জামাদি যা কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ: ফটোকপি মেশিন ১টি, কম্পিউটার ২টি (২টি ইনটেক), প্রিন্টার ২টি (২টি ইনটেক), ইউ.পি.এস ১টি, এয়ার কুলার ২টি, ল্যাপটপ ১টি, ক্যামেরা ১টি (ক্যামেরার কোয়ালিটি ভাল না), স্ক্যানার ২টি, ওভারহেড প্রজেক্টর ১টি, ফ্যাক্স মেশিন ১টি।

জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের জন্য আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদি যা কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ: সেক্রেটারিয়েট টেবিল ২টি, সেক্রেটারিয়েট চেয়ার ২টি, স্টিল আলমারি ৪টি, ফাইল কেবিনেট ৪টি, কম্পিউটার টেবিল ১টি, কম্পিউটার চেয়ার ১টি, টেবিল ৪টি, ভিজিটর চেয়ার ৫০টি, সো-কেস-হট নট ২টি, কনফারেন্স টেবিল ৩টি ও চেয়ার ১০টি, বীরশ্রেষ্ঠদের পেইনটিং ৭টি, স্বাধীনতা যুদ্ধের পেইনটিং ২৫টি, বই এবং সিডি ৪৫টি পাওয়া যায়।

১০. মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন - রাজশাহী

রাজশাহী মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি শহরের এক প্রান্তে অর্থাৎ কামরুজ্জামান চত্তর (বিন্দুর মোড়) এলাকায় অবস্থিত। ভবনের আশে-পাশে হোটেল, দোকানপাট ও অফিস, ইত্যাদি অবস্থিত। ভবনের চারিপাশে সীমানা প্রাচীর আছে। ভবনের মূল ফটকে 'নাম ফলক' আছে। মূল ফটকের পাশে বঙ্গবন্ধুর মুরাল স্থাপন করা হয়েছে। ৬বছর ২ মাস পূর্বে গণপূর্ত অধিদপ্তর মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং মামলা চলার কারণে ভবনটির উদ্বোধন করা হয় নাই। ভবনটিতে কোন র‍্যাম্প নাই।

৩য় তলায় জেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, জেলা সহকারি বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, ৪টি টয়লেট, ১টি সেমিনার কক্ষ।



অফিস মেশিনারী এবং অফিস সরঞ্জামাদি ফটোকপি ১টি, কম্পিউটার ১টি, প্রিন্টার ২টি (১টি খারাপ), ইউপিএস ২টি, এয়ার কুলার ২টি (১টি সচল অন্যটি অচল), ল্যাপটপ ১টি, ক্যামেরা ১টি (ক্যামেরার কোয়ালিটি ভাল না), স্ক্যানার ১টি, ওভারহেড প্রজেক্টর ১টি (প্রজেক্টরের স্ক্রীন সরবরাহ দেয়া হয় নাই), টেলিফোন ১টি, ফ্যাক্স মেশিন ১টি, ফ্যান ৩৭টি (সবগুলি ভাল এবং সচল), সিলিং ফ্যান ২৫ ও ওয়াল ফ্যান ১৪টি।

জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের জন্য আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদি যা কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ: সেক্রেটারিয়েট টেবিল ২টি (১টি ব্যবহার হয়, আরেকটি ইনটেক), সেক্রেটারিয়েট চেয়ার ৩টি, কুশন চেয়ার ১৭টি, স্টিল আলমারি ৩টি, ফাইল কেবিনেট ৩টি, কম্পিউটার টেবিল ২টি, কম্পিউটার চেয়ার ২টি, টেবিল ৪টি, ভিজিটর চেয়ার ২০টি, সো-কেস-হট নট ২টি। ভবনটিতে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র আছে ১১টি, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ।

১১. মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন - সিলেট

সিলেটের মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি শহরের কেন্দ্র স্থলে অর্থাৎ মাছিমপুর সিলেট সদরে উপর অবস্থিত। ভবনের পিছন দিকে ও ডান পাশে বড় পুকুর সামনে বড় বিল্ডিং এবং বাম পাশে রাস্তা অবস্থিত। ভবনের চারিপাশে ৬ ফুট সীমানা প্রাচীর এবং এক পাশে গ্রীলের বেড়া দিয়ে সীমানা দেয়া আছে। ভবনের মূল ফটকে 'নাম ফলক' আছে। তিন তলার দেয়ালে বঙ্গবন্ধুর ছবি আছে যা দূর থেকে দৃশ্যমান হয়। বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়নি। ১৬ই মার্চ, ২০২১ সালে গণপূর্ত অধিদপ্তর সিলেটের মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি এখনো উদ্বোধন করা হয়নি।

ভবনটিতে র‍্যাম্প আছে তবে তা ব্যবহার করা হয়না। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটির নিচতলায় ৯ টি দোকান



আছে যা ভাড়া দেওয়া হয়নি। ২য় তলায় ৪টি টয়লেট (২টি কমোড ও ২টি সাধারণ) আছে, ২টি বেসিন আছে।

৩য় তলায় জেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, জেলা সহকারি বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, ৬টি টয়লেট (৪টি কমোড ও ২টি সাধারণ), ১টি সেমিনার কক্ষ, একটি মিনি লাইব্রেরী আছে যেখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই নাই। ভবনে ৬টি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র আছে। তবে যন্ত্রগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ।

১২. মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন - খুলনা

খুলনা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি শহরের এক প্রান্তে অর্থাৎ ৭৪, খান জাহান আলী রোড, ফেরিঘাট এলাকায় অবস্থিত। ভবনের আশে-পাশে দোকানপাট, হোটেল ও অফিস, ইত্যাদি অবস্থিত। ভবনের চারিপাশে সীমানা প্রাচীর আছে। ভবনের মূল ফটকে 'নাম ফলক' আছে। মূল ফটকের পাশের বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। ভবনটি ৩ রা মার্চ ২০১৮সালে ভবনটির উদ্বোধন করা হয়।

ভবনটিতে শুধুমাত্র নীচতলায় র‍্যাম্প আছে। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটির নিচতলায় ৫ টি দোকান আছে। দোকান সমূহ ভাড়া দেওয়া হয় নাই। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি অফিসিয়ালি হস্তান্তরিত হয় না হওয়ায় ভবনের জন্য আসবাব পত্র গ্রহণ করা হয় নাই।

৩য় তলায় জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, জেলা সহকারি বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস ১টি কক্ষ, ৩টি টয়লেট(২টি কমোড ১টি সাধারণ), ১টি সেমিনার কক্ষ, একটি মিনি লাইব্রেরী আছে যেখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই নাই। ২টি বেসিন, ২ টি আয়না আছে।

যেহেতু ভবনটি অফিসিয়ালি হস্তান্তরিত হয় নাই সেহেতু এই ভবনের জন্য কোন মেশিনারী এবং অফিস সরঞ্জামাদি বা আসবাবপত্র কেন্দ্র হতে প্রদান করা হয় নাই। ভবনটিতে ৬টি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র আছে তবে এগুলো মেয়াদউত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ফ্যান - ২৮টি (৩টি ব্যবহৃত হচ্ছে)। ভবনের ছাদ সমান মাঝখানে উঁচু করা হয় নাই।



৩.১৩ স্থানীয় পর্যায়ে মত বিনিময় কর্মশালা


ভাওয়াল সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুর গত ১৯ মে ২০২১ ইং তারিখে স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. গাজী মো: সাইফুজ্জামান, প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এস.এম. তরিকুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, গাজীপুর। সভায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব পুলক কান্তি বড়ুয়া, পরিচালক, সেক্টর-১, আইএমইডি ও জনাব আমিনুর রহমান, সহকারি পরিচালক, সেক্টর-১, আইএমইডি। সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা বিষয়ক গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জনাব মো: সাইদুর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, উন্নয়ন ধারা। সভা পরিচালনা ও মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মামুন সরদার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, গাজীপুর। কর্মশালায় গাজীপুরের ৩০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ, আইএমইডি এর কর্মকর্তাবৃন্দ, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যান্য অংশীজনসহ সভায় মোট ৪০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালাটি সকাল ১১:০০ মিনিটে শুরু হয়ে বেলা ১:১৫ মিনিটে শেষ হয়।

কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্য

- স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা।
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা বিষয়ক তথ্য উপস্থাপন করা।
- গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করা।
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চলমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং সম্ভাব্য সমাধান বের করা।
- প্রকল্পের সবল এবং দুর্বল দিক চিহ্নিত করা এবং সম্ভাব্য সমাধান বের করা।
- মূলত এই উদ্দেশ্যগুলি সামনে রেখেই এই কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অংশীজন কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

কর্মশালা হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

কর্মশালার শুরুতেই পরিচিতি পর্বের মাধ্যমে উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারী পরিচিত হন। এরপর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব ড. গাজী মো: সাইফুজ্জামান কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ও শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। প্রধান অতিথি মহোদয় তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন এই প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধানত কি



কি অন্তরায় রয়েছে, কতবার ও কেন প্রকল্প সংশোধনী হয়েছে, বর্তমানে সমস্যা কি আছে ও কিভাবে সমাধান করা যায়? এই প্রকল্প এর ফলে কি কি লাভ হয়েছে/হবে? এই সমস্ত বিষয়ে কর্মশালায় সকল অংশগ্রহণকারী ও স্টেক হোল্ডারদের কে তাদের মতামত জানাতে অনুরোধ করেন। সম্মানিত প্রধান অতিথির আলোচ্য বিষয় এবং কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে সন্নিবেশিত করে কর্মশালার মডারেটর পরবর্তী আলোচনা শুরু করেন। এরপর সভার সভাপতি জনাব এস.এম. তরিকুল ইসলাম শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। সভাপতির শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা বিষয়ক গবেষণার তথ্য উপস্থাপন করেন জনাব মো: সাইদুর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, উন্নয়ন ধারা। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা বিষয়ক গবেষণার তথ্য উপস্থাপন করার পর মূলত উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের মতামত কর্মশালায় তুলে ধরেন যা নিম্নরূপ:

কর্মশালায় উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অংশীজনদের মতামতসমূহ

প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

- বর্তমান সরকারের সময়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি (৩ হাজার থেকে ২০ হাজার) এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং যার কারণে বীর মুক্তিযোদ্ধারা পরিবার পরিজন নিয়ে বাঁচতে পারছে।
- সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ হওয়ায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মিলিত হওয়ার জন্য একটি স্থায়ী ঠিকানা হয়েছে, সকলে একসাথে বসে মত বিনিময় করতে পারি।
- নিচতলা এবং দোতলার ভাড়া থেকে যে অর্থ আয় হবে তা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয় হবে।
- সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়েছে।

প্রকল্পের দুর্বলদিক

- মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন ভাড়া থেকে যে আয় হচ্ছে তা মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে না।
- বয়স ও শারীরিক সমস্যার কারণে বীর মুক্তিযোদ্ধারা তিনতলায় উঠতে পারে না।



প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবনাসমূহ

- গাজীপুর মহানগর মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের জন্য প্রস্তাব করা হয়।
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এককালীন ১৫ লক্ষ টাকা বিনা সুদে লোন দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়।
- মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে লিফট সংযোজন করা অতীব জরুরী তাই লিফট সংযোজন করা প্রয়োজন।
- মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের আয় থেকে প্রদত্ত অর্থ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসায় ব্যয় করা প্রয়োজন।
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারিভাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা প্রয়োজন।

৩.১৪ ভবন ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা

কমপ্লেক্স ভবন সংক্রান্ত

দেশের ৬৪ জেলায় সরকার কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে প্রদত্ত ৫ (পাঁচ) কাঠা জমির উপর মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হবে। ৫ তলা ফাউন্ডেশনের উপর বর্তমানে ৩ তলা নির্মাণ করা হবে। ১ম তলায় দোকান, ২য় তলায় কমিউনিটি সেন্টার ও ৩য় তলায় জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ড কাউন্সিলের দফতর হবে। ৩য় তলায় ১টি কক্ষ লাইব্রেরী এবং ১টি কক্ষ চিকিৎসার জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ব্যবহার সংক্রান্ত

- নির্বাচিত কমিটি/জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের ৩য় তলা তাদের দাপ্তরিক কাজ ও জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মিলন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করবেন।
- কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া প্রদান ও দোকান বরাদ্দ/ভাড়া প্রদানের বিষয়টি জেলা প্রশাসনের সহায়তায় গঠিত কমিটির মাধ্যমে জেলা কমান্ড পরিচালনা করবেন।
- কমপ্লেক্স ভবনটি দেখাশোনা করা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা জেলা কমান্ডের দায়িত্ব। প্রতিষ্ঠানের অমর্যাদা হয় এমন কোন কাজ অবশ্যই করা যাবে না।
- কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া কমিটি কর্তৃক প্রতি বৎসর নির্ধারিত হবে। দোকান বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।
- দোকান ভাড়া প্রতিযোগিতামূলক ভাবে হবে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ অগ্রাধিকার পাবে।
- কমিউনিটি সেন্টার ভাড়ার ক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে ৫০% ভাড়া দিতে হবে।

আর্থিক বিষয়

- কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া প্রদান ও দোকান বরাদ্দ/ভাড়া দিয়ে উপার্জিত অর্থ ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হবে ১০%। কমান্ড কাউন্সিলের দাপ্তরিক কাজে ব্যয় করা হবে ২০% এবং স্থানীয় অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান খাতে ব্যয় হবে ৬০%, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রচার প্রচারণা ও বিভিন্ন দিবস পালন ১০%।
- জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি উক্ত অর্থ ব্যয়/বিতরণের দায়িত্ব পালন করবেন।
- আদায়কৃত অর্থ জেলা প্রশাসক/তার মনোনীত প্রতিনিধির তত্ত্বাধানে ব্যাংকে গচ্ছিত থাকবে এবং জেলা প্রশাসক, জেলা কমান্ডার স্বাক্ষরে ব্যাংক থেকে অর্থ বিল আকারে উত্তোলিত হবে।
- প্রতি ৬ মাসে আয় ব্যয়ের হিসাব জেলা প্রশাসকের বরাবরে দাখিল করতে হবে এবং প্রতি বছর জেলা প্রশাসক আয়-ব্যয়ের হিসাব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলে প্রেরণ করবে।
- জেলা কমান্ডার ও স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি আর্থিক অনুদানের বিষয়টি চূড়ান্ত করবে। জেলা প্রশাসক উক্ত কমিটি গঠন করবেন।

প্রকল্প সমাপ্তির পর মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন পরিচালনা নীতিমালাঃ

সকল জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স প্রকল্পটি সমাপ্তির পর ভবন সমূহ পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করা হবেঃ

- জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিকট হস্তান্তর করা হবে।
- সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনটি গণপূর্ত বিভাগের অধীনে বুক ট্রান্সফার হবে এবং গণপূর্ত বিভাগসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করবে।
- কমপ্লেক্সটি পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হবে। কমিটিতে জেলা প্রশাসক সভাপতি, জেলা কমান্ডার সহ-সভাপতি, জেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, সিভিল সার্জন, জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা তথ্য অফিসার, জেলা ডেপুটি কমান্ডার-১ সদস্য সচিব।
- প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স পরিচালনার জন্য ১জন কেয়ারটেকার, ১জন কম্পিউটার অপারেটর, ১জন পিয়ন (এমএলএসএস), ২জন গার্ড নিয়োগ করা হবে।

সূত্র: ডিপিপি

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ বিশ্লেষণ

সবলদিক-দুর্বলদিক, সুযোগ-ঝুঁকি বিশ্লেষণ

সবল-দুর্বল, সুযোগ-ঝুঁকি বিশ্লেষণ একটি কৌশলভিত্তিক আধুনিক পন্থা যা' চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। কোন প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকি চিহ্নিত করার মাধ্যমে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক করা হয়। এটি প্রকল্প মূল্যায়নকে অধিকতর অর্থবহ করে তোলে এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক পরামর্শ/দিকনির্দেশনা প্রদান এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে সবলদিক, দুর্বলদিক, ঝুঁকি ও সুযোগসমূহ কী কী ছিল তা আলোচনা করা হলো।

বীর মুক্তিযোদ্ধা, জেলা প্রশাসক ইত্যাদি লোকের সাথে সাথে সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা (এফজিডি), প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্পের সবল ও দুর্বলদিকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪.১ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

- ৪.১.১ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিকে উজ্জ্বল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তুলে ধরার একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে।
- ৪.১.২ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের উপার্জন থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা।
- ৪.১.৩ জাতীয় দিবসে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা।
- ৪.১.৪ এই ভবনের আয় থেকে অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা, যাতে তারা এই অনুদানের অর্থ দিয়ে স্বচ্ছল জীবন যাপন করতে পারে।
- ৪.১.৫ তথ্য-প্রযুক্তি, আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ৪.১.৬ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্থায়ী একটি অফিসের ব্যবস্থা হয়েছে যেখানে বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও ডেপুটি কমান্ডারের অফিস এবং সভা সেমিনার ইত্যাদি ব্যবস্থা করা।
- ৪.১.৭ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এই ভবনটি একটি প্লাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে।
- ৪.১.৮ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে পরবর্তী জেনারেশন স্বাবলম্বী হবার সুযোগ পায়
- ৪.১.৯ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের এই কমপ্লেক্স এর সাথে সংযুক্ত করা যাতে তারা আগামীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক ও বাহক হতে পারে

৪.২ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ

- ৪.২.১ ভবনটির নকশা তৈরী করার সময় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স বিবেচনা করা হয়নি। কারণ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভবনের তিন তলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও ডেপুটি কমান্ডারের অফিস এবং সভা সেমিনার ইত্যাদি ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শারীরিক অবস্থা ও বয়স বিবেচনায় তাদের পক্ষে ভবনের ৩ তলায় অফিস করা সম্ভব হচ্ছে না।
- ৪.২.২ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের র‍্যাম্প কোন কাজেই ব্যবহার হচ্ছে না। যে সকল ভবন ভাড়া দেয়া হয়েছে এর মধ্যে অধিকাংশই দোকান/হোটেল হিসেবে ভাড়া দেয়া হয়েছে এবং কয়েকটি স্কুল হিসেবে ও ভাড়া দেয়া হয়েছে। এই সকল দোকানে আগত ক্রেতা বা শিক্ষার্থীরা এই সকল র‍্যাম্প ব্যবহার করছে না।
- ৪.২.৩ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের সামনের দেয়াল যে ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যা দেখে মনে হয় না যে নিচ তলায় দোকান আছে। ফলে ভবনসমূহ ভাড়া দিতে সমস্যা হচ্ছে। অন্যদিকে যে সকল ভবনসমূহ ভাড়া দেয়া হয়েছে সেই

সকল ভাড়াটিয়ারা সমানের দেয়াল ভেঙ্গে নিজেদেরমত করে তৈরী করে নিয়েছে।

- ৪.২.৪ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এর মূল নকশা অনুযায়ী প্রত্যেকটি ভবনের নিচ তলায় ৯টি করে দোকানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অথচ দোকানের ভাড়াটিয়া বা ক্রেতা সাধারণের জন্য কোন প্রকার টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়নি।
- ৪.২.৫ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এর মূল নকশা অনুযায়ী প্রত্যেকটি ভবনের নিচ তলায় ৯টি করে দোকানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাস্তবে কোন কোন ভবনে দোকানের জন্য ৯-১৯ টি রুম তৈরী করা হয়েছে। ফলে দোকানের সাইজ এত ছোট হয়েছে যে ভাড়াটিয়ারা দোকান ভাড়া নিতে চায় না।
- ৪.২.৬ রক্সবাজার, বান্দরবান ও রাজশাহী জেলার তিনটি ভবনের মূল নকশা (ডিপিপি তে অনুমোদিত) পরিবর্তন করা হয়েছে। অপরদিকে চট্টগ্রাম জেলার ভবনের একটি রুম এর ডিজাইন পরিবর্তন করে একটি রুম মিউজিয়াম করা হয়েছে।
- ৪.২.৭ চট্টগ্রাম জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের মেইন ডোর এর চৌকাঠ ও পাল্লার কাঠ (সেগুন) এর পরিবর্তে ফরমিকার এবং পার্টেক্স বোর্ড সমন্বয়ে তৈরী করা হয়েছে। এর ফলে কাজের গুণগতমান এবং স্থায়ীত্ব উভয়েই নষ্ট হয়ে যাবে।
- ৪.২.৮ বান্দরবান জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে পানির সংযোগ না থাকা ও ব্যবস্থাপনার অভাবে সেনেটারী/প্লাস্টিং ফিটিংস ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
- ৪.২.৯ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করার সময় এই সকল ভবনের জন্য বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সমঞ্জামাদি ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে অধিকাংশ ভবনের আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি নষ্ট হয়ে গেছে।

৪.৩ প্রকল্পের সুযোগসমূহ

- ৪.৪.১ বাংলাদেশের সকল জেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এর সাথে বীর মুক্তিযোদ্ধারা সরাসরি জড়িত হতে পারছে ফলে এর উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে এবং রক্ষণাবেক্ষণে বীর মুক্তিযোদ্ধারা অবদান রাখতে পারছে।
- ৪.৪.২ যেহেতু ভবনের ৩য় তলায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যক্রমে পরিচালনার জন্য অফিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং নিচ তলা ও ২য় তলা ভাড়া দিয়ে যে আয় হবে তা দিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যবহার করা হবে। এর ফলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মালিকানা তৈরি হচ্ছে।
- ৪.৪.৩ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানেরা পরবর্তীতে এই সকল ভবন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

৪.৪ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ

- ৪.৩.১ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
- ৪.৩.২ ঝালকাঠি জেলাতে কেস চলছে। ফলে ভবনটি বিগত ৩-৪ বছর পূর্বে হস্তান্তর হলেও ভাড়া দেয়া সম্ভব হয়নি।
- ৪.৩.৩ কোন কোন ভবন সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কিন্তু ভাড়া থেকে আয় না হওয়ায় সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না।

পঞ্চম অধ্যায়

পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ

- ৫.১ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত মোট ৬২ টি ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তর করা হয়েছে। একটি ভবনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু হস্তান্তর হয় নাই (খুলনা)। অপরদিকে, একটি ভবনের কাজ বর্তমানে চলমান (ঢাকা জেলা)। এ ক্ষেত্রে বলা যায় প্রায় ১০০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- ৫.২ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের তিন তলা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও ডেপুটি কমান্ডারের অফিস এবং সভা সেমিনার ইত্যাদি ব্যবস্থা করা হয়েছে। বরিশালে বীর মুক্তিযোদ্ধারা অন্য একটি ভবনে অফিস করছে এবং কক্সবাজারে ভবনের নিচ তলা বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অফিস হিসেবে ব্যবহার করছে।
- ৫.৩ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের মূল নকশা অনুসারে প্রত্যেকটি ভবনে একটি করে র‍্যাম্প এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নকশা অনুসারে প্রত্যেকটি ভবনেই একটি করে র‍্যাম্প তৈরী করা হয়েছে।
- ৫.৪ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের সামনের দেয়াল যে ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যা দেখে মনে হয় না যে ভবনের নিচ তলায় কোন দোকান আছে। ফলে ভবনসমূহের নিচ তলা ভাড়া দিতে সমস্যা হচ্ছে। অন্যদিকে যে সকল ভবনসমূহ ভাড়া দেয়া হয়েছে সেই সকল ভাড়াটিয়ারা সামনের দেয়াল ভেঙে নিজেদের মত করে তৈরী করে নিয়েছে।
- ৫.৫ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এর মূল নকশা অনুযায়ী কোন টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়নি।
- ৫.৬ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এর মূল নকশা অনুযায়ী প্রত্যেকটি ভবনের নিচ তলায় ৯টি করে দোকানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাস্তবে কোন কোন ভবনে ৯-১৯ টি দোকান নির্মাণ করা হয়েছে।
- ৫.৭ কক্সবাজার, বান্দরবান ও রাজশাহী জেলার তিনটি ভবনের মূল নকশা (ডিপিপি তে অনুমোদিত) পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ৫.৮ চট্টগ্রাম জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের মেইন ডোর এর চৌকাঠ ও পাল্লার কাঠ (সেগুন) এর পরিবর্তে ফরমিকার এবং পার্টেক্স বোর্ড সমন্বয়ে তৈরী করা হয়েছে।
- ৫.৯ বান্দরবান জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে পানির সংযোগ না থাকায় এবং ব্যবস্থাপনার অভাবে সেনেটারী, প্লাস্টিং ফিটিংস ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
- ৫.১০ বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন ভাড়া দিয়ে যা আয় হচ্ছে তা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ বর্তমানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কোন কমিটি নাই।
- ৫.১১ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করার সময় এই সকল ভবনের জন্য বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে অধিকাংশ ভবনের আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি নষ্ট হয়ে গেছে।
- ৫.১২ দশ বছর যাবৎ চলমান একটি প্রকল্পে ১৫ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। এদের মধ্যে ৭ জন ছিলেন অতিরিক্ত দায়িত্বে।
- ৪.১৩ কোন কোন ভবনের বিদ্যুৎ সংযোগ নাই।
- ৪.১৪ নাটোরের কমপ্লেক্স ভবনের বিভিন্ন স্থানের টাইলস ফেঁটে এবং ভেঙে গেছে।
- ৪.১৫ রাজশাহীতে ভবনের নিচতলা এবং দ্বিতীয় তলার আর্কিটেকচারাল প্লান পরিবর্তন করা হয়েছে (যার কোন ড্রইং পাওয়া যায়নি)। অপরদিকে, কলাম থেকে প্রপার্টি লাইন (বাউন্ডারী ওয়াল) পর্যন্ত প্রথম তলার স্লাব বর্ধিত করা হয়েছে যা ডিজাইন এবং ড্রইংয়ে নেই। কোন অনুমোদন নেই।
- ৪.১৬ যে সকল ভবন ২-৩ বছর পূর্বে হস্তান্তর করা হয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভাড়া দেয়া সম্ভব হয়নি, সেই সকল ভবনে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভেতরের ফিটিংস, আসবাব পত্র ও ওয়াল নষ্ট হচ্ছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সুপারিশসমূহ

- ৬.১ ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নের জন্য পৃথক সময়/আলাদা প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- ৬.২ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের সময় Materials Test এর জন্য আলাদা বাজেট চুক্তি পত্রে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এবং এই খরচ বাজেটে including না করে Excluding অবস্থায় রাখা হলে ঠিকাদারগণকে Test করার জন্য Accountable করা যাবে।
- ৬.৩ চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজে সময় বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় বিধি অনুসরণ করা প্রয়োজন এবং বর্ধিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত না হলে Contractor কে Penalty (সরকারি নিয়ম অনুযায়ী) করা আবশ্যিক।
- ৬.৪ সাইটে গণপূর্ত প্রকৌশলীগণ যে সকল সুপারিশ প্রদান করেন তার ফলো-আপের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সাইটে ষ্টক রেজিস্টারি maintain করতে হবে। প্রত্যেকবার ঢালাইয়ের সময় উপকরণ টেস্ট নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- ৬.৫ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন ভাড়াটিয়ারা তাদের সুবিধামত বিভিন্ন ফ্লোরের আর্কিটেকচারাল প্লান পরিবর্তন করছে, এ ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
- ৬.৬ নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে কোন ভবনের মূল নকশা (ডিপিপি তে অনুমোদিত) পরিবর্তন করা হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ করা প্রয়োজন এবং অনুমোদনের কপি সংশ্লিষ্ট অফিসে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে।
- ৬.৭ যে সকল ভবনে পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ সমস্যা রয়েছে তার সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- ৬.৮ DPP ও RDPP তৈরী করার সময় যথাযথভাবে লগফ্রেম তৈরী করা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ যেন লগফ্রেমে প্রতিফলন হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।
- ৬.৯ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স এবং শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে তাদের পরিবর্তে তাদের সন্তানদের জন্য আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।
- ৬.১০ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের আয় থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম (স্বাস্থ্য সেবা, আর্থিক সাহায্য) প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ৬.১১ আনুভূমিক ফাটল গুলি প্লাস্টার চটিয়ে সিমেন্টের সাথে কেমিক্যাল মিশিয়ে পুনরায় প্লাস্টার করতে হবে। এক্ষেত্রে ওয়ালের ভিতরে ও বাহিরে ১/২ ইঞ্চি গ্রপ করে নিতে হবে। অবশিষ্ট ভবনগুলোতে নিয়মানুযায়ী রং করা যেতে পারে।

উপসংহার

মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি স্থায়ী প্ল্যাটফর্ম। এর মাধ্যমে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধারা একত্রিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তুলে ধরতে পারবে। ভবনের নিচ তলা ও ২য় তলার আয় দিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া এই ভবনের আয় দিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। জাতীয় দিবসে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে দেশ প্রেম জাগিয়ে তোলা হবে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ভবনটি যাতে ব্যবহার করা যায় তার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সংযুক্তি -১

সাইট পরিদর্শন প্রতিবেদন

১. প্রকল্প এলাকা: গাজীপুর

বিগত ২৯ মার্চ ২০২১ গাজীপুর জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন টি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টিম লিডার, নির্বাহী কর্মকর্তা, মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার, আর্থ-সামাজিক পরামর্শক এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। ভবনটি নির্মাণ কাজের জন্য পত্রিকায় টেন্ডার প্রকাশিত হয় ১০ ই আগস্ট ২০১৫। ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১১ নভেম্বর ২০১৫ সালে। চুক্তি অনুযায়ী ভবনটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার কথা ১০ আগস্ট ২০১৬। প্রকৃত পক্ষে সমাপ্ত হয়েছে ১৪/৮/২০১৭ সালে। সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে ভবনটির নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে ভবনটি হস্তান্তর ও উদ্বোধন করা হয়েছে। ভবনটি নির্মাণ কাজে প্রিমিয়াম সিমেন্ট ও বিএসআই রড ব্যবহার



করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণসমূহ

১. প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির ১০০%।
২. প্রয়োজনীয় পরিমাণ materials এর Test report পাওয়া যায়নি।
৩. ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক False Test report জমা দেয়া হয়েছে (সংযুক্ত)।
৪. ছাদে অবস্থিত পানির ট্যাংকির নিচে এবং ছাদের টপ লেভেল বরাবর গাঁথুনিতে ফাটল দেখা দিয়েছে।
৫. গাঁথুনি ও প্লাস্টারে পর্যাপ্ত পরিমাণ কিউরিং না করার কারণে প্লাস্টারের বাহিরের সারফেসে ফাটল দেখা দিয়েছে।
৬. টপ ছাদের উপরে এসি স্লাব ব্যতিত উন্মুক্ত স্থানে সেটিং করার কারণে বৃষ্টি/পানিতে এসি তে ময়লা জমেছে এবং ২টি এসি নষ্ট হয়ে পড়ে আছে।
৭. ছাদের স্লোপে বৃষ্টি/পানি নিষ্কাশন লাইনের মুখ বন্ধ অবস্থায় রয়েছে।
৮. দরপত্রের PCC (Particular Conditions of Contract) অনুচ্ছেদ ৪২ এ উল্লেখ আছে যে, চুক্তিনামা স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক Program of Works দাখিল করতে হবে যা ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে। এ বিষয়ক কোন নথি পাওয়া যায়নি।

২. প্রকল্প এলাকা: ঝালকাঠি

বিগত ৩১ মার্চ ২০২১ ঝালকাঠি জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন টি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার, আর্থ-সামাজিক পরামর্শক ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। ভবনটি নির্মাণ কাজের জন্য নাহার কনস্ট্রাকশন নামে একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৮/৩/২০১২ সালে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পটি সমাপ্ত করার তারিখ ২৭ জুন ২০১৩ সালে, কিন্তু সমাপ্ত হয়েছে ১৪/৮/২০১৫ সালে। বিগত ৩১ মার্চ ২০২১ ইং তারিখে সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে প্রকল্পটি ইতোমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বিগত ২২ অক্টোবর ২০১৫ সালে জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি. মাননীয়



মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ভবনটি উদ্বোধন করেন।

পর্যবেক্ষণসমূহ

১. প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির ১০০%।
২. প্রয়োজনীয় পরিমাণ materials এর Test report পাওয়া যায় নাই।
৩. ছাদের পানি ট্যাংকির নিচে অতিরিক্ত স্লাব বা পেটেন স্টোন ঢালাই না করার কারণে ছাদ ডেমেজ হয়ে ক্রাক ধরেছে এবং শ্যাওলা জন্মেছে ফলে ছাদ লিকেজ হয়ে পানি পড়ে।
৪. র‍্যাম্প এর স্লোপ যথাযথভাবে তৈরী করা হয়নি এবং র‍্যাম্প কিছু অংশে রেলিং ভেঙে গেছে।
৫. দীর্ঘদিন যাবৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার অভাবে ভবনের দেয়াল ও প্লাস্টার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
৬. ভবনের দুই পার্শ্বে ও পিছনের বিভিন্ন স্থানে ময়লা/আবর্জনা রয়েছে।
৭. ছাদে বৃষ্টি/পানি নিষ্কাশন লাইন যথাযথভাবে না হওয়ার কারণে এবং ছাদের রেলিং এর পাইপ নিচ পর্যন্ত না থাকার কারণে বৃষ্টির পানি ছাদের উপর থেকে নিচে বিল্ডিংয়ে ছড়িয়ে পড়ে ফলে ভবনের বাহিরের ওয়াল এবং প্লাস্টার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
৮. দরপত্রের PCC (Particular Conditions of Contract) অনুচ্ছেদ ৪২ এ উল্লেখ আছে যে, চুক্তিনামা স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক Program of Works দাখিল করতে হবে যা ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে। এ বিষয়ক কোন নথি পাওয়া যায়নি।

৩. প্রকল্প এলাকা: বরিশাল

বিগত ৩১ মার্চ ২০২১ বরিশাল জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন টি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার, আর্থ-সামাজিক পরামর্শক এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান খাঁন এবং টিপু (JV) সাথে ১৪ জানুয়ারী ২০১৩ সালে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্প কাজ ১৩ অক্টোবর ২০১৩ সালে সমাপ্ত হওয়ার কথা। বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী ২০১৮ সালে বরিশাল জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।



পর্যবেক্ষণসমূহ

১. প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির ১০০%।
২. প্রয়োজনীয় পরিমাণ materials এর Test report পাওয়া যায় নাই।
৩. তৃতীয় তলায় টয়লেটের বাহিরের ওয়াল ডেমেজ হয়ে প্লাস্টার খসে পড়ছে।
৪. টপ স্লাবে রেইন ওয়াটার লাইনের মুখে নেট দেখা যায়নি।
৫. চিলেকোঠার উপরে রেলিং এর গোড়ায় ক্রাক দেখা দিয়েছে।
৬. ভবনের তৃতীয় তলায় সেনিটারী ফিটিংস ব্যবহার না করার ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
৭. দরপত্রের PCC (Particular Conditions of Contract) অনুচ্ছেদ ৪২ এ উল্লেখ আছে যে, চুক্তিনামা স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক Program of Works দাখিল করতে হবে যা ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে। এ বিষয়ক কোন নথি পাওয়া যায়নি।

৪. প্রকল্প এলাকা: নাটোর

বিগত ১১ এপ্রিল ২০২১ নাটোর জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন টি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার, আর্থ-সামাজিক পরামর্শক এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর এর উপ সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি হয়েছে ৩০/৪/২০১২ এবং সমাপ্ত হয়েছে ১৪/৮/২০১৪ সালে।




পর্যবেক্ষণসমূহ:

১. প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির ১০০%।
২. প্রয়োজনীয় পরিমাণ materials এর Test report পাওয়া যায় নাই।
৩. ভবনের জন্য তৈরী করা র‍্যাম্পের দুইপাশে রেলিং নাই যা একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনের জন্য যুকিপূর্ণ।
৪. ভবনের চিলেকোঠার ছাদে ক্রাক তৈরী হয়েছে।
৫. চিলেকোঠার ছাদের উপরে জিআই পাইপ নষ্ট হয়ে অনবরত পানি পড়ে ছাদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
৬. ভবনের বিভিন্ন স্থানের টাইলস ফেটে এবং ভেঙে গেছে।
৭. ভবনের ভিতরে লম্বালম্বি ফাটল দেখা দিয়েছে।
৮. ভবনের নিচতলায় ১২ টি দোকান রয়েছে যা ভাড়া না হওয়ার কারণে সার্টার, কলাপসিপল গেইট এর নিচের রেইল স্লাইডিং ও ফ্লাট বার মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
৯. ভবনের ২য় তলায় বৈদ্যুতিক লাইনে সমস্যার কারণে লাইট, ফ্যান কোন কিছুই চলে না।
১০. দরপত্রের PCC (Particular Conditions of Contract) অনুচ্ছেদ ৪২ এ উল্লেখ আছে যে, চুক্তিনামা স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক Program of Works দাখিল করতে হবে যা ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে। এ বিষয়ক কোন নথি পাওয়া যায়নি।

৫. প্রকল্প এলাকা: ময়মনসিংহ

বিগত ১০ এপ্রিল ২০২১ ময়মনসিংহ জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন টি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার, আর্থ-সামাজিক পরামর্শক এবং PWD এর সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পটি শুরু হয়েছে ১৪/৫/২০১২ এবং সমাপ্ত হয়েছে ২০/৮/২০১৫।

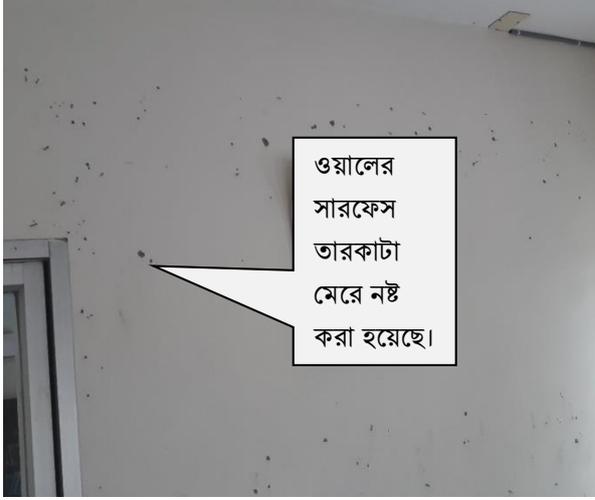

পর্যবেক্ষণসমূহ

১. প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির হয়েছে ১০০%।
২. প্রয়োজনীয় পরিমাণ materials এর Test report পাওয়া যায় নাই।
৩. ভবনের নিচ তলার আর্কিটেকচারাল প্লান পরিবর্তন করে ৯টি দোকানের পরিবের্তে ১২ টি দোকান করা হয়েছে (যার ড্রইং আছে)।
৪. ভবনের দ্বিতীয় তলার সিঁড়ির দেয়ালে প্লাস্টার ও রং দেয়াল থেকে খসে পড়ছে।
৫. ভবনের ছাদের উপরে দুইটি সোলার প্যানেল রয়েছে যা রক্ষণাবেক্ষণ না করার কারণে নষ্ট অবস্থায় আছে।
৬. ভবনের তৃতীয় তলার মাঝখানের ওয়ালের সারফেসে প্রচুর তারকাটা লাগানোর কারণে ওয়ালের প্লাস্টার সারফেস নষ্ট হয়ে গেছে।
৭. দরপত্রের PCC (Particular Conditions of Contract) অনুচ্ছেদ ৪২ এ উল্লেখ আছে যে, চুক্তিনামা স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক Program of Works দাখিল করতে হবে যা ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে। এ বিষয়ক কোন নথি পাওয়া যায়নি।

৬. প্রকল্প এলাকা: ঢাকা

বিগত ৪ মে ২০২১ ঢাকা জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন টি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার, আর্থ-সামাজিক পরামর্শক এবং PWD এর সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পটি শুরু হয়েছে ১৮/১০/২০১৬ এবং সমাপ্ত হবার কথা ৩১/৩/২০২১। কিন্তু ৪/৫/২০২১ তারিখে সরেজমিনে ভিজিট করে দেখা গেছে যে কাজটির মাত্র ৯৫% সমাপ্ত।




পর্যবেক্ষণসমূহ

১. বর্তমানে ভবনের প্রায় ৯৫% কাজ সমাপ্ত হয়েছে
২. বর্তমানে প্রকল্পটি নির্মাণাধীন অবস্থায় রয়েছে। নকশা অনুসারে কাজ করা হয়নি
২. কোন টেস্ট রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।
৩. ভবনের নিচতলায় বিদ্যুৎ লাইন টানা হয়েছে।
৪. ২য় ও ৩য় তলায় জিআই তার লাগানো হয়েছে।
৫. ভবনের র‍্যাম্প এর পাশে ফাটল দেখা দিয়েছে। এবং র‍্যাম্পটি যে পাশে লাগানো হয়েছে সেই পাশে কোন রাস্তা নাই
৬. প্লাস্টার ফিনিশিং বিভিন্ন স্থানে ভালো ভাবে করা হয়নি। বিভিন্ন স্থানে প্লাস্টারের ফাটল দেখা দিয়েছে।
৭. ভবনের ছাদে চিলেকোঠা নির্মাণ করা হয়নি।
৮. ভবনের ছাদে রেইন ওয়াটার লাইন এর মুখে জালি নেই।
৯. Facing bricks ও cobbar এর কারনে front face out looking অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে।
১০. দরপত্রের PCC (Particular Conditions of Contract) অনুচ্ছেদ ৪২ এ উল্লেখ আছে যে, চুক্তিনামা স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক Program of Works দাখিল করতে হবে যা ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে। এ বিষয়ক কোন নথি পাওয়া যায়নি।

৭. প্রকল্প এলাকা: নারায়নগঞ্জ

বিগত ৩ মে ২০২১ নারায়নগঞ্জ জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন টি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার, আর্থ-সামাজিক পরামর্শক এবং PWD এর সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পটি শুরু হয়েছে ১৭/৪/২০১৫ এবং সমাপ্ত হয়েছে ১৭.৮.২০১৮

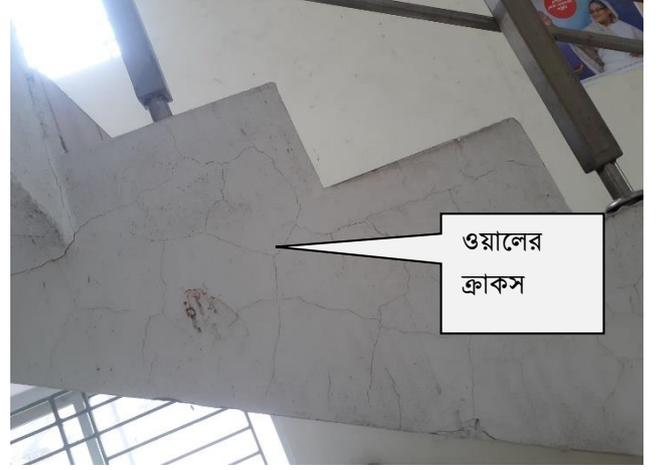


পর্যবেক্ষণসমূহ:

১. কোন টেস্ট রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।
২. ভবনের সিড়িতে কিছু কিছু স্থানে ফ্রাক দেখা দিয়েছে।
৩. ভবনের ২য় তলায় রুমে প্রবেশ করার আগে দরজার উপরিভাগে ফ্রাক দেখা গিয়েছে।
৪. ভবনের ছাদে পানির পাইপ লাইনে ফাটল থাকার কারণে ছাদে শ্যাওলা জমে গিয়েছে।
৫. ভবনের ছাদে রেইন ওয়াটার লাইন এর মুখে জালি নেই।
৬. বীর মুক্তিযোদ্ধারা ভবনের ছাদে একটি রান্নাঘর নির্মাণ করেছে।
৭. ভবনের সিড়িতে কিছু কিছু রাইজার উচু যার কারণে দৃষ্টিহীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
৮. নারায়নগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এর নিচ তলাতে নয়টি দোকানের পরিবর্তে একটি রেস্টুরেন্ট ভাড়া দেওয়া হয়েছে।
৯. দরপত্রের PCC (Particular Conditions of Contract) অনুচ্ছেদ ৪২ এ উল্লেখ আছে যে, চুক্তিনামা স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক Program of Works দাখিল করতে হবে যা ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে। এ বিষয়ক কোন নথি পাওয়া যায়নি।

৮. প্রকল্প এলাকা: মুন্সিগঞ্জ

বিগত ৩ মে ২০২১ মুন্সিগঞ্জ জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন টি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার, আর্থ-সামাজিক পরামর্শক এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর এর সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পটি শুরু হয়েছে ১১/৪/২০১৪ এবং সমাপ্ত হয়েছে ১৫/৮/২০১৬।

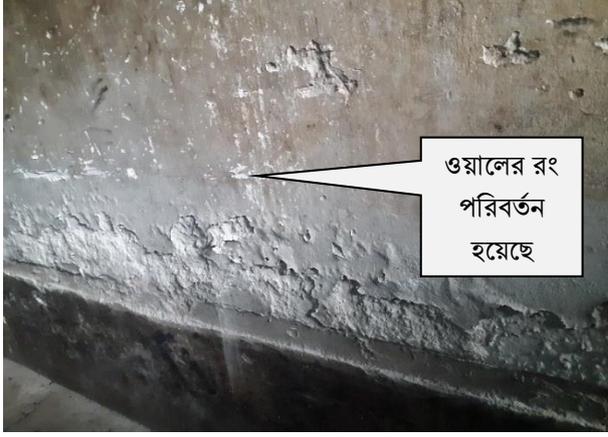

পর্যবেক্ষণসমূহ:

১. কোন টেস্ট রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।
২. সিড়ির টাইলস এ ফাটল দেখা গিয়েছে।
৩. টয়লেটের দেয়ালে টাইলস নেই ১২ পিস (৩য় তলায়)।
৪. টয়লেটের উপরে ফলস্ ছাদের দরজা ভাঙা।
৫. দেয়ালের প্লাস্টার ও হার্ডবোর্ড খসে পড়ছে।
৬. ভবনের ছাদে রেইন ওয়াটার লাইন এর মুখে জালি নেই।
৭. ছাদের উপরে এক পাশে মাটি রাখা আছে সেখানে জংলি গাছ হয়েছে।
৮. রেস্টুরেন্ট এর সকল খাবার ভবনের পিছনে রান্না করা হয়, ফলে যে স্থানে রান্নাকরা হয় সে স্থানের পাশের দেয়াল থেকে প্লাস্টার খসে পড়ছে এবং রান্নার ফলে দেয়ালে কালি দেখা গিয়েছে।
৯. দরপত্রের PCC (Particular Conditions of Contract) অনুচ্ছেদ ৪২ এ উল্লেখ আছে যে, চুক্তিনামা স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক Program of Works দাখিল করতে হবে যা ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে। এ বিষয়ক কোন নথি পাওয়া যায়নি।

৯. প্রকল্প এলাকা: মানিকগঞ্জ

বিগত ৫ মে ২০২১ মানিকগঞ্জ জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন টি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার, আর্থ-সামাজিক পরামর্শক এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরএর সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পটি শুরু হয়েছে ১৪/৪/২০১৪ এবং সমাপ্ত হয়েছে ১৮/৮/২০১৬।



পর্যবেক্ষণসমূহ

১. মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এর বাহিরের প্লাস্টার নষ্ট হয়ে মাটিতে খসে পড়ছে।
২. ভবনের কিছু কিছু স্থানে অতিরিক্ত পুরু প্লাস্টার করার কারণে প্লাস্টারের মাঝে ফাটল দেখা দিয়েছে।
৩. ছাদের উপরে বৃষ্টির পানি নির্গমনের পাইপ নষ্ট হয়ে গেছে, পাইপ দিয়ে পানি পড়ে ভবনের পিছনের দেয়ালে শ্যাওলা পড়ে গেছে এবং প্লাস্টার নষ্ট হয়ে গিয়াছে।
৪. ভবনের থাই ফেব্রিকেশনের কাঁচ ভাংগা।
৫. ভবনটি পরিচর্যার জন্য কোন লোক নাই।
৬. ভার্কিয়াল পাইপ ভেংগে পানি পড়ে ভবনের পিছনের দেয়াল এর প্লাস্টার নষ্ট হয়ে গিয়েছে।
৭. টেস্ট রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে।
৮. দরপত্রের PCC (Particular Conditions of Contract) অনুচ্ছেদ ৪২ এ উল্লেখ আছে যে, চুক্তিনামা স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক Program of Works দাখিল করতে হবে যা ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে। এ বিষয়ক কোন নথি পাওয়া যায়নি।

১০. প্রকল্প এলাকা: কুমিল্লা

বিগত ৬ মে ২০২১ কুমিল্লা জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন টি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার, আর্থ-সামাজিক পরামর্শক এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর এর সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পটি শুরু হয়েছে ৯/৩/২০১৪ এবং সমাপ্ত হয়েছে ১৭/৭/২০১৭।



পর্যবেক্ষণসমূহ

১. ভবনের নিচ তলায় নয়টি দোকান রয়েছে যা ভাড়া হয়নি।
৩. ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার জানালার থাই এর লক নষ্ট।
৪. টয়লেটের উপরে সানসাইট এর মুখে কাঠের দরজা লাগানো হয়েছে।
৫. টয়লেটের ভেন্টিলেটর এর নিচে ফাঁকা দেখা গিয়েছে।
৬. ভবনের দ্বিতীয় তলার প্রবেশ পথে দেয়ালে ক্রাক দেখা গিয়েছে।
৭. টয়লেটের বিদ্যুৎ সংযোগ নাই।
৮. দ্বিতীয় তলার বারান্দাতে শ্যাওলা পড়ে টাইলস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
৯. ভবনের মেইন সুইচের গঠন ঠিক নাই, বাকা ভাবে লাগানো হয়েছে।
১০. ভবনের ছাদের কলাম গুলো ২'-৬" কাষ্টিং করা হয়েছে।
১১. ভবনের ছাদে অনবরত পানি পড়ে ছাদের কার্যকারিতা নষ্ট হচ্ছে।
১২. কোন টেস্ট রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।

সংযুক্তি -২

টেস্ট রিপোর্ট



BANGLADESH UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (BUET)
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY



Mobile: 01819 557 964; PABX: 966 5650-80 Ext. 7226; www.buet.ac.bd/ce/

BRTC No.: 110029425/ 11-12 / CE; Dt. 4/6/12
 Ref.: Memo no. 450; Dt. 3/6/12
 Date of Test: 6/6/12

TENSION TEST OF DEFORMED M.S. BARS [ASTM A 370]

Sent by: Sub-Divisional Engineer
 Manikganj PWD Sub-Division-2, Manikganj
 Project: Construction of Muktiyoddha Sangsad Complex Building at Manikganj

Sl. No.	Frog Mark	Nominal Dia mm	Actual Dia mm	Nominal Area Under Test sq. mm	Actual Unit Weight kg/m	Yield or Proof Load kg	Yield or Proof Strength* kg/cm ²	Average Yield or Proof Strength kg/cm ²	Ultimate Load kg	Ultimate Strength* kg/cm ²	Average Ultimate Strength kg/cm ²	Elongation (%) (Gauge length = 203.2 mm)	Average Elongation (%) (G. length = 203.2 mm)	Bend Test	Rebend Test
1	BSI G60 400	25	24.6	491.00	3.737	22841	4650	4640	35550	7250	7400	17	17	-	-
2	BSI G60 400	25	24.6	491.00	3.743	22841	4650	(66,000 psi)	34945	7100	(105,000 psi)	17	17	-	-
3	BSI G60 400	25	24.6	491.00	3.736	22639	4610	(455 MPa)	38375	7800	(725 MPa)	16	16	-	-
1	BSI G60 400	20	18.7	314.00	2.155	13359	4250	4240	20823	6650	(94,500 psi)	15	16	-	-
2	BSI G60 400	20	18.7	314.00	2.146	13258	4220	(60,500 psi)	20823	6650	(94,500 psi)	15	16	-	-
3	BSI G60 400	20	18.7	314.00	2.157	13359	4250	(416 MPa)	21025	6700	(650 MPa)	17	17	-	-
1	BSI G60 400	16	15.7	201.00	1.521	9122	4540	4640	13762	6850	7000	17	17	-	-
2	BSI G60 400	16	15.9	201.00	1.552	9526	4740	(66,000 psi)	14367	7150	(99,500 psi)	17	17	-	-
3	BSI G60 400	16	15.7	201.00	1.522	9324	4640	(455 MPa)	14166	7050	(685 MPa)	18	18	-	-
1	BSRM XTREME 500W	12	11.9	113.00	0.869	6273	5550	5550	7357	6500	6550	15	16	-	-
2	BSRM XTREME 500W	12	11.9	113.00	0.870	6273	5550	(79,000 psi)	7402	6550	(93,000 psi)	16	16	-	-
3	BSRM XTREME 500W	12	11.9	113.00	0.867	6273	5550	(545 MPa)	7402	6550	(640 MPa)	16	16	-	-
1	BSI G60 400	10	10.2	79.00	0.645	3520	4460	4490	5190	6550	6600	17	16	-	-
2	BSI G60 400	10	10.2	79.00	0.645	3566	4510	(64,000 psi)	5235	6650	(94,000 psi)	16	16	-	-
3	BSI G60 400	10	10.2	79.00	0.643	3566	4510	(440 MPa)	5235	6650	(645 MPa)	16	16	-	-

Minimum Standard Requirements (ASTM A 615)			ASTM A 615M			ASTM A 615/A 615M - 96a)		
Grade	Yield Strength	Ultimate Strength	Grade	Yield Strength	Ultimate Strength	ASTM A 615/A 615M		
	psi (kg/cm ²)	psi (kg/cm ²)		MPa (kg/cm ²)	MPa (kg/cm ²)	Minimum Elongation in 8" (203.2 mm) GL, (%)		
40	40000 (2810)	70000 (4910)	300	300 (3050)	500 (5090)	10 mm	13, 16, 19 mm	22, 25 mm
60	60000 (4210)	90000 (6310)	420	420 (4275)	620 (6295)	11	12	-
75	75000 (5255)	100000 (7015)	520	520 (5275)	690(7010)	9	9	8
						-	7*	7

Minimum Standard Requirements (BDS / ISO 6935-2:1991(E))		
Grade	Yield Strength	Elongation
	N/mm ² or MPa	%
300	300	16
400/400W	400	14
500/500W	500	14

* Strengths are based on nominal area
 Samples were received in sealed condition
 20 mm bars were significantly undersized.

M. Hussaini 9/6/12



Countersigned by: **Dr. Md. Abdur Rouf**; Prof., Dept. of Civil Engg.

Test Performed by: **Dr. Tahmeed M. Al-Hussaini**; Prof., Dept. of Civil Engg.

Important Notes: Samples as supplied to us have been tested in our laboratory. BRTC does not have any responsibility as to the representative character of the samples required to be tested. It is recommended that the samples are sent in a secure and sealed cover/packet/container under signature of the competent authority in order to avoid fraudulent fabrication of test results, it is recommended that all test reports be collected by duly authorized person, and not by the Contractor/Supplier.



Bureau of Research, Testing and Consultancy (BRTC)

Department of Civil Engineering
Chittagong University of Engineering and Technology (CUET)
Chittagong - 4349, Bangladesh

TEST REPORT

Memo No. : BRTC/TEST/CE/2015/981 Date: 21/5/2015
 Supplier : Sub-Divisional Engineer, PWD Hathazari Sub-Division, Rohmatgonj, Chittagong.
 Ref. No. : 25.36.1500.112.14.11/5.2006.1050 Date: 24/11/2014
 Name of the Test : Rod Test
 Location : Construction of all district Muktijoddah Complex Building in Bangladesh one at Chittagong (Civil Sanitary, Deep tube well, Underground water reservoir & internal road).
 Sample : Sealed.

Sample ID (mm)	Dia (mm)	Avg. Dia (mm)	Yield Strength MPa	Avg Yield Strength MPa	Ult. Strength MPa	Avg Ult. Strength MPa	Elongation (%)	Avg. Elongation (%)	Bending	Re Bending
10	10.06	10.00	540.7	-----	622.4	-----	22.63	-----	Satisfactory	Satisfactory
	9.96		526.5		616.4		22.86			
	9.97		-----		-----		-----			
12	12.00	12.03	512.7	-----	623.2	-----	20.36	-----	Satisfactory	Satisfactory
	12.10		513.2		591.5		20.00			
	11.99		-----		-----		-----			
16	16.17	16.16	540.4	-----	623.1	-----	24.86	-----	Satisfactory	Satisfactory
	16.15		527.1		610.1		24.62			
	16.17		-----		-----		-----			
20	19.90	19.90	552.8	-----	649.2	-----	23.74	-----	Satisfactory	Satisfactory
	19.90		549.7		636.5		22.64			
	19.91		-----		-----		-----			

Note: 1 MPa=145.038 psi

Countersigned by

Head

Department of Civil Engineering
Chittagong University of Engineering and Technology.

Test Conducted by

Prof. Dr. Mahmood Omar Imam



Bureau of Research, Testing and Consultancy (BRTC)

Department of Civil Engineering
Chittagong University of Engineering and Technology (CUET)
Chittagong - 4349, Bangladesh


TEST REPORT

Memo No. : BRTC/TEST/CE/2015/981 Date: 21/05/2015
Supplier : Sub-divisional Engineer, Hathazari Sub- Division, Rohmatgonj, Ctg.
Ref. No. : 25.36.1500.112.14.11/5.2006.1050 Date: 24/11/2014
Name of the Test : LA Test of Stone Chips.
Location of the site : Construction of all district Muktijoddah Complex Building in
Bangladesh one at Chittagong (Civil Sanitary, Deep tube well,
Underground water reservoir & internal road).
Sample : Sealed

Table 01: Test of Stone Chips.

Name of the Test	Result	Unit	Remarks
01. Los Angeles Abrasion Test	27.34	%	Sample specimen : "B" Grade as per ASTM C 131

Countersigned by


Head 9/7/15


Department of Civil Engineering
Chittagong University of Engineering and Technology.

Test Conducted by



Mohammad Tarequl Alam

Assistant Professor
Department of Civil Engineering
Chittagong University of Engineering & Technology
Chittagong-4349


Sever
16/8/15



Bureau of Research, Testing and Consultancy (BRTC)

Department of Civil Engineering
Chittagong University of Engineering and Technology (CUET)
Chittagong - 4349, Bangladesh

TEST REPORT

Memo No. : BRTC/TEST/CE/2015/981 Date: 21/05/2015
 Supplier : Sub-divisional Engineer, Hathazari Sub- Division, Rohmatgonj, Ctg.
 Ref. No. : 25.36.1500.112.14.11/5.2006.1050 Date: 24/11/2014
 Name of the Test : FM Test of Coarse Sand.
 Location of the site : Construction of all district Muktijoddah Complex Building in Bangladesh one at Chittagong (Civil Sanitary, Deep tube well, Underground water reservoir & internal road).
 Sample : Sealed

Sieve No	Wt. Retained	% Retained	Cum. % Retained	% Finer	FM
No. 4	0.0	0.0	0.0	100.0	2.91
No. 8	27.3	5.5	5.5	94.5	
No. 16	145.3	29.1	34.5	65.5	
No. 30	141.4	28.3	62.8	37.2	
No. 50	137.5	27.5	90.3	9.7	
No. 100	38.0	7.6	97.9	2.1	
Pan	10.5	2.1	100.0	0.0	

FM = 2.91 (TWO POINT NINE ONE)

Countersigned by

[Signature]
9/7/2015

Head
Department of Civil Engineering
Chittagong University of Engineering and Technology.

Test Conducted by

[Signature]

Mohammad Tarequl Alam
Assistant Professor
Department of Civil Engineering
Chittagong University of Engineering and Technology
Chittagong-4349

Seen
[Signature]
16/8/15



TEST REPORT

Memo No. : BRTC/TEST/CE/2015/981 Date: 21/05/2015
 Supplier : Sub-divisional Engineer, Hathazari Sub- Division, Rohmatgonj, Ctg. Date: 24/11/2014
 Ref. No. : 25.36.1500.112.14.11/5.2006.1050
 Name of the Test : Test of Cement.
 Location of the site : Construction of all district Muktijoddah Complex Building in
 Bangladesh one at Chittagong (Civil Sanitary, Deep tube well,
 Underground water reservoir & internal road).

Sample : **Sealed**


Table for Compressive Strength Test of Cement

Type of Cement	Type of Strength	Sample No.	Strength MPa (psi)	Average MPa (psi)	Remarks
Diamond Cement (Portland Cement)	Compressive	1	17.3 (2510)	17.3 (2510)	03 Days Strength
		2	17.7 (2560)		
		3	16.9 (2460)		
	Compressive	1	20.4 (2960)	20.6 (2980)	07 Days Strength
		2	20.5 (2970)		
		3	20.8 (3020)		
	Compressive	1	26.4 (3830)	26.7 (3870)	28 Days Strength
		2	26.8 (3880)		
		3	26.9 (3900)		

Normal Consistency & Setting Time, Fineness & Soundness Test of Cement

Type of Cement	Normal Consistency (%)	Initial Setting Time	Final Setting Time	Fineness (Sq.cm/gm)
Diamond Cement (Portland Cement)	26.0	1hr. 14 min.	1 hr. 49 min.	4000
Remarks:	Fineness was done by Blaine apparatus basis			

Countersigned by


 Head 9/7/15

Department of Civil Engineering
 Chittagong University of Engineering and Technology.

See Analysis 14/8/15

Test Conducted by



Mohammad Tarequul Alam

Assistant Professor
 Department of Civil Engineering
 Chittagong University of Engineering and Technology
 Chittagong-4349



Sl. No. : CRTS/CE/54/06
Memo No. : ৮৭৬/৫
Sent by : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, গাজীপুর গণপুর্ক উপ-বিভাগ-২, গাজীপুর
Name of Project : Construction of 3 storied muktijodha sangsad complex building with 5-storied foundation at gazipur i/c Civil work, Sanitary and Water Supply, Underground Water Reservoir, Deep Tube-Well, Boundary Wall, Approach Road, Internal & External Electrification etc, during the year of 2015-2016
Type of Specimen : Deformed MS Bar (BSI)
Date of Testing : 15 February 2016

Date : 10 February 2016
Date : 31 January 2016

Report on the Tests of M. S. Bar

Sl. No.	Nominal Bar Dia. mm	Actual Bar Dia. mm	Weight Per Unit Length kg/m	Cross Sectional Area mm ²	Yield Load kN	Ultimate Load kN	Yield Strength MPa	Average Yield Strength MPa	Ultimate Strength MPa	Average Ultimate Strength MPa	Elongation %
1	10	9.69	0.58	73.75	33.4	52.2	453	448	708	676	17.00
2	10	10.03	0.62	79.00	34.0	52.0	430		658		17.50
3	10	10.02	0.62	78.92	36.4	52.2	461		662		17.50
1	10	9.78	0.59	75.10	34.8	53.4	463	462	711	688	16.50
2	10	10.03	0.62	79.00	36.0	52.0	456		658		17.00
3	10	9.78	0.59	75.17	35.0	52.2	466		694		17.50
1	10	9.99	0.61	78.35	37.0	52.4	472	463	669	662	17.00
2	10	10.06	0.62	79.55	37.0	52.6	465		661		16.50
3	10	9.96	0.61	77.96	35.2	51.2	452		657		17.50

Countersigned By :

J. M. Anwar
18/02/16

Chairman
CRTS, Department of Civil Engineering
DUET, Gazipur.

Test Performed By :

S. Shibly Anwar
17/02/16

(Dr. Md. Shibly Anwar)
Assistant Professor
Department of Civil Engineering
DUET, Gazipur.



Note: i) Samples were sealed
ii) 1 MPa = 145.035 psi




No. : CRTS/CE/54/07
 Date : 10 February 2016
 Date : 31 January 2016
 Name of Project : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, গাজীপুর গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২, গাজীপুর
 Type of Specimen : Construction of 3 storied muktijodha sangsad complex building with 5-storied foundation at gazipur i/c Civil work, Sanitary and Water Supply, Underground Water Reservoir, Deep Tube-Well, Boundary Wall, Approach Road, Internal & External Electrification etc. during the year of 2015-2016
 Date of Testing : Deformed MS Bar (BSI)
 : 15 February 2016

Report on the Tests of M. S. Bar

Sl. No.	Nominal Bar Dia.	Actual Bar Dia.	Weight Per Unit Length	Cross Sectional Area	Yield Load	Ultimate Load	Yield Strength	Average Yield Strength	Ultimate Strength	Average Ultimate Strength	Elongation
	mm	mm	kg/m	mm ²	kN	kN	MPa	MPa	MPa	MPa	%
1	12	12.00	0.89	113.06	58.0	82.2	513	496	727	703	13.50
2	12	11.94	0.88	111.90	56.4	78.2	504		699		13.00
3	12	12.20	0.92	116.99	55.0	79.8	470		682		14.50
1	12	11.94	0.88	112.01	55.0	77.8	491	480	695	689	12.50
2	12	12.22	0.92	117.34	53.2	79.4	453		677		17.00
3	12	12.02	0.89	113.40	56.2	78.8	496		695		12.00
1	12	11.88	0.87	110.85	58.6	82.6	529	497	745	708	12.50
2	12	12.21	0.92	117.10	53.6	79.6	458		680		15.00
3	12	12.02	0.89	113.40	57.2	79.2	504		699		12.50


Countersigned By :


 Chairman
 18/02/16
 CRTS, Department of Civil Engineering
 DUET, Gazipur.



Note: i) Samples were sealed
 ii) 1 MPa = 145.035 psi

Test Performed By :


 (Dr. Md. Shibly Anwar)
 Assistant Professor
 Department of Civil Engineering
 DUET, Gazipur.



: CRTS/CE/54/08

: ৮৭৪/২

Date : 10 February 2016

Date : 31 January 2016

: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, গাজীপুর গণগুর্ভ উপ-বিভাগ-২, গাজীপুর

: Construction of 3 storied muktijodha sangsad complex building with 5-storied foundation at gazipur i/c Civil work, Sanitary and Water Supply, Underground Water Reservoir, Deep Tube-Well, Boundary Wall, Approach Road, Internal & External Electrification etc, during the year of 2015-2016

: Deformed MS Bar (BSI)

: 15 February 2016

Report on the Tests of M. S. Bar

Nominal Bar Dia.	Actual Bar Dia.	Weight Per Unit Length	Cross Sectional Area	Yield Load	Ultimate Load	Yield Strength	Average Yield Strength	Ultimate Strength	Average Ultimate Strength	Elongation
mm	mm	kg/m	mm ²	kN	kN	MPa	MPa	MPa	MPa	%
16	15.97	1.57	200.31	90.0	145.0	449	484	724	711	15.00
16	16.02	1.58	201.51	99.0	140.0	491		695		15.00
16	16.02	1.58	201.51	103.0	144.0	511		715		12.50
16	16.01	1.58	201.31	100.0	140.0	497	499	696	697	15.00
16	16.05	1.59	202.32	102.0	142.0	504		702		15.00
16	16.03	1.58	201.92	100.0	140.0	495		693		17.50
16	16.06	1.59	202.53	90.0	143.0	444	461	706	706	16.00
16	16.05	1.59	202.32	90.0	144.0	445		712		15.00
16	16.06	1.59	202.59	100.0	142.0	494		701		15.00

Countersigned By :

Test Performed By :

J. Man
18/02/16
Chairman

CRTS, Department of Civil Engineering
DUET, Gazipur.



Shibly 17/02/16

(Dr. Md. Shibly Anwar)
Assistant Professor
Department of Civil Engineering
DUET, Gazipur.

Note: i) Samples were sealed
ii) 1 MPa = 145.035 psi



Memo No. : CRTS/CE/54/09 Date: 10 February 2016
 Ref. NO. : 869 Date: 31 January 2016
 Sent by : মোহাম্মদ মনিয়াজ্জামান, উপ- বিভাগীয় প্রকৌশলী, গাজীপুর গণপূর্ত উপ- বিভাগ -২, গাজীপুর।
 Name of Project : Construction of 3 storied muklijodha sangsad complex building with 5- Storied foundation at Gazipur i/c. Civil Work, Sanitary Work and Water Supply, Underground Water Reservoir, Deep Tube- Well, Boundary Wall, Approach Road, Internal & External Electrification etc. during the year of 2015-2016.
 Type of Specimen : Deformed MS Bar (BSI)
 Date of Test : 15 February 2016

Report on the Tests of M.S. Bar

Nominal Bar Dia	Actual Bar Dia	Weight Per Unit Length	Cross Sectional Area	Yield Load	Ultimate Load	Yield Strength	Average Yield Strength	Ultimate Strength	Average Ultimate Strength	Elongation
mm	mm	Kg/m	Mm ²	KN	KN	MPa	MPa	MPa	MPa	%
20	20.23	2.52	321.26	151.0	240.0	470	490	747	776	18.0
20	20.21	2.52	320.31	150.0	239.0	507		785		18.9
20	20.19	2.51	320.00	154.0	240.0	495		796		18.5
20	20.20	2.52	320.31	159.0	243.0	496	489	758	759	18.7
20	20.18	2.51	319.68	157.0	245.0	491		766		18.3
20	20.19	2.51	320.00	154.0	241.0	481		753		18.0
20	20.21	2.52	320.63	161.0	247.0	502	494	770	766	18.3
20	20.23	2.52	321.26	156.0	246.0	485		766		18.6
20	20.20	2.52	320.31	159.0	244.0	496		762		18.9

Countersigned By :

J. J. J.
18/02/16

Chairman
CRTS, Department of Civil Engineering
DUET, Gazipur.



Test Performed By :

Shibly 17/02/16

(Dr. Md. Shibly Anwar)
Assistant Professor
Department of Civil Engineering
DUET, Gazipur.

Note: i) Samples were sealed
ii) 1 MPa = 145.035 psi



: CRTS/CE/54/10

: ১৮৩৩/২

Date : 10 February 2016

Date : 31 January 2016

: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, উপ-নির্ভাণীক প্রকৌশলী, গাজীপুর গণপূর্ত উপ-নির্ভাণ-২, গাজীপুর।

: Construction of 3 storied muktijodha sangsad complex building with 6-storied foundation at Gazipur I/c Civil work, Sanitary and Water Supply, Underground Water Reservoir, Deep Tube-Well, Boundary Wall, Approach Road, Internal & External Electrification etc, during the year of 2015-2016

Material of Specimen : Cement (Premier)

Age of Casting : 14 February 2016


Report on Compressive Strength Test of Cement

Sample No.	Curing Age	Date of Testing	Average Cross Sectional Area	Crushing Load	Crushing Strength	Average Crushing Strength
	Days		mm ²	kN	MPa	MPa
1	28	13 March 2016	2505.00	99.4	39.68	40.3
2			2511.68	103.4	41.17	
3			2506.67	100.2	39.97	

Countersigned By :

Test Performed By:

M. Rahman
Chairman 21-03-16
CRTS, Department of Civil Engineering
DUET, Gazipur



Dr. Md. Shibly Anwar
21/03/16
(Dr. Md. Shibly Anwar)
Assistant Professor
Department of Civil Engineering
DUET, Gazipur.

Note: Samples were sealed.



880-2-9252162, PABX: 0171431015, 9264021-25/Ext. 200; Fax: 880-2-9252162

Memo No. : CRTS/CE/54/36
Ref. NO. : 859/E
Sent by : মোহাম্মদ মনিরুলুজ্জামান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, গাজীপুর গণশুভ উপ-বিভাগ -২, গাজীপুর।
Name of Project : Construction of 3 storied multijodha sangsad complex building with 5-
Storied foundation at Gazipur i/c. Civil Work, Sanitary Work and Water
Supply, Underground Water Reservoir, Deep Tube- Well, Boundary
Wall, Approach Road, Internal & External Electrification etc. during the
year of 2015-2016.
Type of Specimen : Concrete Cylinder (Mix Proportion (as Quoted) 1;1.5:3, Aggregate
Type: Stone Chips)
Date of Test : 28th February 2016

Report on the Tests of Concrete Compressive Strength (ASTM C39)

SL. NO.	Date of Casting as per Letter	Specimen Designation / Frog Mark	Specimen Area (mm ²)	Crushing Load (KN)	Crushing Strength (MPa)	Average Crushing Strength (Mpa)	Remarks
1	31.01.2016 (29 days test)	3	7850	230	29.29	29.42	
2		1	7850	227	28.92		
3		2	7850	236	30.06		

Countersigned By :

Head
Department of Civil Engineering
DUET, Gazipur



Test Performed By:

(Md. Rezau Karim)
Lecturer
Department of Civil Engineering
DUET, Gazipur

Note: 1. The samples were sealed
2. 1 MPa = 145.03 psi

Bureau of Research, Testing and Consultation (BRTC)

Department of Civil Engineering

Chittagong University of Engineering and Technology (CUET)

Chattogram-4340, Bangladesh

TEST REPORT

Memo No. : BRTC/TEST/CE/2019/807 Date: 03/03/2019
 Supplier : Sub-divisional Engineer, Lama Public works department, Bandarban. Date: 10/04/2018
 Ref. No. : ২২.৩৬.০৩০০.১২২.০১.১৮/৪২(৩)
 Name of the Test : Tensile Strength, % Elongation and Bend Re-bend Test of Rebar (Brand: RSRM - 400)
 Location : Construction of Muktijoddha Complex in Bandarban district under the project titled "Construction of Muktijoddha Complex Bhaban in all districts (1st Phase)"
 Sample : Sealed

Nominal Dia	Actual Dia (mm)	Avg. Actual Dia (mm)	Yield Strength (MPa)	Avg. Yield Strength (MPa)	Ult. Strength (MPa)	Avg. Ult. Strength (MPa)	US/YS	Elongation (%)	Avg. Elongation (%)	Unit Weight (kg/m)	Avg. Unit Weight (kg/m)	Bend	Re-bend
10	10.23	10.24	432.7	432.1	583.4	582.6	---	16.26	14.61	---	---	S	S
	10.19		431.6		583.7		---	14.29		---			
	10.30		431.9		580.7		---	13.30		---			
12	12.30	12.29	407.1	407.0	612.4	610.5	---	14.42	13.14	---	---	S	S
	12.28		405.3		608.0		---	12.98		---			
	12.28		408.6		611.2		---	12.02		---			
16	16.47	16.48	398.9	402.8	591.2	593.4	---	12.50	11.54	---	---	S	S
	16.52		415.0		601.5		---	11.54		---			
	16.46		394.7		587.4		---	10.58		---			
20	20.31	20.31	385.9	397.9	540.2	550.1	---	11.74	10.95	---	---	S	S
	20.33		415.9		557.6		---	10.80		---			
	20.31		391.9		552.4		---	10.33		---			

Explanatory Notes: 1MPa = 145.048 psi, S=Satisfactory, U=Unsatisfactory

ASTM A615-16 Weight Requirements & Nominal Area of bars (Table A1.1)

Nominal Dia, mm	10	12	16	20	22	25	28	32	36	40	50	60
Nominal Area, sq mm	79	113	201	314	380	491	616	804	1018	1257	1963	2827
Nominal Weight, kg/m	0.617	0.888	1.578	2.466	2.984	3.853	4.834	6.313	7.990	9.865	15.41	22.2

ASTM A 615M-16 Tensile Requirements for Common Steel Grades

	Grade 60 (420)	Grade 75 (520)	Grade 80 (550)
Tensile strength min. MPa (psi)	620 (90000)	690 (100000)	725 (105000)
Yield strength, min MPa (psi)	420 (60000)	520 (75000)	550 (80000)
Elongation in 200mm (8in), min %			
Bar designation No.			
10,12,16,20	9	7	7
25,22	8	7	7
28,32,36,40,50,60	7	6	6

Countersigned by

Umar
28/3/19

Head

Department of Civil Engineering
Chittagong University of Engineering and Technology

Test Conducted by

Dr. Mahmood Omar Inam
(Dr. Mahmood Omar Inam)

Bureau of Research, Testing and Consultation (BRTC)

Department of Civil Engineering

Chittagong University of Engineering and Technology (CUET)

Chattogram-4349, Bangladesh

TEST REPORT

Memo No. : BRTC/TEST/CE/2019/807 Date: 03/03/2019
 Supplier : Sub-divisional Engineer, Lama Public works department, Bandarban.
 Ref. No. : ২২.৩৬.০৩০০.১২২.০১.১৮/৪২(৩) Date: 10/04/2018
 Name of the Test : Tensile Strength, % Elongation and Bend Re-bend Test of Rebar (Brand: RSRM - 400)
 Location : Construction of Muktijoddha Complex in Bandarban district under the project titled "Construction of Muktijoddha Complex Bhaban in all districts (1st Phase)"
 Sample : Sealed

Nominal Dia	Actual Dia (mm)	Avg. Actual Dia (mm)	Yield Strength (MPa)	Avg. Yield Strength (MPa)	Ult. Strength (MPa)	Avg. Ult. Strength (MPa)	US/YS	Elongation (%)	Avg. Elongation (%)	Unit Weight (kg/m)	Avg. Unit Weight (kg/m)	Bend	Re-bend
25	25.18	25.23	451.5	450.5	652.2	652.5	---	11.74	10.95	---	---	S	S
	25.26		450.7		654.1		---	10.80					
	25.24		449.4		651.2		---	10.33					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Explanatory Notes: 1MPa = 145.048 psi, S=Satisfactory, U=Unsatisfactory

ASTM A615-16 Weight Requirements & Nominal Area of bars (Table A1.1)

Nominal Dia, mm	10	12	16	20	22	25	28	32	36	40	50	60
Nominal Area, sq mm	79	113	201	314	380	491	616	804	1018	1257	1963	2827
Nominal Weight, kg/m	0.617	0.888	1.578	2.466	2.984	3.853	4.834	6.313	7.990	9.865	15.41	22.2

• Measured unit weight shall not be less than 94% of the nominal weight

• Area & weight of 22mm dia bar is derived based on principle followed for other sizes in Table A1.1

• Actual dia & US/YS ratio are provided for informative purpose only.

These are not requirements of ASTM A615M-16

ASTM A 615M-16 Tensile Requirements for Common Steel Grades

	Grade 60 (420)	Grade 75 (520)	Grade 80 (550)
Tensile strength min. MPa (psi)	620 (90000)	690 (100000)	725 (105000)
Yield strength, min MPa (psi)	420 (60000)	520 (75000)	550 (80000)
Elongation in 200mm (8in), min %			
Bar designation No.			
10,12,16,20	9	7	7
25,22	8	7	7
28,32,36,40,50,60	7	6	6

Countersigned by

Mohid
28/3/19
Head

Department of Civil Engineering
Chittagong University of Engineering and Technology

Test Conducted by

(Dr. Mahmood Omar Imam)



Bureau of Research, Testing and Consultation (BRTC)

Department of Civil Engineering

Chittagong University of Engineering and Technology (CUET)


Chattogram-4349, Bangladesh

TEST REPORT

Memo No. : BRTC/TEST/CE/2019/806 Date: 03/03/2019
Supplier : SDE, Lama PWD Sub-Division, Bandarban
Ref. No. : 22.36.0300.122.01.18/41(3) Date: 10/04/2018
Name of the Test : Test of Coarse Aggregate. Sample: Sealed
Location : Construction of Freedom Fighter Bhaban at Bandarban

Gradation of Stone Shingles

Sieve Size (mm)	Wt. Retained (gm)	Wt. Retained (%)	Cum. % Retained	% Finer
37.2	0.0	0.0	0.0	100.0
31.75	0.0	0.0	0.0	100.0
25.40	0.0	0.0	0.0	100.0
19.00	813	16.3	16.3	83.7
12.70	2959	59.2	75.4	24.6
9.52	992	19.8	95.3	4.7
4.76	221	4.4	99.7	0.3
Pan	15	---	-----	-----

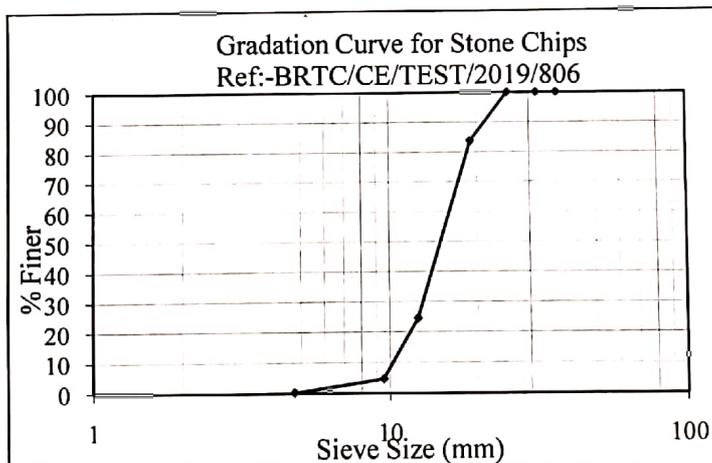

Type of Sample	Test Name	Units	Result	Remarks:
Stone Chips	Specific Gravity	--	2.93	-----
	Aggregate Crushing Value	%	12.29	-----
	Water Absorption	%	0.30	-----

Countersigned by

Morais
13/3/19

Head

Department of Civil Engineering

Chittagong University of Engineering & Technology

Test Conducted by

Sultan Muhammad Farooq
22/06/22

Sultan Muhammad Farooq



Bureau of Research, Testing and Consultation (BRTC)

Department of Civil Engineering
Chittagong University of Engineering and Technology (CUET)
Chattogram-4349, Bangladesh

TEST REPORT

Memo No : BRTC/TEST/CE/2019/808
Supplier : Sub-Divisional Engineer, LAMA, PWD Sub-Division, Bandarban.
Ref. No. : ২২.৩৬.০৩০০.১২২.০১.১৮/৪৫(৩)
Name of the Test : **Fineness Modulus of Sand**
Location : Construction of freedom fighter complex in Bandarban.
Sample : Sealed

Date : 03/03/19
Date : 16/08/18

Sieve No.	Wt. Retained (gm)	% Wt. Retained	Cum. % Retained	% Finer
#4	0	0.00	0.00	100.00
#8	33.9	6.78	6.78	93.22
#16	132.3	26.47	33.25	66.75
#30	191.5	38.31	71.55	28.45
#50	106.8	21.36	92.92	7.08
#100	23.9	4.78	97.70	2.30
Pan	---	---	---	---
Remarks	As per ASTM C136			

FM= 3.02 (THREE POINT ZERO EIGHT)

Countersigned by

Uoia
10/3/19

Head

Department of Civil Engineering

Chittagong University of Engineering and Technology

Test Conducted by

Nusrat Hoque
10/03/19
(Dr. Nusrat Hoque)

সংযুক্তি -৩

ভবন হস্তান্তর বিষয়ক তথ্য

সকল জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)”
শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	কেন্দ্রে নাম	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	খুলনা	২৬/১২/২০১৪	১১/০৩/২০১৫	১২/০৬/২০১৭	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
২	চট্টগ্রাম	০৫/০১/২০১৪	১০/০৪/২০১৪	১৩/০৮/২০১৭	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৩	রাজশাহী	০৬/০৪/২০১২	১০/০৭/২০১২	২৩/০৯/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৪	সিলেট	০৫/০১/২০১৪	১০/০৪/২০১৪	১৩/০৮/২০১৭	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৫	যশোর	০১/০৩/২০১২	১০/০৭/২০১২	১৩/০৮/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৬	দিনাজপুর	০৬/০১/২০১৪	১০/০৩/২০১৪	১৪/০৫/২০১৭	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৭	ময়মনসিংহ	০৮/০২/২০১২	১৪/০৫/২০১২	২০/০৮/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৮	কুমিল্লা	১০/০১/২০১৪	০৯/০৩/২০১৪	১৭/০৭/২০১৭	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৯	বরিশাল	০৪/০৩/২০১৩	০৭/০৬/২০১৩	১৪/০৫/২০১৬	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
১০	ফরিদপুর	০২/০১/২০১৪	১১/০৪/২০১৪	০৮/০৬/২০১৭	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
১১	বগুড়া	০৯/০২/২০১৮	০৩/০৫/২০১৪	০৯/০৮/২০১৮	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
১২	পাবনা	০৭/০১/২০১৫	১০/০৪/২০১৫	১৫/০৭/২০১৮	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
১৩	রাংগামাটি	০৫/০১/২০১৩	১০/০৪/২০১৩	১৩/০৮/২০১৬	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
১৪	কুষ্টিয়া	০৫/০৫/২০১৪	১০/০৮/২০১৪	২৩/০৮/২০১৬	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
১৫	রংপুর	০৫/০১/২০১২	১০/০৪/২০১২	১৩/০৮/২০১৪	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
১৬	খাগড়াছড়ি	০৫/০৭/২০১৩	০৮/১০/২০১৩	১৪/০৮/২০১৬	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
১৭	টাংগাইল	০৮/০১/২০১৪	১০/০৪/২০১৪	১৫/০৮/২০১৭	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
১৮	পঞ্চগড়	১০/০১/২০১২	১০/০৪/২০১২	১৮/০৮/২০১৪	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
১৯	ভোলা	১৫/০১/২০১৬	১৫/০৪/২০১৬	১৯/০৮/২০১৯	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
২০	চাঁদপুর	২০/০১/২০১৪	২০/০৪/২০১৪	০২/০৮/২০১৮	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
২১	হবিগঞ্জ	২৫/০১/২০১৪	০৩/০৪/২০১৪	১৩/০৮/২০১৭	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
২২	লক্ষীপুর	০৫/০১/২০১২	১০/০৪/২০১২	২৩/০৮/২০১৪	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
২৩	বরগুনা	২৫/০১/২০১৪	০৭/০৪/২০১৪	১৩/০৮/২০১৮	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
২৪	বালকাঠি	১৮/০১/২০১২	১০/০৪/২০১২	১৪/০৮/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
২৫	পিরোজপুর	২০/০১/২০১৪	১২/০৪/২০১৪	১৩/০৮/২০১৮	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
২৬	পটুয়াখালী	০৫/০১/২০১২	১৫/০৪/২০১২	২৩/০৮/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
২৭	ঝিনাইদহ	১৫/০১/২০১২	১০/০৪/২০১২	১৩/০৮/২০১৩	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
২৮	নড়াইল	২৫/০১/২০১২	২০/০৪/২০১২	১৪/০৮/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
২৯	মাগুড়া	১২/০১/২০১২	১০/০৪/২০১২	১৭/০৮/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৩০	লালমনিরহাট	১১/০১/২০১২	১৫/০৪/২০১২	১৪/০৮/২০১৪	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৩১	কুড়িগ্রাম	১৫/০১/২০১৫	২০/০৪/২০১৫	১২/০৮/২০১৯	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৩২	নীলফামারী	১৭/০১/২০১২	১০/০৪/২০১২	১৩/০৮/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৩৩	গাইবান্ধা	২০/০১/২০১২	০৭/০৪/২০১২	১৫/০৮/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৩৪	ঠাকুরগাঁও	১২/০১/২০১২	১০/০৪/২০১২	১৩/০৮/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৩৫	সাতক্ষীরা	২৩/০১/২০১৫	২০/০৪/২০১৫	১৪/০৮/২০১৮	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৩৬	বাগেরহাট	০৪/০১/২০১২	২০/০৪/ ২০১২	২০/০৮/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৩৭	চুয়াডাঙ্গা	০৫/০১/২০১৫	২৫/০৪/২০১৫	২২/০৮/২০১৯	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৩৮	মেহেরপুর	০৮/০১/২০১৪	২৮/০৪/২০১৪	২৩/০৮/২০১৬	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৩৯	সিরাজগঞ্জ	০২/০১/২০১২	১০/০৪/২০১২	১৩/০৮/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৪০	নাটোর	১১/০১/২০১২	০৩/০৪/২০১২	১৪/০৮/২০১৪	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৪১	নওগাঁ	০৩/০১/২০১৫	১০/০৪/২০১৫	১৫/০৮/২০১৯	সমাপ্ত
৪২	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	১১/০১/২০১৪	০২/০৪/২০১৪	১৬/০৮/২০১৭	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৪৩	ফেনী	০১/০১/২০১৪	০৪/০৪/২০১৪	১৯/০৮/২০১৭	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত

৪৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০৮/০১/২০১২	১০/০৪/২০১২	১৩/০৮/২০১৪	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৪৫	সুনামগঞ্জ	০৩/০১/২০১২	০৯/০৪/২০১২	১৪/০৮/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৪৬	কক্সবাজার	০৫/০১/২০১২	০৮/০৪/২০১২	১৫/০৮/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৪৭	মৌলভীবাজার	১৫/০১/২০১২	১০/০৪/২০১২	১৬/০৮/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৪৮	গোপালগঞ্জ	১৩/০১/২০১৪	০৭/০৪/২০১৪	১৩/০৮/২০১৭	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৪৯	শরীয়তপুর	০৪/০১/২০১৪	০৯/০৪/২০১৪	১৭/০৮/২০১৬	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৫০	মাদারীপুর	০২/০১/২০১২	১০/০৪/২০১২	১৮/০৮/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৫১	রাজবাড়ী	১১/০১/২০১৫	১১/০৪/২০১৫	১৩/০৮/২০১৮	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৫২	গাজীপুর	১২/০১/২০১৫	১৫/০৪/২০১৫	১৪/০৮/২০১৭	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৫৩	কিশোরগঞ্জ	০৩/০১/২০১২	১৭/০৪/২০১২	১৩/০৮/২০১৪	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৫৪	জামালপুর	১১/০১/২০১৩	১৪/০৪/২০১৩	২৩/০৮/২০১৬	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৫৫	শেরপুর	১২/০১/২০১২	০৯/০৪/২০১২	১৩/০৮/২০১৪	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৫৬	নেত্রকোনা	১৩/০১/২০১২	১০/০৪/২০১২	১৪/০৮/২০১৪	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৫৭	মুন্সিগঞ্জ	২৫/০১/২০১৪	১১/০৪/২০১৪	১৫/০৮/২০১৬	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৫৮	নরসিংদী	৩০/০১/২০১২	১২/০৪/২০১৪	১৬/০৮/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৫৯	নারায়ণগঞ্জ	০২/০১/২০১৫	১৭/০৪/২০১৫	১৭/০৮/২০১৮	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৬০	মানিকগঞ্জ	০৫/০১/২০১৪	১৪/০৪/২০১৪	১৮/০৮/২০১৬	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৬১	জয়পুরহাট	০৯/০১/২০১২	১০/০৪/২০১২	২৩/০৮/২০১৫	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৬২	নোয়াখালী	১০/০১/২০১৪	২০/০৪/২০১৪	১৩/০৮/২০১৬	সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত
৬৩	বান্দরবন	২৯/০১/২০১৭	০৮/০৫/২০১৭	৩০/০৬/২০১৯	সমাপ্ত
৬৪	ঢাকা	০৭/০৬/২০১৬	১৮/১০/২০১৬	৩১/০৩/২০২১	কাজ চলমান

সংযুক্তি - ৪

তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের টুলস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংযুক্তি-৪.১

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

“সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
আর্থ-সামাজিক জরিপ প্রশ্ন পত্র (সম্ভাব্য উপকারভোগী)

সম্মতি পত্র

পরিচিতি ও গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনা

আসহালামু আলাইকুম/নমস্কার,

আমি -----। “উন্নয়ন ধারা” নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি। উন্নয়ন ধারা সরকারী, বেসরকারী এবং আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা/জরিপ কার্য পরিচালনা করে আসছে। মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পক্ষ থেকে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ এর জন্য আমি/আমরা আপনাদের কাছে এসেছি।

গোপনীয়তা এবং সম্মতি: আমরা এই সাক্ষাতকারে উক্ত প্রকল্পের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাইবো। এই জরিপ সম্পর্কে যদি আপনার আর ও কোন প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আপনি জনাব মো: সাইদুর রহমানের সাথে এই ফোন (০১৭১২ ১০০৫৫৯) নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

আপনার প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং সংশ্লিষ্ট জরিপ ব্যতিত অন্য কোথাও ব্যবহার করা হবে না। আপনার সাথে এই তথ্য সংগ্রহ করতে আনুমানিক ৩০ মি: সময় লাগবে। জরিপে অংশগ্রহণের জন্য আপনাকে কোন প্রকার জোর করা হবে না এবং আমরা আশা করছি আপনি স্বেচ্ছায় প্রশ্নোত্তর দিতে সম্মত হবেন, কেননা এই বিষয়ে আপনার মতামত আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কোন উত্তর না দিতে চাইলে আমাদেরকে বলবেন আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাব। এই জরিপে আমাদেরকে সহায়তা করার জন্য আমরা আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনার কি এই জরিপ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আছে? আমরা কি তাহলে শুরু করতে পারি?

হ্যাঁ-----1 না -----2

সাক্ষাৎকার গ্রহণ শুরুর সময়:...../.....

সাক্ষাতের বিষয়ে আপনার সম্মতির জন্য প্রকল্পের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার প্রদানের তারিখ :		সাক্ষাৎ শুরুর সময়:
সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর স্বাক্ষর	মোবাইল নং :	
	এনআইডি নং :	
মুক্তিযোদ্ধা ক্রমিক/গেজেট নং:		
জেলার নাম :		
বিভাগের নাম :		
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম :		স্বাক্ষর:
সুপারভাইজারের নাম :		স্বাক্ষর:
প্রশ্ন পত্রের বিষয় :		

আপনি কি সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা? হ্যাঁ-----1 না -----2

আপনার বর্তমান শারীরিক অবস্থা কি? যুদ্ধাহত সক্ষম অক্ষম অসুস্থ ডিসএ্যাবিলিটি

১. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক বিষয়ক তথ্য:

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	উত্তর সহ কোড	কোড নং	নির্দেশনা
১০১	উত্তর দাতার লিঙ্গ (প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই, দেখে লিখুন)	মহিলা	1	
		পুরুষ	2	
১০২	আপনার বৈবাহিক অবস্থা কি?	বর্তমানে বিবাহিত	1	
		অবিবাহিত	2	
		তালাকপ্রাপ্ত	3	
		পৃথক থাকা	4	
		অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) _____		
১০৩	দয়া করে আপনার বয়স বলুন (প্রয়োজনে জাতীয় পরিচয় পত্র দেখে নিশ্চিত হোন)	(পূর্ণ বয়স লিখুন)-----বছর		
	১৯৭১ সালে আপনার বয়স কত ছিল? (দয়া করে মনে করে বলুন)	(পূর্ণ বয়স লিখুন)-----বছর		
১০৪	আপনি কোন শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন?	১ম-৫ম শ্রেণি	1	
		৬ষ্ঠ -৯ম শ্রেণি	2	
		এস এস সি	3	
		এইচ এস সি পাশ	4	
		বি এ/ম্নাতক	5	
		ম্নাতকোত্তর	6	
		কখনো স্কুলে যাই নাই	7	
১০৫	আপনার পরিবারের সদস্য/লোক সংখ্যা কত?	-----জন		
১০৬	আপনার পরিবারের প্রধান কি কোন কাজের সাথে জড়িত, যা থেকে আয় হয়? (উত্তর না হলে ১০৮ নং প্রশ্নে যান)	হ্যাঁ	1	
		না	2	
১০৭	হ্যাঁ হলে, কী কাজের সাথে জড়িত/আয়ের প্রধান উৎস কী? (একটি মাত্র উত্তর হবে)	কৃষি	1	
		ব্যবসা	2	
		চাকুরি	3	
		অটো চালক	4	
		হাঁস-মুরগী পালন	5	
		মৎস চাষ	6	
		ইলেকট্রনিক্স পন্য মেরামত		
		অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)-----		
১০৮	আপনার পরিবারের আর কে কে আয়ের সাথে জড়িত? যাদের থেকে পরিবারের জন্য আয় হয়? (একাধিক উত্তর হতে পারে)	ছেলে	1	
		মেয়ে	2	
		ছেলের বউ	3	
		নাতি	4	
		ভাই	5	
		অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)-----		
১০৯	আপনি কী কোন কাজের সাথে জড়িত যা থেকে আয় হয়? (উত্তর না হলে ১১১ নং প্রশ্নে যান)	হ্যাঁ	1	
		না	2	
১১০	হ্যাঁ হলে, কী কী কাজের সাথে জড়িত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)	কৃষি	1	
		ব্যবসা	2	
		মৎস চাষ	3	
		হাঁস-মুরগি পালন	4	
		গরু পালন/মোটা তাজাকরণ	5	
		অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)-----		

১১১	বর্তমানে আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত? (সকলের মাসিক আয় এক সাথে যোগ হবে)	-----টাকা	
১১২	বর্তমানে আপনার পরিবারের মাসিক ব্যয় কত? (সকলের মাসিক ব্যয় এক সাথে যোগ হবে)	-----টাকা	

২. আর্থিক সহায়তা এবং অন্যান্য বিষয়ে তথ্য:

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	উত্তর সহ কোড	কোড	নির্দেশনা
২০১	আপনি কী মনে করেন অ-স্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে? (উত্তর না হলে ২০৪ নং প্রশ্নে যান)	হ্যাঁ	1	
		না	2	
২০২	হ্যাঁ হলে, কোন কোন খাতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে? (একাধিক উত্তর হতে পারে)	ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য	1	
		চিকিৎসার জন্য	2	
		পরিবারের সদস্যের শিক্ষা/পড়াশুনা	3	
		বসতবাড়ী তৈরীর জন্য	4	
		অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন): -----		
২০৩	হ্যাঁ হলে, এক কালীন কত টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে?	-----টাকা		
২০৪	আপনি কি মনে করেন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন? (উত্তর না হলে ২০৭ নং প্রশ্নে যান)	হ্যাঁ	1	
		না	2	
২০৫	যদি হ্যাঁ হয় তবে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে কী কী কার্যক্রম করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?	-----		
২০৬	এই সকল কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ফলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কী কী প্রভাব/ উপকার হবে বলে আপনি মনে করেন?	-----		
২০৭	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম না হলে কি প্রভাব/ক্ষতি হতো বলে আপনি মনে করেন?	-----		

৩. তথ্য-প্রযুক্তি, আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বিষয়ক তথ্য:

ক্রমিক#	প্রশ্ন	উত্তর সহ কোড	কোড নং	নির্দেশনা
৩০১	আপনি কী মনে করেন অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন যাতে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে? (উত্তর না হলে ৩০৪ নং প্রশ্নে যান)	হ্যাঁ	1	
		না	2	
৩০২	যদি হ্যাঁ হয়, আয়-বৃদ্ধি মূলক কাজের জন্য কী কী প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?	ক্ষুদ্র ব্যবসা	1	
		হাঁস-মুরগী পালন	2	
		গরু-ছাগল পালন	3	
		গরু মোটা-তাজা করণ	4	
		মৎস চাষ		
		অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)-----		
৩০৩	উপরোক্ত প্রশিক্ষণ পেলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কী কী উপকার হবে বলে আপনি মনে করেন?	আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবার স্বচ্ছল করতে পারবে	1	
		মানসিক শান্তি আসবে	2	
		সুস্থ থাকতে পারবে	3	
		অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)-----		
৩০৪	হ্যাঁ		1	

	আপনি কী মনে করেন অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন যাতে করে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে? (না হলে ৩০৬ নং যান)	না	2	
৩০৫	যদি হ্যাঁ হয়, আয়-বৃদ্ধি মূলক কাজের জন্য অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য কী কী প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?	1		
		2		
		3		
তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ:				
ক্রমিক#	প্রশ্ন	উত্তর সহ কোড	কোড নং	নির্দেশনা
৩০৬	আপনি কী মনে করেন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্যপ্রযুক্তির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে? (উত্তর না হলে সাক্ষাৎপর্ব শেষ করুন)	হ্যাঁ	1	
		না	2	
৩০৭	হ্যাঁ হলে, কী কী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে?	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	1	
		ইন্টারনেট ব্রাউজিং	2	
		অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)-----		

সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ সময়:...../.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: প্রশ্ন পত্রটি পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ পড়ে থাকলে উত্তরদাতা কে আবার ও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিক ভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তর দাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

“সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাদের (পিডি, ডিপিডি) সাথে নিবিড় আলোচনার গাইডলাইন (কেআইআই)

তথ্য সংগ্রহ শুরু করার সময়: -----

- i. উত্তরদাতার নামঃ
- ii. বর্তমান পদবীঃ
- iii. বর্তমান পদে যোগদানের তারিখঃ.....
- iv. ফোন নম্বর:

১. প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility study) করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
হ্যাঁ হলে এ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কোন দুর্বলতা ছিল কি?

২. প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ:

- ক. যদি দেরিতে নিয়োগ করা হয় তবে তার কারণসমূহ-----
- খ. প্রকল্প পরিচালনা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল কি?-----
- গ. বদলি (কতজন পিডি দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সময়কাল) -----

৩. প্রকল্পটি বর্তমানে প্রায় ১০ বছর ধরে চলছে সে ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ফলে এর

ক. এই সময় কাজের গুনগতমান সঠিক থাকবে বলে আপনি মনে করেন? ১. হ্যাঁ ২. না

খ. যদি হ্যাঁ হয় তবে কীভাবে গুনগতমান ঠিক রাখবেন-----

৪. বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে/হচ্ছে কি?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি হচ্ছে কি?

১. হ্যাঁ ২. না

যদি না হয়, তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না হওয়ার কারণসমূহ কি কি?

৫. ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নে বিলম্ব হয়েছে কি?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. তবে-প্রস্তাব দিতে বিলম্ব হয়েছে

১. হ্যাঁ ২. না

খ. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিলম্ব হয়েছে

১. হ্যাঁ ২. না

গ. জমির দাম বেড়ে গেছে

১. হ্যাঁ ২. না

ঘ. মালিকগণ জমি দিতে চান না

১. হ্যাঁ ২. না

ঙ. অন্যান্য-----

৬. প্রকল্পের PIC/PIU and Steering Committee meeting ডিপিপি অনুযায়ী হয় কিনা?

১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে এর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন ও ফলোআপ হয় কিভাবে? -----

৭. অনুমোদিত আরডিপিপি বছর ভিত্তিক সংস্থান অনুযায়ী বরাদ্দ পাওয়া যায় কি?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. বরাদ্দ না পাওয়া গেলে তার কারণসমূহ কি কি? -----

৮. লগফ্রেম Time bound, input output relation, measureable indicator realistic ছিল কি?

৯. প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ

- ক. সবলদিক -----
খ. দুর্বলদিক/বঁধা-----
গ. সুযোগ-----
ঘ. ঝুঁকিসমূহ-----

১০. প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কোন Project Implementation team গঠন করা হয়েছিল কি? ১. হ্যাঁ ২. না

১১. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকি কমিটি করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
হ্যাঁ হলে কমিটির কার্যক্রম সমূহ কি কি? -----

১২. এ প্রকল্পের কোন exit plan তৈরী করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
যদি হ্যাঁ হয় তবে এর সবল ও দুর্বল দিক আলোচনা করুন।

১৩. প্রকল্পটি IMED এর PMIS যুক্ত হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
যদি হ্যাঁ হয় তবে প্রতি মাসে আপডেট করা হয় কি না? ১. হ্যাঁ ২. না
যদি না হয় তবে কেন আপডেট করা হয় না?

১৪. প্রকল্পটি অডিট হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
যদি হ্যাঁ হয় তবে কতবার হয়েছে (সময় সহ উল্লেখ করুন) ১. হ্যাঁ ২. না
কোন অডিট আপত্তি আছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
যদি হ্যাঁ হয় তবে কতটি আপত্তি আছে এবং কতটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

কতটি এখনো নিষ্পত্তি হয় নাই-----
আপত্তিকৃত অডিটের টাকার পরিমাণ কত -----

১৫. আপনি কি মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আরো বেশী কর্ম দক্ষতা সৃষ্টি হবে? যা, বেকারত্ব দূরীকরণে
সহায়ক হবে? -----

১৬. এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার আরো কোন মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন? -----

সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ সময়:...../.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: প্রশ্ন পত্রটি পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ পড়ে থাকলে উত্তরদাতা কে আবার ও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিক ভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তর দাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

“সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

প্রধান প্রকৌশলীর সাথে এর সাথে নিবিড় আলোচনার গাইডলাইন (কেআইআই)

তথ্য সংগ্রহ শুরুর সময়: -----

i. উত্তরদাতার নামঃ

ii. বর্তমান পদবীঃ

iii. ফোন নম্বর:.....

১. প্রকল্প সম্পর্কে কিছু বলুন-----

২. প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility study) করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
হ্যাঁ হলে এ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কোন দুর্বলতা ছিল কি?

৩. প্রকল্পটি বর্তমানে প্রায় ১০ বছর পর্যন্ত চলছে, কেন এত সময়ের প্রয়োজন হয়েছে এর কারণ সমূহ কি কি -----

ক. এই সময় কাজের গুনগতমান সঠিক থাকবে বলে আপনি মনে করেন? ১. হ্যাঁ ২. না

খ. যদি হ্যাঁ হয় তবে কিভাবে গুনগতমান ঠিক রাখবেন-----

৪. বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে/হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

যদি না হয়, তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না হওয়ার কারণ কি কি?

৫. ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নে বিলম্ব হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. প্রস্তাব দিতে বিলম্ব হয়েছে ১. হ্যাঁ ২. না

খ. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিলম্ব হয়েছে ১. হ্যাঁ ২. না

গ. জমির দাম বেড়ে গেছে ১. হ্যাঁ ২. না

ঘ. মালিকরা জমি দিতে চায় না ১. হ্যাঁ ২. না

ঙ. অন্যান্য-----

৬. অনুমোদিত আরডিপিপি বছর ভিত্তিক সংস্থান অনুযায়ী বরাদ্দ পাওয়া গেছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. বরাদ্দ না পাওয়া গেলে তার কারন সমূহ কি কি?

৭. নির্মাণ কাজের জন্য নিয়োজিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান তাদের চুক্তিপত্র এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছে কি?

কাজ কিভাবে তদারক করা হয়?

মাঠ পরিদর্শনের সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়ন হয় কি? কিভাবে ফলো-আপ করা হয়?

৮. নির্বাচিত দরদাতাদের ব্যাংক গ্যারান্টি ব্যাংক থেকে আসল/নকল যাচাই করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

৯. প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ

ক. সবলদিক -----

খ. দুর্বলদিক/বঁধা-----

গ. সুযোগ-----

ঘ. ঝুঁকিসমূহ-----

১০. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারক কমিটি করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে কমিটির কার্যক্রম সমূহ কি কি?-----

১১. এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার আরো কোন মূল্যবান মতামত থাকলে দয়াকরে বলুন?

সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ সময়:...../.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: প্রশ্ন পত্রটি পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ পড়ে থাকলে উত্তরদাতা কে আবার ও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিক ভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তর দাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

“সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

প্রধান প্রকৌশলীর সাথে এর সাথে নিবিড় আলোচনার গাইডলাইন (কেআইআই)

তথ্য সংগ্রহ শুরুর সময়: -----

i. উত্তরদাতার নামঃ

ii. বর্তমান পদবীঃ

iii. ফোন নম্বর:.....

১. প্রকল্প সম্পর্কে কিছু বলুন-----

২. প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility study) করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
হ্যাঁ হলে এ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কোন দুর্বলতা ছিল কি?

৩. প্রকল্পটি বর্তমানে প্রায় ১০ বছর পর্যন্ত চলছে, কেন এত সময়ের প্রয়োজন হয়েছে এর কারণ সমূহ কি কি -----

ক. এই সময় কাজের গুণগতমান সঠিক থাকবে বলে আপনি মনে করেন? ১. হ্যাঁ ২. না

খ. যদি হ্যাঁ হয় তবে কিভাবে গুণগতমান ঠিক রাখবেন-----

৪. বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে/হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

যদি না হয়, তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না হওয়ার কারণ কি কি?

৫. ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নে বিলম্ব হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. প্রস্তাব দিতে বিলম্ব হয়েছে ১. হ্যাঁ ২. না

খ. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিলম্ব হয়েছে ১. হ্যাঁ ২. না

গ. জমির দাম বেড়ে গেছে ১. হ্যাঁ ২. না

ঘ. মালিকরা জমি দিতে চায় না ১. হ্যাঁ ২. না

ঙ. অন্যান্য-----

৬. অনুমোদিত আরডিপিপি বছর ভিত্তিক সংস্থান অনুযায়ী বরাদ্দ পাওয়া গেছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. বরাদ্দ না পাওয়া গেলে তার কারন সমূহ কি কি?

৭. নির্মাণ কাজের জন্য নিয়োজিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান তাদের চুক্তিপত্র এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছে কি?

কাজ কিভাবে তদারক করা হয়?

মাঠ পরিদর্শনের সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়ন হয় কি? কিভাবে ফলো-আপ করা হয়?

৮. নির্বাচিত দরদাতাদের ব্যাংক গ্যারান্টি ব্যাংক থেকে আসল/নকল যাচাই করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

৯. প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ

ক. সবলদিক -----

খ. দুর্বলদিক/বঁধা-----

গ. সুযোগ-----

ঘ. ঝুঁকিসমূহ-----

১০. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারক কমিটি করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে কমিটির কার্যক্রম সমূহ কি কি?-----

১১. এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার আরো কোন মূল্যবান মতামত থাকলে দয়াকরে বলুন?

সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ সময়:...../.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: প্রশ্ন পত্রটি পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ পড়ে থাকলে উত্তরদাতা কে আবার ও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিক ভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তর দাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

তথ্য সংগ্রহ শুরুর সময়: -----

i. উত্তরদাতার নাম : -----

ii. পদবী : -----

iii. জেলার নাম : -----

১. প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলুন;-----
২. প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের এর জন্য আলাদা কর্মপরিকল্পনা করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
যদি না হয়, তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না হওয়ার কারণ কি কি?-----
৩. আপনি কি নিয়মিত প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. নির্মাণ কাজ নকশা ও চুক্তি অনুযায়ী হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
গ. চুক্তি প্রত্র অনুযায়ী মালামালের টেষ্ট করা হয় কি? ১. হ্যাঁ ২. না
ঘ. নির্মাণ কাজের গুণগত মান সঠিক আছে কিনা তা আপনি কিভাবে পরীক্ষা করেন এবং এ ক্ষেত্রে আপনি কোন ধরনের টুলস ব্যবহার করেন?-----
৪. সাইট পরিদর্শন কালে সাইট বইতে আপনার পর্যবেক্ষণ লিখেছেন কি? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. যদি হ্যাঁ হয়, তবে পরিদর্শনের সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা তা কিভাবে ফলো-আপ করেন?

৫. প্রকল্প সাইট পরিদর্শন কালে নির্মাণ কাজের কোন দুর্বল দিক আপনার মনে হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. যদি হ্যাঁ হয় তবে দুর্বল দিকসমূহ কি কি -----
৬. যদি কোন দুর্বলতা পাওয়া যায়, তবে তা কিভাবে উত্তোরণ করা হয়েছে?-----
৭. আপনি কি আপনার পরিদর্শন প্রতিবেদন তৈরী করেন? ১. হ্যাঁ ২. না
হ্যাঁ হলে, কার নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছেন?-----
৮. প্রকল্প বাস্তবায়নে কী কী সুযোগ ছিল বলে আপনি মনে করেন যা কাজে লাগালে প্রকল্পের কার্যক্রম আরো বেশী মানসম্মত ও গতিশীল হত?-----
৯. আপনি কি মনে করেন, এই প্রকল্পের ফলে বীর মুক্তিযোদ্ধারা কারিগরি শিক্ষায় আগ্রহী হবেন? ১. হ্যাঁ ২. না
হ্যাঁ হলে কেন মনে করেন? -----
১০. এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার আরো কোন মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন-----

সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ সময়:...../.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: প্রশ্ন পত্রটি পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ পড়ে থাকলে উত্তরদাতা কে আবার ও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিক ভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তর দাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংযুক্তি-৪.৬

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

“সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ
সমীক্ষা

উপ-সহকারী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, জেলা অফিস এর সাথে নিবিড় আলোচনার কেআইআই (গাইডলাইন)

তথ্য সংগ্রহ শুরুর সময়: -----

i. উত্তরদাতার নাম : -----

ii. পদবী : -----

iii. জেলার নাম : -----

১. আপনার আওতায় বাস্তবায়নাধীন মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি সম্পর্কে কিছু বলুন;-----

২. আপনি কি নিয়মিত প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. নির্মাণ কাজ নকশা ও চুক্তি অনুযায়ী হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

গ. চুক্তি প্রত্র অনুযায়ী মালামালের টেষ্ট করা হয় কি? ১. হ্যাঁ ২. না

গ. নির্মাণ কাজের গুণগত মান সঠিক আছে কিনা তা আপনি কিভাবে পরীক্ষা করেন এবং এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের

টুলস ব্যবহার করেন?-----

৩. সাইট পরিদর্শন কালে সাইট বইতে আপনার পর্যবেক্ষণ লিখেছেন কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. যদি হ্যাঁ হয়, তবে পরিদর্শন সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন হয় কিনা তা কিভাবে ফলো-আপ করেন?

৪. প্রকল্প সাইট পরিদর্শন কালে নির্মাণ কাজের কোন দুর্বল দিক আপনার মনে হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. যদি হ্যাঁ হয় তবে দুর্বল দিকসমূহ কি কি-----

৫. যদি দুর্বলতা থাকে তবে তা কিভাবে সমাধান করা হয়েছে?-----

৬. আপনি আপনার পরিদর্শনের findings নিয়ে কারো সাথে share করেছেন কি? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে, কার সাথে share করেছেন? -----

৭. প্রকল্প বাস্তবায়নে কি কি সুযোগ ছিল বলে আপনি মনে করেন যা কাজে লাগালে প্রকল্পের কার্যক্রম আরো বেশী

গতিশীল হত?-----

৮. এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনাদের আরো কিছু মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন-----

সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ সময়:...../.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: প্রশ্ন পত্রটি পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ পড়ে থাকলে উত্তরদাতা কে আবার ও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিক ভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তর দাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

সংযুক্তি-৪.৭

“সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
জেলা প্রশাসক এর সাথে এর সাথে নিবিড় আলোচনার কেআইআই এর গাইডলাইন

তথ্য সংগ্রহ শুরুর সময়: -----

i. উত্তরদাতার নাম : -----

ii. পদবী : -----

iii. জেলার নাম : -----

১. প্রকল্প সম্পর্কে কিছু বলুন।-----

২. আপনি কি মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অনুযায়ী হচ্ছে? ১. হ্যাঁ ২. না

যদি হ্যাঁ হয়, তবে কেন?-----

যদি না হয়, তবে কেন?-----

৩. আপনার কোন প্রতিনিধি কি প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেছেন? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. কতবার পরিদর্শন করেছেন -----বার

খ. পরিদর্শন প্রতিবেদন----- (যদি থাকে সংগ্রহ করুন)

৪. প্রকল্প সাইট পরিদর্শন কালে নির্মাণ কাজের কোন সবল ও দুর্বল দিক আপনার দৃষ্টিগোচর হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. যদি হ্যাঁ হয় তবে দুর্বল দিক-----

খ. সবল দিক-----

৫. যদি দুর্বলতা থাকে তবে তা কিভাবে উত্তোরণ করা যেত বলে আপনি মনে করেন? -----

৬. আপনি আপনার পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণগুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছেন কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. পরিদর্শনের সুপারিশসমূহ কিভাবে ফলো-আপ করেছেন?-----

৭. আপনি কি মনে করেন, এই প্রকল্পের ফলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে কেন মনে করেন?-----

৮. বর্তমানে আপনার জেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নির্বাচিত কমিটি আছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

যদি কমিটি না থাকে তবে মুক্তিযোদ্ধা ভবন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কাকে দিয়েছেন? -----

৯. এই ভবন নির্মাণ করার একটি উদ্দেশ্য হলো: ১ম ও ২য় তলা ভাড়া দিয়ে এই আয় মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যবহার করা।

সুতরাং আপনার জেলার ভবন ভাড়া দেয়া হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

না হলে কেন হয় নাই?-----

হ্যাঁ হলে এর অর্থ ও ব্যবস্থাপনা কিভাবে হচ্ছে?-----

১০. প্রকল্প বাস্তবায়নে কি কি সুযোগ ছিল বলে আপনি মনে করেন?-----

১১. এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার আরো কোন মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন-----

সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ সময়:...../.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: প্রশ্ন পত্রটি পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ পড়ে থাকলে উত্তরদাতা কে আবার ও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিক ভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তর দাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও ডেপুটি কমান্ডার কেআইআই গাইডলাইন

তথ্য সংগ্রহ শুরুর সময়:.....

i. উত্তরদাতার নাম :

ii. জেলার নাম :

iii. মোবাইল নং :

১. আপনার জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প সম্পর্কে কিছু বলুন।

২. আপনি বা আপনার কোন প্রতিনিধি কি কখনো প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেছেন? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে কতবার পরিদর্শন করেছেন -----বার

৩. প্রকল্প সাইট পরিদর্শন কালে নির্মাণ কাজের কোন সবল ও দুর্বল দিক আপনার দৃষ্টিগোচর হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. যদি হ্যাঁ হয় তবে আপনার মতে দুর্বল দিকসমূহ কি কি -----

খ. সবল দিকসমূহ কি কি -----

৪. যে সকল দুর্বলতা আপনার মনে হয়েছে তা কিভাবে উত্তোরণ করা যেত বলে আপনি মনে করেন? -----

৫. আপনি কি পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণগুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছেন? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. পরিদর্শনের সুপারিশসমূহ কিভাবে ফলো-আপ করেছেন/করছেন? -----

৬. আপনি কি মনে করেন, এই প্রকল্পের ফলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, ১. হ্যাঁ, ২. না

হ্যাঁ হলে কেন মনে করেন? -----

৭. বর্তমানে আপনার জেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কোন কমিটি আছে কি? ১. হ্যাঁ, ২. না

যদি না হয় তবে মুক্তিযোদ্ধা ভবন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কাকে দিয়েছে-----

৮. এই ভবন নির্মাণ করার একটি উদ্দেশ্য হল ১ম ও ২য় তলা ভাড়া এই আয় থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যবহার করা।

সুতরাং আপনার জেলার মুক্তিযোদ্ধা ভবন ভাড়া দেয়া হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

না হলে কেন হয় নাই?-----

হ্যাঁ হলে ভাড়ার অর্থ ও ব্যবস্থাপনা কিভাবে করা হচ্ছে-----

৯. আজ পর্যন্ত এই ভবনের ভাড়ার টাকা দিয়ে কোন জাতীয় দিবস উৎযাপন করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
হ্যাঁ হলে কোন কোন দিবস উৎযাপনে ব্যবহার করা হয়েছে? -----
না হলে কেন ব্যবহার করা হয় নি? -----
১০. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বর্তমান বয়স বিবেচনা করে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার জন্য কী কী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন-----
১১. এই প্রশিক্ষণ গ্রহন করার পর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে যুক্ত হতে পারবে? ১. হ্যাঁ ২. না
১২. আপনি কি মনে করেন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স বিবেচনা করে তাদের পরিবারের অন্য কোন সদস্যকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে? ১. হ্যাঁ ২. না
হ্যাঁ হলে কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?-----
১৩. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে কি কি প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?-----
১৪. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকার কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?-----
১৫. জনগণ যাতে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য কী কী কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?-----
১৬. প্রকল্প বাস্তবায়নে কি কি সুযোগ ছিল বলে আপনি মনে করেন?-----
১৭. এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার আরো কোন মূল্যবান মতামত থাকলে দয়া করে বলুন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ সময়:...../.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: প্রশ্ন পত্রটি পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ পড়ে থাকলে উত্তরদাতা কে আবার ও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিক ভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তর দাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

সংযুক্তি-৪.৯

“সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

এফজিডি গাইডলাইন

পরিচিতি ও গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনা

আসছালামু আলাইকুম/নমস্কার,

আমরা ----- “উন্নয়ন ধারা” নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি। উন্নয়ন ধারা, বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী এবং আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা/জরিপ কার্য পরিচালনা করে আসছে। “সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পক্ষ থেকে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ এর জন্য আপনাদের কাছে এসেছি।

গোপনীয়তা এবং সম্মতি: আমরা এই সাক্ষাতকারে উক্ত প্রকল্পের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাইব। এই জরিপ সম্পর্কে আপনার যদি আর কোন প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আপনি জনাব মো: সাইদুর রহমানের সাথে এই ফোন (০১৭১২ ১০০৫৫৯) নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

আপনাদের দেয়া সকল তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং এই তথ্য সংগ্রহ করতে আমাদের আনুমানিক এক ঘন্টা সময় লাগবে। জরিপে অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের কোন প্রকার জোর করা হবে না এবং আমরা আশা করছি আপনারা স্বেচ্ছায় প্রশ্নোত্তর দিতে রাজি হবেন কেননা এই বিষয়ে আপনাদের মতামত আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা কোন উত্তর না দিতে চাইলে আমাদেরকে বলবেন আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাব। এই জরিপে তথ্য দিয়ে আমাদেরকে সহায়তা করার জন্য আমরা আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনাদের কি এই জরিপ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আছে? আমরা কি তাহলে শুরু করতে পারি ?

সাক্ষাৎকার শুরুর সময়:

এফজিডি হাজিরা সিট:

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	পেশা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর

এফজিডি গাইডলাইন/নমুনা প্রশ্নপত্র

বিষয়: জাতীয় দিবসে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে জনগণের মাঝে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা:

- ১। আপনার মতে, জাতীয় দিবসে কোন কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত?
- ২। আপনার মতে, তরুণ প্রজন্মের মাঝে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত?

বিষয়: অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান:

- ১। আপনার মতে, অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কিভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে?
- ২। আর্থিক সহায়তার ফলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কী কী উপকার হবে বলে আপনারা মনে করেন?

বিষয়: তথ্য-প্রযুক্তি, আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা:

- ১। আপনার মতে, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কি কি ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে?
- ২। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য-প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের জন্য কি কি ডিজিটাল ডিভাইস প্রদান করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?
- ৩। আপনার মতে, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য-প্রযুক্তি ছাড়া আর কি কি আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে?
- ৪। বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কি কি প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?
- ৫। আপনারা কি গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় যোগ করতে চান?

এফজিডি/সাক্ষাৎকার শেষ সময় :

ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

“সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

ভবন পরিদর্শন চেকলিষ্ট

জেলার নাম:.....ভবনের ঠিকানা:
 তথ্য সংগ্রহের তারিখ..... তথ্য সংগ্রহ শুরুর সময়:...../.....

১. মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এর বাহির পাশের তথ্যের জন্য নিম্নের চেকলিষ্ট পূরণ করুন।

গাইড লাইন: (ভবনটির চারদিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন (দেয়াল সহ), এর পাশে কী কী আছে যেমন-দোকান, হোটেল, স্কুল, পার্ক ইত্যাদি, ভালো ভাবে দেখে নিন। ভবনের সামনের ফটকে বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল সহ ছবি নিন। ম্যুরারের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এর মাপ নিন এবং লিপিবদ্ধ করুন। রাস্প দিয়ে হাটুন এবং তার পর মন্তব্য করুন।)

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্তমান অবস্থা		মন্তব্য
		হ্যাঁ (✓)	না (✓)	
১	ভবনের অবস্থান (এর পাশে কী কী আছে-দোকান, হোটেল, মাঠ ইত্যাদি)			
২	ভবনের চারিপাশে সীমানা প্রাচীর আছে কী না			
৩	ভবনের মূল ফটকে 'নাম ফলক' আছে কি না?			
৪	মূল ফটকের পাশের বজ্রবন্ধুর ম্যুরাল আছে কি না?			
৫	ভবনটি কতদিন হয় হস্তান্তর করা হয়েছে?			
৬	ভবনটির উদ্বোধনের তারিখ লিখুন, ছবি সহ			

২. মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এর নীচতলা পর্যবেক্ষণ করুন এবং নিম্নের চেকলিষ্ট পূরণ করুন।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা)	ভাড়ার অবস্থা		টাকার পরিমাণ	কি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে	মন্তব্য
				হ্যাঁ (✓)	না (✓)			
১	নীচ তলার সিঁড়িটি পর্যবেক্ষণ করুন							
২	রাস্প এর অবস্থান দেখুন এবং মন্তব্য লিখুন							
৩	নীচ তলায় কয়টি দোকান আছে?							
৩.১	১নং দোকান							
৩.২	২নং দোকান							
৩.৩	৩নং দোকান							
৩.৪	৪নং দোকান							
৩.৫	৫নং দোকান							
৩.৬	৬নং দোকান							
৩.৭	৭নং দোকান							
৩.৮	৮নং দোকান							
৩.৯	৯নং দোকান							
৩.১০	১০নং দোকান							
৩.১১	১১ নং দোকান							
৩.১২	১২নং দোকান							
৩.১৩	১৩ নং দোকান							
৩.১৪	১৪ নং দোকান							
৩.১৫	১৫ নং দোকান							
৩.১৬	১৬ নং দোকান							
৩.১৭	১৭ নং দোকান							
৩.১৮	১৮ নং দোকান							
৩.১৯	১৯ নং দোকান							
৩.২০	২০ নং দোকান							

দোকান ভাড়া হলে নিম্নলিখিত বিসয়সমূহের তথ্য সংগ্রহ করুন:

- দোকান কোন তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে : -----/------/২০-----
- বর্তমানে মাসিক কত টাকা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে : -----মাসিক টাকা-----বাৎসরিক টাকা
- দোকানের চুক্তিপত্র দেখুন : চুক্তিপত্র আছে কি হ্যাঁ না
- দোকানের ভাড়া কে গ্রহণ করছে : -----
- ভাড়া কি ব্যংক হিসাবে না ক্যাশ দেয়া হয় : -----
- দোকান ভাড়া না হলে তার কারনসমূহ কি কি : -----
- ভবনের জন্য কত তারিখে আসবাব পত্র গ্রহণ করেছেন : -----/------/২০-----

৩. দ্বিতীয় তলার জন্য চেক লিষ্ট

গাইড লাইন: (২য় তলা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন যেমন-কয়টি টয়লেট আছে, ব্যবহার যোগ্য কিনা, পুরুষ, মহিলাদের আলাদা টয়লেট আছে কি না (নেম প্লেট দেখে নিন), কয়টি চেয়ার, টেবিল আছে, টেবিলের সাইজ ভালো ভাবে দেখে/পর্যবেক্ষণ করে তার পর নিম্নের ফর্মটি পূরণ করুন।) এবং আসবাবপত্রের বর্তমান অবস্থা নোট করুন?

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	বর্তমান অবস্থা		মন্তব্য
			ভালো	নষ্ট	
১	কত টি টয়লেট আছে?				
২	কত ধরনের টয়লেট আছে (ধরন অনুসারে মন্তব্যের ঘরে লিখুন)				
৩	কতটি বেসিন আছে?				
৪					

- ২য় তলা বর্তমানে কোন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে কী? হ্যাঁ না
- হ্যাঁ হলে কি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে? -----
- কমিউনিটি সেন্টার হিসাবে ভাড়ার জন্য রান্নার ব্যবস্থা, প্লেট-গ্লাস ধোয়ার ব্যবস্থা আছে কি? থাকলে কি কি ব্যবস্থা আছে? (পর্যবেক্ষণ করুন এবং তার পর লিখুন): -----
- রান্না ঘর আছে কি? হ্যাঁ না
- চুলার ব্যবস্থা আছে কি? হ্যাঁ না
- উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ না থাকলে ভাড়া দিতে সমস্যা হবে কি? সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে জেনে লিখুন:-----
- ২য় তলা এখন পর্যন্ত ভাড়া দেয়া হয়েছে কি না? হ্যাঁ না
- হ্যাঁ হলে, কী কাজে ভাড়া দেওয়া/ব্যবহার করা হয়েছে?-----
- কোন তারিখ থেকে ভবন ভাড়া দেওয়া হয়েছে:-----/------/২০-----
- বর্তমানে মাসিক কত টাকা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে:-----মাসিক টাকা-----বাৎসরিক টাকা
- বর্তমানে কে ভাড়া গ্রহণ করেছেন:-----
- কিভাবে/কার অনুমতি সাপেক্ষে ভাড়া গ্রহণ করেছেন: -----

৪. তৃতীয় তলার জন্য চেক লিষ্ট:

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	বর্তমান অবস্থা		মন্তব্য
			ভালো (✓)	খারাপ (✓)	
১	মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস				
২	সহকারি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের অফিস				
৩	কতটি টয়লেট আছে (ধরন অনুসারে সংখ্যা মন্তব্যের ঘরে লিখুন)				
৪	সেমিনার কক্ষ				
৫	কোন লাইব্রেরী আছে কি না?				
৬	লাইব্রেরীতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই আছে কিনা?				

অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী যাচাইকরণ চেকলিষ্ট

৫. ক মেসিনারী এবং অফিস সরঞ্জামাদি যাচাইকরণ (জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমেপ্লেক্স ভবন)।

ক্রমিক নং	পন্যের নাম	প্রাপ্ত সংখ্যা	তথ্য সংগ্রহের সময় প্রাপ্ত সংখ্যা	বর্তমান অবস্থা (✓)		মন্তব্য
				ভালো	নষ্ট/খারাপ	
১	ফটোকপি মেশিন	১				
২	কম্পিউটার	১				
৩	প্রিন্টার	১				
৪	ইউ.পি.এস	১				
৫	এয়ার কুলার	১				
৬	ল্যাপটপ	১				
৭	ক্যামেরা	১				
৮	স্ক্যানার	১				
৯	ওভারহেড প্রজেক্টর	১				
১০	টেলিভিশন	১				
১১	টেলিফোন	১				
১২	ফ্যাক্স মেশিন	১				
১৩	এলসিডি টিভি (২৮ ইঞ্চি)	১				
১৪	কনফারেন্স সাউন্ড সিস্টেম	১				
সর্বমোট প্রাপ্ত সংখ্যা						

৫. খ আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদি যাচাইকরণ (জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমেপ্লেক্স ভবন)।

ক্রমিক নং	পন্যের নাম	প্রাপ্ত সংখ্যা	তথ্য সংগ্রহের সময় প্রাপ্ত সংখ্যা	বর্তমান অবস্থা		মন্তব্য
				ভালো	নষ্ট	
১	সেক্রেটারিয়েট টেবিল	২				
২	সেক্রেটারিয়েট চেয়ার	২				
৩	কুশন চেয়ার	১০				
৪	স্টিল আলমারি	৪				
৫	ফাইল কেবিনেট	৪				
৬	কম্পিউটার টেবিল	১				
৭	কম্পিউটার চেয়ার	১				
৮	টেবিল	৪				
৯	ভিজিটর চেয়ার	৫০				
১০	সো-কেস-হট নট	২				
১১	কনফারেন্স টেবিল (সংখ্যা)	১				
১২	কনফারেন্স চেয়ার	২০				
১৩	বীর শ্রেষ্ঠদের পেইনটিং	৭				
১৪	মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পেইনটিং (সংখ্যা)	১				
১৫	বই এবং সিডি (সংখ্যা)	১				
সিডিউল অনুযায়ী প্রাপ্ত মোট সংখ্যা						

- অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র আছে কি? হ্যাঁ না
- সর্বমোট কতটি আছে ----- টি
- অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এর এক্সপেরারী তারিখ আছে কি? হ্যাঁ না
- অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে কি? হ্যাঁ না

তথ্য সংগ্রহ শেষ সময়: -----

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংযুক্তি-৪.১১

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

“সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমের মূল্যায়ন চেকলিষ্ট

সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত নীতি-২০০৬, সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত বিধি-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল/সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী
(প্রতিটি প্যাকেজের জন্য আলাদা আলাদা চেক লিষ্ট ব্যবহার করা হবে)

তথ্য সংগ্রহ শুরুর সময়: -----

ক্রমিক নং	বিষয়	উত্তর/ মন্তব্য লিখুন
১	প্রকল্পের নাম	
২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে)	
৫	ক্রয় পদ্ধতি	
৬	ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ	(১) অন-লাইন (২) অফ-লাইন
৭	দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ না
৮	বিনির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ না
৯	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)	১। পত্রিকার নামঃ (বাংলা)-----তারিখঃ----- ২। পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি)-----তারিখঃ----- ৩। সিপিটিইউ ওয়েব সাইট -----তারিখঃ-----
১০	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষের তারিখ ও সময়	শুরু-----শেষ-----তারিখঃ সময়ঃ
১১	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	-----টি
১২	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	-----টি
১৩	টিওএস তৈরির তারিখ	
১৪	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	তারিখঃ সময়ঃ
১৫	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	-----জন
১৬	টিওএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না?	
১৭	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	/ /
১৮	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	----- জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা-----জন
১৯	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	----- জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা-----জন
২০	দরপত্রের জামানত জমা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে- অর্ডার, চালান ইত্যাদি)	হ্যাঁ না
২১	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	----- টি
২২	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	----- টি
২৩	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	

২৪	Notification of Award প্রদানের তারিখ	-----তারিখ
২৫	প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)	-----টাকা
২৬	চুক্তি মূল্য	-----টাকা
২৭	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	
২৮	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	
২৯	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	
৩০	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	
৩১	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	
৩২	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	
৩৩	<input type="checkbox"/> সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি? <input type="checkbox"/> হলে কতদিন বৃদ্ধি; এবং <input type="checkbox"/> বৃদ্ধির কারণ;	
৩৪	সরবরাহকৃত মালামালের ওয়ারেন্টি ছিল কি ?	হ্যাঁ না
৩৫	ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছিল কি না ?	হ্যাঁ না
৩৬	যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুন	
৩৭	ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ?	হ্যাঁ না
৩৮	ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি	
৩৯	ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ না
৪০	হ্যাঁ হলে অডিট আপত্তি ছিল কিনা?	হ্যাঁ না
৪১	অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি ছিল এবং কতটি নিষ্পন্ন হয়েছে?	আপত্তির সংখ্যা-----টি নিষ্পন্নর সংখ্যা-----টি
৪২	অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন না হয়ে থাকলে তার কারণ?	----- -----

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর

(সিলসহ)

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর

তথ্য সংগ্রহ শেষ সময়: -----



Unnyan Dhara

The Hub of Consultancy Service
House # 31/2, Road # 6
Block # Ka, Shyamoli Housing Society
Adabar, Dhaka-1207
Cell Phone # 88-01712100559
e-mail id: [Sayeed.luna@gmail.com](mailto:Sayed.luna@gmail.com)
