



প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) - ১ম পর্যায়



মূল্যায়ন সেক্টর
বাস্তুবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমীক্ষক



ক্রান্তি এসোসিয়েটস্ লিমিটেড

জুন ২০১৫

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) (প্রথম পর্যায়) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

ক্রান্তি পরামর্শকবৃন্দ

ড. মো: মুস্তাফিজুর রহমান
টিম লিডার

ড. এ আর এম মমতাজউদ্দিন
আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ

মো: শামসুল আলম
পরিসংখ্যানবিদ

আইএমইডি কর্মকর্তাবৃন্দ

সালমা মাহমুদ
মহা-পরিচালক

মালিহা নাগিস
পরিচালক

মো: মোশারফ হোসেন
উপ-পরিচালক

পরিচালনায়

মূল্যায়ন সেক্টর

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমীক্ষক



ক্রান্তি এসোসিয়েটস্ লিমিটেড

জুন ২০১৫

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদীবিধৌত দেশের চরাঞ্চলে অধিবাসীদের আয় বৃদ্ধি, স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক “চর জীবিকায়ন কর্মসূচি” বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ছিল জুন ২০০৪ হতে জানুয়ারি ২০১১ এবং সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ ছিল ৬৬৭৪৯.৮৬ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল্যায়ন সেক্টর আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে ‘মেসার্স ক্রান্তি এসোসিয়েটস লিঃ’ নামক পরামর্শক ফার্মকে নিযুক্ত করে।

মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে ছিল - বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ প্রকল্পের ডিপিপি এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা করা, প্রকল্পের প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলি ক্রয় নীতিমালা অনুসারে সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা; প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন- প্রশিক্ষণ, অর্থ-সম্পদ হস্তান্তর, স্বাস্থ্য কর্মসূচি, অপ্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রম, বাড়ি-ভিটা উচ্চকরণের মাধ্যমে পুনর্বাসন এবং ভিলেজ সেভিংস গ্রুপ কর্মকাণ্ড, পরিবেশের দূষণ হ্রাস, নারী ও মেয়ে শিশুদের মর্যাদা বৃদ্ধি, পারিবারিক আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি ইত্যাদির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।

মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফলে প্রকল্পের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ও বিষয়সমূহ লক্ষণীয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো-চরবাসীদের ভিটা উচ্চকরণের ফলে বর্ষাকালে বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়া, ভিটার ঢালে শাক-সবজি চাষ, গাভী পালন ইত্যাদির মাধ্যমে আয়, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, দরিদ্রতার হার হ্রাস, দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন, সঙ্কয়ে সুবিধা, স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি, মালামাল পরিবহন সহজতর হওয়া, অপ্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রম চালু এবং বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার মান উন্নয়ন ইত্যাদি।

ক্রান্তি এসোসিয়েটস লিঃ এর মূল্যায়ন টিমকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া মূল্যায়ন সেক্টরের মহাপরিচালক ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রকল্প পরিচালকসহ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে যৌথ মূল্যায়ন টিমকে সুষ্ঠুভাবে সমীক্ষা সম্পন্ন করতে সহায়তা প্রদান করেছেন তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে, এ মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

(মোঃ শহীদ উল্লাহ খন্দকার)

সচিব

আইএমইডি

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা


“চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (প্রথম পর্যায়)” প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাটি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল্যায়ন সেক্টর সম্পন্ন করেছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে ছিল প্রকল্পের আওতাভুক্ত চরাঞ্চলের চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেকের নিচে নামিয়ে আনা; চর অধিবাসীদের নিরাপত্তাহীনতা ও পরিবেশজনিত ঝুঁকি হ্রাস করা; সুবিধাভোগীদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা; নারী ও মেয়ে শিশুদের প্রতি সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করা; প্রকল্প এলাকার পরিবারসমূহের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষার পরিবেশ প্রদানের লক্ষ্যে পাইলট কর্মসূচি চালু করা এবং প্রকল্পের অর্জিত অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করা।

প্রভাব মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে ছিল বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ প্রকল্পের ডিপিপি এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা করা, প্রকল্পের প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলি ক্রয় নীতিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা; প্রশিক্ষণ, অর্থ-সম্পদ হস্তান্তর, স্বাস্থ্য কর্মসূচি, অপ্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রম, বাড়ি-ভিটি উঁচুকরণের মাধ্যমে পুনর্বাসন এবং ভিলেজ সেভিংস গ্রুপ কর্মকান্ড, পরিবেশের দূষণ হ্রাস, নারী ও মেয়ে শিশুদের মর্যাদা বৃদ্ধি, পারিবারিক আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

মূল্যায়ন সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চরবাসীদের ভিটি উঁচুকরণের ফলে বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া, ভিটির ঢালে শাক-সবজি চাষ, গরু, ছাগল ও ভেড়া পালনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, অতিরিক্ত শ্রমের সুযোগ বৃদ্ধি, দরিদ্র মহিলাদের সামাজিক ক্ষমতায়ন, সঞ্চয়ের সুবিধা, স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে মালামাল পরিবহন সহজতর হওয়া, অপ্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রম চালু এবং বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানোন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

সমীক্ষাটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করে প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রভাব মূল্যায়নের কাজে টেকনিক্যাল এবং স্টিয়ারিং কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ বিশেষ করে আইএমইডি'র সচিব জনাব মোঃ শহীদ উল্লাহ খন্দকারকে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ মূল্যায়ন কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রকল্প পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কর্মশালায় উপস্থিত সম্মানিত অংশগ্রহণকারীগণকে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে, এই মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রতিবেদনটিতে চিহ্নিত সমস্যাবলি ও প্রদত্ত সুপারিশমালা পরবর্তীতে এধরনের প্রকল্প গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।


(সালমা মহিমুদ)
মহাপরিচালক
মূল্যায়ন সেক্টর, আইএমইডি
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

Acronyms

ADP	:	Annual Development Program.
ATP	:	Assets Transfer Program.
AUS Aid	:	Australian Aid
BBS	:	Bangladesh Bureau of Statistics.
CLP	:	Char Livelihoods Program.
CSN	:	Community Safety Net
DCI	:	Data Collection Instrument.
DFID	:	Department for International Development.
DPP	:	Development Project Proposal.
FGD	:	Focus Group Discussion.
IEP	:	Infrastructure Employment Program.
IMLA	:	Innovation, Monitoring and Learning Agency.
IMO	:	Implementing Management Organization.
KII	:	Key Informant Interview.
LCS	:	Labour Contracting Society
LS P	:	Livestock Service Provider
MMS	:	Manob Mukti Sangastha
NDP	:	National Development Program.
PIC	:	Project Implementation Committee.
PRSP	:	Poverty Reduction Strategy Paper.
SWOT	:	Strength Weakness Opportunity and Threat.
UK Aid	:	United Kingdom Aid
VDC	:	Village Development Committee
VSLA	:	Village Saving and Loan Association.

সূচিপত্র

পরিচ্ছেদ

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ.....	পৃষ্ঠা নং
	i-iv
প্রথম পরিচ্ছেদ	
প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য	১-৪
১.১ পটভূমি	১
১.২ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১
১.৩ প্রকল্পের মূল কর্মসূচি	২
১.৪ সিএলপি-১ এর অভিষ্ট সুবিধাভোগীদের যোগ্যতাবলি	২
১.৫ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি.....	২
১.৬ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি.....	৩
১.৭ বর্তমান সমীক্ষার উদ্দেশ্য	৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
প্রকল্পের ডিপিপি এর সাথে বাস্তবায়িত কর্মসূচির সঙ্গতি পর্যালোচনা.....	৫-১৫
২.১ পৃষ্ঠপোষকতা, অর্থ সংস্থান, প্রকল্প নকশা সংশোধন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি.....	৫
২.২ প্রকল্প ব্যয়.....	৫
২.২.১ মোট বরাদ্দ ও ব্যয়.....	৫
২.২.২ জিওবি অংশের বরাদ্দ ও ব্যয়.....	৬
২.২.৩ ডিএফআইডি প্রকল্প সাহায্য অংশের বরাদ্দ ও ব্যয়.....	৬
২.৩ প্রকল্প কর্মসূচি বাস্তবায়ন.....	৯
২.৩.১ অবকাঠামো উন্নয়ন.....	১০
২.৩.২ কাজের জন্য নগদ অর্থ.....	১১
২.৩.৩ সম্পদ হস্তান্তর কর্মসূচি.....	১১
২.৩.৪ কৃষি প্রযুক্তি সহায়তা.....	১১
২.৩.৫ পশু পালন ও চিকিৎসা সহায়তা.....	১২
২.৩.৬ সামাজিক উন্নয়ন.....	১২
২.৩.৭ স্থানীয় শাসন উন্নয়ন.....	১২
২.৩.৮ উদ্যোক্তা উন্নয়ন (Enterprise Development).....	১২
২.৩.৯ পাইলট স্বাস্থ্য কর্মসূচি.....	১৩
২.৩.১০ পাইলট শিক্ষা কর্মসূচি.....	১৩
২.৪ প্রকল্পের অধীনে পণ্য ও কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ.....	১৩
২.৪.১ ভূমিকা.....	১৩
২.৪.২ জিওবি অংশে পণ্য ক্রয়.....	১৩
২.৪.৩ ডিএফআইডি এর অধীনে পণ্য ক্রয় কার্যাবলি সংক্রান্ত তথ্যাবলি.....	১৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
সমীক্ষা পদ্ধতি.....	১৬-২০
৩.১ প্রকল্পটি সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ.....	১৬
৩.২ সমীক্ষা পদ্ধতি.....	১৬
৩.২.১ সমীক্ষার নমুনা এলাকা.....	১৬
৩.২.২ খানা জরিপের নমুনার আকার.....	১৮

৩.২.৩	গুনগত জরিপ.....	২০
৩.২.৪	তথ্য সংগ্রহ ছক/প্রশ্নমালা.....	২০
৩.২.৫	তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ.....	২০
৩.২.৬	সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা.....	২০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

	সুবিধাভোগী ও কন্ট্রোল পরিবারের বৈশিষ্ট্য.....	২১-২৫
৪.১	ভূমিকা.....	২১
৪.২	নির্বাচিত সিএলপি সদস্য ও কন্ট্রোল সদস্যদের পারিবারিক বৈশিষ্ট্য.....	২১
৪.৩	সিএলপি ও কন্ট্রোল উত্তরদাতাগণের বয়স.....	২১
৪.৪	সিএলপি ও কন্ট্রোল সদস্যের স্বামীর বয়স.....	২২
৪.৫	সিএলপি ও কন্ট্রোল পরিবারের সদস্য সংখ্যা.....	২২
৪.৬	সিএলপি ও কন্ট্রোল সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা.....	২২
৪.৭	সিএলপি ও কন্ট্রোল সদস্যের স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা.....	২৩
৪.৮	সিএলপি ও কন্ট্রোল সদস্যের স্বামীর পেশা.....	২৩
৪.৯	সিএলপি ও কন্ট্রোল সদস্যের ছেলে/মেয়ে (৬-১০ বৎসর) স্কুলে যায় এমন খানার সংখ্যা.....	২৪
৪.১০	জমাজমির পরিমাণ.....	২৪
৪.১১	বসতবাড়ীর ধরন.....	২৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

	সিএলপি হতে সহযোগিতা পাওয়ার ধরন.....	২৬-২৮
৫.১	সিএলপি হতে সহযোগিতা পাওয়ার ধরন.....	২৬
৫.২	সিএলপি হতে গরু প্রদান.....	২৬
৫.৩	ভিএসএলএ/সমিতি সম্পর্কিত.....	২৭
৫.৪	সিএলপি ভুক্ত এনজিও হতে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ.....	২৭
৫.৫	সিএলপি ভুক্ত এনজিও কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট প্রকাশ.....	২৮
৫.৬	ভিএসএলএ সম্পর্কিত.....	২৮
৫.৭	সিএলপি হতে কৃষি সম্পর্কিত প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ.....	২৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

	প্রকল্পের প্রভাব.....	২৯-৪৩
৬.১	ভিটি উঁচু করণের প্রভাব.....	২৯
৬.২	দুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ.....	২৯
৬.৩	গরু ক্রয়ের ফলে আর্থিক অবস্থার উন্নয়নসমূহ.....	৩০
৬.৪	বসত ভিটায় শাক-সবজি চাষ.....	৩১
৬.৫	সম্পদের মালিকানা.....	৩১
৬.৬	বিভিন্ন উৎস থেকে পরিবারের আয়.....	৩৩
৬.৭	পরিবারের ব্যয়.....	৩৪
৬.৮	সমীক্ষা এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রভাব.....	৩৫
৬.৯	সমীক্ষা এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের উপর সিএলপির প্রভাব.....	৩৫
৬.১০	নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন ব্যবহার এর উপর সিএলপির প্রভাব.....	৩৬
৬.১১	অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা.....	৩৭
৬.১২	সিএলপি সদস্যগণের অপ্রাতিষ্ঠানিক স্কুল থেকে অর্জন.....	৩৭
৬.১৩	স্বাস্থ্য সম্পর্কিত.....	৩৮
৬.১৪	খাওয়ার সেলাইনের ব্যবহার.....	৩৮
৬.১৫	খাবার সেলাইনের উৎস.....	৩৮

৬.১৬	স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের স্থান.....	৩৯
৬.১৭	পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কিত	৪০
৬.১৮	সামাজিক সচেতনতা.....	৪১
৬.১৯	বাল্য বিবাহের কুফল.....	৪১
৬.২০	পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ.....	৪২
৬.২১	পারিবারিক কলহ/নির্যাতন সংক্রান্ত.....	৪২
৬.২২	নির্যাতিত হওয়ার কারণসমূহ.....	৪২
৬.২৩	দারিদ্রতার উপর সিএলপি'র প্রভাব.....	৪৩
সপ্তম পরিচ্ছেদ		
	প্রকল্পের সবলদিক ও দুর্বলদিকসমূহ (SWOT analysis).....	৪৪-৪৫
৭.১	ভূমিকা.....	৪৪
৭.২	সবলদিকসমূহ (Strength).....	৪৪
৭.৩	দুর্বলদিকসমূহ (Weakness).....	৪৪
৭.৪	সুযোগসমূহ (Opportunity).....	৪৫
৭.৫	প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ (Threat).....	৪৫
অষ্টম পরিচ্ছেদ		
	সুপারিশমালা ও উপসংহার	৪৬-৪৮

পরিশিষ্ট

- পরিশিষ্ট-১ : সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জিওবি অংশের খাতওয়ারী আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি
- পরিশিষ্ট-২ : সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প সাহায্য অংশের (ডিএফআইডি) খাতওয়ারী আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি
- পরিশিষ্ট-৩ : উপকারভোগী জরিপ প্রশ্নমালা
- পরিশিষ্ট-৪ : কম্বোয়াল গ্রুপ জরিপ প্রশ্নমালা
- পরিশিষ্ট-৫ : FGD প্রশ্নমালা
- পরিশিষ্ট-৬ : KII চেকলিষ্ট
- পরিশিষ্ট-৭ : Procurement Checklist

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাংশে যমুনা নদীর চরে বসবাসরত প্রায় ৩০ লক্ষ জনবসতির জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন কল্পে ডিএফআইডির সহায়তায় ২০০৪ হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত “চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি)” পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়।

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো ২০১১ সালের মধ্যে প্রকল্পের আওতাভুক্ত চরাঞ্চলের চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেকের নিচে নামিয়ে আনা। প্রকল্পের অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ হলো :

- (ক) চর অধিবাসীদের নিরাপত্তাহীনতা এবং পরিবেশজনিত ঝুঁকি হ্রাস করা;
- (খ) সুবিধাভোগীদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- (গ) নারী ও মেয়ে শিশুদের প্রতি সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করা;
- (ঘ) প্রকল্পের দুর্বল এলাকার পরিবারসমূহের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা পরিবেশ প্রদানের লক্ষ্যে পাইলট কর্মসূচি চালু করা এবং
- (ঙ) প্রকল্পের অর্জিত অগ্রগতি/অভিজ্ঞতাসমূহ লিপিবদ্ধ করা।

সমীক্ষার উদ্দেশ্য

- (ক) প্রকল্পের বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ প্রকল্পের DPP এর সঙ্গে সংজ্ঞাপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা করা;
- (খ) প্রকল্পের প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলি পিপিআর-২০০৮ মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়েছে কি না তা পর্যালোচনা করা;
- (গ) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম: যেমন-প্রশিক্ষণ, অর্থ ও সম্পদ স্থানান্তর, স্বাস্থ্য কর্মসূচি, অপ্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রম, বাড়ীর ভিটি উঁচু করণের মাধ্যমে পূর্ববাসন এবং ভিলেজ সেভিংস গ্রুপ কর্মকাণ্ড ইত্যাদির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা;
- (ঘ) প্রকল্পের অন্যান্য কর্মসূচি যেমন পরিবেশের দূষণ হ্রাস, নারী ও মেয়ে শিশুদের মর্যাদা বৃদ্ধি, পারিবারিক আয় ও সম্পদ, বাজারে সহজ অংশ গ্রহণ ইত্যাদির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা;
- (ঙ) প্রকল্পটির মাধ্যমে যাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাঁদের দক্ষতা, সম্ভাব্য সুযোগ, দুর্বলদিকসমূহ এবং বাস্তবায়নকালীন হুমকি/সমস্যা SWOT বিশ্লেষণের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা; এবং
- (চ) চরাঞ্চলবাসীদের জীবন ও জীবিকাকে আরো টেকসই ও অবদান সম্পন্ন অংশগ্রহণমূলক করে দেশের স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতির উন্নতিসহ অন্যান্য প্রকল্প এলাকায় replication এর লক্ষ্যে সুপারিশ করা।

প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ১৬০০ জন উপকারভোগী ও ৮০০ জন কন্ট্রোল গ্রুপ এমন পরিবারকে নির্বাচন করা হয় এবং সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে নির্ধারিত প্রশ্ন পত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া গুণগত জরিপ হিসাবে ১৪টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, ২৮টি কি ইনফরমেন্ট ইনটারভিউ (KII) ও একটি মাঠ পর্যায়ে ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প সম্পর্কিত সেকেন্ডারি তথ্য যেমন প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িত কর্মসূচি, মোট ব্যয় ও প্রকল্পের আওতায় পণ্য ও সেবা ক্রয়ে মূল্যায়নের প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ-

- সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট অর্থের সংস্থান ছিল ৬৬৭৪৯.৮৩ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ছিল জিওবি খাতে ৯০৩.৯৪ লক্ষ টাকা এবং ডিএফআইডি হতে প্রকল্প সাহায্য খাতে ৬৫,৮৪৫.৮৯ লক্ষ টাকা। প্রকৃত মোট ব্যয় হয়েছে ৫৮৫৮৫.৬৬ লক্ষ টাকা (৮৭.৭৭%)। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ৫৮১২৮.২৬ লক্ষ টাকা (৮৮.২৮%) এবং জিওবি খাতে মাত্র ৪৫৭.৪০ লক্ষ টাকা (৫০.৬০%)। এতে দেখা যায় যে, কোন খাতেই সম্পূর্ণ বরাদ্দ ব্যয় হয়নি।

প্রাপ্ত ফলাফল

- ১) নির্বাচিত সুবিধাভোগী সিএলপি ১৬০০ সদস্যের মধ্যে শতকরা ৯৮ জন সদস্য প্রকল্পের টাকা হতে গরু/গাভী, ছাগল-ভেড়া (২৮%) ও হাঁস-মুরগি (১৪%) ক্রয় করেছেন। যারা গাভী ক্রয় করেছেন তাঁদের মধ্যে ৫৫.৬% প্রতিদিন গড়ে ২.১ লিটার দুধ পেয়েছেন এবং দুধ বাজারে বিক্রয় করে রোজ ৫৫.৮০ টাকা রোজগার করেছেন।
- ২) নির্বাচিত ১৬০০ সুবিধাভোগী সিএলপি খানার প্রায় সবকয়টি (৯৬.৬%) ঘরের ভিটি উঁচু করা হয়েছে যার ফলে ৮৯% উত্তরদাতার ঘরবাড়ী বন্যার ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।
- ৩) উঁচুকৃত ভিটার ঢালে ৮৪% সদস্যের গাছপালা বা তরি-তরকারীর বাগান করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে আরও দেখা যায় যে ৭৫% পরিবার ভিটি উঁচুকরণ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।
- ৪) ভিটি উঁচুকরণের ফলে বসতভিটার মাটির ক্ষয়রোধ হয়েছে।
- ৫) ৯% জমি বন্ধক নিয়েছে এবং ৭% গরু মোটাতাজা করে বিক্রয় করে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন।
- ৬) দুগ্ধ বাজারজাতকরণের অসুবিধা আছে বলে উল্লেখ করেছেন।
- ৭) সিএলপি সদস্যগণের শতকরা ৯৪ ভাগ এবং কন্ট্রোল খানা সমূহের শতকরা ৬৩.৪ ভাগ পরিবার বসতভিটায় শাক-সবজি চাষ করেছেন। শাক-সবজি উৎপাদনকারী সিএলপি পরিবারের শতকরা ৬৭.৬ জন পরিবার বসতভিটায় উৎপাদিত শাক-সবজি নিজেদের খাওয়ার পরেও বাজারে বিক্রয় করেন।
- ৮) সিএলপি সদস্যদের ৬০% গরু, ৪৮% ছাগল-ভেড়া ও ৬৪% হাঁস-মুরগি আছে। অপরপক্ষে কন্ট্রোলের ১৫% গরু, ৩৮% ছাগল-ভেড়া, ও ৬১% এর হাঁস-মুরগি আছে।
- ৯) প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় সিএলপি সদস্যের পরিবার প্রতি মাসিক গড় আয় ৪৫০২ টাকা যা কন্ট্রোল খানা (৩৮০৫.০৮ টাকা) সমূহের মাসিক গড় আয় থেকে বেশি।
- ১০) সিএলপি সদস্যগণের মধ্যে ৩৫% রাস্তা নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছেন। শতকরা ৬৩ ভাগ মনে করেন যে রাস্তা উন্নয়নের ফলে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন সহজ হয়েছে ও শতকরা ৬৩ ভাগ মনে করেন রাস্তা উন্নয়নের ফলে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় সহজতর হয়েছে।
- ১১) সিএলপি সদস্যগণের মধ্যে ১২৫৪ টি পরিবারে (৭৮%) পাঁচ বৎসরের নীচের সকল শিশুকে উত্তরদাতাদের মতে সব কয়টি টিকা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১২৫৪ পরিবারের মধ্যে ১১৬০টি পরিবারে (৯৩%) টিকার কার্ড দেখাতে পেরেছে।
- ১২) যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে সিএলপি সদস্যগণ কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সেবার জন্য যান।
- ১৩) মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ, এফজিডি, কেআইআই ও মাঠ পর্যায়ের ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন যে, প্রকল্প এলাকায় শতকরা ৫৩ ভাগ চরম দারিদ্রতা হ্রাস পেয়েছে।

সিএলপি প্রকল্পের বিভিন্ন সর্বাঙ্গিকসমূহ

- ১) সিএলপি কর্মসূচিসমূহ দরিদ্র চরবাসীদের জীবন মানউন্নয়নে চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- ২) প্রকল্প চর বাসীদের প্রয়োজন মারফিক সহায়তা দিয়েছে (যেমন-গাভী/গরু কেনার জন্য অর্থ সাহায্য, বন্যা থেকে রক্ষার জন্য বসত বাড়ি ভিটি উঁচুকরণ, বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ)।
- ৩) প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ভালো ছিল।

- ৪) প্রকল্প এলাকায় জনগণ খুব সক্রিয় ছিল।
- ৫) মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ, এফজিডি, কেআইআই ও মাঠ পর্যায়ের ওয়ার্কসেপে অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন যে, প্রকল্প এলাকায় শতকরা ৫৩ ভাগ চরম দারিদ্রতা হ্রাস পেয়েছে, যা প্রকল্পের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সফলত্ব।
- ৬) সুবিধাভোগীগণের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমেছে (বসত বাড়ির ভিটি উঁচু করণের ফলে বন্যা থেকে রক্ষা পেয়েছে)।
- ৭) সুবিধাভোগী সদস্যদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রকল্পের এ্যাসেট ট্রান্সফার কম্পোনেন্ট এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে)।
- ৮) সিএলপি সুবিধাভোগী সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে উঠেছে (৪৭%)।
- ৯) সুবিধাভোগী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে, ছেলে-মেয়েরা বর্তমানে স্কুলে যায় এবং স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকল্পের দুর্বলত্বসমূহ

- ১) কেআইআই, এফজিডি, স্থানীয় পর্যায়ে ওয়ার্কসেপ আলোচনা বিশ্লেষণে দেখা যায় এলাকায় চাহিদার তুলনায় খুবই কম সংখ্যক পরিবার প্রকল্প সুবিধা পেয়েছে।
- ২) এফজিডি, স্থানীয় পর্যায়ে ওয়ার্কসেপের প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় একই সনিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী পরিবার প্রকল্প সুবিধা থেকে বঞ্চিত যা মাঠ জরিপ প্রাপ্ত তথ্যের সংগে সংগতিপূর্ণ।
- ৩) প্রকল্প শেষে সঠিক মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকায় সুবিধাভোগীরা সমস্যায় পড়ে।
- ৪) প্রকল্প চলাকালীন সকল ইউনিটের কাজ সঠিকভাবে পরিকল্পনা না করে একই সাথে সকল ইউনিটের কাজ শুরু হওয়ায় সদস্যদের উপর চাপ বেশী পড়ে।
- ৫) প্রকল্পের বাস্তবায়নে প্রথম দিকে অধিক সময় নষ্ট হয়েছে ফলে সময়ের স্বল্পতা দেখা দিয়েছিল।
- ৬) জিও-এনজিও সমন্বয়ের কিছুটা অভাব ছিল।
- ৭) সূষ্ঠ তদারকির অভাব ছিল।
- ৮) নৌকা ও মাছ ধরার জাল ত্রয়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন ছিল।
- ৯) কিছু উপকারভোগী নদী ভাঙ্গনের ফলে অন্যত্র চলে গেছে।
- ১০) ভূমিহীন কৃষকদেরও ভূমি প্রদান করা উচিত ছিল ও
- ১১) নদী ভাঙ্গনের রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

সুপারিশ

- ১) এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে এ ধরনের আরও প্রকল্প দেশের বিভিন্ন স্থানে পুনরাবৃত্তি করার আগে আরও নিবিড়ভাবে গবেষণা এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন। তাছাড়া প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্য, রিপোর্ট এবং উপদেষ্টাদের কাজ পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।
- ২) বরাদ্দকৃত সমস্ত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করার জন্য প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগণকে সজাগ থাকতে হবে। বরাদ্দকৃত অর্থ পুরোপুরি ব্যয় করতে পারলে এলাকার জনগণ আরও বেশি উপকৃত হতে পারতো এবং সঠিকভাবে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হতো।

- ৩) ভবিষ্যতে একই প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতাও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের ক্রয় নীতিমালা মেনে চলা উচিত।
- ৪) ডিপিপি অনুযায়ী সিএলপিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সেবা প্রদান কার্যক্রমে চালু ছিল। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোন ধরনের অংশীদারিত্ব ছিল না। তাই ভবিষ্যতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সুনিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।
- ৫) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিয়মিত আয়ের পথ সুগম করার লক্ষ্যে পরবর্তী প্রকল্পে নানাবিধ আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা রাখতে হবে ও সংশ্লিষ্ট কাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ৬) দূরবর্তী ও দূর্গম চরাঞ্চলে মাঠকর্মীদের সঠিক ও সফলভাবে কাজ করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষের যথাযথ নজর রাখা অত্যন্ত জরুরী। দূরবর্তী চরের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে মটর সাইকেল, ইঞ্জিনবোট সুবিধা এমনকি প্রয়োজনে দূর্গম চরগুলোতে ছোট ছোট ইউনিট অফিস খোলা প্রয়োজন যাতে কর্মীরা নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে এবং যাতায়াতে অহেতুক সময় নষ্ট না হয়।
- ৭) প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য ও সুবিধাভোগীরা যাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সুবিধা পেয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণ চালু রাখতে হবে।

উপসংহার

- ১) মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তার সবগুলোই দারিদ্রপীড়িত চর এলাকার অধিবাসীদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল।
- ২) প্রকল্প নির্দিষ্ট এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।
- ৩) সর্বোপরি উক্ত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত এলাকাবাসীর চরম দারিদ্রের সংখ্যা ৫৩% কমিয়ে এনেছে।
- ৪) মাঠ জরিপ, কেআইআই, এফজিডি, স্থানীয় পর্যায়ে ওয়াকসপ আলোচনা বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রকল্পের ফল ধরে রাখতে ও আরও এগিয়ে নিতে এ ধরনের আরও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।
- ৫) বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ প্রকল্পের জন্য ৯০৩.৯৪ লক্ষ টাকার সংস্থান রেখেছিল। কিন্তু প্রকল্প শেষে দেখা যায় যে উক্ত বরাদ্দের মাত্র ৫১% খরচ হয়েছে। সঠিকভাবে প্রকল্পের টাকা ব্যবহার করতে পারলে চর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী আরও উপকৃত হতে পারতো।
- ৬) দেশীয় এবং বিদেশী পরামর্শকগণের জন্য মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৫.৭০% ব্যয় করা হয়েছে। উক্ত পরামর্শকগণ প্রকল্প বাস্তবায়নে কি ভূমিকা পালন করেছেন সে বিষয়ে এই মূল্যায়নের প্রতিবেদন পেশ করার পরিকল্পনা ছিল কিন্তু কে কে প্রকল্প বাস্তবায়নে কী কী কাজ করেছেন সে বিষয়ে কোন তথ্য সংগ্রহ করা যায় নি। তাই ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্পের বাস্তবায়ন ইউনিট সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাংশে যমুনা নদীর চর এবং অস্থায়ী দ্বীপাঞ্চলে প্রায় ৩০ লক্ষ জনবসতি রয়েছে। দেশের মূল এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জীবিকা নির্বাহের একাধিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়। গ্রামীণ এই জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র যে দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত তাই নয় বরং এদের বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আর্থিক পরিষেবা খাতে প্রবেশাধিকারের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। কৃষিক্ষেত্রে ছাড়া অর্থনীতির অন্যান্য আনুষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক খাতে চরাঞ্চলবাসীদের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই বললেই চলে। আর একারণেই প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত আমন ধান রোপণ ও ফসল কর্তনের মধ্যবর্তী সময়ে কোন কাজ না থাকায় এরা মঙ্গায় পতিত হয়ে থাকে। আবার কোন কোন বৎসর বন্যা অথবা খরার কারণে এদেরকে দীর্ঘ সময়ের জন্য খাদ্য ঘাটতির মোকাবেলা করতে হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি-২০০১ এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করায় সরকার চরাঞ্চলবাসীদের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের জন্য জোর দেয় এবং চরাঞ্চলবাসীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সরকার সর্বপ্রথম ১৯৯৬ সালে Livestock Development Project নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে।

পরবর্তীতে এই কর্মসূচীকে আরও সুসংহত করে ডিএফআইডির সহায়তায় ২০০৪ হতে ২০১১ অর্থাৎ প্রায় ৮ বৎসর মেয়াদী “চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি-১)” নামক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া, কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়। সিএলপি-১ প্রকল্পে ডিএফআইডি হতে ২০১০ পর্যন্ত অর্থায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ান এইড (অসএইড) এবং ইউনাইটেড কিংডম এইড (ইউকেএইড) এর অর্থায়নে “চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-২ (সিএলপি-২) নামক আরেকটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে এবং বর্তমানে তা চলমান রয়েছে।

চরাঞ্চল অধিবাসীদের আয় বৃদ্ধি ও স্থায়ী কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে যমুনা নদীর উভয় পার্শ্বের কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ এই পাঁচটি জেলার চর অধিবাসীদের জন্য “চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-১” নামক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালের আইপিআরএসপি-তে দারিদ্র বিমোচনের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা হয় এবং ২০০৬ সালের পূর্ণাঙ্গ পোভার্টি রিডাকশন স্ট্র্যাটেজি পেপার (পিআরএসপি) দলিলে দেশের চরম দারিদ্র সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস করে ২০১৫ সালের মধ্য ৯.৫% করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (সূত্র: পিআরএসপি)

সিএলপি-১ প্রকল্পের আওতায় ৫৫,০০০টি অতি দরিদ্র পরিবার কে সরাসরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৯,০০,০০০ (সূত্র: ডিএফআইডি)।

১.২ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রকল্পের লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার, ডিএফআইডি এবং দাতাদের সহায়তায় “২০১৫ সালের মধ্যে প্রকল্পের আওতায়ভুক্ত চরাঞ্চলের চরম দারিদ্র* জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেকের নিচে নামিয়ে আনা” (সূত্র: ডিএফআইডি)। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো যমুনা নদী বিধৌত উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলার চর এলাকার দরিদ্র ও অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুদের জীবন জীবিকার নিরাপত্তা বিধান করা। প্রকল্পের অন্যান্য উদ্দেশ্য সমূহ হলো:-

- (ক) চর অধিবাসীদের নিরাপত্তাহীনতা এবং পরিবেশজনিত ঝুঁকি হ্রাস করা;
- (খ) প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- (গ) নারী ও মেয়ে শিশুদের প্রতি সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করা;

- (ঘ) প্রকল্পের দুর্গম এলাকার পরিবারসমূহের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে পাইলট কর্মসূচি চালু করা;
- (ঙ) প্রকল্পের অর্জিত অগ্রগতি / অভিজ্ঞতা সমূহ লিপিবদ্ধ করা এবং প্রচারে সহায়তা করা।

* বিবিএসএর মতে যে সকল পরিবারের সদস্যগণ গড়ে প্রতিদিন ১৮০৫ কিলো ক্যালোরীর নিচে খাদ্য গ্রহণ করে সে সকল পরিবারকে চরম দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

১.৩ প্রকল্পের মূল কর্মসূচি

প্রকল্পের মূল কর্মসূচি নিম্নরূপ:

- (ক) অবকাঠামো কার্যক্রম (Infrastructure Activities)
- (খ) কাজের জন্য নগদ অর্থ (Cash for work)
- (গ) সম্পদ হস্তান্তর (Asset Transfer)
- (ঘ) পশু সম্পদ (Livestock)
- (ঙ) সামাজিক উন্নয়ন (Social Development)

১.৪ সিএলপি-১ এর অভিষ্ট সুবিধাভোগীদের যোগ্যতাবলি

সিএলপি-১ এর আওতাভুক্ত চর এলাকায় অর্থনৈতিকভাবে হতদরিদ্র পরিবারসমূহকে প্রকল্প সহায়তা/সহযোগিতা দেওয়ার জন্য অভিষ্ট সুবিধাভোগী হিসাবে ভুক্ত বা বিবেচনা করার জন্য কিছু বৈশিষ্ট নির্ধারণ করা হয়। বৈশিষ্টসমূহ নিম্নরূপঃ

- পরিবারটিকে অবশ্যই চরের বাসিন্দা হতে হবে;
- পরিবারটি অবশ্যই ভূমিহীন হতে হবে;
- সম্পদহীন - যাদের উৎপাদনশীল সম্পদের মূল্য ৫০০০ টাকার বেশী নয়;
- যারা অন্য কোন প্রকল্প বা এনজিও হতে অনুদান/সাহায্য বা ঋণ পান না;
- যারা কোন ঋণ গ্রহণকারী দলের সদস্য নন বা যাদের কোন এনজিও এর কাছে কোন প্রকার পরিশোধযোগ্য বকেয়া ঋণ নাই;
- উপরে উল্লেখিত গুণাবলি থাকার পরেও এদের মধ্যে যদি কোন পরিবারের প্রধান মহিলা হন কিংবা পরিবার প্রধান যদি কর্মক্ষম না হন তবে সেই পরিবার অগ্রাধিকার পাবে।

১.৫ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

১।	প্রকল্পের নাম	চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) (প্রথম পর্যায়)																												
২।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় / বিভাগ	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়																												
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ																												
৪।	প্রকল্পের অবস্থান	প্রকল্পের কর্মসূচী নিম্নলিখিত ৫ (পাঁচটি) জেলার ২৮টি উপজেলার ১৫০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে:																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>বিভাগ</th> <th>জেলা</th> <th>উপজেলা</th> <th>ইউনিয়ন</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>রংপুর</td> <td>কুড়িগ্রাম</td> <td>৯</td> <td>৪২</td> </tr> <tr> <td></td> <td>গাইবান্ধা</td> <td>৪</td> <td>১৮</td> </tr> <tr> <td>রাজশাহী</td> <td>বগুড়া</td> <td>৩</td> <td>১০</td> </tr> <tr> <td></td> <td>সিরাজগঞ্জ</td> <td>৫</td> <td>২৯</td> </tr> <tr> <td>ঢাকা</td> <td>জামালপুর</td> <td>৪</td> <td>৫১</td> </tr> <tr> <td>মোট</td> <td>৫</td> <td>২৮</td> <td>১৫০</td> </tr> </tbody> </table>	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	রংপুর	কুড়িগ্রাম	৯	৪২		গাইবান্ধা	৪	১৮	রাজশাহী	বগুড়া	৩	১০		সিরাজগঞ্জ	৫	২৯	ঢাকা	জামালপুর	৪	৫১	মোট	৫	২৮	১৫০
বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন																											
রংপুর	কুড়িগ্রাম	৯	৪২																											
	গাইবান্ধা	৪	১৮																											
রাজশাহী	বগুড়া	৩	১০																											
	সিরাজগঞ্জ	৫	২৯																											
ঢাকা	জামালপুর	৪	৫১																											
মোট	৫	২৮	১৫০																											
৫।	প্রকল্পের ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত																											
	ক) মোট	টাকা: ৪৭৫২৪.৬৯	টাকা: ৬৬৭৪৯.৮৩																											
	খ) টাকা (জিওবি)	টাকা: ৯৫২.৮৪	টাকা: ৯০৩.৯৪																											

	গ) বৈদেশিক মুদ্রা	টাকা: ৪৬,৫৭১.৮৪	টাকা: ৬৫,৮৪৫.৮৯
	ঘ) প্রকল্প সাহায্য (ডিএফআইডি)	টাকা: ৪৬৫৭১.৮৪	টাকা: ৬৫,৮৪৫.৮৯
৬।	বাস্তবায়ন কাল	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
	ক) মূল	জুলাই, ২০০৩	জুন, ২০১১
	খ) সর্বশেষ সংশোধিত	জুলাই, ২০০৩	জুন, ২০১১
	গ) প্রকৃত বাস্তবায়িত	জুন, ২০০৪	জিওবি- জানুয়ারি, ২০১১ ডিএফআইডি- মার্চ, ২০১০

১.৬ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ (ডিপিপি অনুযায়ী) :

(লক্ষ টাকায়)

কাজের বিবরণ	একক	লক্ষ্যমাত্রা (ডি.পি.পি অনুযায়ী)		প্রকৃত ব্যয়	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
বাংলাদেশ সরকারের অর্থ (জিওবি)					
মানব সম্পদ :					
বেতন ভাতা	সংখ্যা	৫৩২.০৯	৯১	৩১০.৪৫	-
অফিস সপ্লাই এবং সার্ভিস (টেলিফোন/তেল/জ্বালানি রক্ষণাবেক্ষণ/সংরক্ষণ)	টাকা	১১৮.৫৩		৭২.৮৯	-
আসবাবপত্র/কম্পিউটার ইত্যাদি ক্রয়	টাকা	১৭.১০		১১.৪১	-
যানবাহন ক্রয়	সংখ্যা	২৩.৮৬	১	২৩.৮৬	১
সম্পদ সংগ্রহ (কম্পিউটার/টেলিফোন/ আর্থিক সম্পদ ইত্যাদি)	টাকা	৮৬.২২		৬৩.০৫	-
সিডি ভ্যাট	টাকা	১৫০.০০	-	-	-
মোট জিওবি	টাকা	৯০৩.৯৪		৪৫৭.৪০	-
ডিএফআইডি অর্থায়ন :					
বেতন ভাতা	সংখ্যা	৬৭৯.২৮	১২২ জন	১৫৪০.০০	৯৮ জন
যানবাহন	সংখ্যা	৪৭৭.৮৩	১১২ টি	৩১০.২৪	১১২ টি
অফিস যন্ত্রপাতি ইত্যাদি	টাকা	৭৫৫.৫৭		১১৭৯.৩২	
দেশী বিশেষজ্ঞ	সংখ্যা	৩১৩৪.৫৬	৬৫	২৪১০.০০	৫৬
বিদেশী বিশেষজ্ঞ	সংখ্যা	৬৩৭৫.৯২	১০	৫৮৯০.০০	১১
Project Management Team (UK)	সংখ্যা	১১৯৯.৬০	৭	৮৯৮.৭০	৬
Program Component	টাকা	৩৯৪৩০.৬৪		৩১৬৭৫.৫০	-
Infrastructure Investment	টাকা	৬৭১২.৯৮		৭৩১৮.৫০	-
Miscellaneous	টাকা	৭০৭৯.৫১		৬৯০৬.০০	-
মোট (ডিএফআইডি)	টাকা	৫৫৮৪৫.৮৯		৫৮১২৮.২৬	-
সর্বমোট (জিওবি + ডিএফআইডি)	টাকা	৬৬৭৪৯.৮৩		৫৮৫৮৫.৬৬	-

১.৭ বর্তমান সমীক্ষার উদ্দেশ্য

টিওআর (ToR) অনুযায়ী বর্তমান সমীক্ষার উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ:

- (ক) প্রকল্পের বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ প্রকল্পের DPP এর সঙ্গে সংজ্ঞাপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা করা;
- (খ) প্রকল্পের প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলি (যেমন টেন্ডার আহ্বান, টেন্ডার মূল্যায়ন, টেন্ডার কার্যাদেশ প্রদান) এবং যেমন-পণ্য, কার্য এবং সেবা ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট সময়, ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা এবং পিপিআর-২০০৮ মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়েছে কি না তা পর্যালোচনা করা;
- (গ) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম: যেমন- প্রশিক্ষণ, অর্থ ও সম্পদ স্থানান্তর, স্বাস্থ্য কর্মসূচি, অপ্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রম, বাড়ীর প্লিহ উচুকেরণের মাধ্যমে পুনর্বাসন এবং ভিলেজ সেভিংস গ্রুপ কর্মকাণ্ড ইত্যাদির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা;
- (ঘ) প্রকল্পের অন্যান্য কর্মসূচি যেমন পরিবেশের দূষণ হ্রাস, নারী ও মেয়ে শিশুদের মর্যাদা বৃদ্ধি, পারিবারিক আয় ও সম্পদ, বাজারে সহজ অংশ গ্রহণ ইত্যাদির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা;
- (ঙ) প্রকল্পটির অভ্যন্তরীণ দক্ষতা, সম্ভাব্য সুযোগ, দুর্বলতা এবং বাস্তবায়নকালীন হুমকি/সমস্যা SWOT বিশ্লেষণের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা;
- (চ) চরাঞ্চলবাসীদের জীবন জীবিকাকে আরো টেকসই, অবদান সম্পন্ন, অংশগ্রহণমূলক করে দেশের স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতির উন্নতিসহ অন্যান্য প্রকল্প এলাকায় এর সফল কর্মসূচি পুনরাবৃত্তি (replication) করার লক্ষ্যে সুপারিশ করা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকল্পের ডিপিপি এর সাথে বাস্তবায়িত কর্মসূচির সঙ্গতি পর্যালোচনা ও প্রকল্পের অধীনে পণ্য ও কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ

২.১ পৃষ্ঠপোষকতা, অর্থ সংস্থান, প্রকল্প নকশা সংশোধন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-১ পৃষ্ঠপোষকতা করেছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও ডিএফআইডি, বাংলাদেশ। সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ডিএফআইডি হতে বাংলাদেশী টাকায় মোট ৬৫,৮৪৫.৮৯ লক্ষ টাকা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার হতে মোট ৯০৩.৯৪ লক্ষ টাকা অর্থায়নের সংস্থান রাখা হয়েছিল। প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল ছিল মার্চ, ২০০৪ থেকে মার্চ, ২০১১ (ডিএফআইডি: মার্চ, ২০০৪ থেকে মার্চ, ২০১০; এবং জিওবি: মার্চ, ২০০৪ থেকে জানুয়ারী, ২০১১)।

পরিকাঠামো তৈরী, দরিদ্র বাসিন্দাদের কণ্ঠ (Voice) জোরদার করা এবং স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চরাঞ্চলবাসীদের মৌলিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করাই ছিল সিএলপি-১ এর আদি নকশার (Original Design) মূল লক্ষ্য। এগুলো বাস্তবায়নের শুরুতে এটি বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয় যেখানে স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা ধারণার উপর নির্ভরশীল এই নকশাটিকে অত্যন্ত জটিল ও অবাস্তব হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং নতুন একটি বাস্তবমুখী নকশা তৈরী করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এ মোতাবেক ২০০৫ সালের শেষের দিকে প্রকল্পের জন্য নতুন নকশা তৈরী করা হয় যেখানে প্রকল্প সুবিধা স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে বন্টন না করে চরবাসী অতিদরিদ্র পরিবারগুলোকে সরাসরি প্রকল্প সুবিধা বন্টনের পদ্ধতি গ্রহণ করা এবং পরবর্তীতে এ অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি তৈরী (২০০৬-০৭ সালে) ও অনুমোদিত হয় (২০০৮ সালে) এবং সিএলপি-১ লগফ্রেম সংশোধন করে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।

সিএলপি-১ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল ম্যানেজমেন্ট স্ট্যাম্প প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক নিয়োগকৃত ম্যানেজমেন্ট টিম। সিএলপি ম্যানেজমেন্ট টিমের এর প্রধান কার্যালয় পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়ায় স্থাপিত করা হয়েছে যা সিএলপি সেক্রেটারিয়েট নামে পরিচিত। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমসমূহ প্রধানত বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের মূল দায়িত্ব পালন করেছে সিএলপি সেক্রেটারিয়েট এর সাথে চুক্তিবদ্ধ স্থানীয় এনজিও সমূহ। এছারা, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদসমূহও সামান্য মাত্রায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের দায়িত্বে ছিল। চুক্তিবদ্ধ স্থানীয় এনজিওসমূহের নামকরণ করা হয়েছিল ইমপ্লিমেন্টিং ম্যানেজমেন্ট অরগানাইজেশন (Implementing Management Organization) বা আইএমও। সংশোধিত জবাবদিহিমূলক অনুদান প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময় এ সমস্ত চুক্তি করা হয়েছিল যার আওতায় সেবা, ইনপুট, কাজের আকার, স্কেল ও মান নির্দিষ্ট ছিল। সিএলপি ম্যানেজমেন্ট টিমের পক্ষে এ সমস্ত চুক্তি নবায়ন/বাতিল করার স্বাধীনতা ছিল এবং তা ক্ষেত্র বিশেষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। সিএলপি ম্যানেজমেন্ট টিম ও আইএমও সমূহের মধ্যে এরকম স্বচ্ছ ও কার্যকর সম্পর্কের ফলে প্রকল্প দলিল মোতাবেক মাঠ পর্যায়ে সকল সাহায্য/সহায়তা বিতরণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল।

২.২ প্রকল্প ব্যয়

২.২.১ মোট বরাদ্দ ও ব্যয়

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট অর্থের সংস্থান ছিল ৬৬৭৪৯.৮৩ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ছিল জিওবি খাতে ৯০৩.৯৪ লক্ষ টাকা এবং ডিএফআইডি হতে প্রকল্প সাহায্য খাতে ৬৫,৮৪৫.৮৯ লক্ষ টাকা (সারণি-২.১)। প্রকৃত মোট ব্যয় হয়েছে ৫৮৫৮৫.৬৬ লক্ষ টাকা (৮৭.৭৭%)। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ৫৮১২৮.২৬ লক্ষ টাকা (৮৮.২৮%) এবং জিওবি খাতে মাত্র ৪৫৭.৪০ লক্ষ টাকা (৫০.৬০%)। এতে দেখা যায় যে কোন খাতের ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অংশ ব্যয় হয়নি।

সারণি-২.১ : সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ও প্রকৃত মোট খরচ (লক্ষ টাকা)

খাতের নাম	মোট বরাদ্দ	প্রকৃত মোট ব্যয়	প্রকৃত মোট ব্যয় (%)
জিওবি	৯০৩.৯৪	৪৫৭.৪০	৫০.৬০%
প্রকল্প সাহায্য	৬৫৮৪৫.৮৯	৫৮১২৮.২৬	৮৮.২৮%
সর্বমোট	৬৬৭৪৯.৮৩	৫৮৫৮৫.৬৬	৮৭.৭৭%

তথ্যসূত্র : প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট (পিসিআর), সিএলপি-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এলজিআরডি মন্ত্রণালয়

২.২.২ জিওবি অংগের বরাদ্দ ও ব্যয়

জিওবি অংগে সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী রাজস্ব খাতে বরাদ্দ ছিল ৬৬৭.৭২ লক্ষ টাকা এবং মূলধনী খাতে ২৩৬.২২ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে মাত্র ৩৯৪.৩৫ লক্ষ টাকা ও ৬৩.০৫ লক্ষ টাকা (সারণি-২.২)। এই অংগে লোকবল হিসাবে ৮ জন কর্মকর্তা ও ৯১ জন কর্মচারী নিয়োজিত ছিল যাদের বেতন-ভাতা খাতে বরাদ্দ ছিল ৫৩২.০৯ লক্ষ টাকা কিন্তু খরচ হয়েছে মাত্র ৩১০.৪৫ লক্ষ টাকা। সরবরাহ ও সেবা খাতে ১৩৫.৬৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৩.৯০ লক্ষ টাকা। ক্যাপিটাল খাতে প্রধান ব্যয়ের মধ্যে ২৩.৮৬ লক্ষ টাকা দিয়ে ১ টি জিপ (বরাদ্দ ছিল ২৩.৮৬ লক্ষ টাকা) এবং ৩২.৯৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৬.০ লক্ষ টাকা দিয়ে ৩২ টি কমপিউটার ও এর আনুষঙ্গিক অংশ ক্রয় করতে ব্যয় হয়েছে। এ ছাড়া সিডি/ভ্যাট প্রদানের জন্য ১৫০.০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে কোন ব্যয় হয় নাই। লোকবল, সরবরাহ ও সেবা এবং সিডি/ভ্যাট খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকা অব্যয়িত থাকার ফলে জিওবি অংগের ব্যয়ের অগ্রগতি প্রায় ৫১% হয়েছে। বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১ এ দেখা যাবে।

সারণি-২.২ : সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের জিওবি অংগের মোট বরাদ্দ ও প্রকৃত মোট খরচ (লক্ষ টাকা)

খাতের নাম	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত মোট ব্যয় (%)	উদ্বৃত্ত (+) (লক্ষ টাকা)
রেভিনিউ				
বেতন ও ভাতাদি	৫৩২.০৯	৩১০.৪৫	৫৮.৩৫	২২১.৬৪
সরবরাহ ও সেবা	১৩৫.৬৩	৮৩.৯০	৬১.৮৬	৫১.৭৩
মোট	৬৬৭.৭২	৩৯৪.৩৫	৫৯.০৬	২৭৩.৩৭
ক্যাপিটাল				
১ টি জিপ ক্রয়	২৩.৮৬	২৩.৮৬	১০০.০০	০
৩২ টি কমপিউটার ও এর আনুষঙ্গিক অংশ	৩২.৯৬	২৬.০০	৭৮.৮৮	৬.৯৬
ক্যামেরা, আসবাবপত্র, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি	২৯.৪০	১৩.১৯	৪৪.৮৬	১৬.২১
সিডি ভ্যাট	১৫০.০০	০	০.০০	১৫০
মোট	২৩৬.২২	৬৩.০৫	২৬.৬৯	১৭৩.১৭
সর্বমোট (রেভিনিউ+ক্যাপিটাল)	৯০৩.৯৪	৪৫৭.৪০	৫০.৬০	৪৪৬.৫৪

তথ্যসূত্র : প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট, সিএলপি-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এলজিআরডিসি মন্ত্রণালয়

২.২.৩ ডিএফআইডি: প্রকল্প সাহায্য অংগের বরাদ্দ ও ব্যয়

ডিএফআইডি কর্তৃক প্রকল্প সাহায্য অংগের বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্ট-২ এ দেখা যাবে। নিম্নে বিশেষ উপখাতগুলোর পর্যালোচনা করা হলো।

২.২.৩.১ লোকবল: কর্মকর্তা/কর্মচারী বেতন-ভাতা ব্যয়

ডিএফআইডি: প্রকল্প সাহায্য অংশে সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ৮ জন কর্মকর্তা ও ১২২ জন কর্মচারী প্রকল্পে নিয়োগ করার জন্য বরাদ্দ ছিল ৬৭৯.২৮ লক্ষ টাকা কিন্তু এর বিপরিতে ৯৮ জন স্টাফ নিয়োগ করায় বেতন-ভাতা বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৫৪০.০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের চাইতে ৮৬০.৭২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত (সারণি-২.৩)। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মেনটরিং সাপোর্ট দেয়ার জন্য লোকাল কসালটেন্টদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোকবল তুলে এনে লোকাল স্টাফ হিসেবে নিয়োজিত করা হয়েছে।

সারণি-২.৩ : সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প সাহায্য অংশের কর্মকর্তা/ কর্মচারী বেতন-ভাতা খাতে মোট বরাদ্দ ও প্রকৃত মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)

খাতের নাম	মোট বরাদ্দ	প্রকৃত মোট খরচ
প্রকল্প কর্মকর্তা ও কর্মচারী বেতন-ভাতা	৬৭৯.২৮	১৫৪০.০

তথ্যসূত্র: প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট, সিএলপি-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এলজিআরডিসি মন্ত্রণালয়

২.২.৩.২ লোকবল: পরামর্শক (বিদেশী ও দেশী) বেতন-ভাতা ব্যয়

এই প্রকল্পে দেশী ও বিদেশী পরামর্শক নিয়োজিত করার বন্দোবস্ত আছে। এই প্রকল্পে ক্ষেত্রে বিদেশী পরামর্শকের বেলায় দুধরনের পরামর্শকের ব্যবস্থা আছে: যেমন ক) প্রকল্প ভিত্তিক বিদেশী পরামর্শক, ও খ) যুক্তরাজ্য ভিত্তিক প্রকল্প ব্যবস্থাপনা টিম।

সারণি-২.৪ : সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প সাহায্য অংশের পরামর্শক (বিদেশী ও দেশী) বেতন-ভাতা খাতে মোট বরাদ্দ ও প্রকৃত মোট খরচ (লক্ষ টাকা)

খাতের নাম	মোট বরাদ্দ	প্রকৃত মোট খরচ
দেশী পরামর্শক (২০৬১ জন-মাস)	৩১৩৪.৫৬	২৪১০.০
বিদেশী পরামর্শক (৫০২ জন-মাস)		
প্রকল্প ভিত্তিক	৬৩৭৫.৯২	৫৮৯০.০
যুক্তরাজ্য ভিত্তিক (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা টিম)	১১৯৯.৬০	৮৯৮.৭
মোট	৭৫৭৫.৫২	৬৭৮৮.৭

তথ্যসূত্র: প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট (পিসিআর), সিএলপি-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এলজিআরডি মন্ত্রণালয়

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পে ৬৫ (২০৬১ জন-মাস) জন দেশী পরামর্শক নিয়োজিত করার জন্য ৩১৩৪.৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল কিন্তু নিয়োজিত করা হয়েছে ৫৬ জন (২০৬১ জন-মাস) এবং ব্যয় হয়েছে ২৪১০.০ লক্ষ টাকা (সারণি-২.৪)। প্রকল্প ভিত্তিক বিদেশী পরামর্শক ও যুক্তরাজ্য ভিত্তিক প্রকল্প ব্যবস্থাপনা টিম এর জন্য যথাক্রমে ১০ জন ও ৭ জন (মোট ১৭ জন: ৫০২ জন-মাস) নিয়োজিত করার জন্য বরাদ্দ ছিল ৬৩৭৫.৯২ লক্ষ টাকা ও ১১৯৯.৬০ লক্ষ টাকা (মোট ৭৫৭৫.৫২ লক্ষ টাকা) এর বিপরিতে যথাক্রমে ১১ জন ও ৬ জন (মোট ১৭ জন: ৫০২ জন-মাস) নিয়োজিত করা হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে ৫৮৯০.০ লক্ষ টাকা ও ৮৯৮.৭ লক্ষ টাকা (মোট ৬৭৮৮.৭ লক্ষ টাকা)। এখানে দেখা যায় যে দেশী পরামর্শক এর ক্ষেত্রে গড়ে মাস প্রতি প্রায় ১.১৭ লক্ষ টাকা এবং বিদেশী পরামর্শক এর ক্ষেত্রে গড়ে মাস প্রতি প্রায় ১৩.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি'র মোট বরাদ্দের প্রেক্ষিতে প্রকৃত মোট ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রকল্পে পরামর্শক খাতে ব্যয় হয়েছিল প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ১৫.৭০%, যা ছিল দেশী পরামর্শকের ক্ষেত্রে ৪.১১% এবং বিদেশী পরামর্শকের ক্ষেত্রে ১১.৫৯%। আরও উল্লেখ্য দেশী পরামর্শক এবং বিদেশী পরামর্শকগণ কী ধরনের কাজ করেছেন, প্রকল্পে তাদের কী আউটপুট ছিল এবং সর্বোপরি প্রকল্পে তাদের অবদান কী ছিল সে সংক্রান্ত তথ্যে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা টিমের প্রবেশাধীকার না থাকায় এ সম্পর্কে জানা সম্ভব হয় নাই।

২.২.৩.৩ যানবাহন, অফিস যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক ব্যয়

গাড়ি, স্পিড/ইঞ্জিন বোট, মোটর সাইকেল ইত্যাদি বাবদ বরাদ্দ ছিল মোট ৪৭৭.৮৩ লক্ষ টাকা। এ খাতে ২০ টি গাড়ি, ২ টি স্পিড/ইঞ্জিন বোট, ও ৯০ টি মোটর সাইকেল বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩১০.২৪ লক্ষ টাকা (সারণি-২.৫)। অফিস যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ইত্যাদি বাবদ বরাদ্দ ছিল মোট ৪০৭.৮২ লক্ষ টাকা অথচ এ খাতে খরচ হয়েছে ৬১০.০ লক্ষ টাকা (অতিরিক্ত ২০২.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে)। আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দ ছিল মোট ৩৪৭.৭৫ লক্ষ টাকা কিন্তু ব্যয় হয়েছে ৫৬৯.৩২ লক্ষ টাকা (অতিরিক্ত ২২১.৫৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে)।

সারণি-২.৫ : সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প সাহায্য অঙ্গের যানবাহন, অফিস যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক খাতে মোট বরাদ্দ ও প্রকৃত মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)

খাতের নাম	মোট বরাদ্দ	প্রকৃত মোট ব্যয়	ব্যয় (%)
গাড়ি, স্পিড/ইঞ্জিন বোট, মোটর সাইকেল	৪৭৭.৮৩	৩১০.২৪	৬৪.৯৩
অফিস যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ইত্যাদি	৪০৭.৮২	৬১০.০	১৪৯.৫৮
আনুষঙ্গিক	৩৪৭.৭৫	৫৬৯.৩২	১৬৩.৭২

তথ্যসূত্রঃ প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট (পিসিআর), সিএলপি-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এলজিআরডি মন্ত্রনালয়

২.২.৩.৪ প্রোগ্রাম কমপোনেন্ট ব্যয়

প্রোগ্রাম কমপোনেন্ট খরচ এর খাতে বরাদ্দ ছিল মোট ৩৯৪৩০.৬৪ লক্ষ টাকা এবং মোট খরচ হয়েছে ৩১৬৭৫.৫০ লক্ষ টাকা (সারণি-২.৬)। এর উপখাতগুলো হলো: ক) উপজেলা ও ইউনিয়ন শক্তিশালীকরণ; খ) যোগাযোগ ও মিডিয়া; গ) প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা; ঘ) কমিটি; যানবাহন ও ভ্রমণ; ঙ) সামর্থ্য উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি; চ) গবেষণা/জরিপ/মনিটরিং/মূল্যায়ন; ছ) প্রশাসন ও পরিচালন; জ) জীবিকা ও এন্টারপ্রাইজ উন্নয়ন তহবিল; ও ঝ) এনজিও চুক্তি। এগুলোর মধ্যে জীবিকা ও এন্টারপ্রাইজ উন্নয়ন তহবিল উপখাতে সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ ও ব্যয় হয়েছে, যা ছিল যথাক্রমে ১৯৯৬১.৬৬ ও ১৮৬৪০.৪১ লক্ষ টাকা।

সারণি-২.৬ : সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প সাহায্য অঙ্গের প্রোগ্রাম কমপোনেন্ট খাতে মোট বরাদ্দ ও প্রকৃত মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)

খাতের নাম	মোট বরাদ্দ	প্রকৃত মোট ব্যয়	ব্যয় (%)
উপজেলা ও ইউনিয়ন শক্তিশালীকরণ	৬৫৬২.৭৪	৩১৬৭.২১	৪৮.২৬
যোগাযোগ ও মিডিয়া	৮৬৩.৭৯	৫০০.১৭	৫৭.৯০
প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা	৬২০.৪১	৪১৫.৬৮	৬৭
কমিটি; যানবাহন ও ভ্রমণ	১১.৯১	১৪.১৬	১১৮.৮৯
সামর্থ্য উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি	১৫০৮.২১	৩৬৪.৮৭	২৪.১৯
গবেষণা/জরিপ/মনিটরিং/মূল্যায়ন	২৬২০.৫৭	২৪৬৫.৬৬	৯৪.০৯
প্রশাসন ও পরিচালন	২৩৪২.৪৬	১৪০৫.৯৩	৬০.০২
জীবিকা ও এন্টারপ্রাইজ উন্নয়ন তহবিল	১৯৯৬১.৬৬	১৮৬৪০.৪১	৯৩.৩৮
এনজিও চুক্তি	৪৯৩৮.৮৯	৪৭০১.৪১	৯৫.১৯
সর্বমোট	৩৯৪৩০.৬৪	৩১৬৭৫.৫০	৮০.৩৩

তথ্যসূত্রঃ প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট (পিসিআর), সিএলপি-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এলজিআরডি মন্ত্রনালয়

দ্বিতীয় স্থানে ছিল এনজিও চুক্তি উপখাত যাতে বরাদ্দ ও ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৪৯৩৮.৮৯ ও ৪৭০১.৪১ লক্ষ টাকা। এর পরবর্তী স্থানে ছিল উপজেলা ও ইউনিয়ন শক্তিশালীকরণ উপখাত যাতে বরাদ্দ ও খরচ হয়েছে যথাক্রমে ৬৫৬২.৭৪ ও ৩১৬৭.২১ লক্ষ টাকা। বরাদ্দের তুলনায় সবচেয়ে কম ব্যয় হয়েছে সামর্থ্য উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি উপখাতে যাতে বরাদ্দ ছিল ১৫০৮.২১ লক্ষ টাকা কিন্তু খরচ হয়েছে মাত্র ৩৬৪.৮৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ব্যয় হয়েছে মোট বরাদ্দের ২৪.১৯%।

২.২.৩.৫ অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যয়

অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যয় খাতে বরাদ্দ ছিল মোট ৬৭১২.৯৮ লক্ষ টাকা এবং মোট খরচ হয়েছে ৭৩১৮.৫ লক্ষ টাকা (সারণি-২.৭)। এর উপখাতগুলো হলো: ক) যোগাযোগ বিনিয়োগ; খ) পরিবহন বিনিয়োগ; গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ; ঘ) সুপেয় পানি ও সেনিটেশন; এবং ঙ) পরিবেশ। এগুলোর মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ উপখাতে সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ ও খরচ হয়েছে, যা ছিল যথাক্রমে ৪৬০৬.৮৬ ও ৫০১৯.৩৫ লক্ষ টাকা। এ খাতে বরাদ্দকৃত পরিমাণ থেকে ৪১২.৪৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। সুপেয় পানি ও সেনিটেশন উপখাতে বরাদ্দ ও ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ২০৮৯.৬৯ ও ২২৮৯.৩২ লক্ষ টাকা। সবচেয়ে কম বরাদ্দ ছিল পরিবহন বিনিয়োগ (২.৭৮ লক্ষ টাকা) ও পরিবেশ (১.৪৫ লক্ষ টাকা) উপখাতে। কিন্তু এ দুটি খাতে ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ২.৮৮ ও ২.০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দ হতে সামান্য বেশী।

সারণি-২.৭ : সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প সাহায্য অংগের অবকাঠামো বিনিয়োগ খাতে মোট বরাদ্দ ও প্রকৃত মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)

খাতের নাম	মোট বরাদ্দ	প্রকৃত মোট ব্যয়	ব্যয় (%)
যোগাযোগ বিনিয়োগ	১২.২০	৪.৯৫	৪০.৫৭
পরিবহন বিনিয়োগ	২.৭৮	২.৮৮	১০৩.৬০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ	৪৬০৬.৮৬	৫০১৯.৩৫	১০৮.৯৫
সুপেয় পানি ও সেনিটেশন	২০৮৯.৬৯	২২৮৯.৩২	১০৯.৫৫
পরিবেশ	১.৪৫	২.০০	১৩৭.৯৩
সর্বমোট	৬৭১২.৯৮	৭৩১৮.৫০	১০৯.০২

তথ্যসূত্রঃ প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট (পিসিআর), সিএলপি-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এলজিআরডি মন্ত্রণালয়

২.২.৩.৬ বিবিধ/ব্লক বরাদ্দ ব্যয়

বিবিধ বা ব্লক বরাদ্দ সংবেদনশীল কর্মকান্ড যেমন কর্মসূচীর বিভিন্ন দিক, রিভিউ ও পরিচালন ইত্যাদি প্রয়োজন/ঘাটতি মেটানোর জন্য তহবিল হিসাবে রাখা হয়েছিল। এতে থোক বরাদ্দ ছিল মোট ৭০৭৯.৫১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬৯০৬.০ লক্ষ টাকা (সারণি-২.৮)।

সারণি-২.৮ : সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প সাহায্য অংগের ৬ বিবিধ/ব্লক খাতে মোট বরাদ্দ ও প্রকৃত মোট খরচ (লক্ষ টাকা)

খাতের নাম	মোট বরাদ্দ	প্রকৃত মোট ব্যয়	ব্যয় (%)
সংবেদনশীল প্রয়োজন/ঘাটতি মেটানো	৭০৭৯.৫১	৬৯০৬.০	৯৭.৫৫

তথ্যসূত্রঃ প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট (পিসিআর), সিএলপি-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এলজিআরডি মন্ত্রণালয়

২.৩ প্রকল্প কর্মসূচি বাস্তবায়ন

সিএলপি-১ এর প্রকল্প কর্মসূচিসমূহ কয়েকটি ভাগে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল এবং এগুলো ছিলঃ ক) অবকাঠামো উন্নয়ন; খ) কাজের জন্য নগদ অর্থ; গ) সম্পদ হস্তান্তর কর্মসূচি; ঘ) কৃষি প্রযুক্তি সহায়তা; ঙ) প্রাণী স্বাস্থ্য সহায়তা; চ) সামাজিক উন্নয়ন; ছ) সুশাসন উন্নয়ন; জ) এন্টারপ্রাইজ উন্নয়ন; বা) পাইলট স্বাস্থ্য কর্মসূচি; এবং ঞ) পাইলট শিক্ষা কর্মসূচি।

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী উল্লেখিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভিষ্ট লক্ষ্যের বিপরীতে যে সব আউটপুটসমূহ অর্জন করা গেছে তা নিম্নে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনের তথ্য সূত্র মোতাবেক বর্ণনা করা হলোঃ

২.৩.১ অবকাঠামো উন্নয়ন

২.৩.১.১ ভিটি উঁচুকরণ

হতদরিদ্র চরাঞ্চলবাসীদের ঘরবাড়ি বন্যার ক্ষয়ক্ষতির কবল হতে রক্ষার জন্য ১০০,০০০ খানার ভিটি উঁচু করার লক্ষ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের মধ্যে আইএমও সমূহের মাধ্যমে ৯০,৩৭৭ টি খানার ভিটি উঁচু করা হয়েছে এবং উপজেলা কমিটি/ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের মাধ্যমে ৪০৭ টি স্কুল, মসজিদ, কবরস্থান ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিটি উঁচু করা হয়েছে। অনেক হতদরিদ্র চরাঞ্চলবাসীদের ঘরবাড়ির জায়গা নিজস্ব না হওয়ায় আশ্রয়দাতার অনুমতি না পাওয়া এবং মাটি সংগ্রহের উৎস স্থান না থাকা ইত্যাদি কারণে লক্ষ্য পূরণ করা যায় নাই বলিয়া প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।



সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলাধীন চর রাণীপুরা গ্রামে সিএলপি কর্তৃক ভিটি উঁচুকরণ কর্মসূচির আওতায় নির্মিত বসতবাড়ী

২.৩.১.২ স্লাব-ল্যাট্রিন স্থাপন

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ৫০,০০০ হতদরিদ্র চরাঞ্চলবাসীদের বাড়িতে স্লাব-ল্যাট্রিন স্থাপন করার লক্ষ্য ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের মধ্যে আইএমও সমূহের মাধ্যমে ৬২, ২০৩ টি বাড়িতে স্লাব-ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।



চর রাণীপুরা গ্রামে সিএলপি কর্তৃক নির্মিত স্লাব-ল্যাট্রিন

২.৩.১.৩ টিউব-ওয়েল স্থাপন

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ১০,০০০ হতদরিদ্র চরাঞ্চলবাসী পরিবারের সদস্যবৃন্দ যাতে নিরাপদ পানির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে সেই লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। অভিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী সকলে ভাগাভাগির ভিত্তিতে স্থাপিত টিউব-ওয়েল এর চারপাশের বাড়ি যাতে দশ মিনিটের মধ্যে নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের মধ্যে আইএমও সমূহের মাধ্যমে ১৪৬৯ টি নতুন টিউব-ওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।



বেলকুচি উপজেলাধীন চর রাণীপুরা গ্রামে সিএলপি কর্তৃক স্থাপিত টিউব-ওয়েল ও প্ল্যাট ফর্ম

এছাড়া, ব্যক্তিগত বা নিজস্ব উদ্দেশ্যে স্থাপিত যে সমস্ত টিউব-ওয়েলসমূহের পানি বন্যার সময় ডুবে যাওয়ার কারণে নিরাপদ থাকে না এরকম ৩৪৮৪ টি টিউব-ওয়েল এর পাকা প্লাটফর্ম সাবসিডির মাধ্যমে তৈরী করে দেয়া হয়েছে। পানি পরীক্ষার মাধ্যমে যে সব টিউব-ওয়েলে নিরাপদ মানের পানি নিশ্চিত করা গেছে শুধুমাত্র সেগুলোকে ১০০% সাবসিডি (১৩২০ টি) দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া চরাঞ্চলবাসী পরিবারের ৭৩০ জন মহিলা ও পুরুষকে টিউব-ওয়েলে মেকানিকস ট্রেনিং দেয়া হয়েছে।

২.৩.২ কাজের জন্য নগদ অর্থ

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী চরাঞ্চলে মংগা মোকাবিলার জন্য অবকাঠামো কর্মসংস্থান কর্মসূচির (Infrastructure Employment Programme বা IEP) আওতায় ২.০ মিলিয়ন (২০,০০,০০০) ব্যক্তি দিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর বিপরীতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের মধ্যে ১৩২,০০০ লোকের জন্য ৫.৪৫২ মিলিয়ন জন দিবস কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল (সূত্র- প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট (পিসিআর), সিএলপি-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এলজিআরডি মন্ত্রণালয়)।

২.৩.৩ সম্পদ হস্তান্তর কর্মসূচি

সিএলপি কার্যক্রমসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সম্পদ হস্তান্তর কর্মসূচি (Asset Transfer Programme)। এর মাধ্যমে নির্বাচিত চরম দরিদ্র পরিবারসমূহকে কিছু প্রাথমিক মূলধনের যোগান দেয়া যা দিয়ে তাদের উপার্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তিনটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে এই সমস্ত চরম দরিদ্র পরিবারসমূহকে নির্বাচিত করা হয়। এগুলো হলো:

- ক) যারা ভূমিহীন,
- খ) সম্পদের মোট মূল্য ৫০০০ টাকার কম, এবং
- গ) যাদের কোন নিয়মিত কর্মসংস্থান নেই।



সিএলপি'র আর্থিক সহায়তায় একটি গরু ক্রয় করে চর রাণীপুরা গ্রামের হালিমা বেগম বর্তমানে চারটি গরুর মালিক হয়েছেন

এটিপি কর্তৃক প্রদানকৃত প্রাথমিক মূলধন (১৩০০০ থেকে ১৭০০০ টাকা) দিয়ে কর্মসূচির মেনুর মধ্য হতে প্রতিটি সুবিধাভোগী পরিবার পছন্দমত সম্পদ (যেমন গরু) ক্রয় করেছে; সম্পূর্ণ খরচ হিসাবে প্রতিটি সুবিধাভোগী পরিবারকে প্রথম ছয় মাসের জন্য মাস প্রতি ৪০০ হতে ৬০০ টাকা এবং পরবর্তী ১২ মাসের জন্য মাস প্রতি ৩০০ হতে ৩৫০ টাকা মাসিক বৃত্তি হিসাবে প্রদান করা হয়। প্রাথমিক মাসিক বৃত্তি সহায়তার উদ্দেশ্য ছিল সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ (গরুর খাবার যোগান এবং রোগ-বলাই প্রতিকার যেমন কুমিনাশক সেবন করান) এবং সংসারের অভাব-অনটনের কারণে পরিবারের অন্য কোন সম্পদ যেন বিনষ্ট করতে না হয়। পরবর্তী ১২ মাসের বৃত্তি সহায়তার উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য সহায়তা। সিএলপি সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৫০ টি সভায় অংশগ্রহণের শর্তে শুধুমাত্র মহিলা সুবিধাভোগীদের এই বৃত্তি সহায়তা প্রদান করা হতো।

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ৫০,০০০ হতদরিদ্র চরাঞ্চলবাসী পরিবারকে সম্পদ হস্তান্তর কর্মসূচির আওতায় সহায়তা প্রদানের টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, ৫৫,০০০ পরিবারকে (পরবর্তীতে, আরও ৫০০০ পরিবারের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়) এই সহায়তা দেয়া হয়েছিল যাদের মধ্যে ৬৭,৮৯৬ টি গরু-বাহুর, ৩৯,৯৯৫ টি ছাগল-ভেড়া, এবং ১২,৩৭৮ টি হাঁস-মুরগি বন্টন করা হয়। কিছু সংখ্যক পরিবার (৮৯৫) প্রদেয় অর্থের বিনিময় কৃষি জমি লিজ নিয়েছিল। এছারা, ৫৫,০০০ পরিবারের মধ্যে ৫৪,২৫৩ টি পরিবারকে ১৮ মাসের বৃত্তি (stipend) প্রদান করা হয়। বাকী পরিবারগুলো আওতাভুক্ত চরাঞ্চল হতে অন্যত্র চলে (migrate) যাওয়ায় লক্ষ্য পূর্ণ করা যায় নাই।

২.৩.৪ কৃষি প্রযুক্তি সহায়তা

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও আইএমও সমূহের সাহায্যে ৫০,০০০ থেকে ১০০,০০০ সুবিধাভোগী পরিবারকে বাড়ির আঙ্গিনায় সজী চাষ প্রযুক্তি সহায়তা, উন্নত বীজ প্রদান, কম্পোষ্ট উৎপাদন প্রযুক্তি সহায়তা, সজী চাষের জন্য পিট/মাদা প্রস্তুত করে দেয়া, গাছ/বাঁশের চারা বিতরণ, বাড়ির আঙ্গিনায় সজী চাষ ও কম্পোষ্ট উৎপাদন প্রযুক্তির উপর ট্রেনিং ইত্যাদির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। লক্ষ্যের বিপরীতে (সিএলপি তালিকাভুক্ত ও তালিকা বহির্ভূত সমেত) হতদরিদ্র ৯০,৮৭৯ টি পরিবারকে বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করেছে ও লতা সজী চাষের জন্য ৫০,২০১ টি কমপোষ্ট পিট/মাদা স্থাপন করে দেয়া হয়েছে ও ১০০,৭৪৩ টি পরিবারকে উন্নত বীজ প্রদান করেছে, এবং বাড়ির আঙ্গিনায় সজী চাষ প্রযুক্তির উপর ১৮৫,২৫৩ জন-দিন ও কম্পোষ্ট উৎপাদন প্রযুক্তির উপর ১০৬,৫৪৩ জন-দিন ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে।

২.৩.৫ পশু পালন ও চিকিৎসা সহায়তা

ডিপিপি অনুযায়ী প্রাণী স্বাস্থ্য সহায়তার ব্যাপারে কোন ভৌত টার্গেট নির্ধারণ করা ছিল না। এ ক্ষেত্রে গরু-বাছুরের প্রধান প্রধান রোগ প্রতিরোধের জন্য ১৭৮,৯২৯ টি প্রতিষেধক টিকা, ২২৬,৭৫২ ডোজ গরু-বাছুরের কৃমিনাশক ঔষধ, ৫৩৫১ টি গরুর কৃত্রিম প্রজনন, ৪৫২৪৬ টি উন্নত ঘাস চাষের প্লট স্থাপন, ও ৩৬৬,১৮১টি হাস-মুরগী, গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া প্রতিপালন, কৃত্রিম প্রজনন ইত্যাদির উপর ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে (সূত্র- প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট (পিসিআর), সিএলপি-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এলজিআরডি মন্ত্রণালয়, পৃ-২৪)।



সিএলপি'র আওতায় গবাদি পশু পালনের প্রশিক্ষণ

২.৩.৬ সামাজিক উন্নয়ন

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী সামাজিক উন্নয়ন দল গঠন পূর্বক ৫০,০০০ জন হতদরিদ্র চরাঞ্চলবাসী সুবিধাভোগীকে সামাজিক উন্নয়ন দলের আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। সে মোতাবেক মোট ৫৪,৯৯২ জন সুবিধাভোগীকে সংগঠিত করে ২,৬৯১ টি সামাজিক উন্নয়ন দল গঠন করা হয়েছে এবং এসব দলকে সক্রিয় করা হয়েছে। এ দলগুলোর সদস্যদের মোট ৩৮৩৫২৮২ জন দিবস বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন/সচেতনামূলক বিষয়ের উপর ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে।

নদী ভাঙ্গন, ঝড়-বন্যা ইত্যাদি আঘাতে পর্যুদস্ত হতদরিদ্র চরাঞ্চলবাসীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ১৫,০৮০ টি অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সিএলপি এর সামাজিক উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক প্রদানকৃত ট্রেনিং এর অংশ হিসাবে কমিউনিটি নিরাপত্তা নেট (Community Safety Net) নামে সামাজিক উন্নয়ন দলগুলোর মধ্যে একটি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে সদস্যবৃন্দ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যৌথ তহবিল গঠন করে দুস্থ কোন সদস্যকে সহায়তা দিয়ে টেনে তুলতে পারে। এরকম উদ্যোগের ফলে সামাজিক উন্নয়ন দল সদস্যবৃন্দ কর্তৃক ২০৮০ টি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুদান সহায়তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, সিএলপি সুবিধাভোগী পরিবারে যে সব সদস্য কাজের বিনিময় অর্থ উপার্জন করতে অক্ষম সেরকম লোকের জন্য ৯৭৬২ টি অনুদান প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু, ডিএফআইডি এর অনুমোদনক্রমে ২০০৭-০৮ সালে খাদ্যের উচ্চমূল্যের কারণে ১১,৮২,৪৪১ খাদ্য ক্রয়ের জন্যে সাময়িকভাবে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে (সূত্র- প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট (পিসিআর), সিএলপি-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এলজিআরডি মন্ত্রণালয়, পৃ-২৫)।

২.৩.৭ স্থানীয় শাসন উন্নয়ন


স্থানীয় শাসন উন্নয়ন কর্মসূচিতে কোন ভৌত টার্গেট নির্ধারণ করা ছিল না। এক্ষেত্রে ৩৬২ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ৩৮৬৬ জন ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বর, ও ৩৫৫ জন ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারিকে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সুশাসন উন্নয়নে সক্ষমতা অর্জনে বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে।

২.৩.৮ উদ্যোক্তা উন্নয়ন (Enterprise Development)

উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচিতে কোন ভৌত টার্গেট নির্ধারণ করা ছিল না। এক্ষেত্রে ৭৪২ জন মহিলা ও ৭৮১ জন পুরুষকে পোষাক শিল্প শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য ট্রেনিং করান হয়েছে। উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ১৮,৭৮১ জনকে উন্নত ঘাস চাষের উপর ট্রেনিং করান হয়েছে। এর ফলে ১০,৪৪৭ জন উন্নত ঘাস বিক্রেতা গড়ে উঠেছে। হাস-মুরগী প্রতিপালনকারী হিসাবে ৩৯,৫৫৫ জনকে হাস-মুরগী প্রতিপালনের উপর ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে এবং ১৭,৯২৩ জনকে দুধ বিপণনের উপর ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ৩৮৭ জনকে প্রাণী স্বাস্থ্য সেবাদানকারী হিসাবে ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে (সূত্র- প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট (পিসিআর), সিএলপি-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এলজিআরডি মন্ত্রণালয়, পৃ-২৬)।

২.৩.৯ পাইলট স্বাস্থ্য কর্মসূচি

পাইলট স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে কোন ভৌত টার্গেট নির্ধারণ করা ছিল না। চরাঞ্চলে এ কর্মসূচির আওতায় ১৫,৬১২ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক চালু করা হয়েছে এবং প্যারামেডিক্স এর সহায়তায় মোট ৭০৯,৫৭০ জনকে স্বাস্থ্য সেবা (ব্যবস্থাপত্র চিকিৎসা) প্রদান করা হয়েছে (সূত্র- প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট (পিসিআর), সিএলপি-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এলজিআরডি মন্ত্রণালয়, পৃ-২৭)।।



সিএলপি'র সহযোগী বাস্তবায়নকারী সংস্থা এনডিপি কর্তৃক সরবরাহকৃত চর স্বাস্থ্য বই, বেলকুচি উপজেলা সিরাজগঞ্জ



মানব মুক্তি সংস্থা পরিচালিত চর স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে ঔষধ বিতরণের দৃশ্য, বেলকুচি উপজেলা সিরাজগঞ্জ

২.৩.১০ পাইলট শিক্ষা কর্মসূচি

পাইলট শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু তা ডিএফআইডি এর সম্মতিতে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু সিএলপি শিশুদের জন্য পাইলট হিসাবে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখে যেখানে ৫০০০ শিশুকে ভর্তির লক্ষ্যের বিপরীতে ২৩৯২ টি মেয়ে শিশু ও ২৪৭৩ টি ছেলে শিশু অর্থাৎ মোট ৪৮৬৫ শিশু ভর্তি হয়। কিছু পরিবার অন্যত্র চলে যাওয়ার কারণে লক্ষ্য পূরণ হয় নাই (সূত্র- প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট (পিসিআর), সিএলপি-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এলজিআরডি মন্ত্রণালয়, পৃ-২৭)।।

২.৪ প্রকল্পের অধীনে পণ্য ও কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ

২.৪.১ ভূমিকা

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন/প্রবিধান ২০০৩, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ সরকারী ক্রয় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের মধ্যে সততা এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের দ্বারা প্রণয়ন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত “চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি-১)” প্রকল্পের সমস্ত ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ উক্ত নিয়ম এবং প্রবিধান অনুসরণ করে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পে নিম্নলিখিত দুই ধরনের ক্রয় কার্যাবলি (পণ্য ও কার্য) সম্পন্ন করা হয়েছে।

চর জীবিকায়ন কর্মসূচির (সিএলপি-১) আওতায় জিওবি অংশ ও ডিএফআইডি অংশে পণ্য, কার্য ও অবকাঠামো নির্মাণে ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রকল্পের অধীনে পণ্য ও কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৩ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এবং অনুসরণ না করা হয়ে থাকলে, কী কী অনিয়ম ঘটেছে, সে সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পিপিআর-২০০৩ অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে “প্রকিউরমেন্ট চেকলিস্ট” অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং প্রকল্প পরিচালকের অফিস পরিদর্শনকালে আরো নিবিড়ভাবে ক্রয় সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

২.৪.২ জিওবি অংশে পণ্য ক্রয়

প্রকল্পে জিওবি অংশে মোট দুই ধরনের পণ্য ক্রয় কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.৪.২.১ যানবাহন ক্রয়

প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, একটি প্রাডো জীপ ক্রয় করা হয়। উল্লেখ্য পিপিআর-২০০৩ এর সঠিক নির্দেশনা অনুসরণ করে ২০০৪ সালে উক্ত ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে (সারণি-২.৯)।

সারণি ২.৯ : যানবাহন ক্রয়

ক্র.নং	আইটেমের বর্ণনা	পরিমাণ (সংখ্যা)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)		ক্রয়ের তারিখ	ক্রয় পদ্ধতি
			লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত		
০১	জীপ	১টি	২৩.৮৬	২৩.৮৬	১০.৬.১৪	OTM
	মোট	১টি	২৩.৮৬	২৩.৮৬		

২.৪.২.২ অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয়

প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অফিস ইকুইপমেন্টের আওতায় ২টি আইটেম যেমন কম্পিউটার সেট ও ফটোকপিয়ার ২০০৪-২০০৫ সালে ক্রয় করা হয়েছে (সারণি-২.১০)।

সারণি ২.১০ : অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয়

ক্র.নং	আইটেমের বর্ণনা	পরিমাণ (সংখ্যা)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)		ক্রয়ের তারিখ	ক্রয় পদ্ধতি
			লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত		
০১	কম্পিউটার সেট	২০টি	১৩.৭৫	১৩.৭৫	২৭.০৪.২০০৫	OTM
০২	ফটোকপিয়ার	১টি	০১.৭৫	০১.৭৫	১৭.০২.২০০৫	OTM
	মোট	২১টি	১৫.৫	১৫.৫		

২.৪.২.৩ জিওবি অংগে ক্রয় সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ তথ্যাদির মূল্যায়ন

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের অধীনে যে সকল পণ্য ক্রয় করা হয়েছে সে সমস্ত প্যাকেজের উপর তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে আলোচনা সাপেক্ষে জানা যায় যে, প্রকল্পের অধীনে ক্রয় কার্যক্রমে পিপিআর-২০০৩ অনুসরণ করা হয়েছে। ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রাডো জীপ ও ডেব্রটপ কম্পিউটার প্যাকেজ দুটির আওতায় লটের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ০১ (এক)-টি ও ২০ (বিশ)-টি। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দুটি প্যাকেজই উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই দরপত্র দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিল। আরও উল্লেখ্য যে, উভয় প্যাকেজে দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির ০১ জন করে সদস্য ছিলেন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতেও অত্র দপ্তরের বাইরের দপ্তর হতে ০২ (দুই) জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (সারণি-২.১১)।

সারণি-২.১১ : জিওবি অংগে ক্রয় সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ তথ্যাদির মূল্যায়ন

ক্র.নং	সূচক	দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের নাম	
		প্রাডো জীপ	ডেব্রটপ কম্পিউটার
০১	প্রতিটি প্যাকেজে লটের সংখ্যা	১টি	২০টি
০২	ক্রয় পদ্ধতি	ওটিএম	ওটিএম
০৩	দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কি না	হ্যাঁ	হ্যাঁ
০৪	পত্রিকার নাম ও তারিখ	ভোরের কাগজ, ১৫.৫.২০০৪	দৈনিক দিনকাল, ২১.১২.২০০৪
০৫	দরপত্র দাখিলের তারিখ	০৮.০৬.২০০৪	০৭.০১.২০০৫
০৬	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	০৩	০৫
০৭	জমাকৃত দরপত্রের সংখ্যা	০৩	০২
০৮	দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির সদস্য সংখ্যা	০৬	০৫

০৯	দরপত্র উন্মুক্তকরণের সময় উপস্থিত সদস্যের সংখ্যা	০৬	০৫
১০	দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি'-তে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির একজন সদস্য ছিলেন কিনা ?	হ্যাঁ	হ্যাঁ
১১	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে অত্র দপ্তরের বাইরের দপ্তর হতে ০২ (দুই) জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিনা ?	হ্যাঁ	হ্যাঁ
১২	Initial Tender Validity Period এর মধ্যে Contract Award করা হয়েছিল কিনা ?	হ্যাঁ	হ্যাঁ

অডিট রিপোর্ট মূল্যায়ন করে দেখা যায় যে, উপরোক্ত ক্রয় কার্যক্রমে কোনো প্রকার অডিট আপত্তি অমিমাংসিত নাই।

জিওবি'র অংশে প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের আওতায় যে সকল ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে তা সরকারের 'ক্রয় বিধিমালা ২০০৩' অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৩)।

উল্লেখ্য যে, জিওবি অংশে ক্রয়কৃত কম্পিউটারগুলো সিএলপি-২ এর উপজেলা ইউনিট কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২.৪.৩ ডিএফআইডি এর অধীনে পণ্য ক্রয় কার্যাবলি সংক্রান্ত তথ্যাবলি

প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ডিএফআইডি'র অধীনে কয়েক ধরনের যানবাহন ও জেনারেটর ক্রয় করা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের আওতায় ভিটি উঁচুকরণ ও ল্যাট্রিন নির্মাণের কার্য সম্পন্ন এবং সেবা কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় ও বৈদেশিক পরামর্শক নিয়োগ করেছে। উল্লেখ্য, উপরোক্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিএফআইডি নিজস্ব প্রকিউরমেন্ট নীতিমালা অনুসরণ করেছে।

সারণি ২.১২ : ডিএফআইডি'র অধীনে সম্পাদিত ক্রয় কার্যাবলী

ক্র.নং	আইটেমের বর্ণনা	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	
		ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত
০১	যানবাহন/স্টেশনারী		
	কার, জীপ, মাইক্রোবাস, পিকআপ, জেনারেটর, স্পীড বোট	৫০১.০০	৩১২.৪৪
০২	অবকাঠামো নির্মাণ		
	ভিটি উঁচুকরণ ও ল্যাট্রিন		৪৭৩৬.০০
০৩	পরামর্শক সেবা ক্রয়		
	বৈদেশিক	৭৫৭৬.০০	৬৭৮৯.০০
	দেশীয়	৩১৩৫.০০	২৪১০.০০

একই প্রকল্পে ক্রয় কার্য সম্পাদনের জন্য দুধরনের নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ক্রয় কার্যের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা উচিত। এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমীক্ষা পদ্ধতি

৩.১ প্রকল্পটি সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ

প্রকল্পটি সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত প্রতিবেদনসমূহ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়ঃ

(ক) উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প দলিল (ডিপিপি); (খ) প্রকল্পের লগ ফ্রেম; (গ) বেস লাইন সার্ভে রিপোর্ট; (ঘ) প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন; (ঙ) মনিটরিং এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন; (চ) প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন। এছাড়া, আইএমইডি, প্রকল্প পরিচালক-সিএলপি-২ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করে প্রকল্পটির কার্যক্রম, প্রকল্পের সাধারণ এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ এবং সমীক্ষার টিওআর এর অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করা হয়।

৩.২ সমীক্ষার গবেষণা পদ্ধতি

প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকায় প্রত্যাশিত প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্প সুবিধাভোগী ও প্রকল্প সুবিধাভোগী বহির্ভূত (কন্ট্রোল হিসাবে) অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার তথ্য বা পার্থক্য বিচার-বিশ্লেষণের জন্য এ সমীক্ষায় বর্ণনামূলক গবেষণা ডিজাইন অনুসরণ করা হয়েছে। *এ সমীক্ষায় গুণগত ও সংখ্যাগত, উভয় প্রকার তথ্য প্রাইমারি ও সেকেণ্ডারি উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত সার্ভে রিপোর্ট, প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন, মনিটরিং এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ইত্যাদি হতে সেকেণ্ডারি এবং নমুনার ভিত্তিতে সুবিধাভোগী ও সুবিধাবঞ্চিত অতিদরিদ্র খানা জরিপের মাধ্যমে প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পূর্ব প্রণীত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে নমুনায়িত প্রতিটি খানা প্রধানদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও চেকলিষ্ট ব্যবহার করে বিভিন্ন নমুনায়িত এলাকার স্টেকহোল্ডার গ্রুপ বা ব্যাক্তিবর্গের নিকট হতে এফজিডি (FGD), কী-ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (Key-informant Interview), স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা (Workshop), ইত্যাদি সংগঠিত করে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.২.১ সমীক্ষার নমুনা এলাকা

এ সমীক্ষায় স্টাডি এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বৈবচয়নের ভিত্তিতে মাল্টি-স্টেজ ক্লাস্টার স্যাম্পলিং টেকনিক অনুসরণ করা হয়েছে। এ অনুসারে প্রকল্পের বিভাগওয়ারী সকল (৫টি) জেলাকেই নমুনার আওতায় আনা হয়েছে এবং যৌক্তিক সংখ্যক উপজেলা ও ইউনিয়ন নির্বাচন করতে হবে বিধায় মোট ৫০ শতাংশ উপজেলা ও ২৫ শতাংশ ইউনিয়নকে নমুনায়িত উপজেলা ও ইউনিয়ন হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এতে করে মোট ১৪টি উপজেলা এবং ৪০টি ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়। নমুনায়িত উপজেলা ও ইউনিয়নসমূহকে দ্বৈবচয়নের (Random Sampling) ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছে। নির্বাচিত ৪০টি ইউনিয়নের প্রতিটি থেকে Systematic Random Sampling Technique এর মাধ্যমে প্রকল্প সুবিধাভোগী ও প্রকল্প সুবিধাবঞ্চিত অতিদরিদ্র খানা (Household) নির্বাচন করা হয়েছে।

* এই প্রকল্পের মূল্যায়নের জন্য পূর্বের তুলনায় পরের সুবিধাভোগীদের কি ধরনের পরিবর্তন হল দেখার ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য বেইজলাইন সার্ভের তথ্য ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সিএলপি-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস থেকে সিএলপি-১ এর কোন Baseline Survey Report পাওয়া যায় নাই। Baseline Survey Report সরবরাহের নিমিত্তে বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী ২০১৫ ইং তারিখে প্রকল্প পরিচালক সিএলপি-২ বরাবর ক্রান্তি এসোসিয়েটস লিমিটেড থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হলে ৫টি ছোট ছোট স্টাডি রিপোর্ট এর সফট কপি পত্র বাহককে প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ৮ই মার্চ ২০১৫ ইং তারিখে (স্মারক নম্বর সিডি আরসি ৪৭. ৬৪. ১০৮৮. ০৪০. ১৭. ০০৩. ২০১৪. ১২৮ পত্র মারফত Baseline Survey প্রতিবেদন (হার্ডকপি) ও ৫৫ হাজার বেনিফিসিয়ারীদের নামের তালিকা (সফট কপি, যেখানে শুধুমাত্র সুবিধাভোগীর নাম, স্বামীর নাম, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং এটিপি ফেজ উল্লেখিত আছে) ক্রান্তির প্রতিনিধির নিকট প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য ক্রান্তির মূল্যায়নের টিমের সদস্য জনাব ডঃ এ আর এম মমতাজ উদ্দীন উক্ত Report স্টাডি করে দেখেন যে Report টি Baseline Survey Report নয় বরং তা একটি Qualitative Participatory Survey Report 2006. পরবর্তীতে সিএলপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক মহোদয় ১৯/০৫/২০১৫ ইং তারিখে (স্মারক নং পউসবি/পউএ/ সিএলপি-২/বিবিধ-১৮/২০১৪/৬৪৯) পত্রে উল্লেখ করেছেন যে সিএলপি-১ এর বেইজলাইন সার্ভে রিপোর্টে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নে তা ব্যবহার করা হয়নি এবং পূর্বে সরবরাহকৃত Qualitative Participatory Survey Report টি Baseline Survey Report নয়। বেইজলাইন সার্ভের কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই বিধায় মূল্যায়ন কাজ সমাপ্ত করার জন্য নির্বাচিত সিএলপি সদস্যগণের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে নির্বাচিত প্রকল্প সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে তুলনা করা হয়। যদি বেইজলাইন সার্ভের কোন তথ্য পাওয়া যেতো পূর্বের সাথে পরে এবং সুবিধাভোগীদের সাথে কন্ট্রোল খানাসমূহের তুলনা করা যেত যা খুবই যুক্তিযুক্ত ছিল। এমতাবস্থায় বর্তমান মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রকল্প এলাকায় Baseline তথ্য ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় নাই। ফলে বর্তমান সমীক্ষায় সিএলপি সুবিধাভোগী (প্রদত্ত ৫৫০০০ হাজার বেনিফিসিয়ারী তালিকা হতে গৃহীত) এবং কন্ট্রোল গ্রুপ (যারা সিএলপি-১ থেকে কোনরূপ সাহায্য সহযোগিতা পান পাই), তাঁদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে Recall method ব্যবহার করে Before-after তথ্য সংগ্রহ করে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা এলাকা



৩.২.২ খানা জরিপের নমুনার আকার

এই সমীক্ষাটির জন্য Cluster sampling technique ব্যবহার করা হয়। নিম্নোক্ত নির্বাচন পদ্ধতি মোতাবেক প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থাৎ প্রকল্পের উত্তরদাতা সুবিধাভোগী খানা নমুনার আকার নিরূপণের জন্য নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে:

$$n = \frac{z^2 q}{r^2 p} \times \text{design effect} \dots \dots \dots (i)$$

নমুনার আকার আনুমানিক হিসাবে ৯৫% আস্থাস্তর (Confidence Level) এবং ৫% স্পষ্টতাস্তর (Precision Level) হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা অনুরূপ সামাজিক গবেষণায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ডিজাইন ইফেক্ট হিসাবে ৫% ত্রুটি বিবেচনা করা হয়েছে।

এখানে,

n = নমুনার আকার

z = Standard Normal Variate যা ধরা হয়েছে ১.৯৬ (৫% Level of Significance এবং ৯৫% Confidence Level)

p = ধরা হয়েছে, এই প্রকল্প বাস্তবায়নকালে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্রের হার ৩০% হ্রাস পাবে মাধ্যমে অর্থাৎ p = ৩০% = ০.৩০

q = ১-p = ১-০.৩০ = ০.৭০

r = দরিদ্র সীমার relative variation যা ১০ শতাংশ ধরা হয়েছে।

সুতরাং, r = ০.১০

অতএব, সমীকরণটির মান বসালে নিম্নরূপ হয় :-

$$n = \frac{(১.৯৬)^2 \times ০.৭০}{(০.১০)^2 \times ০.৩০} = \frac{(৩.৮৪১৬) \times ০.৭০}{(০.০১) \times ০.৩০}$$
$$= \frac{২.৬৮৯১২}{০.০০৩০} = ৮৯৬.৩৮$$

এই সমীক্ষায় ডিজাইন ইফেক্ট ধরা হয়েছে ১.৭৫,

অতএব, নমুনার আকার = ৮৯৬.৩৮ × ১.৭৫ = ১৫৬৮

সুতরাং, সর্বাপেক্ষা নিকটতম ভাবে, সুবিধাভোগী নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬০০। এই ১৬০০ নমুনা প্রকল্পের সুবিধাভোগী (যারা প্রকল্প থেকে সরাসরি সাহায্য পেয়েছেন) তালিকা থেকে Systematic Random Sampling Technique এর মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য কন্ট্রোল হিসাবে প্রকল্প সুবিধাভোগী বর্হিভূত অতিদরিদ্র খানার (প্রকল্প থেকে যারা কোনো সাহায্য/সহযোগিতা পাননি এবং যারা অন্য চর এলাকা থেকে মাইগ্রেন্ট করে বর্তমান চরে ছয় মাস বা তার অধিক সময় থেকে বসবাস করছে) মধ্য থেকে মোট নমুনা সংখ্যার অর্ধেক সংখ্যা (৮০০) কন্ট্রোল হিসেবে নেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রকল্প বর্হিভূত অতি দরিদ্র পরিবারকে কন্ট্রোল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা সিএলপিভুক্ত খানা সমূহের সিএলপিতে যোগদানের পূর্বের অবস্থায় ছিল। অতএব, মোট নমুনার সংখ্যা হবে (১৬০০+৮০০) = ২৪০০। প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ভিত্তিক সংগ্রহকৃত খানা তালিকা হতে উপরোক্ত ২৪০০ নমুনার প্রত্যেকটি খানা দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নওয়ারী নমুনা বিভাজন নিম্নরূপ (সারণি-৩.১)।

সারণি-৩.১ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নওয়ারী নমুনা বিভাজন

বিভাগ	নমুনায়িত জেলা	নমুনায়িত উপজেলা	নমুনায়িত ইউনিয়ন	প্রকল্প সুবিধাভোগী তালিকা অনুযায়ী খানার সংখ্যা	নমুনায়িত খানার সংখ্যা	
					সুবিধাভোগী	কন্ট্রোল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। রংপুর	১। কুড়িগ্রাম	১। সদর	১। যোগাদাহ	৯১০	৫০	২৫
			২। পাঁচগাছিয়া	২১৯	১২	৬
			৩। যাত্রাপুর	৭৪৮	৪০	২০
			৪। মোঘলবাদশা	১০০২	৫৪	২৭
		২। নাগেশ্বরী	৫। কাঁচাকাটা	১০৩৬	৫৬	২৮
			৬। বরুবাড়ি	৩০৭	১৮	৯
		৩। উলিপুর	৭। সাহেবের আলগা	১৫৬২	৮৬	৪৩
			৮। দলদলিয়া	২২২	১২	৬
			৯। হাতিয়া	১৪০	৮	৪
		৪। চর রাজিবপুর	১০। কোদালকাটি	১৩৪৬	৭৪	৩৭
			১১। মোহনগঞ্জ	৭৫৯	৪২	২১
			১২। চর রাজীবপুর	৩৮৮	২০	১০
	২। গাইবান্ধা	৫। সদর	১৩। মোল্লাচর	৪৬৭	২৬	১৩
			১৪। বাদিয়াখালি	৩৮০	২০	১০
		৬। ফুলছড়ি	১৫। গজারিয়া	৫২৪	৩০	১৫
			১৬। উরিয়া	৩৬৯	২০	১০
			১৭। ইন্দ্রবাড়ি	১৫১৮	৮২	৪১
	১৮। ফুলছড়ি	১২৭৫	৭০	৩৫		
	২। রাজশাহী	৩। বগুড়া	৭। সারিয়াকান্দি	১৯। কর্ণিবাড়ী	১৫৬০	৮৬
২০। হাট শেরপুর				৮৫১	৪৮	২৪
২১। চালুয়াবাড়ী				১৫৫	৮	৪
২২। বহাইল				৮৬৪	৪৬	২৩
২৩। কাজলা				১৫২৪	৮২	৪১
৮। ধুনট		২৪। ভান্ডার বাড়ী	৭৭	৪	২	
৪। সিরাজগঞ্জ		৯। সদর	২৫। সয়বাদ	৯৮	৬	৩
			২৬। মিশ্রা	৭০৬	৩৮	১৯
			২৭। কাওয়াকোলা	৩৩১	১৮	৯
		১০। বেলকুচি	২৮। বড়খুল	৫২৫	৩০	১৫
			২৯। বেলকুচি	১১১৫	৬০	৩০
		১১। চৌহালী	৩০। রাজাপুর	২৪১	১৪	৭
			৩১। ওমরপুর	২০০৩	১১০	৫৫
৩২। ঘোরজান		১০৫৭	৫৮	২৯		
৩। ঢাকা	৫। জামালপুর	১২। ইসলামপুর	৩৩। বেলগাছা	১১৬৯	৬৪	৩২
			৩৪। কুলকান্দি	৩০৯	১৮	৯
			৩৫। নোসপাড়া	৬০১	৩২	১৬
			৩৬। সাপাহারি	৫৪৬	৩০	১৫
		১৩। বকশিগঞ্জ	৩৭। নীলক্ষীমা	৭৮	৬	৩
			৩৮। মেরুচর	১৭০৭	৯২	৪৬
			৩৯। সাধুর পাড়া	২৮৭	১৬	৮
		১৪। দেওয়ানগঞ্জ	৪০। হাতিভাংগা	২৪৮	১৪	৭
৩ টি বিভাগ	৫ টি জেলা	১৪ টি উপজেলা	৪০ টি ইউনিয়ন	২৯২২৪	১৬০০	৮০০

* মোট সুবিধাভোগীর তালিকা প্রকল্প অফিস হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.২.৩ গুণগত জরিপ (Qualitative Survey)

৩.২.৩.১ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)

সুবিধাভোগীদের নিকট হতে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পে FGD অনুষ্ঠানের গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে টেকনিক্যাল কমিটির পরামর্শক্রমে প্রতিটি উপজেলায় সুবিধাজনক ইউনিয়নে ১টি করে FGD অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করা হয়। প্রকল্পের আওতায় মোট FGD এর সংখ্যা হয় ১৪x১=১৪ টি। প্রতিটি দলগত আলোচনায় (ক) মধ্যম ও বড় কৃষক, শিক্ষক ও এনজিও কর্মী; (খ) মহিলাগোষ্ঠী; (গ) ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.২.৩.২ মূল তথ্য সরবরাহকারীগণের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview- KII)

প্রধান কার্যালয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জেলা/উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জেলা/উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তা, স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গের নিকট হতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ফলাফল ও প্রকল্পের সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে KII অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট KII এর সংখ্যা হয়েছে ১৪x১=১৪টি।

৩.২.৩.৩ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ে প্রকল্প এলাকায় ১টি স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা (TOR মোতাবেক) সংগঠিত করা হয়েছে। এই কর্মশালায় প্রকল্পের Stakeholders ও সুবিধাভোগীদের সঙ্গে আলোচনা মোতাবেক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

৩.২.৪ তথ্য সংগ্রহ ছক/প্রশ্নমালা

সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রশ্নাবলি ও চেকলিষ্ট উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনঃ

- (ক) খানা ভিত্তিক প্রশ্নমালা (Household Questionnaire) প্রণয়ন (সুবিধাভোগী ও সুবিধাবঞ্চিত বা কন্ট্রোল গ্রুপ);
- (খ) এফজিডি- এর চেকলিষ্ট/প্রশ্নাবলি
- (গ) কে আই আইএর জন্য চেকলিষ্ট/প্রশ্নাবলি
- (ঘ) Procurement সম্পর্কিত চেকলিষ্ট/প্রশ্নাবলি

উপরোক্ত প্রশ্নমালা (Questionnaire) ও চেকলিষ্টসমূহ পরিশিষ্ট ৩-৭ এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩.২.৫ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ (Recruitment of Data Enumerator)

কমপক্ষে কৃষি বিষয়ে স্নাতক/ডিপ্লোমা এবং তথ্য সংগ্রহে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ১২ জন তথ্য সংগ্রহকারী ও ৪ জন প্রধান ইনভেস্টিগেটর (Principal investigator) নিয়োগ করা হয়। তথ্য সংগ্রহকারীদের জন্য ২ দিনের প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হয়।



ক্রান্তি ট্রেনিং সেন্টারে তথ্য সংগ্রহকারীদের দু'দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে

৩.২.৬ সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা

অত্র সমীক্ষার সীমাবদ্ধতাগুলো নিম্নরূপ-

- ১) প্রকল্পে বেজলাইন তথ্য না থাকা।
- ২) প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় (আরডিএ, বগুড়া) থেকে চাহিদা মোতাবেক তথ্য না পাওয়া।
- ৩) ডিএফআইডি প্রকিউরমেন্ট তথ্যের প্রবেশাধীকার না থাকা।
- ৪) প্রকল্পের পরামর্শকবৃন্দের টিওআর, আউটপুট ইত্যাদি বিষয়ে কোন তথ্য না পাওয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সুবিধাভোগী ও কন্ট্রোল পরিবারের বৈশিষ্ট্য

৪.১ ভূমিকা

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত ৫টি জেলার ১৪টি উপজেলার ৪০টি ইউনিয়নের ১৬০০ জন সিএলপি সদস্যগণের নিকট থেকে পারিবারিক ও আর্থিক সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ তুলনা করার জন্য একই স্থান হতে আরও ৮০০ জন পরিবার যারা সিএলপি সদস্য নয় (কন্ট্রোল গ্রুপ) তাঁদের নিকট হতে একই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক ফলাফলসমূহ নিম্নের অনুচ্ছেদসমূহে উপস্থাপন করা হলো।

৪.২ নির্বাচিত সিএলপি সদস্য ও কন্ট্রোল সদস্যদের পারিবারিক বৈশিষ্ট্য

নির্বাচিত সিএলপি সদস্য ও কন্ট্রোল খানার পারিবারিক বৈশিষ্ট্য যেমন খানা প্রধানের বয়স, খানা প্রধানের স্বামীর বয়স, সিএলপি সদস্যের/কন্ট্রোল গ্রুপের খানাসমূহের পরিবারের সদস্য সংখ্যা, সিএলপি সদস্যের/কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিএলপি সদস্যের/কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতার স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিএলপি সদস্যের/কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতার স্বামীর পেশা, সিএলপি সদস্যের/কন্ট্রোল গ্রুপের ছেলে/মেয়ে স্কুলে যায় এমন খানার সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ নিম্নের অনুচ্ছেদসমূহে উপস্থাপন করা হল।


৪.৩ সিএলপি ও কন্ট্রোল উত্তরদাতাগণের বয়স

বয়সের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩০.০% সিএলপি সদস্যগণের বয়স ২০-২৯ বছরের মধ্যে। অপর পক্ষে ৫৩.২% কন্ট্রোল উত্তরদাতাগণের বয়স ২০-২৯ বছরের মধ্যে। ৩০-৩৯ বছরের মধ্যে সিএলপি সদস্যগণের সংখ্যা ৪০.৭% এবং কন্ট্রোল উত্তরদাতাগণের সংখ্যা ২৬.৬%। উভয় দলেই ৫০ এবং এর উর্ধ্ব বয়সের পরিবারের সংখ্যা খুবই কম (সারণি-৪.১)।

সারণি ৪.১ : সিএলপি ও কন্ট্রোল উত্তরদাতাগণের বয়স

ক্র.নং	বয়সের রেঞ্জ	সিএলপি'র সদস্য		কন্ট্রোল খানা প্রধান	
		সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
১	২০ - ২৯	৪৭৯	৩০.০	৪২৬	৫৩.২
২	৩০ - ৩৯	৬৫১	৪০.৭	২১৩	২৬.৬
৩	৪০ - ৪৯	৩০৪	১৯.০	১০২	১২.৮
৪	৫০ - ৫৯	১০৬	৬.৬	৪০	৫.০
৫	৬০ এর উর্ধ্ব	৬০	৩.৮	১৯	২.৪
	মোট	১৬০০	১০০.০	৮০০	১০০.০

সিএলপি ও কন্ট্রোল উত্তরদাতাগণের বয়স

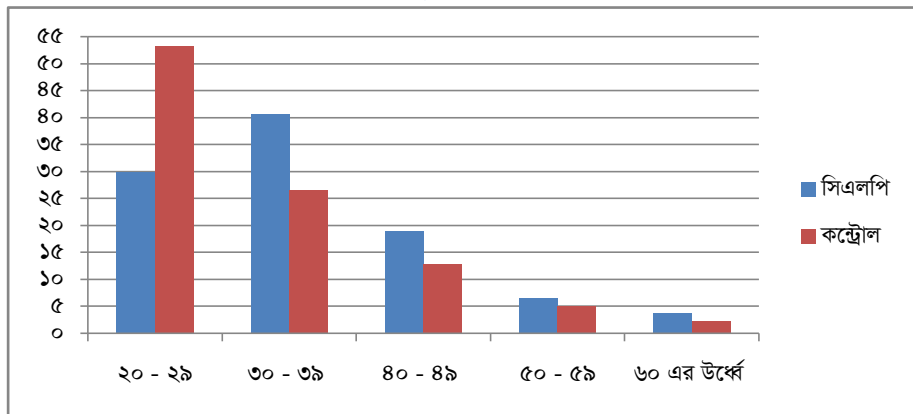

৪.৪ সিএলপি ও কন্ট্রোল সদস্যের স্বামীর বয়স

যেহেতু সিএলপি সদস্য ও কন্ট্রোল খানা প্রধানগণ মহিলা তাই তাঁদের স্বামীগণের বয়সের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সিএলপি সদস্য ও কন্ট্রোল খানা প্রধানের স্বামীর বয়স বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৪০.৪% সিএলপি সদস্যগণের স্বামীর বয়স ৩১-৪০ বছরের মধ্যে অপর পক্ষে ৪০.৬% কন্ট্রোল খানা প্রধানের স্বামীর বয়স ৩১-৪০ বছরের মধ্যে। উভয় দলেই ৫০ এবং এর উর্ধ্বে স্বামীর বয়সের পরিবারের সংখ্যা খুবই কম (সারণি-৪.২)।

সারণি ৪.২ : সিএলপি ও কন্ট্রোল সদস্যের স্বামীর বয়স

ক্র.নং	বয়সের রেঞ্জ	সিএলপি'র সদস্যের স্বামী		কন্ট্রোল সদস্যের স্বামী	
		সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
১	২০ - ২৯	৮০	৫.৫	১৭৭	২৩.৭
২	৩০ - ৩৯	৫৮৬	৪০.৪	৩০৪	৪০.৬
৩	৪০ - ৪৯	৪৯০	৩৩.৮	১৬৪	২১.৯
৪	৫০ - ৫৯	১৯০	১৩.১	৬২	৮.৩
৫	৬০ এর উর্ধ্বে	১০৩	৭.১	৪১	৫.৫
	সকল	১৬০০	১০০.০	৮০০	১০০.০

৪.৫ সিএলপি ও কন্ট্রোল পরিবারের সদস্য সংখ্যা

বর্তমান সমীক্ষায় স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে গঠিত প্রতিটি ইউনিটকে পরিবার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। গড়ে সিএলপি সদস্যের পরিবারে ৪.৩৭ জন সদস্য আছে অপর পক্ষে কন্ট্রোল গ্রুপের খানা প্রধানের পরিবারে ৪.১২ জন সদস্য আছে। ৭০.৫% সিএলপি সদস্যের পরিবারে ৪-৬ জন সদস্য আছে এবং ৬৩.৩% কন্ট্রোল গ্রুপের খানা প্রধানের পরিবারে ৪-৬ জন সদস্য আছে (সারণি-৪.৩)। বিবিএস (২০১১) এর তথ্য মতে উভয় দলের পরিবারের সদস্যের সংখ্যা জাতীয় গড় সংখ্যার চেয়ে কিছুটা কম (৪.৫০)।

সারণি ৪.৩ : সিএলপি ও কন্ট্রোল পরিবারের সদস্য সংখ্যা

ক্র.নং	সদস্য সংখ্যা	সিএলপি সদস্য			কন্ট্রোল সদস্য		
		সংখ্যা	শতকরা হার	গড় সদস্য সংখ্যা	সংখ্যা	শতকরা হার	গড় সদস্য সংখ্যা
১	১ - ৩	৩৬৪	২২.৮	৪.৩৭	২৫০	৩১.৩	৪.১২
২	৪ - ৬	১১২৯	৭০.৫		৫০৭	৬৩.৩	
৩	৭ - ৯	১০৭	৬.৭		৪৩	৫.৪	
	সকল	১৬০০	১০০		৮০০	১০০	

৪.৬ সিএলপি ও কন্ট্রোল সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা

নির্বাচিত সিএলপি সদস্যের ও কন্ট্রোল ব্যক্তিবর্গের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সিএলপি সদস্যের মধ্যে কোন শ্রেণী পাশ করে নাই এমন খানার হার শতকরা ৪৬.৩ এবং কন্ট্রোল এলাকায় ৪৪.৮%। শতকরা ৪৮.১ ভাগ সিএলপি সদস্য এবং শতকরা ৪৭.৬ ভাগ নির্বাচিত কন্ট্রোল এলাকায় ১ম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন (সারণি-৪.৪)। এই তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উভয় এলাকার নির্বাচিত নমুনা সদস্যগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রায় একই ধরন। বিবিএস-২০১১ এর তথ্য মতে উভয় দলের খানা প্রধানগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা জাতীয় শিক্ষাগত (গ্রামীণ) যোগ্যতা ৪২.৩% এর তুলনায় কম।

সারণি ৪.৪ : সিএলপি ও কন্ট্রোল সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা

ক্র.নং	সর্বোচ্চ শ্রেণি পাশ	সিএলপি সদস্য		কন্ট্রোল সদস্য	
		সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
১	কোন শ্রেণি পাশ করে নাই	৭৪১	৪৬.৩	৩৫৯	৪৪.৮
২	১ম শ্রেণি হতে ৫ম শ্রেণি	৭৬৯	৪৮.১	৩৮১	৪৭.৬
৩	৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ৮ম শ্রেণি	৬৭	৪.২	৩৮	৪.৮
৪	৯ম শ্রেণি হতে ১০ম শ্রেণি	৬	০.৪	১৪	১.৮
৫	এস এস সি ও অধিক	১৭	১.০	৮	১.০
	সকল	১৬০০	১০০.০	৮০০	১০০.০

৪.৭ : সিএলপি ও কন্ট্রোল সদস্যের স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা

নির্বাচিত সিএলপি সদস্য ও কন্ট্রোল ব্যক্তিবর্গের সবাই মহিলা তাই তাঁদের স্বামীগণের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উক্ত তথ্যে দেখা যায় যে, সিএলপি সদস্যের স্বামীদের মধ্যে কোন শ্রেণী পাশ করে নাই এমন খানার হার শতকরা ৪৬.০% এবং কন্ট্রোল এর বেলায় ৫৩.৬%। শতকরা ৪৭.৮ ভাগ সিএলপি সদস্য গণের স্বামী এবং শতকরা ৩৮.৭ ভাগ নির্বাচিত কন্ট্রোল খানা প্রধানের স্বামী ১ম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন (সারণি-৪.৫)। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে উভয় দলের স্বামী গণের শিক্ষাগত যোগ্যতা একই রকম নয়।

সারণি ৪.৫ : সিএলপি ও কন্ট্রোল সদস্যের স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা

ক্র.নং	সর্বোচ্চ শ্রেণি পাশ	সিএলপি সদস্য		কন্ট্রোল সদস্য	
		সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
১	কোন শ্রেণি পাশ করে নাই	৮১৮	৪৬.০	৪২৮	৫৩.৬
২	১ম শ্রেণি হতে ৫ম শ্রেণি	৬৯২	৪৭.৮	৩১০	৩৮.৭
৩	৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ৮ম শ্রেণি	৪২	২.৯	২৪	৩.০
৪	৯ম শ্রেণি হতে ১০ম শ্রেণি	১৯	১.৩	১৮	২.২
৫	এস এস সি ও অধিক	২৯	২.০	২০	২.৫
	সকল সদস্য	১৬০০	১০০	৮০০	১০০

৪.৮ সিএলপি ও কন্ট্রোল সদস্যের স্বামীর পেশা

উল্লেখ্য যে নির্বাচিত সকল সিএলপি সদস্যই মহিলা। তাই কন্ট্রোল হিসাবে যে ৮০০ পরিবারকে নির্বাচিত করা হয়েছে তাঁদের শতভাগই মহিলা। উভয় দলের প্রধানগণ মহিলা বিধায় তাঁদের স্বামীদের পেশার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, উভয় দলের ৫৫% এর অধিক স্বামীগণ দিনমজুর। সিএলপির সদস্যগণের মধ্যে ১১.৮% কৃষি কাজের সাথে জড়িত এবং কন্ট্রোল খানাসমূহে ২৩.৭% স্বামীগণ কৃষি কাজে জড়িত। ছয় থেকে নয় শতাংশ স্বামীগণ বয়সগত কারণে অন্যের উপর নির্ভরশীল। উক্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে উভয় দলের পরিবারগুলো গরিব এবং সিএলপি সঠিকভাবেই গরিব জনগোষ্ঠীকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করেছে (সারণি-৪.৬)।

সারণি ৪.৬ : সিএলপি ও কন্ট্রোল সদস্যের স্বামীর পেশা

ক্র.নং	পেশার নাম	সিএলপি'র সদস্য		কন্ট্রোল সদস্য	
		সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
১	নির্ভরশীল	১৫১	৯.৪	৫২	৬.৫
২	দিনমজুর	৮৯২	৫৫.৮	৪৪৪	৫৫.৫
৩	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	১৫৭	৯.৮	৪০	৫.০
৪	চাকুরী	১৭৪	১০.৯	৬৪	৮.০
৫	কৃষক	১৮৯	১১.৮	১৯০	২৩.৭
৬	জেলে	৩৭	২.৩	১০	১.৩
	সকল	১৬০০	১০০	৮০০	১০০


৪.৯ সিএলপি ও কন্ট্রোল সদস্যের ছেলে/মেয়ে (৬-১০ বৎসর) স্কুলে যায় এমন খানার সংখ্যা

নির্বাচিত খানাসমূহ থেকে ৬-১০ বৎসর বয়সের ছেলে বা মেয়ে স্কুলে যায় এমন পরিবার খুঁজে বের করা হয়। এ তথ্য থেকে দেখা যায় যে, নির্বাচিত সিএলপিভুক্ত ১৬০০ খানার শতকরা ৮১.৪০ ভাগ খানা হতে ছেলে/মেয়ে স্কুলে যায়। অপর পক্ষে নির্বাচিত কন্ট্রোল খানার শতকরা ৬৮.৬ ভাগ খানা হতে ছেলে/মেয়ে স্কুলে যায় (সারণি-৪.৭)। সিএলপি সদস্যগণের শিক্ষার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে হয়তো বেশিই ভাগ ছেলে-মেয়ে স্কুলে যায় যা সিএলপির অবদান।

সারণি ৪.৭ : সিএলপি ও কন্ট্রোল সদস্যের ছেলে/মেয়ে (৬-১০ বৎসর) স্কুলে যায় এমন খানার সংখ্যা

খানার ধরন	খানার সংখ্যা	শতকরা হার
সিএলপি	১০৫৯	৬৬.২%
কন্ট্রোল	৪৩৫	৫৪.৫%

সিএলপি ও কন্ট্রোল সদস্যের ছেলে/মেয়ে (৬-১০ বৎসর) স্কুলে যায় এমন খানার সংখ্যা




৪.১০ জমাজমির পরিমাণ

নির্বাচিত উভয় খানাসমূহের জমাজমির মালিকানার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সিএলপি খুবই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করেছে যাদের খুব কম সংখ্যকেরই জমি আছে (১১.১%) এবং জমির পরিমাণও সামান্য (৩৯.৭ শতক)। জমির মালিকানার তথ্য বিশ্লেষণে আরও প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য যে সকল খানাসমূহকে কন্ট্রোল হিসাবে নেওয়া হয়েছে তাঁরাও জমির মালিকানা হিসেবে সিএলপি সদস্যগণের মতই। বিস্তারিত সারণি-৪.৮ এ প্রদর্শিত হলো।

সারণি ৪.৮ : জমির পরিমাণ

ক্র.নং	জমির ধরন	সিএলপি সদস্য			কন্ট্রোল সদস্য		
		সংখ্যা	শতকরা হার	গড় জমির পরিমাণ (শতক)	সংখ্যা	শতকরা হার	গড় জমির পরিমাণ (শতক)
১	নিজস্ব কৃষি জমি	১৭৭	১১.১	৩৯.৭	৫৫	৬.৯	৪০.২
২	লিজ নেওয়া জমি	৫২২	৩২.৬	৩৮.২	১০০	১২.৫	৪১.৬

জমির পরিমাণ

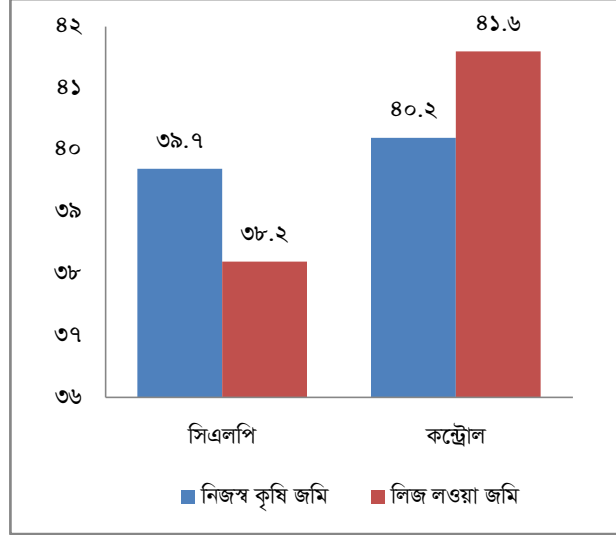

৪.১১ বসতবাড়ীর ধরন

নির্বাচিত সিএলপি সদস্য ও কন্ট্রোল খানাসমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানার জন্য তাঁদের বাসস্থানের ধরন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং বিশ্লেষিত তথ্য সারণি-৪.৯ এ উপস্থাপন করা হল। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে উভয় দলেই টিনের ছাদযুক্ত ঘর আছে এমন সংখ্যাই অধিক (৯৫.৩%-৯৬.৩%)। টিনের দেওয়ালযুক্ত ঘর আছে এমন খানার সংখ্যাই অধিক ৮৩.০%-৬২.৮%। বসতবাড়ির দেওয়াল কিসের তৈরি সে বিবেচনায় সিএলপিভুক্ত খানাসমূহের বাসস্থানের অবস্থা কন্ট্রোল খানাসমূহের তুলনায় কিছুটা ভাল।

সারণি ৪.৯ : বসতবাড়ীর ধরন

ক্র.নং	কিরূপ / কিসের তৈরি	সিএলপি সদস্য		কন্ট্রোল সদস্য	
		সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
১.	বসতবাড়ির ছাদ				
১.১	খড় দিয়ে	৬০	৩.৭	৩৮	৪.৮
১.২	টিন দিয়ে	১৫৪০	৯৬.৩	৭৬২	৯৫.৩
	সর্বমোট	১৬০০	১০০	৮০০	১০০
২.	বসতবাড়ির দেওয়াল				
২.১	বাঁশ দিয়ে	২৭২	১৭.০	২৯৮	৩৭.২
২.২	টিন দিয়ে	১৩২৮	৮৩.০	৫০২	৬২.৮
	সর্বমোট	১৬০০	১০০	৮০০	১০০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সিএলপি হতে সহযোগিতা পাওয়ার ধরন

৫.১ সিএলপি হতে সহযোগিতা পাওয়ার ধরন

নির্বাচিত সিএলপিভুক্ত সদস্যগণ সিএলপি থেকে কি ধরনের সহযোগিতা পেয়েছেন সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, নির্বাচিত খানাসমূহের ৯৮.০% গরু, ৯৬.০% বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, ৯৬.৬% বাসস্থানের ভিটি উঁচুকরণ, ৮৭.৩% স্লাব ল্যাট্রিন, ৭৫.৩% বসত বাড়িতে সবজি উৎপাদনের জন্য বীজ ও সার এবং ৬২.৪% কাজের বিনিময়ে টাকা পেয়েছেন। এছাড়াও প্রকল্প থেকে স্বাস্থ্য সেবা পেয়েছেন ৫৭.৫% নির্বাচিত সিএলপি সদস্যগণ। ছাগল, যৌথভাবে নলকূপ, হাঁস-মুরগি ও ঋণ সুবিধা পেয়েছেন যথাক্রমে ২৮.২%, ১৬.২%, ১৩.৯% এবং ৬.৭% (সারণি-৫.১)।

সারণি ৫.১ : সিএলপি হতে সহযোগিতা পাওয়ার ধরন

ক্র.নং	সাহায্যের ধরন	মোট খানার সংখ্যা	সাহায্য প্রাপ্ত খানার সংখ্যা	সাহায্য প্রাপ্ত খানার শতকরা হার
১	বাসস্থানের ভিটি (Plinth) উঁচুকরণ	১৬০০	১৫৪৬	৯৬.৬
২	নলকূপ (যৌথভাবে)	১৬০০	২৫৯	১৬.২
৩	কাজের বিনিময়ে টাকা	১৬০০	৯৯৮	৬২.৪
৪	হাঁস-মুরগি	১৬০০	২২২	১৩.৯
৫	স্লাব ল্যাট্রিন	১৬০০	১৩৯৭	৮৭.৩
৬	গরু	১৬০০	১৫৭২	৯৮.৩
৭	ছাগল	১৬০০	৪৫১	২৮.২
৮	প্রশিক্ষণ	১৬০০	১৫৩৩	৯৫.৮
৯	স্বাস্থ্য সেবা	১৬০০	৯২০	৫৭.৫
১০	ঋণ সুবিধা	১৬০০	১০৭	৬.৭
১১	বসত বাড়িতে সবজি উৎপাদনের জন্য বীজ ও সার	১৬০০	১১৮৮	৭৪.৩

৫.২ সিএলপি হতে গরু প্রদান

সিএলপি যত ধরনের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছে গরু ক্রয় তাদের মধ্যে অন্যতম। নির্বাচিত ১৬০০ খানাসমূহের মধ্যে ১৫৭২ (৯৮.৩%) গরু ক্রয়ের জন্য গড়ে ১৫৮১০ টাকা পেয়েছেন। সিএলপি কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে স্থানীয় বাজার হতে গরু ক্রয় করা হয়েছে। নির্বাচিত সদস্য সমূহের ১৫৭২ জন সদস্য গরু ক্রয় করেছেন গড়ে ১৪৯৮৪ টাকার মধ্যে তাদের মধ্যে ১১৭ জনের গরু ক্রয় করার পরও গড়ে ৮২৬ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে এবং তা দিয়ে হাঁস-মুরগি ক্রয় করে (সারণি-৫.২)।

সারণি ৫.২ : সিএলপি থেকে গরু প্রদান ও গরু/ছাগল/হাঁস-মুরগী রক্ষণাবেক্ষণের সহায়তা প্যাকেট

ক্র.নং	গরু ক্রয় সংক্রান্ত	মোট খানার সংখ্যা	সাহায্য প্রাপ্ত খানার সংখ্যা	সাহায্য প্রাপ্ত খানার %
১	গরু ক্রয় এর জন্য নগদ টাকা পাওয়া	১৬০০	১৫৭২	৯৮.৩
২	গরু ক্রয়ে মোট ব্যয় (টাকা)	১৬০০	১৫৭২	৯৮.৩
৩	গরু ক্রয়ের পর উদ্বৃত্ত টাকা হাঁস-মুরগি ক্রয় করেছেন	১৬০০	১১৭	৭.৪
৪	প্রকল্পে গরু ক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় ছিল (যার হ্যাঁ, বলেছেন)	১৬০০	১৫৯৫	৯৯.৭
৫	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গরু ক্রয় করেছেন	১৬০০	১৫৪০	৯৬.০
৬	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গরু ক্রয় করতে পারে নাই	১৬০০	৩২	২.০

৭	সহায়তা প্যাকেট পেয়েছেন	১৬০০	১৫৩৬	৯৬.০
৮	পেলে তা কার্যকরী ছিল	১৬০০	১৫৩২	৯৯.৭
৯	প্রতি মাসে গরুর চিকিৎসা বাবদ ৩৫০ টাকা পেয়েছে	১৬০০	১৫১৯	৯৮.৯

গরু ক্রয়ের প্রাপ্ত গড় : ১৫,৮১০ টাকা

গরু ক্রয়ের গড় ব্যয় : ১৪,৯৮৪ টাকা

গরু ক্রয়ের পর উদ্ধৃত ৮২৬ টাকায় হাঁস-মুরগি ক্রয় করেছেন

৫.৩ ভিএসএলএ/সমিতি সম্পর্কিত

সিএলপি প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতি উপজেলায় এক থেকে দুইটি এনজিও নিয়োজিত ছিল। নির্বাচিত ২০টি উপজেলাতে অনুরূপভাবে এনজিও প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করেছে। নির্বাচিত ১৪টি উপজেলার ১৬০০ সিএলপির সদস্যগণ ভিএসএলএ এর সদস্য কিনা সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উক্ত তথ্য বিশ্লেষণের ফলাফলে দেখা যায় যে, নির্বাচিত সিএলপির সদস্যগণের মধ্যে ৪৫.৬% ভিএসএলএর সদস্য এবং সকলেই গড়ে ১৯১৭ টাকা জমা করেছেন। ভিএসএলএভুক্ত সদস্যগণের মধ্যে ৩৪.৫৬% গড়ে ২৪৫২ টাকা ঋণ নিয়েছেন মাত্র ৫.৫৪% সুদে (সারণি-৫.৩)।

সারণি ৫.৩ : ভিএসএলএ/সমিতি সম্পর্কিত

ক্র.নং	ভিএসএলএ সংক্রান্ত	খানার সংখ্যা	শতকরা হার	গড় টাকা/ গড় সুদ
১	ভিএসএলএ (VSLA) এর সদস্য	৭২৯	৪৫.৬	-
২	কত টাকা সঞ্চয় জমা হয়েছে	৭২৯	১০০	১৯১৭
৩	ওখান হতে কত টাকা ঋণ নিয়েছে	২৫২	৩৪.৫৬	২৪৫২
৪	বার্ষিক কত হারে সুদ দিতে হয়েছে (%)	২৫২	৩৪.৫৬	৫.৫৪

সঞ্চয় জমা: সর্বনিম্ন-১০০ টাকা, সর্বোচ্চ-২৫,০০০ টাকা, এসটিডি-২৩৯৩ টাকা।

ঋণ গ্রহণ: সর্বনিম্ন-২০০ টাকা, সর্বোচ্চ-২৫,০০০ টাকা, এসটিডি-২৭৬২ টাকা।

৫.৪ সিএলপিভুক্ত এনজিও হতে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ

সিএলপি বাস্তবায়নে নিযুক্ত এনজিও সমূহ প্রকল্পের সদস্যগণকে কি ধরনের সেবা প্রদান করেছেন তার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের (সারণি-৫.৪) ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে এনজিও ভুক্ত ৭২৯ জনের মধ্যে শতভাগই প্রশিক্ষণ সুবিধা ভোগ করেছেন। সিএলপি ভুক্ত এনজিও হতে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহের মধ্যে-

- সমাজ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ১০০%,
- শাক-সবজির বীজ সহায়তা পেয়েছেন ১৬.০৫%,
- সঞ্চয় সুবিধা পেয়েছেন ৯.৭৪%,
- স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন ২৮.৮১% এবং
- সামাজিক সচেতনতা বিষয়ে পরামর্শ পেয়েছেন ১৯.২০%।

দলীয় আলোচনা, কি ইনফরমেট ইন্টারভিউ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণও অভিমত প্রকাশ করেন যে প্রকল্পভুক্ত সকল এনজিও সম্পদ হস্তান্তর, দলগঠন, সমাজ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, শিশুদের শিক্ষা ও গবাদী পশুর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

সারণি ৫.৪ : সিএলপিভুক্ত এনজিও হতে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ

ক্র.নং	সুবিধা সমূহের নাম	খানার সংখ্যা	শতকরা হার
১	সমাজ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৭২৯	১০০
২	শাক-সবজির বীজ গ্রহণ	১১৭	১৬.০৫
৩	সঞ্চয় সুবিধা	৭১	৯.৭৪
৪	স্বাস্থ্য সেবা	২১০	২৮.৮১
৫	সামাজিক সচেতনতা	১৪০	১৯.২০

৫.৫ সিএলপিভুক্ত এনজিও কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্টি প্রকাশ

সিএলপিভুক্ত এনজিও কর্মকাণ্ড বিষয়ে সদস্যগণের অভিমত সম্পর্কিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, নির্বাচিত ১৬০০ সিএলপি সদস্যগণের মধ্যে ৭২৯ (৪৫.৫৬%) প্রকল্পভুক্ত এনজিওর সদস্য। উক্ত সদস্যগণের সকলেই (১০০%) এনজিও কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। দলীয় আলোচনা, কি ইনফরমেট ইন্টারভিউ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণও অভিমত প্রকাশ করেন যে প্রকল্পভুক্ত সকল এনজিওর কর্মকাণ্ডে তারা সন্তুষ্টি।

৫.৬ ভিএসএলএ সম্পর্কিত

নির্বাচিত ১৬০০ সিএলপি সদস্যগণের মধ্যে ৭২৯ (৪৫.৫৬%) ভিএসএলএ সদস্য ছিল। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সমিতির সদস্যগণ নিয়মিত বৈঠক করতেন ও সমাজ উন্নয়নের নানা দিক সম্পর্কে আলোচনা করতেন। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর এখনও ভিএসএলএ চালু আছে কি না ও পূর্বের ন্যায় বৈঠক হয় কিনা এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ৫২% সদস্যের ভিএসএলএ চালু আছে এবং ৪৭% সদস্যগণ নিয়মিত সমিতির বৈঠক করেন (সারণি-৫.৫)। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও সদস্যরা তাদের আয় উন্নতি বৃদ্ধির জন্য ভিএসএলএ/বাক্স সমিতি চালু রেখেছেন। উল্লেখ্য যে, ভিএসএলএ সমিতিকে আরও অধিক মাত্রায় Sustainable করার জন্য বর্তমানে সরকারী অথবা বেসরকারী সাহায্য সংস্থা থেকে পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন রয়েছে।

সারণি ৫.৫ : ভিএসএলএ সম্পর্কিত

ক্র.নং	বিষয়	খানার সংখ্যা	শতকরা হার
১	প্রকল্প শেষে আপনাদের ভিএসএলএ চালু আছে	৩৮২	৫২
২	নিয়মিত সমিতিতে বৈঠক হয়	৩৪৪	৪৭

৫.৭ সিএলপি হতে কৃষি সম্পর্কিত প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ

প্রকল্প থেকে সিএলপি সদস্যগণকে কৃষি সম্পর্কিত নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সিএলপি নির্বাচিত সদস্যগণ যে সকল বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলো বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজি বাগান (৯৯.৪%), গাভী পালন (৯৮.৩%), নলকূপ মেরামত (৬৩.৪%), হাঁস-মুরগি পালন (৯১.৭০%), জৈব সার তৈয়ারী (৯০.৮%) এবং গো-খাদ্য চাষ (৭৯.৮%)। সবগুলি প্রশিক্ষণই ফলপ্রসূ ছিল বলে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ মনে করেন (সারণি-৫.৬)। দলীয় আলোচনা, কি ইনফরমেট ইন্টারভিউ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণও অভিমত প্রকাশ করেন যে সিএলপি প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ খুবই ফলপ্রসূ ছিল এবং প্রশিক্ষণ লব্ধজ্ঞান দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছেন।

সারণি ৫.৬ : সিএলপি হতে কৃষি সম্পর্কিত প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	মোট খানার সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খানার সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খানার %
১	বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি বাগান	১৬০০	১৫৯০	৯৯.৪
২	গাভী পালন	১৬০০	১৫৭৩	৯৮.৩
৩	নলকূপ মেরামত	১৬০০	১০১৪	৬৩.৪
৪	হাঁস-মুরগি পালন	১৬০০	১৪৬৭	৯১.৭
৫	গোবর সংরক্ষণ	১৬০০	১৪৫২	৯০.৮
৬	গো-খাদ্য চাষ	১৬০০	১২৭৭	৭৯.৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ প্রকল্পের প্রভাব


৬.১ ভিটি উঁচু করণের প্রভাব

নির্বাচিত ১৬০০ সিএলপি খানার প্রায় সবকয়টি খানার (৯৬.৬%) ঘরের ভিটি উঁচু করা হয়েছে এবং ৮৮.৯% সদস্যই বলেছেন এতে তাদের ঘড়বাড়ী বন্যার ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। উঁচুকৃত ভিটির ঢালে ৮৩.৬% সদস্য গাছপালা বা তরি-তরকারী লাগিয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য থেকে আরও দেখা যায় যে ৭৫.১% পরিবার ভিটি উঁচু করণের কাজে অংশগ্রহণ করেছেন (সারণি-৬.১)। দলীয় আলোচনা, কি ইনফরমেট ইন্টারভিউ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণও অভিমত প্রকাশ করেন যে ঘরের ভিটি উঁচু করণের ফলে ঘড়বাড়ী বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়েছে ও উঁচুকৃত ভিটির ঢালে গাছ-পালা লাগিয়েছেন ও তরিতরকারি চাষ করেছেন।

সারণি ৬.১ : ভিটি উঁচু করণের প্রভাব

ক্র.নং	ভিটি উঁচু করণ	মোট নির্বাচিত খানার সংখ্যা	হ্যাঁ বলেছেন এমন খানার সংখ্যা	হ্যাঁ বলেছেন এমন খানার শতকরা হার
১	খানায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ভিটি উঁচু করণ করা হয়েছে	১৬০০	১৫৪৬	৯৬.৬
২	ভিটি উঁচু করাতে বন্যার ক্ষয় ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়েছে	১৬০০	১৪২৩	৮৮.৯
৩	উঁচু ভিটির ঢালে গাছপালা/তরি-তরকারী লাগিয়েছেন	১৬০০	১৩৩৭	৮৩.৬
৪	ভিটি উঁচু করণের কাজে অংশগ্রহণ করেছেন	১৬০০	১২০২	৭৫.১
৫	ভিটি উঁচু করণের ফলে মাটির ক্ষয়রোধ হয়েছে	১৬০০	১৩৯২	৮৭.০

ভিটি উঁচু করণের প্রভাব

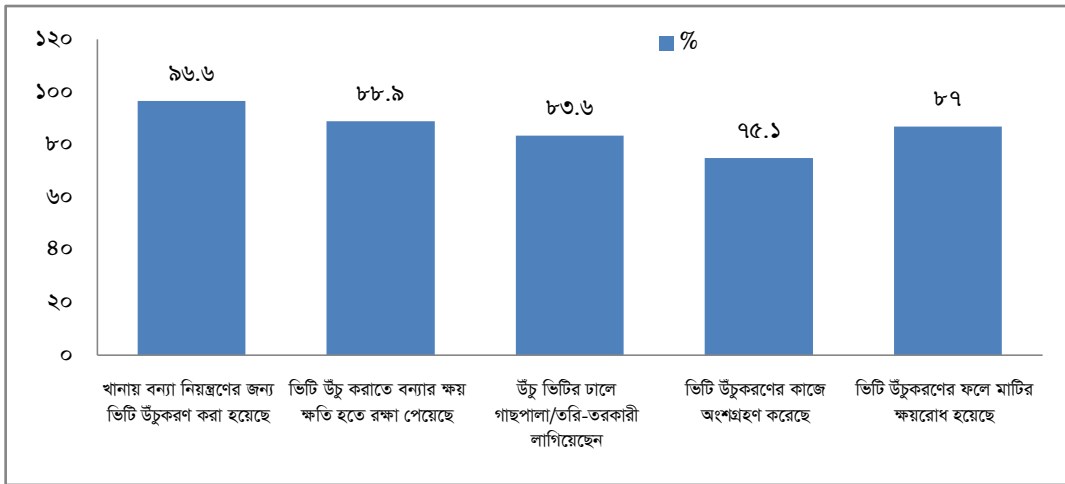

৬.২ দুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ

সিএলপি থেকে প্রকল্পভুক্ত সদস্যকে গরু ক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে নির্বাচিত ১৬০০ সদস্যের মধ্যে ৯৮.৩% সদস্য প্রকল্পের টাকা হতে গরু/গাভী ক্রয় করেছেন। তাদের মধ্যে শতকরা ৫৫.৬ ভাগ প্রতিদিন গড়ে ২.১ লিটার দুধ পেয়েছেন এবং বাজারে বিক্রয় করে রোজ ৫৫.৮০ টাকা রোজগার করেছেন। দুধ বিক্রয়গণের ৩০.১% সঠিক মূল্য পান না বলে উল্লেখ করেছেন। দুধের সঠিক মূল্য না পাওয়ার কারণ হিসাবে ৯২.৫% ক্রেতার অভাবকেই দায়ী করেন। বিস্তারিত সারণি-৬.২ তে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৬.২ : দুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ

ক্র.নং	দুধ উৎপাদন সম্পর্কিত	গরু ক্রয় করেছেন এমন খানার সংখ্যা	উত্তরদাতা খাতার সংখ্যা	গড় পরিমাণ	টাকা	শতকরা কত জন
১	প্রতি দিন প্রাপ্ত দুধের পরিমাণ (লিটার)	১৫৭২	৮৭৪	২.১	-	৫৫.৬
২	প্রতি দিন দুধ পান করে (লিটার)	১৫৭২	৬৩৫	০.৭	-	৪০.৪
৩	প্রতি দিন দুধ বিক্রয় করে (লিটার)	১৫৭২	৮১৭	১.৭	-	৫২.০
৪	প্রতি দিন কত টাকার দুধ বিক্রয় করে	১৫৭২	৮১৭	-	৫৫.৮	৫২.০
৫	দুধ বিক্রয়ে সঠিক মূল্য পান (%)	১৫৭২	১০৯৯	-	-	৬৯.৯
৬	দুধ বিক্রয়ে সঠিক মূল্য পান না (%)	১৫৭২	৪৭৩	-	-	৩০.১
৭	সঠিক মূল্য না পাওয়ার কারণ (%) -					
৮	ক্রেতার অভাব	৪৭৩	৪৩৮	-	-	৯২.৫
৯	বাজার দূরে	৪৭৩	৩৫	-	-	৭.৪০


৬.৩ গরু ক্রয়ের ফলে আর্থিক অবস্থার উন্নয়নসমূহ

প্রকল্পের টাকায় গরু ক্রয়ের ফলে আর্থিক কি ধরনের উন্নয়ন হয়েছে সে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৫৩% দুধ বিক্রয় করে সংসার চালায়, ২৪% মনে করেন গরু ও দুধ বিক্রয় করে তাদের টাকা সঞ্চয় হয়েছে। ৯% জমি বন্ধক নিয়েছে এবং ৭% গরু মোটাতাজা করে বিক্রয় করে তারা লাভবান হয়েছেন (সারণি-৬.৩)।

সারণি ৬.৩ : গরু ক্রয়ের ফলে আর্থিক অবস্থার উন্নয়নসমূহ

ক্র.নং	কিভাবে আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে	খানা	শতকরা হার
১	দুধ বিক্রি করে সংসার চালায়	৮১৭	৫৩
২	গরু ও দুধ বিক্রয় করে সঞ্চয় বৃদ্ধি হয়েছে	৩৭৬	২৪
৩	জমি বন্ধক লওয়া হয়েছে	১৪১	৯
৪	গরু মোটা তাজা করে বিক্রয় করে	১১৪	৭
৫	উত্তর দেয়নি	১০৯	৭
	সর্বমোট	১৫৫৭	১০০

গরু ক্রয়ের ফলে আর্থিক অবস্থার উন্নয়নসমূহ

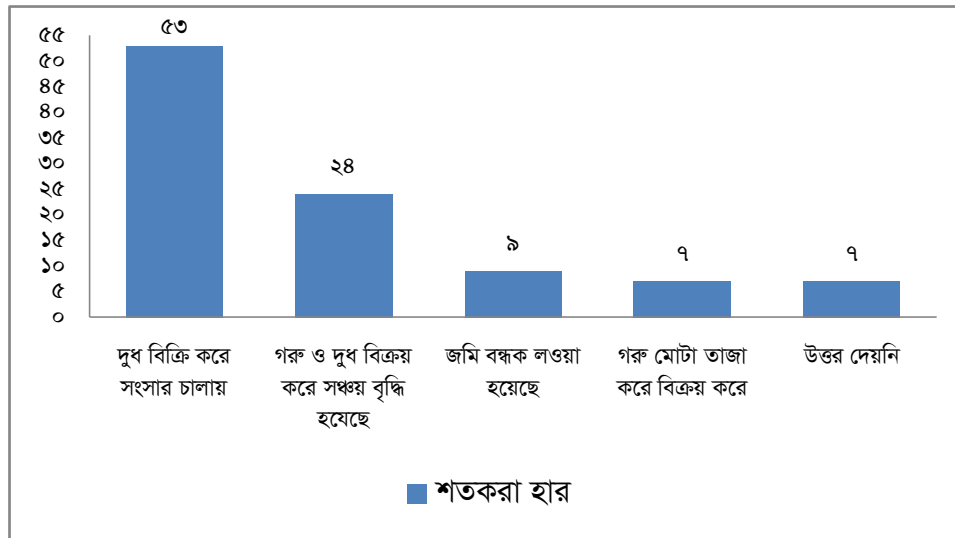


৬.৪ বসত ভিটায় শাক-সবজি চাষ

মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত সিএলপি সদস্যগণের শতকরা ৯৪ ভাগ এবং কন্ট্রোল খানাসমূহের শতকরা ৬৩.৪ ভাগ পরিবার বসতভিটায় শাক-সবজি চাষ করেছেন। শাক-সবজি উৎপাদনকারী সিএলপি পরিবারের শতকরা ৬৭.৬ ভাগ ও কন্ট্রোল খানা সমূহের শতকরা ৩২.৭ ভাগ পরিবার বসতভিটায় উৎপাদিত শাক-সবজি নিজেদের খাওয়ার পরেও বাজারে বিক্রয় করেন। সিএলপি সদস্যগণের শতকরা ৬৪.০ ভাগ ও কন্ট্রোল খানা সমূহের শতকরা ৫০.৩ ভাগ মনে করেন যে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাত করণের সু-ব্যবস্থা হয়েছে (সারণি-৬.৪)। এসব তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে সিএলপি'র কর্মকাণ্ড শাক-সবজি উৎপাদনে ও বাজারজাতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে এবং এলাকায় রাস্তা ও বাজার উন্নয়নের আরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

সারণি ৬.৪ : বসত ভিটায় শাক-সবজি চাষ

ক্র.নং	বসত ভিটায় শাক-সবজি চাষ	সিএলপি (১৬০০)		কন্ট্রোল (৮০০)	
		সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
১	বসতভিটায় শাক-সবজি চাষ করে	১৫০৪	৯৪.০	৪৫৫	৬৩.৪
২	বসতভিটায় উৎপাদিত শাক সবজি বিক্রয় করেন	১০৮১	৬৭.৬	২২৮	৩২.৭
৩	উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাত করণের সুব্যবস্থা আছে	১০২৪	৬৪.০	৩৭৮	৫০.৩
৪	বাজারজাত করণের সমস্যা -				
১	বাজারে ক্রেতা কম	২৪৮	৫১.১	১৯২	৬০.৬
২	বাজার দূরে	৩৪৫	৭১.১	২১২	৬৬.৯

বসত ভিটায় শাক-সবজি চাষ

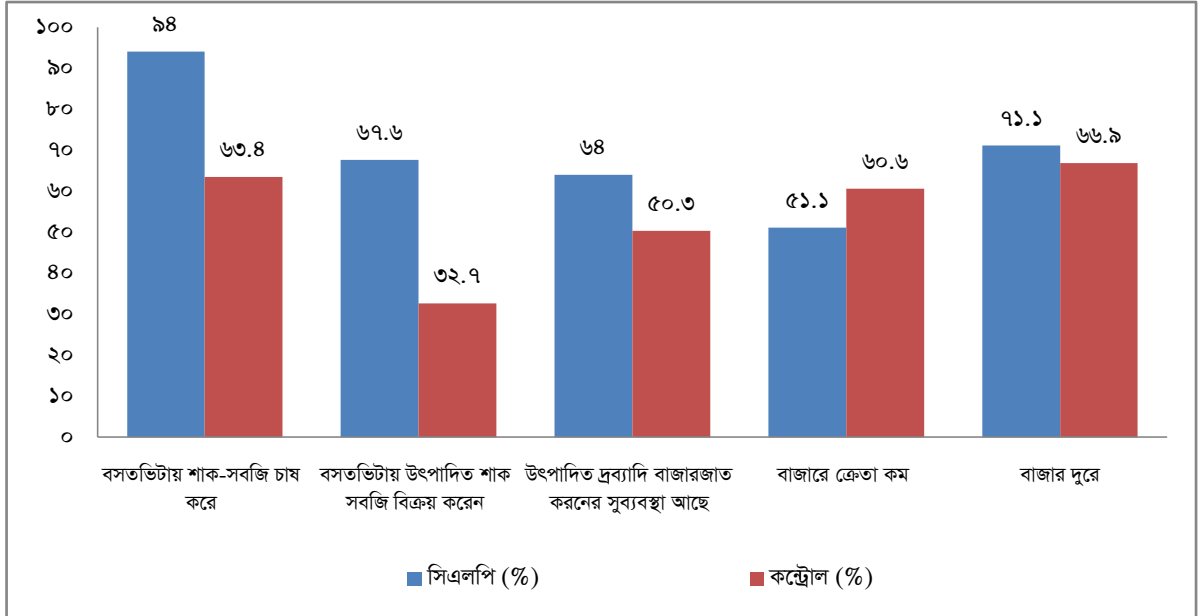

৬.৫ সম্পদের মালিকানা


নির্বাচিত সিএলপি সদস্য ও কন্ট্রোল খানাসমূহের মালিকানায় বর্তমান সম্পদেও পরিমাণ ও মোট মূল্য কত ছিল তা সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জমি এবং ঘরবাড়ি ইত্যাদি স্থায়ী সম্পদ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অস্থায়ী সম্পদের মূল্য নেওয়া হয়েছে যেগুলোর মধ্যে ছিল বাই-সাইকেল, টেলিভিশন, মোবাইল, রিকসা-ভ্যান, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী ইত্যাদি। সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে সিএলপি সদস্যগণের ৬০% খানায় গরু-বাছুর ৪৮% খানায় ছাগল ভেড়া ও ৬৪%

খানায় হাঁস-মুরগী আছে। অপরপক্ষে কন্ট্রোল খানা সমূহের ১৫% খানায় গরু-বাহুর ৩৮% খানায় ছাগল ভেড়া ও ৬১% খানায় হাঁস-মুরগী আছে। গরু-বাহুরের গড় মূল্য সিএলপি সদস্যের বেলায় ৩৮১৪২ টাকা এবং কন্ট্রোল খানা সমূহের বেলায় ২৭৯২৬ টাকা (সারণি-৬.৫)।

সারণি ৬.৫ : সম্পদের মালিকানার ধরন

ক্র. নং	সম্পদ	সিএলপি			কন্ট্রোল		
		খানা	খানা (%)	উত্তরদাতাদের ভাষ্য মতে গড় মূল্য (টাকা)	খানা	খানা (%)	উত্তরদাতাদের ভাষ্য মতে গড় মূল্য (টাকা)
১	সাইকেল	৬৪	৪	২,৮৮৮	২০	৩	২,৫৫০
২	টেলিভিশন	২৪	২	৪,৬৪২	১১	১	২,২০৯
৩	মোবাইল	৭৮৫	৪৯	১,৮৪৩	৩৯৯	৫০	১,৫৮২
৪	রিকশা/ভ্যান	১৬	১	১৩,১৫৬	৩	০	১১,৩৩৩
৫	গরু-বাহুর	৯৫৮	৬০	৩৮,১৪২	১১৯	১৫	২৭,৯২৬
৬	ছাগল-ভেড়া	৭৬৩	৪৮	৪,৪৭৭	৩০৭	৩৮	৩,৬৬৪
৭	হাঁস / মুরগি	১০২৯	৬৪	১,০৫৯	৪৮৮	৬১	৭৮০

সম্পদের মালিকানার ধরন

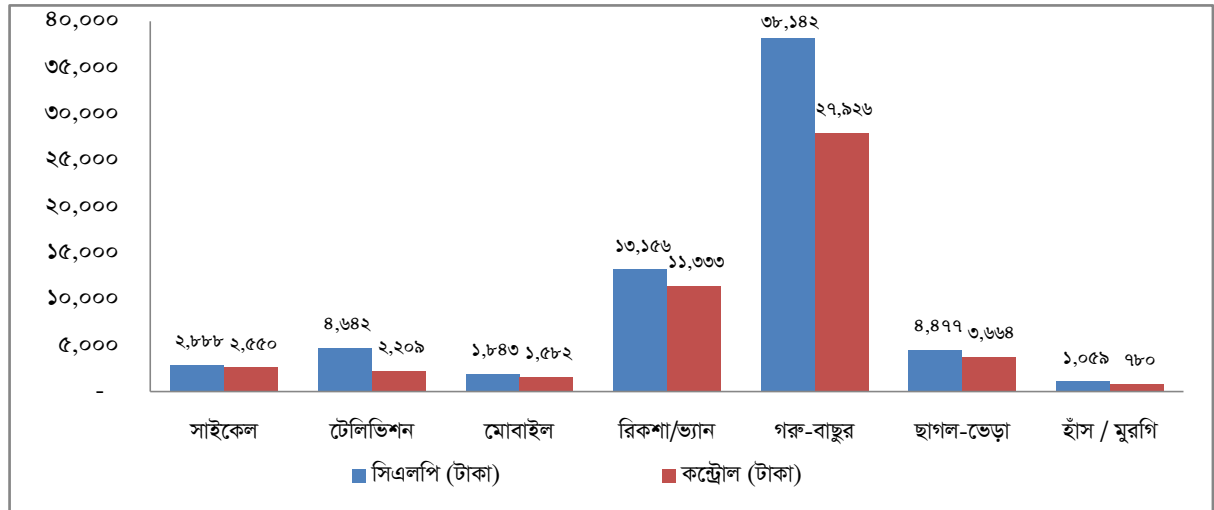

সমীক্ষায় সম্পদ মূল্যের শ্রেণী বিন্যাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোয়ালিটিভ পার্টিসিপেটরী সার্ভে রিপোর্ট ২০০৬ প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে বেজলাইন তথ্য হিসাবে সুবিধাভোগী সিএলপি সদস্যদের মোট সম্পদের গড় মূল্য দেখান হয়েছে অপেক্ষাকৃত ৫০০০ টাকার কম। বিশ্লেষিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে নমুনায়িত সিএলপি খানা সমূহের মধ্যে প্রায় ৫৮ টি (৪%) খানার সম্পদের মোট মূল্য বেজলাইনের সমতুল্য শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ ৫০০০ টাকা বা তার নিচে। বাকী সবার সম্পদের মোট মূল্য ৫১০০ টাকা থেকে ৪০০০০ টাকা বা তার বেশী। এদের মধ্যে ৫১০০ টাকা হতে ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের সম্পদ ছিল মাত্র মোট ১৫% খানার। ১৫১০০ টাকা হতে ৩৫০০০ টাকা ছিল সর্বমোট ৭৪% খানার এবং যথাক্রমে ৫% ও ২% খানার সম্পদের মূল্য টাকা ৩৫১০০ থেকে ৪০০০০ টাকা ও ৪০১০০ টাকা বা তার উপরে। অপরপক্ষে, কন্ট্রোল খানার অধিকাংশের অর্থাৎ প্রায় ৬১% খানার সম্পদের মূল্য এখনও ৫০০০ টাকার নিচে এবং ১৯% খানার সম্পদের মূল্য এখনও ৫১০০ হতে ১০০০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ (সারণি-৬.৬)। অতএব, এই সমীক্ষায় দেখা যায় যে প্রকল্প সহায়তার ফলে সিএলপি সদস্যবৃন্দ যথেষ্ট সঙ্গতিসম্পন্ন সম্পদ অর্জন করেছে।


সারণি ৬.৬ নমুনায়িত খানার সম্পদ মূল্যের শ্রেণী বিন্যাস

সম্পদ মূল্যের শ্রেণী বিন্যাস	সিএলপি		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
৫০০০ টাকার নীচে	৫৮	৩.৬	৪৮৮	৬১.০
৫০০১ টাকা - ১০০০০ টাকা	৭৫	৪.৭	১৫১	১৮.৯
১০০০১ টাকা - ১৫০০০ টাকা	১৬৯	১০.৬	৫৭	৭.১
১৫০০১ টাকা - ২০০০০ টাকা	৩৭৮	২৩.৬	৩৮	৪.৮
২০০০১ টাকা - ২৫০০০ টাকা	৩০৭	১৯.২	২৫	৩.১
২৫০০১ টাকা - ৩০০০০ টাকা	৩১৭	১৯.৮	২৩	২.৯
৩০০০১ টাকা - ৩৫০০০ টাকা	১৮৮	১১.৮	১২	১.৫
৩৫০০১ টাকা - ৪০০০০ টাকা	৭৮	৪.৯	৪	০.৫
৪০০০০ টাকার উপরে	৩০	১.৯	২	০.৩
মোট নমুন সংখ্যা	১৬০০	১০০.০	৮০০	১০০.০

সিএলপি গড় ৩০০৪৯, STD ২৪৮৭৩

কন্ট্রোল গড় ৮৭৯৯, STD ১০১৫৫

নমুনায়িত খানার সম্পদ মূল্যের শ্রেণী বিন্যাস

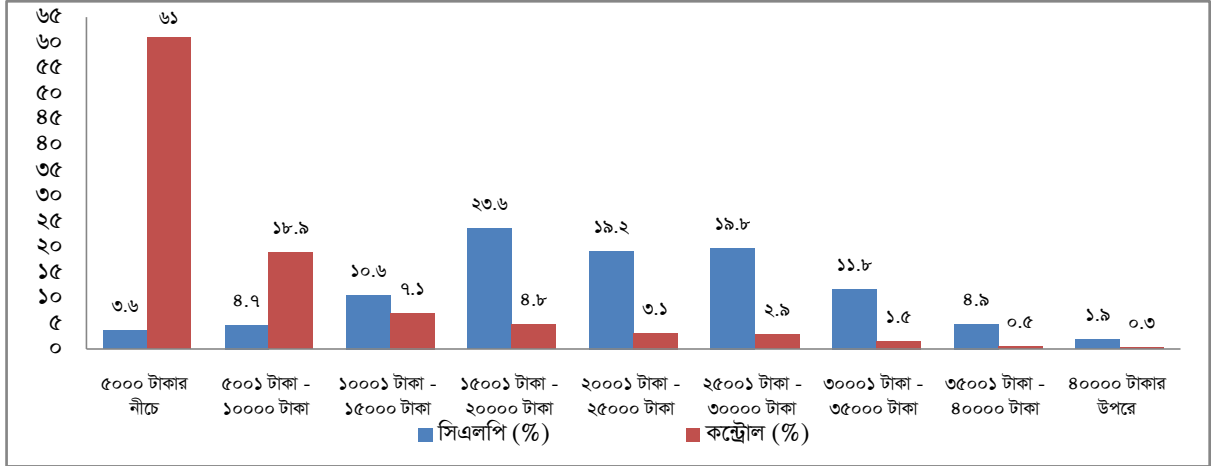

৬.৬ বিভিন্ন উৎস থেকে পরিবারের আয়


মাসিক বা বাৎসরিক আয় দ্বারা একটি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন নির্ধারণ করা যায়। এ উদ্দেশ্যে সামনে রেখেই নির্বাচিত সিএলপি সদস্য ও কন্ট্রোল খানাসমূহের নিকট থেকে মাসিক আয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয় উক্ত তথ্য থেকে দেখা যায় ৭৭.৬% নির্বাচিত সিএলপি সদস্য মাসে জন প্রতি শ্রম বিক্রয় করে গড়ে ১০০১ টাকা, পশু পালন/মাছ ধরা থেকে মাসে গড়ে ৩০৫ টাকা, ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকে মাসে গড়ে ৯০২ টাকা এবং ফসল চাষ থেকে মাসে গড়ে ৫০৯ টাকা উপার্জন করেছেন এবং সামগ্রিকভাবে এদের মাসিক গড় আয়ের পরিমাণ প্রায় ১০৩০ টাকা (সারণি-৬.৭)। অন্যদিকে, নির্বাচিত কন্ট্রোল সদস্য মাসে জন প্রতি শ্রম বিক্রয় করে গড়ে ৯১৪ টাকা, পশু পালন/মাছ ধরা হতে মাসে গড়ে ২৫৫ টাকা, ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকে মাসে গড়ে ৪২৭ টাকা এবং ফসল চাষ থেকে মাসে গড়ে ৫৩৫ টাকা উপার্জন করেছেন এবং সামগ্রিকভাবে এদের মাসিক গড় আয়ের পরিমাণ প্রায় ৯২৪ টাকা। প্রতিটি উৎসের বেলায় কন্ট্রোল সদস্যদের জন প্রতি মাসিক গড় আয় সিএলপি সদস্য থেকে কিছু কম। বিবিএস কর্তৃক (২০১০) পরিচালিত খানাসমূহের আয় ব্যয়ের জরিপ প্রতিবেদনে গ্রামীণ এলাকার জন প্রতি মাসিক আয় ১০৮৩.৭২ টাকা। মূল্যায়ন প্রাপ্ত জন প্রতি মাসিক আয়ের তথ্যের সাথে বিবিএস কর্তৃক (২০১০) পরিচালিত জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনা করলে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকার সিএলপি সদস্য এবং কন্ট্রোল খানাসমূহের আয় বাংলাদেশে পল্লী জনগোষ্ঠীর আয়ের তুলনায় (১০৮৩.৭২ টাকা) কিছুটা কম।

সারণি ৬.৭ : পরিবারের আয়ের উৎস ও জন প্রতি মাসিক গড় আয়ের পরিমাণ

ক্র.নং	আয়ের উৎস	নমুনায়িত খানা							
		সিএলপি				কন্ট্রোল			
		সংখ্যা*	%	গড় টাকা	STD	সংখ্যা*	%	গড় টাকা	STD
১	ফসল চাষ	৫৫৭	৩৪.৮	৫০৯	৪৫৪	১৩৪	১৬.৮	৫৩৫	৫৯১
২	পশুপালন/মাছ ধরা	৬২১	৩৮.৮	৩০৫	৪২৫	১৬৫	২০.৬	২৫৫	৫২১
৩	শ্রম বিক্রয়	১২৪২	৭৭.৬	১০০১	৩৯৪	৬৭৩	৮৪.১	৯১৪	৩৫০
৪	ক্ষুদ্র ব্যবসা	১১০	৬.৯	৯০২	৬৬৪	৪৪	৫.৫	৪২৭	৮০১
সামগ্রিক আয়				১০৩০	৪৮৪			৯২৪	৫৭৩

*একাধিক উত্তর

পরিবারের আয়ের উৎস ও জন প্রতি মাসিক গড় আয়ের পরিমাণ

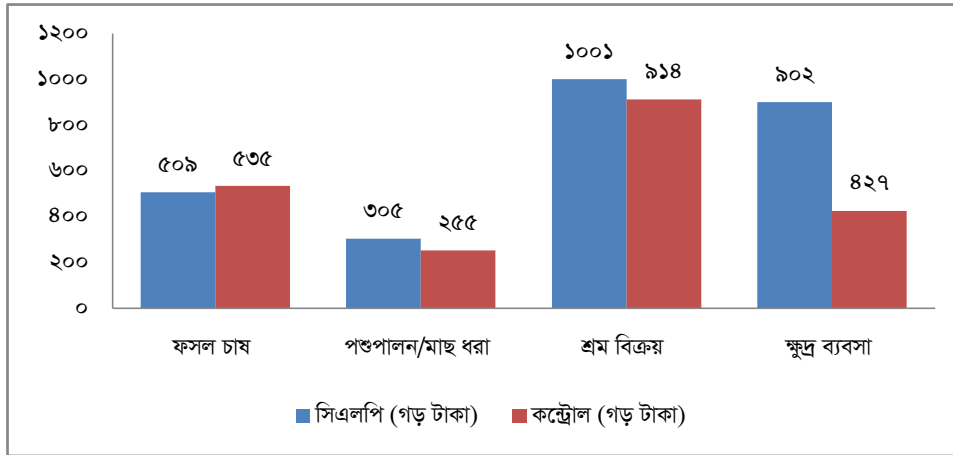

৬.৭ পরিবারের ব্যয়


নির্বাচিত সিএলপি সদস্য ও কন্ট্রোল খানাসমূহের নিকট থেকে পরিবার প্রতি মাসিক ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয় ও ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে নির্বাচিত সিএলপি সদস্য প্রতি মাসে গড়ে খাদ্য ক্রয়ে ৩৬৮৬, কৃষিতে ৭৫৬ টাকা, শিক্ষায় ৩৪১ টাকা, চিকিৎসায় ২৮৮ টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৭০৪ টাকা ব্যয় করেন এবং সামগ্রিকভাবে মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৩১৩ টাকা। অন্যদিকে, নির্বাচিত সিএলপি সদস্য প্রতি মাসে গড়ে খাদ্য ক্রয়ে ৩,৪৩৯ টাকা, কৃষিতে ৮৬০ টাকা, শিক্ষায় ৩১৭ টাকা, চিকিৎসায় ২৫৯ টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৫৭৮ টাকা ব্যয় করেন এবং সামগ্রিকভাবে এদের মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৩৩৫৫ টাকা। সিএলপি সদস্যের তুলনায় কন্ট্রোল খানা সমূহের মাসিক গড় ব্যয় কৃষিবাদে অন্য সবগুলি খাতেই কম টাকা ব্যয় হয়। এখানে দেখা যায় যে, সামগ্রিক মাসিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে কন্ট্রোল সদস্যের তুলনায় সিএলপি সদস্যদের ব্যয় ২৮.৫৬% বেশী। বিস্তারিত সারণি-৬.৮ এ উপস্থাপিত হলো।

সারণি ৬.৮ : পরিবারের ব্যয়ের খাত ও মাসিক গড় ব্যয়ের পরিমাণ

ক্র.নং	ব্যয়ের খাত	নমুনা খানা							
		সিএলপি				কন্ট্রোল			
		সংখ্যা*	%	মাসিক গড় টাকা	STD	সংখ্যা*	%	মাসিক গড় টাকা	STD
১	খাদ্য	১৬০০	১০০.০	৩,৬৮৬	১৪৩১	৮০০	১০০.০	৩,৪৩৯	১২৬৩
২	চিকিৎসা	১৫৩৪	৯৫.৯	২৮৮	২৫৮	৭৪৯	৯৩.৬	২৫৯	২১৭
৩	কৃষি	৪৪৪	২৭.৮	৭৫৬	৮৭৬	১০৭	১৩.৪	৮৬০	১৬৮৪
৪	শিক্ষা	১১০১	৬৮.৮	৩৪১	৩৪৬৭	৪৪১	৫৫.১	৩১৭	৩২১০
৫	অন্যান্য	৮৪৯	৫৩.১	৭০৪	৫০৪	৩৫৭	৪৪.৬	৫৭৮	৫৬৬
সামগ্রিক ব্যয়				৪৩১৩	২১৭৯			৩৩৫৫	২১১২

*একাধিক উত্তর

খাতওয়ারী মাসিক গড় ব্যয়ের পরিমাণ

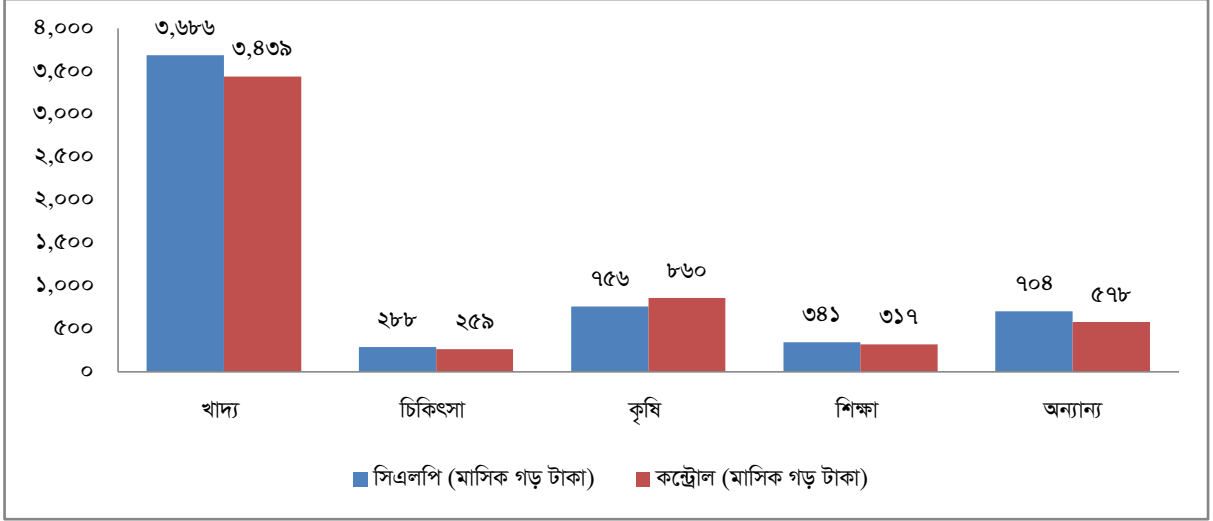

৬.৮ সমীক্ষা এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রভাব

সিএলপি থেকে প্রকল্প এলাকার রাস্তা নির্মাণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। নির্বাচিত সুবিধাভোগী সিএলপি সদস্য ও কন্ট্রোল পরিবারসমূহ থেকে রাস্তা নির্মাণের/রক্ষণাবেক্ষণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার কি উন্নতি হয়েছে সে সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয় এবং প্রাপ্ত ফলাফল সারণি-৬.৯ এ উপস্থাপন করা হলো। প্রাপ্ত ফলাফলের দেখা যায় যে, নির্বাচিত সিএলপি সদস্যগণের ৩৫.৩% রাস্তা নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছেন। শতকরা ৬৩ ভাগ মনে করেন যে রাস্তা উন্নয়নের ফলে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহনে সহজ হয়েছে ও শতকরা ৬২.৯ ভাগ মনে করেন রাস্তা উন্নয়নের ফলে ডিম/দুধ বিক্রয় সহজতর হয়েছে। রাস্তা উন্নয়ন কার্যক্রম চলাকালে কন্ট্রোল খানাসমূহের সদস্যগণও (২৩.৯%) রাস্তা উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁরা মনে করেন রাস্তা উন্নয়নের ফলে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন সহজ হয়েছে (৫৮.৪%) এবং রাস্তা উন্নয়নের ফলে ডিম/দুধ বিক্রয় সহজতর হয়েছে (৫৬.৫%)। দলীয় আলোচনা, কি ইনফরমেট ইন্টারভিউ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণও অভিমত প্রকাশ করেন যে রাস্তা উন্নয়নের ফলে এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং আরও উন্নয়নের প্রয়োজন আছে।

সারণি ৬.৯ : সমীক্ষা এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রভাব

ক্র.নং	যোগাযোগ সংক্রান্ত	খানার সংখ্যা	শতকরা হার
সিএলপি			
১	রাস্তা নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেছে	৫৬৪	৩৫.৩
২	রাস্তা উন্নয়নের ফলে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন সহজ হয়েছে	১০০৮	৬৩.০
৩	রাস্তা উন্নয়নের ফলে ডিম/দুধ বিক্রয় সহজতর হয়েছে	১০০৬	৬২.৯
কন্ট্রোল			
১	রাস্তা নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেছে	১৯১	২৩.৯
২	রাস্তা উন্নয়নের ফলে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন সহজ হয়েছে	৪৬৭	৫৮.৪
৩	রাস্তা উন্নয়নের ফলে ডিম/দুধ বিক্রয় সহজতর হয়েছে	৪৫২	৫৬.৫

৬.৯ সমীক্ষা এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের উপর সিএলপির প্রভাব

খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম। খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের জন্য সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সিএলপি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। খাদ্য নিরাপত্তা মাপার জন্য পরিবারের সদস্যগণ দিনে কতবার খাবার খান এই নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশক প্রকল্প শুরুর পূর্বে কেমন ছিল এবং বর্তমানে কেমন হয়েছে তার

তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং ফলাফল সারণি-৬.১০ এ উপস্থাপন করা হলো। তথ্য বিশ্লেষণের ফলাফলে দেখা যায় যে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে উভয় দলের পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা উন্নতি হয়েছে এবং কন্ট্রোল পরিবারের তুলনায় সিএলপি সদস্যের পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতির হার অধিক। বর্তমানে কোন দলের পরিবারের সদস্যগণ দিনে ১ বেলা খানা খান না। পূর্বে সিএলপি সদস্যগণের ৭.৬% তিন বেলা খেতে পারতেন বর্তমানে ৯৭.৩% তিন বেলা খেতে পারেন। অপরপক্ষে পূর্বে কন্ট্রোল পরিবারের সদস্যগণের ১৯.৬% দিনে তিন বেলা খেতে পারতেন, বর্তমানে ৫৩.৩% তিন বেলা খেতে পারে। সিএলপি সদস্যের ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় মাছ/মাংস/ডিম খাওয়া বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন ৯৬.৫% এবং শাক-সবজি/ফলমূল খাওয়া বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন ৯৭.০%। কন্ট্রোল খানাসমূহে উক্ত ক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিমাণ খুবই কম (৩৫.৫% ও ৪১.৯%)। বিস্তারিত সারণি-৬.১০ এ উপস্থাপিত হয়েছে। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে সিএলপি বাস্তবায়নের ফলে সদস্যগণের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।


সারণি ৬.১০ : সমীক্ষা এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের উপর সিএলপির প্রভাব

ক্র.নং	খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশক	খানার সংখ্যা	শতকরা হার
সিএলপি			
১	পূর্বে পরিবারের সদস্যগণ দিনে কত বার খেতেন		
	১ বার খাবার খেতেন	৫১	৩.২
	২ বার খাবার খেতেন	১৪২৮	৮৯.৩
	৩ বার খাবার খেতেন	১২১	৭.৬
২	বর্তমানে পরিবারের সদস্যগণ দিনে কতবার খান		
	১ বার খাবার খেতেন	০	০.০
	২ বার খাবার খেতেন	৪৩	২.৭
	৩ বার খাবার খেতেন	১৫৫৭	৯৭.৩
৩	আগের তুলনায় বর্তমানে মাছ/মাংস/ডিম বেশি খাওয়া হয়	১৫৪৪	৯৬.৫
৪	আগের তুলনায় বর্তমানে শাক-সবজি/ফলমূল অধিক খাওয়া হয়	১৫৫২	৯৭.০
কন্ট্রোল			
১	পূর্বে পরিবারের সদস্যগণ দিনে কত বার খেতেন		
	১ বার খাবার খেতেন	৬৬	৮.৩
	২ বার খাবার খেতেন	৫৭৭	৭২.১
	৩ বার খাবার খেতেন	১৫৭	১৯.৬
২	বর্তমানে পরিবারের সদস্যগণ দিনে কতবার খান		
	১ বার খাবার খেতেন	০	০.০
	২ বার খাবার খেতেন	৩৭৪	৪৬.৮
	৩ বার খাবার খেতেন	৪২৬	৫৩.৩
৩	আগের তুলনায় বর্তমানে মাছ/ মাংস /ডিম বেশি খাওয়া হয়	২৯২	৩৬.৫
৪	আগের তুলনায় বর্তমানে শাক-সবজি/ফলমূল অধিক খাওয়া হয়	৩৩৫	৪১.৯

৬.১০ নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন ব্যবহার এর উপর সিএলপির প্রভাব

এক্ষেত্রে প্রমাণিত যে, নিরাপদ পানি পান না করা ও স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ব্যবহার না করাই ডায়রিয়া জনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রধান কারণ। তাই নিরাপদ পানি পান ও স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ব্যবহারের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, সিএলপি সদস্যের ৯৩.৯% খানা সমূহে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা আছে এবং ৮১.১% খানায় স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিনের ব্যবস্থা আছে। অপর পক্ষে কন্ট্রোল খানাসমূহের ৮৩.৮০% খানাসমূহে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা আছে এবং ৫২.৯% খানায় স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ব্যবস্থা আছে। দলীয় আলোচনা, কি ইনফরমেট ইন্টারভিউ ও মার্চ পর্যায়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণও অভিমত প্রকাশ করেন যে এলাকার জনগণের নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প সহায়তার কারণেই অধিক সংখ্যক সিএলপি পরিবারে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ব্যবস্থা আছে (সারণি-৬.১১)।

নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ব্যবহার এর উপর সিএলপির প্রভাব

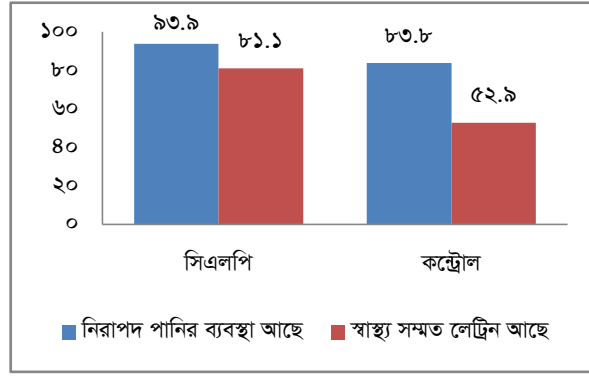

সারণি ৬.১১ : নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ব্যবহার এর উপর সিএলপির প্রভাব

ক্র.নং	নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা	সিএলপি (১৬০০)		কন্ট্রোল (৮০০)	
		সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
১	নিরাপদ পানির ব্যবস্থা আছে	১৫০৩	৯৩.৯	৬৭০	৮৩.৮
২	স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন আছে	১২৯৮	৮১.১	৪২৩	৫২.৯

৬.১১ অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

নির্বাচিত ১৬০০ সিএলপি সদস্যগণের খানা থেকে মোট ৩৮৪ (২৪%) খানার গড়ে ১.১ জন সদস্য অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে (সারণি-৬.১২)। দলীয় আলোচনা, কি ইনফরমেট ইন্টারভিউ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণও অভিমত প্রকাশ করেন যে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম এলাকার জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

সারণি ৬.১২ : অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা	সিএলপি			কন্ট্রোল		
	খানার সংখ্যা	শতকরা হার	শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (গড়)	খানার সংখ্যা	শতকরা হার	শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (গড়)
খানার সদস্য অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন	৩৮৪	২৪.০	১.১	৩১	৩.৯	১.২

৬.১২ সিএলপি সদস্যগণের অপ্রাতিষ্ঠানিক স্কুল থেকে অর্জন

সিএলপি সদস্যগণের খানা থেকে যারা অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে ২২.৪% পড়তে শিখেছে, ৮১.০% নাম লিখতে শিখেছে, ১৮.৮% হিসাব করতে শিখেছেন ও ৫.৫% পড়তে, নাম লিখতে ও হিসাব করতে শিখেছেন (সারণি-৬.১৩)।

সারণি ৬.১৩ : সিএলপি সদস্যগণের অপ্রাতিষ্ঠানিক স্কুল থেকে অর্জন

ক্র.নং	কি কি শিক্ষা অর্জন করেছেন	খানার সংখ্যা	শতকরা হার
১	পড়তে পারা	৮৬	২২.৪
২	পড়তে এবং লিখতে পারা	৩১১	৮১.০
৩	হিসাব করতে পারা	৭২	১৮.৮
৪	উপরোক্ত সবগুলিই শিখেছেন	২১	৫.৫

৬.১৩ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত

সিএলপি থেকে পাঁচ বৎসরের শিশুদের টিকা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচি কেমন ছিল তা জানার জন্য টিকা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নির্বাচিত ১৬০০ সিএলপি সদস্যগণের মধ্যে ১২৫৪ টি পরিবারে (৮৫.১%) পাঁচ বৎসরের নীচের সকল শিশুকে সব কয়টি টিকা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১২৫৪ পরিবারের মধ্যে ১১৬০ টি পরিবারে (৯২.৫%) টিকার কার্ড সম্পূর্ণ আছে (সারণি-৬.১৪)। দলীয় আলোচনা, কি ইনফরমেট ইন্টারভিউ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণও অভিমত প্রকাশ করেন যে এলাকার জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৬.১৪ : স্বাস্থ্য সম্পর্কিত

ক্র.নং	স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত নির্দেশক	খানার সংখ্যা	শতকরা হার
১	পাঁচ বৎসরের নীচের সকল শিশুকে সবগুলো টিকা দেওয়া হয়েছে	১২৫৪	৭৮.৩৭
২	টিকার কার্ড সম্পূর্ণ দেখতে পেয়েছে	১১৬০	৯২.৫
৩	টিকার কার্ড অসম্পূর্ণ দেখতে পেয়েছে	৯৪	৭.৫

৬.১৪ খাওয়ার সেলাইনের ব্যবহার

চর অঞ্চলে ডাইরিয়ার প্রবণতা খুবই বেশী। তাই সরকার এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা ডাইরিয়া হলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে খাওয়ার সেলাইন খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়ে থাকে। সিএলপি'র আওতায় এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। খাওয়ার সেলাইন এর ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, নির্বাচিত সিএলপি সদস্যের (৯১.০%) পরিবারে ডাইরিয়া হলে খাওয়ার সেলাইন ব্যবহার করেন। অপর দিকে নির্বাচিত কন্ট্রোল পরিবারে ডাইরিয়া হলে ৮১% খাওয়ার সেলাইন ব্যবহার করেন (সারণি-৬.১৫)।

সারণি-৬.১৫ : খাওয়ার সেলাইনের ব্যবহার

ক্র.নং	সেলাইন ব্যবহার	খানার সংখ্যা	শতকরা হার
সিএলপি			
১	পরিবারের কারও ডাইরিয়া হলে খাওয়ার সেলাইন ব্যবহার করেন	১৪৫৬	৯১.০
২	পরিবারের কারও ডাইরিয়া হলে খাওয়ার সেলাইন ব্যবহার করেন না	১৪৪	৯.০
কন্ট্রোল			
১	পরিবারের কারও ডাইরিয়া হলে খাওয়ার সেলাইন ব্যবহার করেন	৬৪৪	৮১.০
২	পরিবারের কারও ডাইরিয়া হলে খাওয়ার সেলাইন ব্যবহার করেন না	১৫৬	১৯.০

৬.১৫ খাবার সেলাইনের উৎস

সে সকল পরিবার খাওয়ার সেলাইন ব্যবহার করেছেন তাদের নিকট হতে খাওয়ার সেলাইনের উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বর্তমানে ৩৩.০% সিএলপি সদস্য এবং ৩৯.০% কন্ট্রোল সদস্য বাজার থেকে সেলাইন কিনে খাওয়ান অপর দিকে ৬৯.০% সিএলপি সদস্য এবং ৬১.০% কন্ট্রোল সদস্যরা সেলাইন নিজে তৈরি করে খাওয়ান (সারণি ৬.১৬)।

সারণি ৬.১৬ : খাবার সেলাইনের উৎস

ক্র.নং	ব্যবস্থা গ্রহণ এর ধরন	বর্তমানে	
		খানার সংখ্যা	শতকরা হার
সিএলপি			
১	নিজে তৈরি করে খাওয়ান	৯৭৫	৬৭.০
২	বাজার থেকে কিনে খাওয়ান	৪৮১	৩৩.০
	সর্বমোট	১৪৫৬	১০০
কন্ট্রোল			
১	নিজে তৈরি করে খাওয়ান	৩৯৫	৬১.০
২	বাজার থেকে কিনে খাওয়ান	২৪৯	৩৯.০
	সর্বমোট	৬৪৪	১০০


৬.১৬ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের স্থান

সিএলপি সদস্যগণের প্রকল্পে অংশগ্রহণের পূর্বের তুলনায় বর্তমানে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের স্থানের বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশি সংখ্যক সিএলপি সদস্য স্বাস্থ্য কর্মী (৪২.৫%) ও কমিউনিটি ক্লিনিকে (২৬.৭%) স্বাস্থ্য সেবার জন্য যান। অপর পক্ষে কন্ট্রোল গ্রুপের পরিবারের সদস্যগণও স্বাস্থ্য কর্মী (৩৬.৭%) ও কমিউনিটি ক্লিনিকে (২৭.৫%) যান কিন্তু তুলনামূলকভাবে সিএলপি সদস্যগণের চেয়ে কম (সারণি-৬.১৭)।

সারণি ৬.১৭ : স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের স্থান

ক্র.নং	চিকিৎসার স্থান	পূর্বে		বর্তমানে	
		খানার সংখ্যা	শতকরা হার	খানার সংখ্যা	শতকরা হার
সিএলপি					
১	স্বাস্থ্য কর্মী	১৮১	১৭.৭	৬৬১	৪২.৫
২	কমিউনিটি ক্লিনিক	৩৪	৩.৩	৪১৬	২৬.৭
৩	Union Health & Family Welfare Center	১৩৮	১৩.৫	৩৬৮	২৩.৬
৪	এনজিও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে	১৪	১.৪	১৪৮	৯.৫
৫	উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে	৪৫৯	৪৪.৯	৮৭৮	৫৬.৪
কন্ট্রোল					
১	স্বাস্থ্য কর্মী	১০৯	২১.৪	২৮৩	৩৬.৭
২	কমিউনিটি ক্লিনিক	১৩	২.৬	২১২	২৭.৫
৩	Union Health & Family Welfare Center	৬৭	১৩.২	১৮৭	২৪.২
৪	এনজিও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে	৭	১.৪	৭৯	১০.২
৫	উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে	২২৮	৪৪.৮	৪০৮	৫২.৮


উত্তরদাতাদের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের স্থান (%)

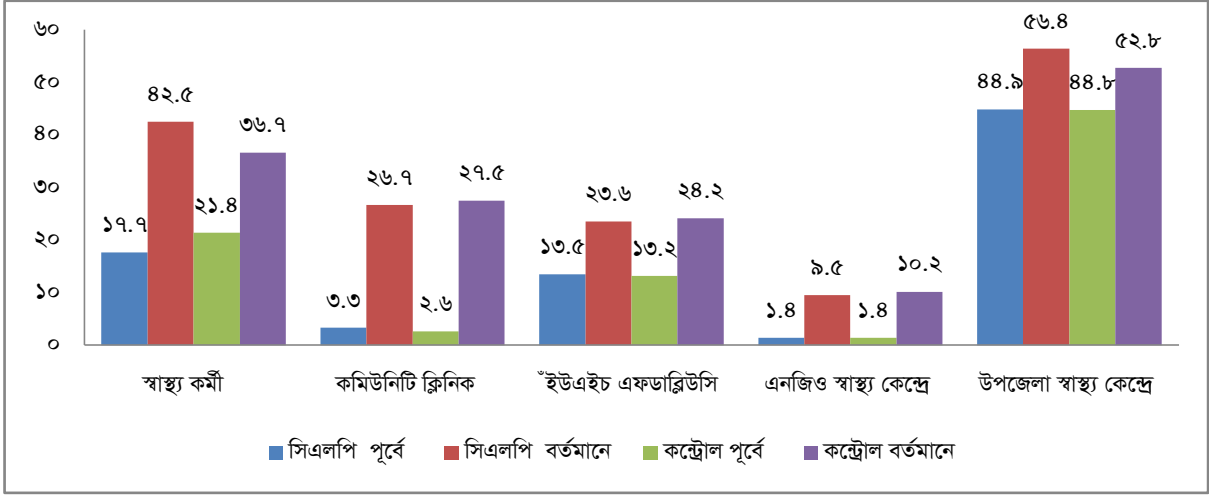

৬.১৭ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কিত

নির্বাচিত পরিবারসমূহ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কিনা এবং যদি করে তবে কি পদ্ধতি ব্যবহার করে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে নির্বাচিত সিএলপি খানাসমূহের ৫৩% পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং ৪৭% পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। অপর পক্ষে কন্ট্রোল খানার ৪৩% পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং ৫৭% পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। উভয় ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার জাতীয় গড় হারের (৭৫.৫১%) চেয়ে কম (বিবিএস, ২০১১)। পরিবার পরিকল্পনার কি পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সিএলপি সদস্যগণের মধ্যে শতকরা ৫১% বড়ি, ৬১% কনডম, ১৬% ইনজেকশন ব্যবহার করেছেন ও ৪% লাইগেশন গ্রহণ করেছেন। অপর পক্ষে কন্ট্রোল খানা শতকরা ৭০% বড়ি, ৬৯% কনডম ১৪% ইনজেকশন ব্যবহার করেছেন ও ৩% লাইগেশন গ্রহণ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য থাকে যে উভয় দলেই একের অধিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন (সারণি-৬.১৮)।

পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কিত

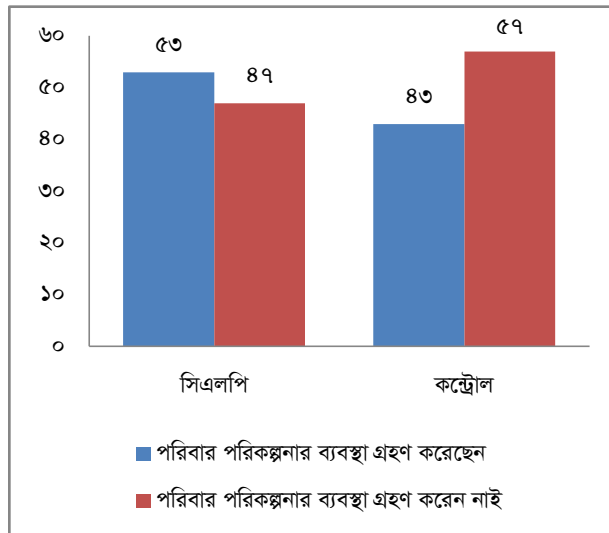

সারণি ৬.১৮ : পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কিত

ক্র.নং	পরিবার পরিকল্পনা	সিএলপি		কন্ট্রোল	
		সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
১	পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন	৮৪৫	৫৩.০	২৪০	৪৩.০
২	পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই	৭৫৫	৪৭.০	৪৬০	৫৭.০
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ *		সংখ্যা *	শতকরা হার	সংখ্যা *	শতকরা হার
১	বড়ি	৪৩৫	৫১	২৩৯	৭০
২	লাইগেশন	৩৫	৪	১১	৩
৩	ইনজেকশন	১৩৫	১৬	৪৭	১৪
৪	কনডম	৫১২	৬১	২৩৫	৬৯

* এক অথবা একের অধিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

৬.১৮ সামাজিক সচেতনতা

সিএলপি থেকে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সমাজ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা, র্যালি ইত্যাদি করা হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডসমূহের ফলাফল কি তা জানার জন্য সরকার নির্ধারিত মেয়েদের বিয়ের বয়স জানতে চাওয়া হয়। নির্বাচিত সিএলপি সদস্যগণের ৯৬.৮% ও কন্ট্রোল খানা সমূহের ৭৮.১৫% সরকার নির্ধারিত মেয়ের বিয়ের বয়স ১৮ জানেন। বেশী সংখ্যক সিএলপি সদস্যের সঠিক তথ্য জানার কারণ তাঁরা এসব বিষয়ে প্রকল্পের বিভিন্ন মিটিং বা রেলী থেকে জানতে পেরেছেন (সারণি ৬.১৯)। দলীয় আলোচনা, কি ইনফরমেট ইন্টারভিউ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণও অভিমত প্রকাশ করেন যে সিএলপি কর্তৃক আয়োজিত সমাজ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা, র্যালি ইত্যাদি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।

সারণি ৬.১৯ : সামাজিক সচেতনতা

মেয়ের বিয়ের বয়স	সিএলপি		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
১৮ বছর	১৫৪৯	৯৬.৮	৭২৫	৯০.৬

৬.১৯ বাল্য বিবাহের কুফল

বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে তথ্য শুধুমাত্র সিএলপি সদস্যদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, আগের তুলনায় অধিক সংখ্যক সিএলপি সদস্য উত্তরদাতা বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে অবগত। তাদের মতে বাল্য বিবাহের প্রধান কুফলগুলো হলো মাতৃ মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি ও শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি (সারণি-৬.২০)। দলীয় আলোচনা, কি ইনফরমেট ইন্টারভিউ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণও অভিমত প্রকাশ করেন যে সিএলপি কর্তৃক আয়োজিত সমাজ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা, র্যালি ইত্যাদি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।

সারণি ৬.২০ : বাল্য বিবাহের কুফল (সিএলপি)

ক্র.নং	কুফল সমূহ	পূর্বে		পরে	
		খানার সংখ্যা	শতকরা হার	খানার সংখ্যা	শতকরা হার
১	মাতৃ মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি	৩৯৪	২৪.৬	১৩৫৭	৮৪.৮১
২	শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি	২৮৮	১৮.০	১২৫৭	৭৮.৫৬
৩	শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস সমস্যার সম্ভাবনা বেশি	২৬	১.২৫	৬২৮	৩৯.২৫


৬.২০ পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

নির্বাচিত সিএলপি সদস্য ও কন্ট্রোল পরিবারের উত্তরদাতা সবাই মহিলা। তাই নারী ক্ষমতায়নের নির্দেশিকা হিসাবে মহিলাদের পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, সিএলপি সদস্যগণের ৭৫% এবং কন্ট্রোল খানা সমূহের ৫৩% পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ গ্রহণ করেন (সারণি-৬.২১)। সিএলপি সদস্যগণের অধিক হারে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের কারণ হিসাবে বলা যায় যে, তারা প্রকল্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে।

সারণি ৬.২১ : মহিলাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ক্র.নং	পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ	সিএলপি		কন্ট্রোল	
		সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
১	মহিলাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে	১২০৩	৭৫.০	৪২৫	৫৩.০

মহিলাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

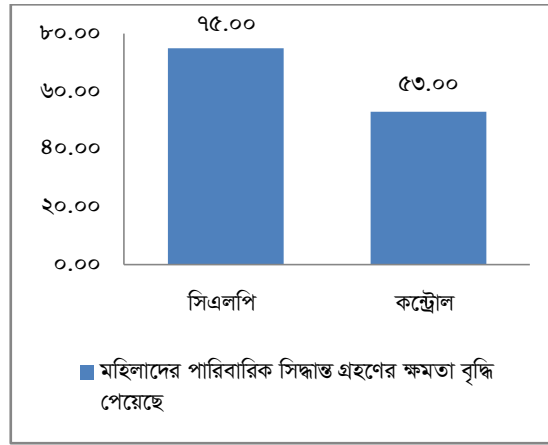

৬.২১ পারিবারিক কলহ/ নির্যাতন সংক্রান্ত

গ্রাম বাংলায় মহিলারা সাধারণত স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে থাকে। নির্বাচিত মহিলা বা সরকার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করে স্বামী নির্যাতন হ্রাস করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সিএলপি'তে ও এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পদক্ষেপগুলির মধ্যে হল রেলি/মিটিং/প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। গত ১ বৎসরে স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছেন এমন তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সিএলপি পরিবারে স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হওয়া শতকরা হার ৩৩.৪%, কন্ট্রোল খানাসমূহে (৩৫.৩%)। বিস্তারিত সারণি-৬.২২ এ প্রদান করা হলো।

সারণি ৬.২২ : পারিবারিক কলহ/ নির্যাতন সংক্রান্ত

ক্র.নং	স্বামী নির্যাতন	সিএলপি		কন্ট্রোল	
		সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
১	স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছেন	৫৩৫	৩৩.৪	২৮২	৩৫.৩

৬.২২ নির্যাতিত হওয়ার কারণসমূহ

নির্বাচিত সিএলপি সদস্য ও কন্ট্রোল উত্তরদাতাগণ স্বামী নির্যাতনের প্রধান কারণ হিসেবে যৌতুক, আর্থিক অনটন, স্বামীর ব্যক্তিগত বদ অভ্যাস (মদ খাওয়া/জুয়া খেলা) ইত্যাদি উল্লেখ করেন (সারণি-৬.২৩)।


সারণি ৬.২৩ : নির্যাতিত হওয়ার কারণসমূহ

ক্র.নং	কারণ সমূহ	সিএলপি		কন্ট্রোল	
		খানার সংখ্যা	শতকরা হার	খানার সংখ্যা	শতকরা হার
১	যৌতুক	২৫	৭.৪	৩০	১১
২	আর্থিক অনটন	১৮০	৫৪	১৮৭	৬৬
৩	স্বামীর ব্যক্তিগত বদ অভ্যাস (মদ খাওয়া/জুয়া খেলা)	১৩০	৩৯	৬৫	২৩

৬.২৩ দারিদ্রতার উপর সিএলপির প্রভাব

দারিদ্রতার উপর সিএলপি'র প্রভাব সম্পর্কে ১৬০০ নির্বাচিত সুবিধাভোগী উত্তরদাতার প্রদত্ত মতামতকে গড় করলে দেখা যায় যে, শতকরা ৫২.৬ ভাগ জনগোষ্ঠীর দারিদ্রতা হ্রাস পেয়েছে। খাদ্য গ্রহণের পরিমাপ বা অন্য কোন মাপকাঠি ব্যবহার করে উক্ত তথ্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। শতকরা ৮৯.৬ ভাগ মনে করেন তাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার গতি উর্ধ্বমুখী (সারণি-৬.২৪)। সিএলপি'র বিভিন্ন কর্মকান্ডের বাস্তবায়নের ফলেই এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে বলে তাহারা অভিমত ব্যক্ত করেন। দলীয় আলোচনা, কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণও অভিমত প্রকাশ করেন যে সিএলপি অত্র এলাকায় দারিদ্রতায় হ্রাস করণের সহায়তা করেছে।

দারিদ্রতার উপর সিএলপির প্রভাব

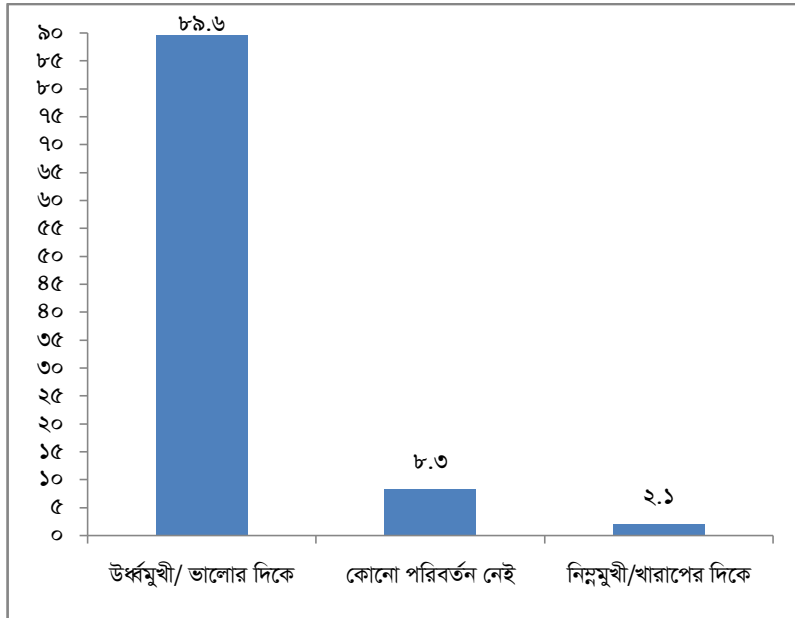

সারণি ৬.২৪ : দারিদ্রতার উপর সিএলপির প্রভাব

ক্র.নং	প্রভাব	খানার সংখ্যা	শতকরা হার	শতকরা কত জন
১	সিএলপি প্রকল্পটি চালু হওয়ার ফলে এলাকায় দারিদ্রতা কমেছে	১৬০০	১০০	-
২	যদি কমে তবে শতকরা কত পরিবারের দারিদ্রতা কমেছে	-	-	৫২.৬*
৩	বর্তমানে আপনার আর্থ সামাজিক অবস্থার গতি			
৩.১	উর্ধ্বমুখী/ভালোর দিকে	১৪৩৩	৮৯.৬	-

* এটা উত্তরদাতাদের নিজস্ব মতামত, কারণ তারা অতীব দরিদ্র, সিএলপি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তরাস্থিত করেছে। তবে এ তথ্যকে পরিসংখ্যানিকভাবে ব্যাখ্যা করা সহজ নয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রকল্পের সবলদিক ও দুর্বলদিকসমূহ (SWOT analysis)

৭.১ ভূমিকা

SWOT বিশ্লেষণ হচ্ছে একটি সুসংগঠিত পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি প্রকল্পের সফলতা ও দুর্বলতাসমূহ এবং প্রকল্পের সুযোগসমূহ এবং একই সাথে ঝুঁকি সমূহ নির্ণয়/মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এফজিডি, সিএলপি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা থেকে KII, মাঠ পর্যায়ের সুবিধাভোগীদের থেকে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা হতে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে SWOT analysis করা হয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

৭.২ সবলদিকসমূহ (Strengths)

সিএলপি প্রকল্পের বিভিন্ন সবলদিকসমূহ-

- সিএলপি কর্মসূচিসমূহ দরিদ্র চরবাসীদের জীবন মানউন্নয়নে চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- প্রকল্প চরবাসীদের প্রয়োজন মাফিক সহায়তা দিয়েছে (যেমন-গাভী/গরু কেনার জন্য অর্থ সাহায্য, বন্যা থেকে রক্ষার জন্য বসতবাড়ি ভিটি উঁচুকরণ, বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ)।
- মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ, এফজিডি, কেআইআই ও মাঠ পর্যায়ের ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন যে, প্রকল্প এলাকায় শতকরা ৫৩ ভাগ চরম দারিদ্রতা হ্রাস পেয়েছে, যা প্রকল্পের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সবলদিক।
- প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ভালো ছিল।
- প্রকল্প এলাকায় জনগণ খুব সক্রিয় ছিল।
- সুবিধাভোগীগণের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমেছে (বসত বাড়ির ভিটি উঁচুকরণের ফলে বন্যা থেকে রক্ষা পেয়েছে)।
- সুবিধাভোগী সদস্যদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রকল্পের এ্যাসেট ট্রান্সফার কম্পোনেন্ট এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে)।
- সিএলপি সুবিধাভোগী সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে উঠেছে (৪৭%)।
- সুবিধাভোগী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে, ছেলে-মেয়েরা বর্তমানে স্কুলে যায় এবং স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত হয়েছে।

৭.৩ দুর্বলদিকসমূহ (Weaknesses)

প্রকল্পের দুর্বলদিকসমূহ-

- কেআইআই, এফজিডি, স্থানীয় পর্যায়ে ওয়ার্কসপ আলোচনা বিশ্লেষণে দেখা যায় এলাকায় চাহিদার তুলনায় খুবই কম সংখ্যক পরিবার প্রকল্প সুবিধা পেয়েছে।
- এফজিডি, স্থানীয় পর্যায়ে ওয়ার্কসপের প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় একই সল্লিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী পরিবার প্রকল্প সুবিধা থেকে বঞ্চিত যা মাঠ জরিপ প্রাপ্ত তথ্যের সংগে সংগতিপূর্ণ।
- প্রকল্প শেষে সঠিক মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকায় সুবিধাভোগীরা সমস্যায় পড়ে।

- প্রকল্প চলাকালীন সকল ইউনিটের কাজ সঠিকভাবে পরিকল্পনা না করে একই সাথে সকল ইউনিটের কাজ শুরু হওয়ায় সদস্যদের উপর চাপ বেশী পড়ে।
- প্রকল্পের বাস্তবায়নে প্রথম দিকে অধিক সময় নষ্ট হয়েছে ফলে সময়ের স্বল্পতা দেখা দিয়েছিল।
- জিও-এনজিও সমন্বয়ের কিছুটা অভাব ছিল।
- সূষ্ঠ তদারকির অভাব ছিল।
- নৌকা ও মাছ ধরার জাল ত্রয়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন ছিল।
- কিছু উপকারভোগী নদীভাঙ্গনের ফলে অন্যত্র চলে গেছে।
- ভূমিহীন কৃষকদেরও ভূমি প্রদান করা উচিত ছিল ও
- নদীভাঙ্গনের রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

৭.৪ সুযোগসমূহ (Opportunity)

- স্থানীয় জনগণ উন্নয়ন কার্যে অংশগ্রহণে আগ্রহী ছিল।
- এলাকার ব্যাপক উন্নয়নের সুযোগ ছিল।

৭.৫ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ (Threat)

- স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ।
- ঘন ঘন নদী ভাঙ্গন ও বন্যা।
- হঠাৎ বন্যা।
- স্থানীয় পর্যায়ের দক্ষ কর্মীর অভাব।
- এলাকার জনগণ হতো দরিদ্র।
- স্থানীয় জনগণের কারিগরী দক্ষতার অভাব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ সুপারিশমালা ও উপসংহার

সুপারিশ

- ১) এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে এ ধরনের আরও প্রকল্প দেশের বিভিন্ন স্থানে পুনরাবৃত্তি করার আগে আরও নিবিড়ভাবে গবেষণা এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন। তাছাড়া প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্যে, রিপোর্ট এবং উপদেষ্টাদের কাজ পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।
- ২) বরাদ্দকৃত সমস্ত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করার জন্য প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগণকে সজাগ থাকতে হবে। বরাদ্দকৃত অর্থ পুরোপুরি ব্যয় করতে পারলে এলাকার জনগণ আরও বেশি উপকৃত হতে পারতো এবং সঠিকভাবে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হতো।
- ৩) ভবিষ্যতে একই প্রকল্পের ত্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতাও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের ত্রয় নীতিমালা মেনে চলা উচিত।
- ৪) ডিপিপি অনুযায়ী সিএলপিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সেবা প্রদান কার্যক্রমে চালু ছিল। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোন ধরনের অংশীদারিত্ব ছিল না। তাই ভবিষ্যতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সুনিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।
- ৫) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিয়মিত আয়ের পথ সুগম করার লক্ষ্যে পরবর্তী প্রকল্পে নানাবিধ আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা রাখতে হবে ও সংশ্লিষ্ট কাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ৬) প্রকল্প এলাকায় সুবিধাভোগীদের উৎপাদিত পণ্য যাতে সহজতরভাবে বাজারজাতকরণ করতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কেননা উৎপাদিত পণ্য সঠিকভাবে বাজারজাতকরণ করতে না পারলে পণ্যের সঠিক মূল্য প্রাপ্তি থেকে উৎপাদনকারীরা বঞ্চিত হন। ফলে প্রকল্পের দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য অর্জন বাধাগ্রস্ত হয়।
- ৭) দূরবর্তী ও দূর্গম চরাঞ্চলে মাঠকর্মীদের সঠিক ও সফলভাবে কাজ করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষের যথাযথ নজর রাখা অত্যন্ত জরুরী। দূরবর্তী চরের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে মটর সাইকেল, ইঞ্জিনবোট সুবিধা এমনকি প্রয়োজনে দূর্গম চরাঞ্চলে ছোট ছোট ইউনিট অফিস খোলা প্রয়োজন যাতে কর্মীরা নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে এবং যাতায়াতে অহেতুক সময় নষ্ট না হয়।
- ৮) প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য ও সুবিধাভোগীরা যাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সুবিধা পেয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণ চালু রাখতে হবে।

উপসংহার

- ১) মার্চ পর্যায়ে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তার সবগুলোই দারিদ্রপীড়িত চর এলাকার অধিবাসীদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল।

- ২) প্রকল্প নির্দিষ্ট এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।
- ৩) সর্বোপরি উক্ত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত এলাকাবাসীর চরম দারিদ্রের সংখ্যা ৫৩% কমিয়ে এনেছে।
- ৪) মাঠ জরিপ, কেআইআই, এফজিডি, স্থানীয় পর্যায়ে ওয়ার্কসপ আলোচনা বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রকল্পের ফল ধরে রাখতে ও আরও এগিয়ে নিতে এ ধরনের আরও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।
- ৫) বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ প্রকল্পের জন্য ৯০৩.৯৪ লক্ষ টাকার সংস্থান রেখেছিল। কিন্তু প্রকল্প শেষে দেখা যায় যে উক্ত বরাদ্দের মাত্র ৫১% খরচ হয়েছে। সঠিকভাবে প্রকল্পের টাকা ব্যবহার করতে পারলে চর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী আরও উপকৃত হতে পারতো।
- ৬) দেশীয় এবং বিদেশী পরামর্শকগণের জন্য মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৫.৭০% ব্যয় করা হয়েছে। উক্ত পরামর্শকগণ প্রকল্প বাস্তবায়নে কী ভূমিকা পালন করেছেন সে বিষয়ে এই মূল্যায়নের প্রতিবেদন পেশ করার পরিকল্পনা ছিল কিন্তু কে কে প্রকল্প বাস্তবায়নে কী কী কাজ করেছেন সে বিষয়ে কোন তথ্য সংগ্রহ করা যায় নি। তাই ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্পের বাস্তবায়ন ইউনিট সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।
- ৭) প্রকল্পের শুরুতে বেজলাইন সার্ভে করা হয়েছিল। কিন্তু বেজলাইন তথ্য ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় নাই। বেজলাইনের তথ্য পাওয়া গেলে প্রকল্পের সামগ্রিক সবল ও দুর্বলদিকগুলো আরও স্পষ্ট হতো।

References

1. Statistical Yearbook Bangladesh 2013, Statistics and Information Division, Ministry of Planning, Bangladesh Bureau of Statistics.
2. Report of the Household Income & Expenditure Survey 2011; Statistics Division, Ministry of Planning, Bangladesh Bureau of Statistics.
3. Project Completion Report (PCR) on Chars Livelihoods Programme (CLP), Rural Development and Cooperatives Division, Local Government, Rural Development and Cooperatives Ministry.
4. Revised Development Project Proposal (RDPP) on Char Livelihoods Programme (CLP) 1st Revision; Rural Development and Cooperatives Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives; Government of the People's Republic of Bangladesh, November 2007.
5. Qualitative Participatory Survey Report 2006, PRA Promoters' society-Bangladesh, May 2006.

পরিশিষ্ট-১

পরিশিষ্ট-১ : সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জিওবি অংশের খাতওয়ারী আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

ইকোনমিক কোড	খাত	ভৌত একক	টার্গেট		প্রকৃত অগ্রগতি		আর্থিক উন্নয়ন/ঘটতি (+/-) (লক্ষ টাকা)
			আর্থিক(লক্ষ টাকা)	ভৌত	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত	
ক) রেভিনিউ খাত							
	জনবল						
৪৫০০	কর্মকর্তাদের বেতন	পার্সন	৪৭.১৯	৮	২৬.০৭		২১.১২
৪৬০০	কর্মচারীদের বেতন	পার্সন	২৬৯.৬৩	৯১	২০৭.০১		৬২.৬২
৪৭০০	ভাতাদি	থোক	২১৫.২৭		৭৭.৩৭		১৩৭.৯
	মোট (জনবল)		৫৩২.০৯		৩১০.৪৫		২২১.৬৪
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা						
৪৮০১	টিএ	পার্সন	২১.০০	৯৯	২৩.৩৩		-২.৩৩
৪৮০২	বদলীজনিত টিএ	থোক	১.৫৬		০.৫৭		০.৯৯
৪৮০৩	আয়কর	থোক	০.৮৪		১.২৮		-০.৪৪
৪৮০৫	ওভার টাইম	পার্সন	২.২২		২.২২		০.০০
৪৮০৬	অফিস ভাড়া	সংখ্যা	৩.৯৩	২৮	২.৮৩		১.১০
৪৮১৫	পোস্টেজ	সংখ্যা	০.২১		০.১৩		০.০৮
৪৮১৬	টেলিফোন,টেলিগ্রাম,টেলিপ্রিন্টার	সংখ্যা	৬.৯৮	৭	২.৩৪		৪.৬৪
৪৮১৭	ফ্যাক্স	সংখ্যা	০.৬০	১	০.০০		০.৬০
৪৮২১	বিদ্যুৎ বিল	সংখ্যা	১.৯৫		০.৬১		১.৩৪
৪৮২২	ফুয়েল ও গ্যাস	সংখ্যা	১১.৫০	১	৭.২৭		৪.২৩
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	সংখ্যা	৬.০০		৫.১৩		০.৮৭
৪৮২৪	বীমা	সংখ্যা	৪.২০	১	২.৮৭		১.৩৩
৪৮২৭	প্রিন্টিং	সংখ্যা	০.৩০		০.০০		০.৩০
৪৮২৮	স্টেশনারিজ	সংখ্যা	১৪.১০		৯.৩১		৪.৭৯
৪৮৩১	বইপত্র ও জার্নাল	সংখ্যা	০.০০		০.০০		০.০০
৪৮৩৩	যোগাযোগ/মিডিয়া	সংখ্যা	১.৮৫		০.৩৫		১.৫০
৪৮৩৬	ইউনিফর্ম	পার্সন	০.৬১	৩২	০.২১		০.৪০
৪৮৪২	চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ	পার্সন	৬.০০	৯১	০.০০		৬.০০
৪৮৪৫	আপ্যায়ন	সংখ্যা	২.০৪		০.৮০		১.২৪
৪৮৪৬	পরিবহন	সংখ্যা	১.৫৮		০.৬৩		০.৯৫
৪৮৮৩	সম্মানী	পার্সন	০.৪৩		০.০৩		০.৪০
৪৮৮৮	কমপিউটার আনুষঙ্গিক উপকরণ	সংখ্যা	৬.৫০	৩৮	৩.৩৭		৩.১৩
৪৮৯৯	অন্যান্য খরচ	সংখ্যা	২৪.১৩		৯.২১		১৪.৯২
	মোট (সরবরাহ ও সেবা)		১১৮.৫৩		৭২.৪৯		৪৬.০৪
৪৯০০	মেরামত,রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন						
৪৯০১	যানবাহন/ মোটর গাড়ি	সংখ্যা	৫.৬৫		৪.৫০		১.১৫
৪৯০৬	আসবাবপত্র	সংখ্যা	০.৯৫		০.০০		০.৯৫
৪৯১১	কমপিটার ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	১০.৫০		৬.৯১		৩.৫৯
	মোট (মেরামত,রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন)		১৭.১০		১১.৪১		৫.৬৯
	মোট (রেভিনিউ খাত)		৬৬৭.৭২		৩৯৪.৩৫		২৭৩.৩৭
খ) ক্যাপিটাল খাত							
৬৮০০	সম্পদ অর্জন						
৬৮০৭	যানবাহন-জীপগাড়ি	সংখ্যা	২৩.৮৬	১	২৩.৮৬		০.০০
৬৮১২	ক্যামেরা	সংখ্যা	০.৪৫	১	০.০০		০.৪৫
৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	১০.৭৫	৬	১.৭৫		৯.০০
৬৮১৫	কমপিউটার ও আনুষঙ্গিক উপকরণ	সংখ্যা	৩২.৯৬	৩২	২৬.০০		৬.৯৬
৬৮১৯	অফিস ইকুইপমেন্ট এবং কনজিউমেবলস	সংখ্যা	৩.৫০		০.০০		৩.৫০
৬৮২১	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৩.৯৪		১০.৮৩		৩.১১
৬৮২৩	টেলিকমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	০.৭৬		০.৬১		০.১৫
	মোট (সম্পদ অর্জন)		৮৬.২২		৬৩.০৫		২৩.১৭
৭৯০০-৭৯৭৯	সিডি/ভ্যাট	সংখ্যা	১৫০.০০		০.০০		১৫০.০০
	মোট (ক্যাপিটাল খাত)		২৩৬.২২		৬৩.০৫		১৭৩.১৭
	সর্বমোট (রেভিনিউ+ক্যাপিটাল)		৯০৩.৯৪		৪৫৭.৪০		৪৪৬.৫৪

তথ্যসূত্রঃ প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট, সিএলপি-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এলজিআরডিসি মন্ত্রনালয়

পরিশিষ্ট-২

পরিশিষ্ট-২ : সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প সাহায্য অংশের (ডিএফআইডি) খাতওয়ারী আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

খাত	উপখাত	ভৌত একক	টার্গেট		প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত	
১। জনবল	ক) কর্মকর্তা	সংখ্যা	-	৮	-	-	২০০৮-০৯ সাল হতে দেশী পরামর্শক খাত হতে মেটরিং সাপোর্ট স্থানীয় কর্মচারী খাতে বদলী করা হয়েছে।
	খ) কর্মচারী	সংখ্যা	৬৭৯.২৮	১২২	১৫৪০.০০	৯৮	
	মোট	সংখ্যা	৬৭৯.২৮	১৩০	১৫৪০.০০	৯৮	
২। ভৌত নির্মাণ	প্রযোজ্য নয়						
৩। যানবাহন	ক) কার, জীপ, মাইক্রোবাস, পিক-আপ	সংখ্যা	৩৯০.০৮	২০	২৮৫.৪০		
	খ) মোটর সাইকেল	সংখ্যা	৭৫.৭২	৯০	১১.৬৭		
	গ) নৌকা/স্পিড-বোট	সংখ্যা	১২.০৩	২	১৩.১৭		
	মোট	সংখ্যা	৪৭৭.৮৩		৩১০.২৪		
৪। অফিস-ইকুইপমেন্ট, ফার্নিচার, কম্পিউটার		থোক	৪০৭.৮২		৬১০.০০		
৫। আনুষঙ্গিক	(স্টেশনারী, ডাকযোগাযোগ, টেলিফোন, ইনটারনেট, বিদ্যুৎ ইত্যাদি)	থোক	৩৪৭.৪৭		৫৬৯.৩২		
৬। জমি অধিগ্রহণ বা লিজ	প্রযোজ্য নয়						
৭। পরামর্শক	ক) বিদেশী	সংখ্যা	৭৫৭৫.৫২	১৭	৬৭৮৮.৭০		২০০৮-০৯ সাল হতে দেশী পরামর্শক খাত হতে মেটরিং সাপোর্ট স্থানীয় কর্মচারী খাতে বদলী করা হয়েছে।
	খ) দেশী	সংখ্যা	৩১৩৪.৫৬	৬৫	২৪১০.০০		
	মোট		১০৭১০.০৮		৯১৯৮.৭০		
৮। কর্মসূচি	ক) উপজেলা ও ইউনিয়ন শক্তিশালীকরণ	থোক	৬৫৬২.৭৪		৩১৬৭.২১		
	খ) যোগাযোগ ও মিডিয়া	থোক	৮৬৩.৭৯		৫০০.১৭		
	গ) প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা	থোক	৬২০.৪১		৪১৫.৬৮		
	ঘ) কমিটি	থোক	৮.২৯		১০.৫৬		
	ঙ) যানবাহন ও ভ্রমণ খরচ	থোক	৩.৬২		৩.৬০		
	চ) সামর্থ্য ও সচেতনতা উন্নয়ন	থোক	১৫০৮.২১		৩৬৪.৮৭		
	ছ) গবেষণা/জরিপ/মনিটরিং/মূল্যায়ন	থোক	২৬২০.৫৭		২৪৬৫.৬৬		
	জ) প্রশাসন ও পরিচালন খরচ	থোক	২৩৪২.৪৬		১৪০৫.৯৩		
	ঝ) জীবিকা ও এন্টারপ্রাইজ উন্নয়ন	থোক	১৯৯৬১.৬৬		১৮৬৪০.৪১		
	ঞ) এনজিও চুক্তি খরচ	থোক	৪৯৩৮.৮৯		৪৭০১.৪১		
	ট) সিডি/ভ্যাট	থোক	০		০		
মোট			৩৯৪৩০.৬৪		৩১৬৭৫.৫০		
৯। অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যয়	ক) যোগাযোগ বিনিয়োগ	থোক	১২.২০		৪.৯৫		
	খ) পরিবহন বিনিয়োগ	থোক	২.৭৮		২.৮৮		
	গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ	থোক	৪৬০৬.৮৬		৫০১৯.৩৫		
	ঘ) সুপেয় পানি ও সেনিটেশন	থোক	২০৮৯.৬৯		২২৮৯.৩২		
	ঙ) পরিবেশ	থোক	১.৪৫		২.০০		
	মোট		৬৭১২.৯৮		৭৩১৮.৫০		
১০। বিবিধ/ব্লক বরাদ্দ	ক) সংবেদনশীল তহবিল (কর্মসূচি মোতাবেক)	থোক	৭০৭৯.৫১		৬৯০৬.০০		
	খ) সংবেদনশীল তহবিল (রিভিউ ও পরিচালন)	থোক					
	গ) ব্লক বরাদ্দ	থোক					
	ঘ) বিবিধ	থোক					
	মোট		৭০৭৯.৫১		৬৯০৬.০০		
সর্বমোট			৬৫৮৪৫.৬১		৫৮১২৮.২৬		

তথ্যসূত্র : প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট, সিএলপি-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এলজিআরডিসি মন্ত্রণালয়

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) (প্রথম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

খানা জরিপ প্রশ্নমালা (উপকারভোগী)

(প্রজেক্ট এরিয়ার জন্য: অবকাঠামো কার্যক্রম, কাজের জন্য নগদ অর্থ, সম্পদ হস্তান্তর,
পশু সম্পদ, সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি)।

ভূমিকা: আসসালামু আলাইকুম। আমরা ক্রান্তি এসোসিয়েট লি: (গবেষণা প্রতিষ্ঠান) এবং আইএমইডি (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়) থেকে মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন জরিপের উদ্দেশ্যে এসেছি। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০০৩-২০১১ ইং সালে চর জীবিকায়ন কর্মসূচি প্রকল্পটি দেশের পাঁচ (৫)টি জেলায় (কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও জামালপুর) ২৮টি উপজেলা ও ১৫০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার ও ডিএফআইডি এর সহায়তায় ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের চর অঞ্চলের চরম দারিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেকের নিচে নামিয়ে আনা। উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলায় চর এলাকার দারিদ্র ও অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুদের জীবিকার নিরাপত্তা উন্নয়ন করা প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য। প্রকল্প সহায়তা ও ফলাফল সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত সংগ্রহের জন্য আমরা এসেছি।

আপনি মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। আপনার মতামত শুধুমাত্র মূল্যায়নের কাজেই ব্যবহৃত হবে। আপনার দেয়া তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে আমি সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি।

নমুনা খানা নং :

জেলা :	কোড নং :
উপজেলা :	কোড নং :
ইউনিয়ন :	কোড নং :
গ্রাম :	

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম :..... সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ :.....
সুপারভাইজারের নাম :..... তারিখ :..... মোবাইল নং.....
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শুরুর সময়:..... শেষ সময়:..... মোবাইল নং.....

খানার বৈশিষ্ট্য

- ১। উত্তরদাতা মহিলার নাম :..... বয়স :.....
 সর্বোচ্চ কোন শ্রেণি পাশ করেছেন :..... পেশা :..... মোবাইল নং.....
 স্বামীর নাম :..... বয়স :.....
 সর্বোচ্চ কোন শ্রেণি পাশ করেছেন :..... পেশা :..... মোবাইল নং.....
 ১.১. পরিবারে কতজন সদস্য আছে ?..... জন।
 ১.২. পরিবারের কোন ছেলে/মেয়ে স্কুলে যায় কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না
 না হলে কেন স্কুলে যায় না ?

কোড	কারণ	প্রকল্পের পূর্বে	বর্তমানে
০১.	কাছে কোন স্কুল নেই বলে		
০২.	স্কুল অনেক দূরে		
০৩.	স্কুলে যাওয়া আসার সমস্যা		
০৪.	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....		

- ১.৩. আপনার খানায় নিরাপদ পানির ব্যবস্থা আছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না
 না থাকলে কেন নেই ?.....

- ১.৪. আপনার খানায় স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট সুবিধা আছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না
 না থাকলে কেন নেই ?.....

(তথ্য সংগ্রহকারীগণ টয়লেট সুবিধা **Observe** করবেন/পর্যবেক্ষণ করে মন্তব্য লিখুন)।

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) সম্পর্কিত তথ্য :

- ২। জীবিকায়ন কর্মসূচি (CLP) থেকে কোন রূপ সাহায্য পেয়েছিলেন কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না
 হ্যাঁ হলে কি কি সাহায্য পেয়েছেন ? (কোডের উপর টিক (✓) চিহ্ন দিন)

কোড	সাহায্যের ধরন	কোড	সাহায্যের ধরন
১	বাসস্থানের ভিটি (Plinth) উঁচুকরণ	৭	ছাগল
২	নলকূপ (যৌথভাবে)	৮	প্রশিক্ষণ
৩	কাজের বিনিময়ে টাকা	৯	স্বাস্থ্য সেবা
৪	হাঁস-মুরগি	১০	ঋণ সুবিধা
৫	স্ল্যাব ল্যান্ড্রিন	১১	বসত বাড়িতে সবজি উৎপাদনের জন্য বীজ, সার ইত্যাদি
৬	গরু		অন্যান্য (উল্লেখ করুন).....

- ২.১. গরু ক্রয়ের জন্য CLP হতে নগদ কত টাকা পেয়েছেন ? টাকা।
 ২.১.১. গরু ক্রয় করতে কত টাকা ব্যয় করেছেন ? টাকা।
 ২.১.২. গরু ক্রয় করতে বেশি টাকা ব্যয় হলে অতিরিক্ত টাকার উৎস কি ? ১. নিজ তহবিল ২. ঋণ করে
 ২.১.৩. গরু ক্রয়ে কম টাকা ব্যয় হলে বাকী টাকা কি কাজে ব্যবহার করেছেন ?

ছাগল ক্রয়	<input type="text" value="১"/>
হাঁস-মুরগি ক্রয়	<input type="text" value="২"/>
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	<input type="text" value="৩"/>

- ২.১.৪. প্রকল্পে গরু ক্রয় করার কোন নির্দিষ্ট তারিখ বা নির্দিষ্ট সময় ছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
- ২.১.৪.১. হ্যাঁ হলে আপনি উল্লেখিত নির্দিষ্ট তারিখ/সময়ে গরু ক্রয় করেছিলেন কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
- ২.১.৪.২. না হলে কেন নয় উল্লেখ করুন.....
- ২.২. গরু হতে প্রতিদিন কি পরিমাণ দুধ পান..... লিটার/কেজি,
দুধ পান করেন..... লিটার/কেজি, দুধ বিক্রয় করেন..... লিটার/কেজি।
বিক্রয় মূল্য..... টাকা।
- ২.৩. দুধ বিক্রয়ে সঠিক মূল্য পান কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না
না হলে কেন নয় ?.....
- ২.৪. গরু/ছাগল/হাঁস-মুরগী ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে ৯টি কার্ড সম্বলিত সহায়তায় প্যাকেট পেয়েছেন কি না ?
১. হ্যাঁ ২. না
- ২.৫. সহায়তা প্যাকেট পেয়ে থাকলে গরু-ছাগল রক্ষণাবেক্ষণে তা কার্যকরী ছিল কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না
- ২.৫.১. প্রতি মাসে গরুর চিকিৎসা বাবদ ৩৫০ টাকা সঠিক ভাবে পেয়েছেন কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
২.৫.১.১. না হলে কেন পান নাই উল্লেখ করুন.....
- ২.৫.২. গরু ক্রয়ের ফলে আপনার আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
২.৫.২.১. হ্যাঁ হলে কিভাবে.....
২.৫.২.২. না হলে কিভাবে.....
- ২.৬. বসত ভিটা/আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ করেন কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না
- ২.৭. বসত ভিটার উৎপাদিত তরি-তরকারী/ফল-মূল নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রি করেন কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না
- ৩। আপনার উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাত করণের সু-ব্যবস্থা আছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
না হলে বাজারজাত করণে কি সমস্যা ?.....
- ৪। আপনি ভিএসএলএ (VSLA) এর সদস্য কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না
- ৪.১. হ্যাঁ হলে কত টাকা সঞ্চয় জমা দিয়েছেন টাকা.....।
- ৪.২. ওখান হতে কত টাকা ঋণ নিয়েছেন, টাকা.....।
- ৪.৩. কত হারে সুদ দিতে হয়েছে, বার্ষিক হার.....%
- ৪.৪. সমিতি হতে কিভাবে উপকৃত হয়েছেন ?.....
- ৪.৫. লোন নিয়ে থাকলে ঠিকমত পরিশোধ করেছেন কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না
না হলে, কি কি কারণে লোন ঠিকমত পরিশোধ করতে পারেন নাই.....
- ৫। ভিটি উচ্চকরণ (Plinth Raise) সংক্রান্ত :
- ৫.১. আপনার এলাকায়/খানায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য Plinth Raise করা হয়েছে কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না
- ৫.২. Plinth উঁচু করাতে বন্যা থেকে রক্ষা পেয়েছেন কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না
- ৫.৩. হ্যাঁ হলে কিরূপ উপকৃত হয়েছেন ?.....
- ৫.৪. ভিটি (Plinth) এর ঢালে গাছপালা/তরি-তরকারী লাগিয়েছেন কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

- ৫.৫. ভিটি (Plinth) উঁচু করণের কাজে আপনার খানার কেউ অংশগ্রহণ করেছেন কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না
 ৫.৬. ভিটি (Plinth) উঁচু করণের ফলে মাটির ক্ষয়রোধ হয়েছে কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

৬। জমিজমা সংক্রান্ত :

- ৬.১. আপনার কৃষি জমি আছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না
 হ্যাঁ হলে, পরিমাণ (বর্তমান)শতাংশ।
 (পূর্বে)শতাংশ।
 ৬.২. জমিতে কি কি চাষাবাদ করেন ?.....
 ৬.৩. সেচ সুবিধা আছে কি না ?.....
 ৬.৪. আপনি জমি লীজ নিয়েছেন কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না
 হ্যাঁ হলে, পরিমাণ.....শতাংশ।

৭। বর্তমান সম্পদ :

- ৭.১. বর্তমানে আপনি/আপনার পরিবার কি কি সম্পদের মালিক হয়েছেন ও তাঁর মূল্য কত ?

কোড	সম্পদ	প্রকল্পের পূর্বে		বর্তমানে	
		সংখ্যা	মূল্য (টাকা)	সংখ্যা	মূল্য (টাকা)
০১.	সাইকেল				
০২.	টেলিভিশন				
০৩.	মোবাইল				
০৪.	রিকশা/ভ্যান				
০৫.	জমি				
০৬.	গরু				
০৭.	ছাগল				
০৮.	হাঁস/মুরগি				
০৯.	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করণ).....				
মোট					

- ৭.২. বসত বাড়ি সম্পর্কিত : আপনার বসত বাড়ির ছাদ ও দেওয়াল কিরূপ / কিসের তৈরি ?

ক্র.নং	কিরূপ /কিসের তৈরি	বসত বাড়ির ছাদ		বসত বাড়ির দেওয়াল	
		বর্তমান	পূর্বে	বর্তমান	পূর্বে
১	খড় দিয়ে তৈরি				
২	টিনের তৈরি				
৩	সিমেন্ট ঢালাই				
৪	অন্যান্য				

৮। পরিবারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত :

- ৮.১. আপনার পরিবারের মাসিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণ-

কোড	আয়ের উৎস	টাকা	কোড	ব্যয়ের খাত	টাকা
০১	কৃষি		০১	খাদ্য	
০২	অকৃষি		০২	চিকিৎসা	
০৩	শ্রম বিক্রয়		০৩	কৃষি	
০৪	ক্ষুদ্র ব্যবসা		০৪	বন্যা/নদী ভাঙ্গন	
০৫	বিদেশ হতে টাকা পাঠায়		০৫	শিক্ষা	
০৬	অন্যান্য		০৬	অন্যান্য	
মোট =			মোট =		

৯। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা :

৯.১. প্রকল্পে অংশগ্রহণের পর হতে আপনি/আপনার পরিবারের কোন সদস্য অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন ? ১. হ্যাঁ ২. না

৯.২. হ্যাঁ হলে কত জন অংশগ্রহণ করেছেন ? (সংখ্যা).....

৯.৩. অপ্রাতিষ্ঠানিক স্কুল থেকে কি কি শিক্ষা অর্জন করেছেন ?

কোড	কি কি শিক্ষা অর্জন করেছেন	প্রকল্পের পূর্বে	বর্তমানে
১.	পড়তে পারা		
২.	লিখতে পারা		
৩.	হিসাব করতে পারা		
৪.	উপরোক্ত সবগুলিই শিখেছেন		

১০। প্রশিক্ষণ বিষয়ক :

১০.১. CLP হতে আপনি কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

১০.২. হ্যাঁ হলে কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ?

কোড	প্রশিক্ষণের বিষয়	কত দিনের প্রশিক্ষণ
১	বাড়ির আঙ্গিনায় সজি বাগান	
২	গাভী পালন	
৩	নলকূপ মেরামত	
৪	হাঁস-মুরগি পালন/উন্নত ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাত করণ	
৫	গোবর সংরক্ষণ	
৬	গো-খাদ্য চাষ	
৭	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করণ).....	

১০.৩. প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কার্যকারী ও ফলপ্রসূ ছিল কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

১০.৪. না, হলে কেন নয়.....
.....

১১। খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত :

১১.১. আগে আপনার পরিবারের সদস্যগণ দিনে কত বার খেতে পারতেন ?..... বার।

১১.২. বর্তমানে আপনার পরিবারের সদস্যগণ দিনে কত বার খেতে পারেন ?..... বার।

১১.৩. আপনি বর্তমানে মাছ/মাংস/ডিম আগের চেয়ে বেশি খেতে পান কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

১১.৪. আপনি বর্তমানে শাক-সবজি/ফল-মূল আগের চেয়ে বেশি খেতে পান কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

১২। যোগাযোগ সংক্রান্ত :

১২.১ আপনি রাস্তা নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

১২.২. রাস্তা উন্নয়নের ফলে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন সহজ হয়েছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

১২.৩. রাস্তা উন্নয়নের ফলে ডিম/দুধ বিক্রয় সহজতর হয়েছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

১৩। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত :

১৩.১. পাঁচ বৎসরের নীচের শিশুর সবগুলো টিকা দেওয়া হয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে টিকার কার্ডটি দেখান-

১৩.২. টিকার কার্ড দেখে নিচের সম্ভাব্য উত্তর লিখুন-

১. সম্পূর্ণ....., ২. অসম্পূর্ণ.....

১৩.৩. আপনি/আপনার স্ত্রী গর্ভাবস্থায় গর্ভকালীন সেবা নিয়েছেন কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে কত বার নিয়েছেন.....বার।

১৩.৪. আপনার শেষ সন্তান কোথায় প্রসব করিয়েছেন ?

কোড	প্রসবের স্থান	প্রকল্পের পূর্বে	বর্তমানে
১	বাড়ীতে		
২	Community Clinic		
৩	সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে		
৪	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....		

১৩.৫. পরিবারে কেউ অসুস্থ হলে আপনারা সাধারণতঃ কোথায় চিকিৎসা নিয়ে থাকেন-

কোড	চিকিৎসার স্থান	প্রকল্পের পূর্বে	বর্তমানে
১	স্বাস্থ্য কর্মী		
২	Community Clinic		
৩	Union Health & Family Welfare Center		
৪	NGO স্বাস্থ্য কেন্দ্রে		
৫	উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে		
৬	সরকারী হাসপাতালে		
৭	অন্য কোথাও নির্দিষ্ট করুন		

১৩.৬. স্বাস্থ্য সেবা যদি সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে/Community Clinic এ হয় তা হলে, এর দূরত্ব কত.....কি.মি.

১৩.৭. পরিবারের কারও ডাইরিয়া হলে সেলাইন খাওয়ান কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে কিভাবে-

কোড	ব্যবস্থা নেন	প্রকল্পের পূর্বে	বর্তমানে
১	নিজে তৈরি করে খাওয়ান		
২	বাজার থেকে কিনে খাওয়ান		
৩	না হলে বিকল্প কি খাওয়ান		

১৩.৮. বর্তমানে বিবাহিত হলে আপনি/আপনার স্বামী পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থা নেন কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে আপনি অথবা আপনার স্বামী কি পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন ?

১৪। সামাজিক সচেতনতা সংক্রান্ত :

১৪.১. কত বৎসর বয়সে একটি কিশোরীর বিয়ে হওয়া উচিত.....বয়স।

১৪.২. বাল্য বিবাহের কুফলগুলি জানেন কি ?

কোড	কুফল	প্রকল্পের পূর্বে	বর্তমানে
১	মাতৃ মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি		
২	শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি		
৩	শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস সমস্যার সম্ভাবনা বেশি		
৪	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করণ).....		

১৫। পারিবারিক কলহ/নির্ঘাতন সংক্রান্ত :

১৫.১. আপনি আপনার স্বামী কর্তৃক কোন দিন নির্ঘাতিত হয়েছেন কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

১৫.২. হ্যাঁ হলে কি কারণে নির্ঘাতিত হয়েছেন ?

কোড	কারণ	প্রকল্পের পূর্বে	বর্তমানে
১	যৌতুক		
২	আর্থিক অনটন		
৩	স্বামীর ব্যক্তিগত বদ অভ্যাস (মদ খাওয়া/জুয়া খেলা)		
৪	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করণ).....		

১৫.৩. প্রকল্পে অংশ গ্রহণের পর মহিলাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

১৬। এনজিও বিষয়ক :

১৬.১. CLP ভুক্ত এনজিও হতে আপনি কি সুবিধা পেয়েছেন ?.....

১৬.২. এনজিও কর্মকাণ্ডে আপনি সন্তুষ্ট কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

১৬.৩. না, হলে কেন নয় ?.....

১৭। প্রকল্প শেষে আপনাদের VSLA চালু আছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

১৭.১. নিয়মিত সমিতিতে বৈঠক হয় কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

১৭.২. না হলে কি কারণে বৈঠক হচ্ছে না-

কোড	কারণ	বর্তমানে
১	নিয়মিত বৈঠক করা বোঝা স্বরূপ	
২	সাংসারিক কাজের ব্যস্ততা বেশী	
৩	বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা কম/নেই	
৪	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করণ).....	

১৮। এই সিএলপি প্রকল্পটি চালু হওয়ার ফলে আপনাদের এলাকায় দারিদ্রতা কমেছে কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

১৮.১. হ্যাঁ হলে আপনার হিসেবে শতকরা কত পরিবারের দারিদ্রতা কমেছে ?.....%

১৯। বর্তমানে আপনার আর্থ সামাজিক অবস্থার গতি কিরূপ- (১. উর্ধ্বমুখী, ২. নিম্নমুখী, ৩. কোনো পরিবর্তন নেই)

কারণ উল্লেখ করণ.....

২০। প্রকল্প সম্পর্কে আপনার মতামত-

ক্র.নং	প্রকল্পের সফল দিক	ক্র.নং	প্রকল্পের দুর্বল দিক
০১		০১	
০২		০২	
০৩		০৩	
০৪		০৪	
০৫		০৫	

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর :.....

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) (প্রথম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

খানা জরিপ প্রশ্নমালা (কন্ট্রোল গ্রুপ)

(প্রজেক্ট এরিয়ার জন্য: অবকাঠামো কার্যক্রম, কাজের জন্য নগদ অর্থ, সম্পদ হস্তান্তর,
পশু সম্পদ, সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি)।

ভূমিকা: আসসালামু আলাইকুম। আমরা ক্রান্তি এসোসিয়েট লি: (গবেষণা প্রতিষ্ঠান) এবং আইএমইডি (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়) থেকে মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন জরিপের উদ্দেশ্যে এসেছি। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০০৩-২০১১ ইং সালে চর জীবিকায়ন কর্মসূচি প্রকল্পটি দেশের পাঁচ (৫)টি জেলায় (কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও জামালপুর) ২৮টি উপজেলা ও ১৫০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার ও ডিএফআইডি এর সহায়তায় ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের চর অঞ্চলের চরম দারিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেকের নিচে নামিয়ে আনা। উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলায় চর এলাকার দারিদ্র ও অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুদের জীবিকার নিরাপত্তা উন্নয়ন করা প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য। প্রকল্প সহায়তা ও ফলাফল সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত সংগ্রহের জন্য আমরা এসেছি।

আপনি মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। আপনার মতামত শুধুমাত্র মূল্যায়নের কাজেই ব্যবহৃত হবে। আপনার দেয়া তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে আমি সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি।

নমুনা খানা নং :

জেলা :	কোড নং :
উপজেলা :	কোড নং :
ইউনিয়ন :	কোড নং :
গ্রাম :	

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম :..... সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ :.....
সুপারভাইজারের নাম :..... তারিখ :..... মোবাইল নং.....
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শুরুর সময়:..... শেষ সময়:..... মোবাইল নং.....

খানার বৈশিষ্ট্য

- ১। উত্তরদাতা মহিলার নাম :..... বয়স :.....
 সর্বোচ্চ কোন শ্রেণি পাশ করেছেন :..... পেশা :..... মোবাইল নং.....
 স্বামীর নাম :..... বয়স :.....
 সর্বোচ্চ কোন শ্রেণি পাশ করেছেন :..... পেশা :..... মোবাইল নং.....
- ১.১. পরিবারে কতজন সদস্য আছে ?..... জন।
- ১.২. পরিবারের কোন ছেলে/মেয়ে স্কুলে যায় কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না
 না হলে কেন স্কুলে যায় না ?

কোড	কারণ	প্রকল্পের পূর্বে	বর্তমানে
০১.	কাছে কোন স্কুল নেই বলে		
০২.	স্কুল অনেক দূরে		
০৩.	স্কুলে যাওয়া আসার সমস্যা		
০৪.	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....		

- ১.৩ . আপনার খানায় নিরাপদ পানির ব্যবস্থা আছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না
 না থাকলে কেন নেই ?.....

- ১.৪. আপনার খানায় স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট সুবিধা আছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না
 না থাকলে কেন নেই ?.....

- (তথ্য সংগ্রহকারীগণ টয়লেট সুবিধা **Observe** করবেন/পর্যবেক্ষণ করে মন্তব্য লিখুন)।

স্থানীয় কোন সংস্থা হতে প্রাপ্ত সুবিধাধি :

- ২। স্থানীয় কোন সংস্থা হতে কোন রূপ সাহায্য পেয়েছিলেন কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না
- হ্যাঁ হলে কি কি সাহায্য পেয়েছেন ? (কোডের উপর টিক (✓) চিহ্ন দিন)
- | কোড | সাহায্যের ধরন | কোড | সাহায্যের ধরন |
|-----|----------------------------------|-----|-----------------------------|
| ১ | বাসস্থানের ভিটি (Plinth) উঁচুকরণ | ৬ | প্রশিক্ষণ |
| ২ | নলকূপ (যৌথভাবে) | ৭ | স্বাস্থ্য সেবা |
| ৩ | কাজের বিনিময়ে টাকা | ৮ | ঋণ সুবিধা |
| ৪ | হাঁস-মুরগি | ৯ | অন্যান্য (উল্লেখ করুন)..... |
| ৫ | গরু/ছাগল | | |
- ২.১. আপনার গরু আছে কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না
- ২.২. হ্যাঁ হলে গরু হতে প্রতিদিন কি পরিমাণ দুধ পান..... লিটার/কেজি,
 দুধ পান করেন..... লিটার/কেজি, দুধ বিক্রয় করেন..... লিটার/কেজি।
- ২.৩. দুধ বিক্রয়ে সঠিক মূল্য পান কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না
 না হলে কেন নয় ?.....

২.৪. গরু/ছাগল ইত্যাদি প্রতিপালনের জন্য সরকারী/বেসরকারী সংস্থা হতে কোন সাহায্য/সহযোগিতা পেয়েছেন কি না ?

১. হ্যাঁ ২. না

২.৫. হ্যাঁ হলে কি কি সহায়তা পেয়েছেন ?

১	
২	
৩	

২.৬. সহায়তা পর্যাপ্ত ছিল কি না ?

১. হ্যাঁ ২. না

২.৭. বসত ভিটা/আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ করেন কিনা ?

১. হ্যাঁ ২. না

২.৮. বসত ভিটার উৎপাদিত তরি-তরকারী/ফল-মূল নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রি করেন কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

৩। আপনার উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাত করনের সু-ব্যবস্থা আছে কি ?

১. হ্যাঁ ২. না

না হলে বাজারজাত করণে কি সমস্যা ?.....
.....

৪। আপনি কি কোন সমিতির সদস্য/সদস্যা কিনা ?

১. হ্যাঁ ২. না

৪.১. হ্যাঁ হলে কত টাকা সঞ্চয় জমা দিয়েছেন টাকা..... ।

৪.২. ওখান হতে কত টাকা ঋণ নিয়েছেন, টাকা..... ।

৪.৩. কত হারে সুদ দিতে হয়েছে, বার্ষিক হার.....%

৪.৪. সমিতি হতে কিভাবে উপকৃত হয়েছেন ?.....
.....

৪.৫. লোন নিয়ে থাকলে ঠিকমত পরিশোধ করেছেন কি না ?

১. হ্যাঁ ২. না

না হলে, কি কি কারণে লোন ঠিকমত পরিশোধ করতে পারেন নাই.....
.....

৫। জমিজমা সংক্রান্ত :

৫.১. আপনার কৃষি জমি আছে কি না ?

১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে, পরিমান (বর্তমান)শতাংশ ।

(পূর্বে)শতাংশ ।

৫.২. জমিতে কি কি চাষাবাদ করেন ?.....

৫.৩. সেচ সুবিধা আছে কি না ?.....

৫.৪. আপনি জমি লীজ নিয়েছেন কি না ?

১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে, পরিমান.....শতাংশ ।

৬। বর্তমান সম্পদ :

৬.১. বর্তমানে আপনি/আপনার পরিবার কি কি সম্পদের মালিক হয়েছেন ও তাঁর মূল্য কত ?

কোড	সম্পদ	প্রকল্পের পূর্বে		বর্তমানে	
		সংখ্যা	মূল্য (টাকা)	সংখ্যা	মূল্য (টাকা)
০১.	সাইকেল				
০২.	টেলিভিশন				
০৩.	মোবাইল				
০৪.	রিকশা/ভ্যান				
০৫.	জমি				
০৬.	গরু				
০৭.	ছাগল				
০৮.	হাঁস/মুরগি				
০৯.	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করণ).....				
মোট					

৬.২. বসত বাড়ি সম্পর্কিত : আপনার বসত বাড়ির ছাদ ও দেওয়াল কিরূপ / কিসের তৈরি ?

ক্র.নং	কিরূপ /কিসের তৈরি	বসত বাড়ির ছাদ		বসত বাড়ির দেওয়াল	
		বর্তমান	পূর্বে	বর্তমান	পূর্বে
১	খড় দিয়ে তৈরি				
২	টিনের তৈরি				
৩	সিমেন্ট ঢালাই				
৪	অন্যান্য				

৭। পরিবারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত :

৭.১. আপনার পরিবারের মাসিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণ-

কোড	আয়ের উৎস	টাকা	কোড	ব্যয়ের খাত	টাকা
০১	কৃষি		০১	খাদ্য	
০২	অকৃষি		০২	চিকিৎসা	
০৩	শ্রম বিক্রয়		০৩	কৃষি	
০৪	ক্ষুদ্র ব্যবসা		০৪	বন্যা/নদী ভাঙ্গন	
০৫	বিদেশ হতে টাকা পাঠায়		০৫	শিক্ষা	
০৬	অন্যান্য		০৬	অন্যান্য	
মোট =			মোট =		

৮। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা :

৮.১. আপনি/আপনার পরিবারের কোন সদস্য অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন ? ১. হ্যাঁ ২. না

৮.২. হ্যাঁ হলে কত জন অংশগ্রহণ করেছেন ?.....

৮.৩. অপ্রাতিষ্ঠানিক স্কুল থেকে কি কি শিক্ষা অর্জন করেছেন ?

কোড	কি কি শিক্ষা অর্জন করেছেন	প্রকল্পের পূর্বে	বর্তমানে
১.	পড়তে পারা		
২.	লিখতে পারা		
৩.	হিসাব করতে পারা		
৪.	উপরোক্ত সবগুলিই শিখেছেন		

৯। প্রশিক্ষণ বিষয়ক :

৯.১. আপনি কোন এনজিও/সংস্থা হতে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

৯.২. হ্যাঁ হলে কোথা থেকে এবং কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ?.....

কোড	প্রশিক্ষণের বিষয়	কত দিনের প্রশিক্ষণ
১	বাড়ির আঙ্গিনায় সজি বাগান	
২	গান্ধী পালন	
৩	নলকূপ মেরামত	
৪	হাঁস-মুরগি পালন/উন্নত ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাত করণ	
৫	গোবর সংরক্ষণ	
৬	গো-খাদ্য চাষ	
৭	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করণ).....	

৯.৩. প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কার্যকারী ও ফলপ্রসূ ছিল কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

৯.৪. না, হলে কেন নয়.....

১০। খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত :

১০.১. আগে আপনার পরিবারের সদস্যগণ দিনে কত বার খেতে পারতেন ?..... বার।

১০.২. বর্তমানে আপনার পরিবারের সদস্যগণ দিনে কত বার খেতে পারেন ?..... বার।

১০.৩. আপনি বর্তমানে মাছ/মাংস/ডিম আগের চেয়ে বেশি খেতে পান কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

১০.৪. আপনি বর্তমানে শাক-সবজি/ফল-মূল আগের চেয়ে বেশি খেতে পান কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

১১। যোগাযোগ সংক্রান্ত :

১১.১ আপনি রাস্তা নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

১১.২. রাস্তা উন্নয়নের ফলে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন সহজ হয়েছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

১১.৩. রাস্তা উন্নয়নের ফলে ডিম/দুধ বিক্রয় সহজতর হয়েছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

১২। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত :

১২.১. পাঁচ বৎসরের নীচের শিশুর সবগুলো টিকা দেওয়া হয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে টিকার কার্ডটি দেখান-

১২.২. টিকার কার্ড দেখে নিচের সম্ভাব্য উত্তর লিখুন-

১. সম্পূর্ণ....., ২. অসম্পূর্ণ.....

১২.৩. আপনি গর্ভাবস্থায় গর্ভকালীন সেবা নিয়েছেন কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে কত বার নিয়েছেন.....বার।

১২.৪. আপনার শেষ সন্তান কোথায় প্রসব করিয়েছেন ?

কোড	প্রসবের স্থান	প্রকল্পের পূর্বে	বর্তমানে
১	বাড়ীতে		
২	Community Clinic		
৩	সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে		
৪	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করণ).....		

১২.৫. পরিবারে কেউ অসুস্থ হলে আপনারা সাধারণতঃ কোথায় চিকিৎসা নিয়ে থাকেন-

কোড	চিকিৎসার স্থান	প্রকল্পের পূর্বে	বর্তমানে
১	স্বাস্থ্য কর্মী		
২	Community Clinic		
৩	Union Health & Family Welfare Center		
৪	NGO স্বাস্থ্য কেন্দ্রে		
৫	উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে		
৬	সরকারী হাসপাতালে		
৭	অন্য কোথাও নির্দিষ্ট করুন		

১২.৬. স্বাস্থ্য সেবা যদি সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে/Community Clinic এ হয় তা হলে, এর দুরত্ব কত.....কি.মি.

১২.৭. পরিবারের কারও ডাইরিয়া হলে সেলাইন খাওয়ান কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে কিভাবে-

কোড	ব্যবস্থা নেন	প্রকল্পের পূর্বে	বর্তমানে
১	নিজে তৈরি করে খাওয়ান		
২	বাজার থেকে কিনে খাওয়ান		
৩	না হলে বিকল্প কি খাওয়ান		

১২.৮. বর্তমানে বিবাহিত হলে আপনি/আপনার স্বামী পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থা নেন কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না
হ্যাঁ হলে আপনি অথবা আপনার স্বামী কি পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন ?

১৩। সামাজিক সচেতনতা সংক্রান্ত :

১৩.১. কত বৎসর বয়সে একটি কিশোরীর বিয়ে হওয়া উচিত.....বয়স।

১৩.২. বাল্য বিবাহের কুফলগুলি জানেন কি ?

কোড	কুফল	প্রকল্পের পূর্বে	বর্তমানে
১	মাতৃ মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি		
২	শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি		
৩	শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস সমস্যার সম্ভাবনা বেশি		
৪	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....		

১৪। পারিবারিক কলহ/নির্যাতন সংক্রান্ত :

১৪.১. আপনি আপনার স্বামী কর্তৃক কোন দিন নির্যাতিত হয়েছেন কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

১৪.২. হ্যাঁ হলে কি কি কারণে নির্যাতিত হয়েছেন ?

কোড	কারণ	প্রকল্পের পূর্বে	বর্তমানে
১	যৌতুক		
২	আর্থিক অনটন		
৩	স্বামীর ব্যক্তিগত বদ অভ্যাস (মদ খাওয়া/জুয়া খেলা)		
৪	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....		

১৫। বর্তমানে আপনার আর্থ সামাজিক অবস্থার গতি কিরূপ- (১. উর্ধ্বমুখী, ২. নিম্নমুখী, ৩. কোনো পরিবর্তন নেই)
কারণ উল্লেখ করুন.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর :

“চর জীবিকায়ন কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
দলীয় আলোচনার নির্দেশিকা: প্রকল্প এলাকায় ইউনিয়ন পর্যায়ে
(FGD Guideline at Union Level)

[প্রতি FGD-তে অংশগ্রহণকারী ৮-১০ জন]

অংশগ্রহণকারীর ধরন :

মহিলা, কৃষক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পরিবহন শ্রমিক, ধর্মীয় নেতা

ভূমিকা: আসসালামু আলাইকুম। আমরা ক্রান্তি এসোসিয়েট লি: (গবেষণা প্রতিষ্ঠান) এবং আইএমইডি (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়) এর মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন জরিপের উদ্দেশ্যে এসেছি। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (Rural Development and Cooperative Department) কর্তৃক ২০০৩-২০১১ ইং সালে চর জীবিকায়ন কর্মসূচি প্রকল্পটি দেশের পাঁচ (৫)টি জেলায় (কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও জামালপুর) ২৮টি উপজেলার ১৫০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা। প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার এবং দাতাদের সহায়তায় ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের চর অঞ্চলের চরম দারিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেকের নিচে নামিয়ে আনা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলায় চর এলাকার দারিদ্র ও অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুদের জীবিকার নিরাপত্তা উন্নয়ন করা। আমরা প্রকল্প সম্পর্কে আপনাদের মূল্যবান মতামত সংগ্রহের জন্য এসেছি।

আপনারা মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ গবেষণার কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। আপনাদের মতামত শুধুমাত্র মূল্যায়নের কাজেই ব্যবহৃত হবে।

নমুনা
নং :

--	--

জেলা:	কোড নং :.....
উপজেলা :.....	কোড নং :.....
ইউনিয়ন :.....	কোড নং :.....

এফজিডি সমন্বয়কারীর নাম :..... সহায়তাকারীর নাম :.....

দলীয় আলোচনার স্থান :..... তারিখ :.....

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্য :

ক্রমিক নং	নাম	লিঙ্গ মহিলা/পুরুষ	বয়স	শিক্ষা	পেশা	মোবাইল নম্বর
১.						
২.						
৩.						
৪.						
৫.						
৬.						
৭.						
৮.						
৯.						
১০.						

নির্দেশনা : নির্ধারিত নমুনা এলাকায় প্রকল্পের আওতায় যে কম্পোনেন্টের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে শুধুমাত্র সেই সেই কম্পোনেন্টের ওপর অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

১। আপনার এলাকায় চর জীবিকায়ন প্রকল্পের অধীনে কি কি কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে ?

ক) অবকাঠামো কার্যক্রম

খ) কাজের জন্য নগদ অর্থ

গ) সম্পদ হস্তান্তর

ঘ) পশু সম্পদ সহায়তা

ঙ) সামাজিক উন্নয়ন

২। প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন/তদারকি করা হত কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কিভাবে করা হত ?.....

কে তদারকি করতেন..... মাসে কত বার..... ?

৩। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উক্ত প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কোন কোন কাজ কম হয়েছে এবং কেন ?

কোন কোন কাজ		কাজ কম হওয়ার কারণ	
০১		০১	
০২		০২	
০৩		০৩	

৪। প্রকল্পের কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ চাহিদামত পাওয়া গেছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কত (%) পাওয়া গেছে ? কত বিলম্বে পাওয়া গেছে ?

%	দিন	মাস

৫। প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত কাজের বাইরে কোন কাজ এই প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বা নির্মিত হয়েছে কি ?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি কাজ ?

.....

- ৬। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে, কি কি সমস্যা দেখা দিয়েছিল ?
.....
- ৭। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে, কি ধরনের অংশগ্রহণ ছিল ?
.....
- ৮। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে / প্রভাবশালী মহল থেকে কোন প্রতিবন্ধকতা এসেছিল কি ?
১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে, কি.....
- ৯। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে, কিভাবে ?
.....
- ১০। প্রকল্পের আওতায় কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে, কাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল ?
খ. কি কি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল ?
.....
- গ. প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কার্যকরী ও ফলপ্রসূ ছিল কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না
না হলে, কেন ?.....
- ১১। প্রকল্পের অবকাঠামো ও অন্যান্য কার্যাবলী পর্যবেক্ষনের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কোন কমিটি আছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে, কি কমিটির নাম ?.....
খ. এই কমিটি কি কি কাজ করে থাকে ?
.....
- ১২। প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে, কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় ?
.....
খ. কারা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের দায়িত্বে রয়েছে ?
.....
গ. না হলে, কেন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না ?
.....
ঘ. কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় ?
.....
- ১৩। প্রকল্পভুক্ত এনজিও আপনার এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করেছে কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না
হ্যাঁ হলে, কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে ?
.....

১৪। আপনার কর্মএলাকার বিভিন্ন জায়গায় এই প্রকল্পের আওতায় যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার মতামত.....

১৫। প্রকল্পের সফলতাগুলো বা শক্তিশালী দিকগুলো কি কি ?

.....
.....

১৬। প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো কি কি ?

.....
.....
.....

১৭। ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যাতে উপরি উক্ত দুর্বলতাগুলো না থাকে সেজন্য কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

.....
.....
.....

১৮। বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে তা চালু রাখার জন্য আপনার মতামত

.....
.....
.....
.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর :.....

(ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন)

“চর জীবিকায়ন কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
কি ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ

(প্রজেক্ট এরিয়ার জন্য: অবকাঠামো কার্যক্রম, কাজের জন্য নগদ অর্থ, সম্পদ হস্তান্তর,
পশু সম্পদ, সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি)।

ভূমিকা: আসসালামু আলাইকুম। আমরা ক্রান্তি এসোসিয়েট লি: (গবেষণা প্রতিষ্ঠান) এবং আইএমইডি (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়) পক্ষ থেকে এর মাঠপর্যায়ে মূল্যায়ন জরিপের উদ্দেশ্য এসেছি। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (Rural Development and Cooperative Department) কর্তৃক ২০০৩-২০১১ ইং সালে চর জীবিকায়ন কর্মসূচি প্রকল্পটি দেশের পাঁচ (৫)টি জেলায় (কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও জামালপুর) ২৮টি উপজেলার ১৫০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা। প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার এবং দাতাদের সহায়তায় ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের চর অঞ্চলের চরম দারিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেকের নিচে নামিয়ে আনা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলায় চর এলাকার দারিদ্র ও অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুদের জীবিকার নিরাপত্তা উন্নয়ন করা। আমরা প্রকল্প সম্পর্কে আপনাদের মূল্যবান মতামত সংগ্রহের জন্য এসেছি।

আপনি মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ মূল্যায়নের কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। আপনার মতামত শুধুমাত্র মূল্যায়নের কাজেই ব্যবহৃত হবে। আপনার দেয়া তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে।

নমুনা নং :

উত্তর দাতার নাম	পদবী	সংস্থার নাম	মোবাইল

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম :..... সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ :.....

সুপারভাইজারের নাম :..... তারিখ :.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শুরু সময়:..... শেষ সময়:..... মোবাইল.....

১। এই উপজেলায় চর জীবিকায়ন কর্মসূচির এর আওতায় কখন, কোথায় কি কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে (২০০৪-২০১২) ?

কাজের নাম	আর্থিক পরিমাণ	মোট সংখ্যা	সুবিধাভোগীর সংখ্যা	শুরু ও শেষ বছর	বরাদ্দ		ব্যয়		অগ্রগতি %
					পরিমাণ	টাকা	পরিমাণ	টাকা	
অবকাঠামো কার্যক্রম									
কাজের জন্য নগদ অর্থ									
সম্পদ হস্তান্তর									
পশু সম্পদ									
সামাজিক উন্নয়ন									

২। প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন/তদারকি করা হত কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কিভাবে করা হত ?.....

কে তদারকি করতেন..... মাসে কত বার..... ?

৩। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উক্ত প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কোন কোন কাজ কম হয়েছে এবং কেন ?

.....

৪। প্রকল্পের কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ চাহিদামত পাওয়া গেছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কত (%) পাওয়া গেছে ? কত বিলম্বে পাওয়া গেছে ?

.....

৫। প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত কাজের বাইরে কোন কাজ এই প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বা নির্মিত হয়েছে কি ?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি কাজ ?

৬। প্রকল্প বাস্তবায়নকালী সময়ে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছিল কি ?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি কি সমস্যা দেখা দিয়েছিল ?

৭। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল কি ?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি ধরনের অংশগ্রহণ ছিল ?

৮। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে / প্রভাবশালী মহল থেকে কোন প্রতিবন্ধকতা এসেছিল কি ?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি.....

৯। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল কি ?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কিভাবে ?

১০। প্রকল্পের আওতায় কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল কি ?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল ?

খ. কি কি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল ?

গ. প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কার্যকরী ও ফলপ্রসূ ছিল কিনা ?

১. হ্যাঁ ২. না

না হলে, কেন ?

১১। প্রকল্পের অবকাঠামো ও অন্যান্য কার্যাবলী পর্যবেক্ষনের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কোন কমিটি আছে কি ?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি কমিটির নাম ?

খ. এই কমিটি কি কি কাজ করে থাকে ?

১২। প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কি ?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় ?

খ. কারা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের দায়িত্বে রয়েছে ?

গ. না হলে, কেন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না ?

ঘ. কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় ?

১৩। আপনার কর্মএলাকার বিভিন্ন জায়গায় এই প্রকল্পের আওতায় যে সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার মতামত.....

১৪। (ক) প্রকল্পে পার্টনার এনজিও ছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে, কতগুলি এনজিও ছিল ? (সংখ্যা).....

(খ) পার্টনার এনজিও সিলেকশন ঠিকমত হয়েছিল কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

না হলে, কেন ?.....

(গ) পার্টনার এনজিওগুলি চুক্তি অনুযায়ী সঠিকভাবে কাজ করেছে কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

না হলে, কেন ?.....

১৫। প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ করার কোন নির্দিষ্ট তারিখ বা নির্দিষ্ট সময় ছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

১৫.১. হ্যাঁ হলে আপনি উল্লেখিত নির্দিষ্ট তারিখ/সময়ে গুরুত্বপূর্ণ করেছিলেন কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

১৫.২. না হলে কেন নয় উল্লেখ করুন.....

১৬। প্রকল্পের সফলতাগুলো বা শক্তিশালী দিকগুলো কি কি ?

.....
.....

১৭। প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো কি কি ?

.....
.....
.....

১৮। ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যাতে উপরি উক্ত দুর্বলতাগুলো না থাকে সেজন্য কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

.....
.....
.....

১৯। বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় যে সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে তা চালু রাখার জন্য আপনার মতামত.....

.....
.....
.....

২০। প্রকল্পের অধীনে মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি :

(প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে অথবা প্রয়োজন হলে আঞ্চলিক অফিস হতে সংগ্রহ করা হবে)

ক) প্রকল্পের অধীনে মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

খ) উত্তর না হলে, কেন হয়নি এবং কি কি ব্যত্যয় হয়েছে তা উল্লেখ করুন:.....

.....

গ) মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপি অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে কি না ?

১. হ্যাঁ ২. না

ঘ) উত্তর না হলে, তার কারণ উল্লেখ করতে হবে:.....

.....

- ঙ) সকল মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রকল্প পরিচালক হতে সম্পন্ন করা হয়েছে না কি সদর দপ্তরের বরাদ্দ হতে আঞ্চলিক অফিস হতে করা হয়েছে তা উল্লেখ করুন:.....
- চ) কোন অফিস হতে কি ধরনের মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে তার তালিকা দিতে হবে:.....
- ছ) ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না
- জ) উত্তর হ্যাঁ হলে, এ পর্যন্ত কতটি প্যাকেজ সম্পাদন করা হয়েছে এবং কোন কোন দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে:.....
- ঝ) যেসব ক্ষেত্রে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়নি তার সংখ্যা.....এবং কোথায় কোথায় বিজ্ঞপ্তি টানানো হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে.....
- ঞ) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, দরপত্র গ্রহণ, দরপত্র মূল্যায়ন এবং কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ সহ বিস্তারিত তথ্যাদি ছক আকারে (প্রয়োজনীয় মতামতসহ) সংযুক্ত করতে হবে।
- ট) ডিপিপি অনুযায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে (Goods, Works, Services) কতটি দরপত্র আহ্বানের সংস্থান ছিল এবং প্রকল্পের আওতায় কতটি দরপত্র সম্পন্ন করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে.....
- ঠ) প্রকল্পের আওতায় কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে কি কি বিষয়ে (Goods, Works, Services) কতটি কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে তাদের সংখ্যা প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা সহ দিতে হবে:.....
- ড) বৈদেশিক অর্থ ছাড় ও ব্যয় করতে কোন ধরনের সমস্যা হয়েছিল কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না
যদি সমস্যা হয়ে থাকে তার বর্ণনা দিন.....
- ঢ) বৈদেশিক পরামর্শকগণের কর্মকাণ্ড-

বিশেষজ্ঞ (পদবী)	মাস	শুরুর তারিখ- শেষ করার তারিখ	কর্মপরিধি (TOR অনুযায়ী)	কাজের Output কি ছিল (Module/Gideline /Report)	কোথায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার ফলাফল
টিম লিডার / চীফ একজিকিউটিভ					
অপারেশনস ডাইরেক্টর					
ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর					
অ্যাডভাইজার(আইএমএলএ)					
লাইভলিহুডস কো-অর্ডিনেটর					
এন্টারপ্রাইজ কো-অর্ডিনেটর					
সোস্যাল মোবাইলিজেশন এন্ড গভর্নেন্স কো-অর্ডিনেটর					

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর :.....

(ধন্যবাদ দিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ করুন)

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) (প্রথম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ণ সমীক্ষা
ভৌত অবকাঠামোর গুণগতমান ও ক্রয় পদ্ধতি পর্যালোচনার প্রশ্নমালা/চেকলিষ্ট
(পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ ছক)

আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

(প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার জন্য নিম্নে উল্লিখিত প্রশ্নগুলো প্রযোজ্য)

ক্রমিক	বিবরণ	প্রকৃত	মন্তব্য
(ক) দরপত্র আহ্বান সংক্রান্ত			
১.	প্যাকেজ / দরপত্র নং :		
২.	কাজের ধরণ : মালামাল/কার্য/সেবা :		
৩.	দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের নাম :		
৪.	প্রতিটি প্যাকেজে কতটি করে লট আছে :		
৫.	ক্রয় পদ্ধতি :		
৬.	দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে কিনা। প্রকাশের তারিখ ও পত্রিকার নাম। (পত্রিকার কপি সরবরাহ করুন)		
৭.	দরপত্র (১ কোটি টাকার উর্ধ্ব) সিপিটিউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে কিনা।		
(খ) দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত			
৮.	দরপত্র দাখিলের তারিখ কত ছিল ?		
৯.	কতগুলো দরপত্র বিক্রয় করা হয়েছে ?		
১০.	কতগুলো দরপত্র জমা পড়েছে ?		
১১.	পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল কিনা ?		
(গ) দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত			
১২.	'দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি'র কতজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল ?		
১৩.	'দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি'র কতজন সদস্য দরপত্র উন্মুক্তকরণের সময় উপস্থিত ছিলেন ?		
১৪.	দরপত্র মূল্যায়নে কমিটি হতে ০১ (এক) জন সদস্য 'দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি'-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কিনা ?		
১৫.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে অত্র দপ্তরের বাইরের দপ্তর হতে ০২ (দুই) জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিনা ?		
১৬.	কত তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন শেষ করা হয়েছে।		
১৭.	উপযুক্ত (Responsive) দরদাতার সংখ্যা কত ?		
১৮.	দরপত্র মূল্যায়ন রিপোর্ট কত তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়া হয়েছিল ?		

ক্রমিক	বিবরণ	প্রকৃত	মন্তব্য
১৯.	কত তারিখে দরপত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে ?		
২০.	দরপত্র Delegation of Financial Power অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত হয়েছে কিনা?		
(ঙ) কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত			
২১.	কত তারিখে Notification of Award জারী করা হয়েছে ?		
২২.	Initial Tender Validity Period এর মধ্যে Contract Award করা হয়েছে কিনা ?		
২৩.	Contract Award CPTU-এর Website এ প্রকাশ করা হয়েছিল কিনা ?		
২৪.	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)		
২৫.	উদ্ধৃতদর (টাকা)		
২৬.	চুক্তিমূল্য (টাকা)		
২৭.	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ কত ছিল ?		
২৮.	বাস্তবে কাজ সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ করুন।		
২৯.	কাজ সমাপ্তিতে বিলম্ব হয়ে থাকলে Liquidated Damage আরোপ হয়েছে কি না ?		
৩০.	কাজটির মূল ঠিকাদার (প্রথম কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদার) কতক সমাপ্ত হয়েছিল কিনা ?		
(চ) বিল প্রদান সংক্রান্ত			
৩১.	প্রকল্পের প্রকৌশলী তত্ত্বাবধায়ন কর্তৃক কাজটি সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত মর্মে প্রত্যায়নের তারিখ কত ?		
৩২.	ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ ও দাখিলের তারিখ কত ?		
৩৩.	কর্তনকৃত আয়কর+ভ্যাট এর পরিমাণ কত ?		
৩৪.	বিলম্বে কোন বিল পরিশোধ করা হয়েছে কিনা ?		
৩৫.	বিলম্বে বিল পরিশোধের জন্য Interest পরিশোধ করা হয়েছে কিনা ?		
(ছ) দরপত্রের গ্রহণ যোগ্যতা ও স্বচ্ছতা সংক্রান্ত			
৩৬.	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের কোন পর্যায়ে কোন ধরনের অনিয়ম হয়েছে, এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন কিনা ?		
৩৭.	কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে তা কোন পর্যায়ে এবং কি ধরনের অনিয়ম হয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানেন কিনা ?		
৩৮.	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ/কার্যাদেশ প্রদান বিষয়ে কোন ধরনের অভিযোগ ছিল কি না।		
৩৯.	অভিযোগের কারণে কোন দরপত্রের Award modification করতে হয়েছে কিনা ?		
৪০.	কোন অভিযোগ থাকলে উহা মিটানো হয়েছে কিনা ?		

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর :.....
