

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রকল্প পরিবীক্ষণ ছক

পরিদর্শনের তারিখ: ০৭/০৫/২০১৮ খ্রিঃ

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: মোহাম্মদ এনামুল আহসান

পদবী : উপ-পরিচালক

সেক্টর: সেক্টর -৭

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

১. প্রকল্পের নাম: ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি
২. প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা): কারিগরি সহায়তা
- ৩.
- ৩.১ অর্থায়নের উৎস (জিওবি/ প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন/অন্যান্য) : প্রকল্প সাহায্য
- ৩.২ উন্নয়ন সহযোগী : আইডিএ এবং ডিএফআইডি
- ৪.
- ৪.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
- ৪.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)
৫. (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

(লক্ষ টাকা)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	*পরিবর্তন(+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ(%)
মূল	২৫১৫.৭৫	-	২৫১৫.৭৫	-	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৬	২৭-১১-২০১১		
সংশোধিত (১ম) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৭৫৩৯.০০	-	৭৫৩৯.০০	-	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৬	২১-১০-২০১৩	+	-
সংশোধিত (২য়) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৭৫৩৯.০০	-	৭৫৩৯.০০	-	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৬	২৫-০২-২০১৫	-	-
সংশোধিত (৩য়) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১০৩০৭.০০	-	১০৩০৭.০০	-	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৯	১০-০৪-২০১৬	+	+
							৩৬.৭২ %	৬০%

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): ৩০৯.৭০%

(গ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): ৬০%

৬. প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
ঢাকা	ঢাকা	বেপজা, ঢাকা এবং এর অধীনস্থ আটটি ইপিজেড		

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত):

দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বাধক নীতি ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান ও বেপজাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুদক্ষ করার লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পটি প্রনয়ণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি Private Sector Development Support Project (PSDSP) এর আওতাভুক্ত।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

৮. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭-১৮		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (এপ্রিল '১৮)	
			বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
০১	০২	০৩	০৪		০৫		০৬		০৭	
	টিএডিএ ও অন্যান্য এলাউপ			৬৩.০০		৩৫.৩৩		১০.৫০		৬.৪১
	প্রিন্টিং			২.০০						
	স্টেশনারী			১৩.০০		৩.২৫		২.০০		
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন			৩.০০				০.৫০		
	আপায়ন			৪.০০		১.০৮		১.০০		০.১২
	পরিবহন ব্যয়			২২০.০০		১৬৯.৬৭		২৪.০০		২৩.০৪
	প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফর			২৩০.০০		১৬৩.২৬		৪০.০০		
	প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফর (কাউন্সিলরদের জন্য)			১৫০.০০		১১৭.৪৭				
	বিনিয়োগ উন্নয়ন সেমিনার			২৩০.০০		১২৭.৫০		৪০.০০		৩৯.১৪
	ভিডিও ও পোস্টারিং এর সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ক্যাম্পেইন			১৫০.০০		১৪২.৯৪				
	এনভায়রনমেন্ট স্পেশালিষ্ট			২৮০.০০		৯৭.৮০		৪০.০০		২১.৬২
	আইটি সিস্টেম কনসালটেন্ট			৩৬৪.০০		১০১.১১		৪৮.০০		২৮.৫০
	সোস্যাল কাউন্সিলর			২৯৮৪.০০		১৮১৬.০১		৫৫৬.০০		৩৯৭.৬৯
	এনভায়রনমেন্টাল কাউন্সিলর			১৩৫৩.০০		৭০১.৩৪		২৭২.০০		১৮০.১২
	সোস্যাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল অডিট ফর ফার্ম			১১০.০০		৮৪.৯৯				
	বিজনেস অটোমেশনের জন্য ফার্ম নিয়োগ			২৯৬.০০		২৯৪.৯৮				
	সোসিং কনসালটেন্ট			১৯২.০০		১২৪.৯০		৩০.০০		১৯.০১
	আইটি ম্যানেজার			২১৬.০০		৮৮.৬৯		৩৮.০০		২৭.৫৫
	ম্যানেজমেন্ট অফ গ্রীণ জোন সেল			২০০.০০		১৭৭.৩৬				
	ক্রিয়ারিং, ফরওয়ার্ডিং ও অন্যান্য			৯.৫০		৮.৩৫				
	ল্যাব পরিচালন ব্যয়			৫৩.০০				২৪.০০		
	বিবিধ			১৮.৫০		১.২৪		৫.০০		০.০৯
	মোট রাজস্ব			৭১৪১.০০		৪২৫৭.২৭		১১৩১.০০		৭৪৩.৩১ (৬৫.৭২ %)
	মূলধন খাতঃ									
	হার্ডওয়ার ফর অটোমেশন			২২০.০০		২১৫.৯৭				

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭-১৮		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (এপ্রিল '১৮)	
			বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
০১	০২	০৩	০৪		০৫		০৬		০৭	
	কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদি ক্রয়			৭৯.৭২		৭৭.৪৭				
	ইপিজেড জেনস এবং এন্টারপ্রাইজের ভিতর কানেকটিভিটি			৯৫.০০		৯৪.৯৭				
	সোলার প্যানেল ফর স্ট্রীট লাইট এন্ড ইনভেস্টর ক্লাব এন্ড গ্রীণ ইনিশিয়েটিভ			৮৬৮.৮০		৮৬৮.৮০				
	ল্যাব স্থাপন			২৫০.০০		২৪৭.৬১				
	সিসি টিভি সার্ভিলেন্স সিস্টেম			৯৪০.০০		৯২৩.২২				
	ওয়াকিটকি সিস্টেম স্থাপন			১৪২.০০		১৪১.৮৩				
	ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন			৯০.০০		৮৭.৪৮				
	ইপিজেডে একসেস কন্ট্রোল সিস্টেম			১৭৫.০০		১৬২.৭০				
	সিডি, ভ্যাট			৩০৫.৪৮		৩০৫.৪৮				
	মোট মূলধন			৩১৬৬.০০		৩১২৫.৫৫				
	সর্বমোট (রাজস্ব ও মূলধন)			১০৩০৭.০০	৮৫%	৭৩৮২.৮২ (৭১.৬৩%)		১১৩১.০০		৭৪৩.৩১ (৬৫.৭২%)

৯. অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
২০১১-১২	১৪৪.৯০	৩৫০.০০	১৪৪.৯০	১৪৪.৯০ (৪১.৪০%)
২০১২-১৩	৩৬২.৫৪	৬৩৭.০০	৩৬২.৫৪	৩৬২.৫৪ (৫৬.৯১%)
২০১৩-১৪	৪৪০.৩৮	১৯৭৫.০০	৪৪০.৩৭	৪৪০.৩৭ (২২.২৯%)
২০১৪-১৫	৪৫৭৩.৬৫	৩৪৩৩.০০	১৯৭৫.৮৮	১৯৭৫.৮৮ (৫৭.৫৫%)
২০১৫-১৬	১৩২৭.৪৩	৩৭২০.০০	১৬৯৭.৬৮	১৬৯৭.৬৮ (৪৫.৬৩%)
২০১৬-১৭	১৩৮৪.০০	৩০০০.০০	২৭৬১.৪২	২৭৬১.৪২ (৯২.০৪%)
২০১৭-১৮	১৩৮৪.০০	১১৩১.০০	৭৪৩.৩০	৭৪৩.৩০ (৬৫.৭২%)

১০. (ক) ডিপিপি/টিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা:

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য: (লক্ষ টাকা)

প্যাকেজ (১,২,৩...)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
হার্ডওয়্যার ফর অটোমেশন (জি-২)	০৩.০৮.১৫ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা	০৩.১২.১৫ ২১৫.৯৭ লক্ষ টাকা	২৪.০৪.১৬	২৪.০৪.১৬	
কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, ল্যাপটপ, স্ক্যানার (জি-৩ সি)	০৪.১০.১৬ ৩৮.৩৮	২৮.১২.১৬ ২৯.৪৯	২৫.০৩.১৭	২৫.০৩.১৭	
ল্যান, ওয়ান কানেক্টিভিটি (জি ৪)	০৩.০৮.১৫ ১২৫.০০	০১.১২.১৫ ৮৯.৭১	২১.০৪.১৬	২১.০৪.১৬	
ইকুইপমেন্ট ফর এনভারনমেন্ট ল্যাব এ্যাট চিটাগঞ্জ ইপিজেড (জি ৬ এ)	২৫.০২.১৫ ২৪০.৭২	২১.০৬.১৫ ২২১.৩১	২০.০৯.১৫	২০.০৯.১৫	
ল্যাব ইন্টারনাল ওয়ার্কস ফর এনভারনমেন্ট ল্যাব এ্যাট চিটাগঞ্জ ইপিজেড (জি ৬ বি)	২৫.০২.১৫ ৩০.৭০	২১.০৬.১৫ ২৬.৩০	২০.০৮.১৫	২০.০৮.১৫	

প্যাকেজ (১,২,৩...)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
সিসিটিভি সারভেলাস সিস্টেম এন্ড বেসজা এক্সিকিউটিভ অফিস এবং ঢাকা, আদমজী, কুমিল্লা ইপিজেড (জি ৭)	০৫.০৭.১৫ ৯৪০.০০	৩০.১১.১৫ ৯২৩.২২	৩০.০৬.১৫	৩০.০৬.১৫	
ইনস্টলেশন অফ ওয়াকিটিকি সিস্টেম (জি ৮)	২২.০২.১৫ ২২৫.০০	২৬.০৭.১৫ ১৩৩.১২	০৯.১২.১৫	০৯.১২.১৫	
ইনস্টলেশন অফ ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম (জি ৯)	০৩.০২.১৫ ১২৫.০০	২৬.০৭.১৫ ৮৭.৪৮	১৯.১২.১৫	১৯.১২.১৫	
এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম (জি ১০)	১২.১১.১৫ ২৭৫.০০	০১.০৩.১৬ ১৬২.৭০	২৯.০৫.১৬	২৯.০৫.১৬	
এনভারনমেন্টাল স্পেশালিটি (এস ২)	২৮০.০০	১৪২.১৫	৩১.১২.১৮		
আইটি সিস্টেম কনসালটেন্ট (এস ৩)	৩৬৪.০০	১৫৬.৬২	৩১.১২.১৮		
আইটি ম্যানেজার (এস ৬)	২১৬.০০	১৪৩.৩৪	৩১.১২.১৮		
সোর্সিং কনসালটেন্ট (প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিটি) (এস ৮)	১৯২.০০	১৬৩.৪১	৩১.১২.১৮		

১১. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):

প্রকল্প পরিচালক-এর আইডি নং	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
এ কে এম মাহবুবুর রহমান	বেপজা, সদস্য (অর্থ)	০১.০৭.২০১১ — ৩১.০১.২০১৫	অতিরিক্ত	হ্যাঁ	
মোঃ আশরাফুল কবীর	বেপজা, প্রধান প্রকৌশলী	০১.০২.২০১৫- অদ্যাবধি	অতিরিক্ত	হ্যাঁ	

১২. ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে): প্রযোজ্য নহে।

১৩. অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: কোন অডিট আপত্তি নাই।

১৪. স্ট্রিয়ারিং/পিআইসি সভা সংক্রান্ত: ২ টি স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা ও ০৩ টি পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৫. Project Management Information System (PMIS)/অনলাইনে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের তারিখ (পিএমআইএস চালু হলে): প্রযোজ্য

গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ:

১৬. (ক) পরিদর্শনকৃত এলাকা: বেপজা প্রধান কার্যালয়, ধানমন্ডি ১২০৫, ঢাকা।

(খ) পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারীর নাম ও তারিখ: প্রযোজ্য নয়।

১৭. পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:

ক. অজ্ঞাভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ডিপিপি/টিএপিপি'র সংস্থান প্রতিপালন: অজ্ঞাভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে টিএপিপি'র সংস্থান প্রতিপালন করা হচ্ছে মর্মে জানা যায়।

খ. পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় প্রচলিত আইন/বিধি অনুসরণ: পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ে প্রচলিত আইন/বিধি অনুসরণ করা হচ্ছে মর্মে জানা যায়।

গ. গুণগতমান (প্রয়োজনে ল্যাব-টেস্টিং-এর ফলাফলের মাধ্যমে যাচাইকৃত):

- সম্পাদিত কাজ: সন্তোষজনক।
- ব্যবহৃত পণ্য/ উপকরণ: সন্তোষজনক।

ঘ. সাইট বই পর্যালোচনা (ভৌত কাজের ক্ষেত্রে): প্রযোজ্য নয়।

ঙ. বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত নতুন ঝুঁকি/ বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে): প্রযোজ্য নয়।

চ. সুবিধাভোগীর মতামত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): প্রযোজ্য নয়।

ছ. অন্যান্য বিষয় (যদি থাকে): প্রযোজ্য নয়।

১৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত আইএমইডি কর্তৃক গত ০৭/০৫/২০১৮ তারিখে বেপজা, প্রধান কার্যালয়, ধানমন্ডি ১২০৫, ঢাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় উপ ব্যবস্থাপক (হিসাব), বেপজা, ও আইটি ম্যানেজারসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। পরিদর্শনকালীন প্রকল্পের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা এবং সরেজমিন পরিদর্শনে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ সমূহ পাওয়া যায়:

১৮.১ পরিদর্শন:

প্রকল্পের আওতায় ইপিজেডে শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে ৬০ জন সোশ্যাল কাউন্সিলর ও পরিবেশগত দিক বিবেচনার জন্য ৩০ জন এনভায়রনমেন্ট কাউন্সিলর নিয়োগ করা হয়েছে। Process Development খাতের আওতায় ৬৩টি মডিউলের মধ্যে ১৫টি মডিউল Automation করা হয়েছে। কর্মকর্তা কর্মচারীদের কম্পিউটার ব্যবহারের জন্য ব্যাসিক লেবেল ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ড্রিলিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ফিন্যান্সিয়াল কমপ্লায়েন্স ও ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। Environment Specialist নিয়োগ করা হয়েছে। Automation কাজের জন্য Hardware ক্রয় ও সংস্থাপন করা হয়েছে। গ্রীন ইনিশিয়েটিভের জন্য চট্টগ্রাম ইপিজেডে ইনভেস্টরস্ ক্লাব ও রাস্তার বাতির জন্য সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা ইপিজেড এবং চট্টগ্রাম ইপিজেডে এনভায়রনমেন্ট ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। জোনের নিরাপত্তার জন্য সিসি টিভি স্থাপন করা হয়েছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ উন্নয়ন সেমিনার ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

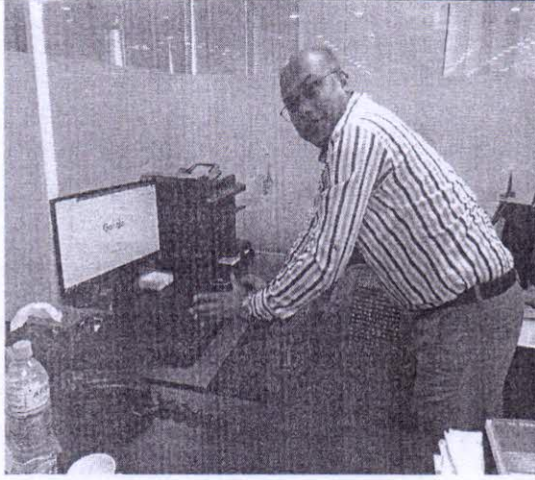
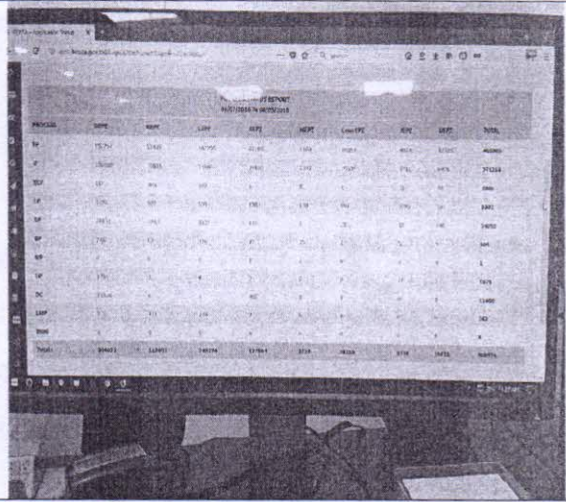


১৮.২ আর্থিক অগ্রগতি :

বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প ব্যয়	মন্তব্য
মোট প্রকল্প ব্যয় (৩য় সংশোধিত) এডিশনাল ফাইনানসিং সহ	১০৩০৭.০০	৮০৫২.৮২	আর্থিক অগ্রগতি ৭৮.১৩৫%
এডিশনাল ফাইনানসিং	২৭৬৮.০০	৮৮৩.৪১	আর্থিক অগ্রগতি ৩১.৯২%
আরএডিপি ২০১৭-২০১৮	১১৩১.০০	৬৭০.০০	আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.২৪%

১৮.৩ কর্মপরিকল্পনাঃ এ প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়া হয়েছে।

১৮.৪ ক্রয় পরিকল্পনাঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়া হয়েছে।

১৯. প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির/ ভিডিও চিত্র ও বর্ণনা:

চিত্র	চিত্র
	
চিত্র-১ অটোমেশান কার্যক্রম	চিত্র-২ অটোমেশানের জন্য সফটওয়্যার
	
চিত্র-৩ বেপজার ওয়ার্কস্টেশন	চিত্র-৪ বেপজার এক্সেসেস কন্ট্রোল


২০. সুপারিশ/মতামত:

- ২০.১ নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তির নিমিত্ত সময় ভিত্তিক ওয়ার্ক প্ল্যান প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালককে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।
- ২০.২ ডিপিপি অনুযায়ী পিআইসি ও স্ট্রয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন করা হয়নি। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে নিয়মিতভাবে পিআইসি ও স্ট্রয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে। এ'ব্যাপারে সংস্থা প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো;
- ২০.৩ এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ অনুসারে অত্র প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের অংগভিত্তিক ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। আর্থিক অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় (৫৯.২৪%)। আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

[Handwritten signature]

- ২০.৪ প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম জোরালো করার জন্য বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সার্বিক কাজের অগ্রগতি বাস্তবায়নকারী সংস্থা আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে নিয়মিত অবহিত করা বাঞ্ছনীয়।
- ২০.৫ প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি (আইএমইডি/০৫ ও আইএমইডি/০৩) নিয়মিতভাবে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডিতে প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ২০.৬ উপরোক্ত সুপারিশ/মতামত (অনুচ্ছেদ ২০.১ হতে ২০.৫) অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা আগামী ২১ দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে অবহিত করবে।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা

স্বাক্ষর ... 
২৭/৫/১৮

নাম: মোহাম্মদ এনামুল আহসান
পদবী: উপ-পরিচালক
তারিখ: ২৭/০৫/১৮
ফোন নম্বর: ৯১৮০৭০৬
